//// gov.br/sudene

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DA SUDENE

3º ciclo de monitoramento
e avaliação 2021

Sudene

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PÁTRIA AMADA
BRASIL
GOVERNO FEDERAL

Arte: Freepik.com (adaptado)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

Relatório de Acompanhamento da Execução Programática da Sudene
3º Ciclo de Monitoramento e Avaliação 2021

RECIFE/PE
2021

Sumário

1. Introdução 1
2. Resultados do Monitoramento dos Planos Operativos e Planos Operativos Prioritários 1
3. Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) 12
4. Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais 23
5. Indicadores de Gestão de Convênios 29
6. Indicadores de Gestão de Pessoas 35
7. Indicadores de gestão da Comunicação Social e Marketing Institucional 38
8. Metas de desempenho institucional para o período out/2020 - set/2021 49
9. Conclusão 54

Lista de Anexos

ANEXO I - Planos Operativos do Monitoramento;

ANEXO II - Gestão Orçamentária e Financeira (Posição até setembro/2021);

ANEXO III - Planos Operativos tabulados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da Sudene;

ANEXO IV – Planos Operativos tabulados segundo a Programação do PPA;

ANEXO V – Planos Operativos tabulados segundo Unidades Administrativas da Sudene;

ANEXO VI – Planos Operativos Prioritários;

ANEXO VII – Planos Operativos prioritários, tabulados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da Sudene;

ANEXO VIII – Planos Operativos prioritários, tabulados segundo a Programação do PPA;

ANEXO IX – Planos Operativos prioritários, tabulados segundo Unidades Administrativas da Sudene.

1. Introdução

A Sudene, por meio da Coordenação-Geral de Gestão Institucional (CGGI), apresenta o **3º Ciclo de Monitoramento e Avaliação 2021** dos Planos Operativos elaborados e acompanhados pelas Coordenações-Gerais das Diretorias de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN) e Diretoria de Fundos e de Atração de Investimentos (DFIN). O referido ciclo manteve o processo de monitoramento de sua programação com base no planejamento estratégico vigente, tendo sido elaborado com base na Metodologia de Monitoramento e Controle da Programação, aprovada pela 121ª reunião da Diretoria Colegiada em 01/11/2012.

Cabe destacar que o presente relatório esboça a situação dos planos operativos considerados estratégicos pela administração da Sudene até a data de fixação 30/09/2021, como também informa os resultados obtidos por meio dos indicadores de desempenho destinados a acompanhar tanto a gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, como dos incentivos fiscais, dos convênios, da gestão de pessoas e da comunicação social e marketing. A fim de permitir maior visibilidade do projeto e de suas etapas, os mesmos são apresentados por meio de planilhas eletrônicas (Anexos I e VI).

Destaca-se a necessidade de acompanhamento e monitoramento dos projetos, que ocorrem trimestralmente, no sentido de envolver a administração superior, a fim de reduzir a quantidade de insucessos, melhorar a qualidade da sua execução e proporcionar a conclusão dos projetos em sua grande maioria. Percebe-se que nos ciclos anteriores vários projetos permaneceram com status “em atraso” e “paralisados”, fato que demandou da Coordenação-Geral de Gestão Institucional providências junto à alta gestão para entendimento e resolução dos entraves. Um dos fatores relevantes para o fato acima mencionado foi a permanência da pandemia do coronavírus, que impactou bastante o desenvolvimento das atividades e etapas previstas, sendo necessária a alteração no cronograma de execução de vários projetos.

Neste terceiro ciclo de 2021, foram mapeados **211** projetos, dos quais: 16 foram concluídos, 175 estão em andamento, 11 estão atrasados em sua execução, 2 foram cancelados e 7 paralisados.

De acordo com as apurações feitas, até 30 de setembro de 2021, a unidade com maior quantidade de projetos, perfazendo um total de 139, o que engloba as emendas parlamentares, permanece sendo à Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres (COCIC), unidade vinculada à Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS) da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN). Os demais projetos e suas unidades responsáveis serão detalhados no decorrer do relatório.

Com o objetivo de manter a transparência e o princípio da impessoalidade, o referido documento será disponibilizado no *site* da Sudene por meio do *link*: https://www.gov.br/sudene/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/gestao-institucional para acesso dos órgãos de controle e diversos atores que tenham interesse em conhecer e acompanhar as ações e entregas da instituição em sua área de atuação. Entende-se que, dessa forma, a Sudene fortalece o controle social e acesso à informação.

2. Resultados do Monitoramento dos Planos Operativos e Planos Operativos Prioritários.

Este tópico apresentará a situação dos Planos Operativos que são conduzidos pelas unidades finalísticas, de gestão e de suporte da Sudene. Entende-se como Planos Prioritários as atividades e

projetos interdisciplinares e de alta complexidade ligados diretamente ao atingimento da finalidade da autarquia, que é a promoção do desenvolvimento includente e sustentável de sua área de atuação e a integração competitiva da base produtiva regional na economia nacional e internacional.

É importante esclarecer que os planos prioritários foram submetidos e aprovados pela Diretoria Colegiada, por meio dos documentos: ata da 304ª reunião da Diretoria Colegiada, de 16 de maio de 2018 e Resolução nº 281/2017. Isso explica o fato de estarem separados por anos 2017 e 2018.

2.1 – Resultados Gerenciais do 3º Ciclo de Monitoramento 2021.

Neste ciclo, a Coordenação-Geral de Gestão Institucional atualizou, juntamente com as unidades responsáveis, os *status* e etapas dos projetos e apresentou por meio do quadro a seguir o quantitativo de projetos por Coordenações-Gerais e suas respectivas Diretorias. A fim de proporcionar melhor entendimento, os projetos da Coordenação-Geral de Desenvolvimento Sustentável - CGDS foram especificados separadamente dos que ficam sob a responsabilidade da COCIC, unidade vinculada à citada Coordenação-Geral.

Quadro 1 - Situação dos Planos Operativos do 3º ciclo 2021, por Diretoria e unidade vinculada, segundo o Status

STATUS	DPLAN				DFIN	DAD		Total
	CGDS	CGEP	CGCP	COCIC	CGDF	CGGP	CPTCE	-
A Iniciar								
Concluído	3	2	1	4	6			16
Em Andamento	15	10	7	128	12	2	1	175
Atrasado	1			6	4			11
Cancelado		2						2
Paralisado	3	1	1	1	1			7
TOTAL	22	15	9	139	23	2	1	211

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Ressalta-se que houve um avanço significativo em relação ao ciclo anterior no que se refere ao aumento dos projetos que foram concluídos e diminuição dos projetos que estavam atrasados. Em relação ao quantitativo de projetos paralisados, não houve variação. Abaixo segue figura para melhor visualização:

Figura 1 - Comparativo de resultado com ciclo anterior.

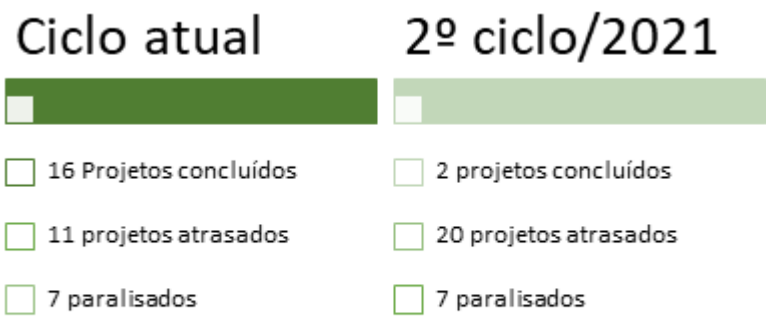

Neste relatório apresenta-se também as principais alterações realizadas em cada projeto, fazendo um comparativo entre a situação atual e a situação dos projetos no ciclo anterior, para um melhor entendimento da problemática que impossibilita o andamento dos trabalhos conforme o que fora planejado:

Projeto	Unidade Responsável	Situação no 2º ciclo/2021	3º ciclo/2021
PO CGGP 2018001 - Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho:	CGGP/DAD	Percentual de execução 62%	Aumento no percentual de execução para 80%
PO CGGP 2020001 - Indicadores de Gestão de Pessoas:	CGGP/DAD	Percentual de execução 31%	Aumento no percentual de execução para 80%
PO CGEP 2019001 - Avaliação Qualidade dos Gastos Municipais	CGEP/DPLAN	Status atrasado	Projeto concluído
PO CGEP 2019004 - Rede de Poços e Barragens	CGEP/DPLAN	Status Paralisado	Projeto cancelado podendo ser retomado em momento oportuno.
PO CGEP 2020001 - Estudo de georeferenciamento das empresas incentivadas na área de atuação da Sudene	CGEP/DPLAN	Status atrasado	Status em andamento Alteração na data de conclusão do projeto para 30/11/2021.
PO CGEP 2019005 - Estruturar processos de inteligência necessários ao monitoramento da carteira de programas	CGEP/DPLAN	Status atrasado, com etapas canceladas	Projeto paralisado Está em tratativas com a CGEE aguardando o envio de produtos para análise da

e projetos do PRDNE - Trilha 3			Sudene.
PO CGEP 2020006 - INOVA + NE	CGEP/DPLAN	Status em andamento	Projeto cancelado Será reescrito, tendo já em processo nova estratégia de implementação
PO CGEP 2020008 - Avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE	CGEP/DPLAN	Status em andamento, com etapas em atraso	As etapas foram repactuadas em função do atraso do MDR em definir pela aprovação do plano de trabalho; Data de conclusão do projeto alterada para 15/11/2021.
PO CGEP 2021001 (ex PO CGEP/2019003) - Redelimitação do Semiárido:	CGEP/DPLAN	Status em andamento	Projeto totalmente reformulado em função do novo normativo; Novo número de PO 2021001 com ajustes em suas etapas e prazos.
PO CGEP 2020002 - IDEB como instrumento direcionador regional das Políticas Públicas da Educação:	CGEP/DPLAN	Status em andamento	Data de conclusão do projeto alterada para 31/12/2021
PO CGEP 2020010 - Avaliação de Políticas Públicas	CGEP/DPLAN	Status em andamento	Projeto teve alteração de etapas e de datas em função da priorização de outros processos internos.
PO CGDS 2018002 - Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público:	CGDS/DPLAN	Status paralisado	Status paralisado Projeto será apresentado à atual Gestão para verificação de interesse em retomar as articulações com a FAO.

PO CGDS 2018004 - BIOÁGUA FAMILIAR	CGDS/DPLAN	Status paralisado	Status paralisado O projeto possui recursos em restos a pagar 2018 que precisa ser liquidado neste ano, sob pena de cancelamento.
PO CGDS 2012001 - - Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	CGDS/DPLAN	Status em andamento	Status paralisado Projeto com pendência apenas na realização do seminário Nordestino, que devido a pandemia teve sua realização adiada, com data a definir. Existe a possibilidade de prorrogação do prazo de conclusão do projeto.
PO CGDS 2014001 - Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano.	CGDS/DPLAN	Status paralisado	Status em andamento Em função da pandemia, o projeto teve algumas atividades paralisadas, tendo sido aditivado, passando a ter a sua vigência até 26/12/2021. A Empaer solicitou ajuste no plano de trabalho para finalizar as atividades restantes.
PO CGDS 2015001 - Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	CGDS/DPLAN	Status atrasado	Status atrasado Aguardando conclusão do posicionamento técnico final, com previsão de conclusão em novembro/2021.

- PO CGDF 2012002 - Natulab**;** **- PO CGDF 2012003 -** Deten; **- PO CGDF 2012004 -** Braskem; **- PO CGDF 2015001 -** Tiberina; **- PO CGDF 2016001 -** Brametal;	CGDF/DFIN	Status atrasado	Projetos concluídos
PO CGDF 2008002 - Candeias; **- PO CGDF 2011001 -** Embuaca; **- PO CGDF 2011002 -** Bela Vista; e **- PO CGDF 2011003 -** Mar e Terra.	CGDF/DFIN	Status atrasado	Status atrasado Foi realizado esforço junto ao Banco do Nordeste – BNB, para dirimir dúvidas em relação à emissão dos Certificados de Empreendimento Implantado, alguns atrasados desde 2008.
PO CGCP 2020001 - Revisão PRDNE	CGCP/DPLAN	Status em andamento	Status em andamento O produto 6 está em análise pela CGCP para aprovação.
PO CGCP 2021004 - Guarabira	CGCP/DPLAN	Status em andamento	O procedimento licitatório

			está atrasando a execução do projeto, porém, segundo informado pela Prefeitura, houve contestação por um dos concorrentes.
PO CGCP 2021005 - CINEP	CGCP/DPLAN	Status em andamento	Status em andamento O procedimento licitatório está atrasando a execução das próximas etapas do projeto e, segundo informado pela Prefeitura, a licitação foi publicada nos meios exigidos, com data marcada para 11/01/2022
PO CGCP 2017001 Feira de Santana	CGCP/DPLAN	Status paralisado	Status paralisado Algumas de suas etapas foram canceladas pelo PNUD e CGEE, após Termo Aditivo ao Acordo que suprimiu parte de seus produtos. A JOF/PNUD solicitou o pagamento parcial do produto 4, que foi aprovado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do produto, conforme decisão da 397ª Diretoria Colegiada.

As tabelas 1, 2 e 3 a seguir mostram a distribuição e performance dos projetos, respectivamente, segundo diretrizes e objetivos estratégicos da Sudene; os programas e as ações do PPA; e segundo as unidades administrativas. E o Gráfico 1, em sequência, apresenta a evolução dos projetos monitorados na Sudene ao longo dos ciclos de monitoramento de 2020 até o presente ciclo de 2021.

Tabela 1 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo
Diretrizes e Objetivos Estratégicos, conforme o andamento até o 3º Ciclo de Monitoramento de 2021

Diretriz Estratégica	Objetivo Estratégico	Projetos enquadrados (qtde)	Recursos previstos (R$ 1 mil)	Recursos liberados (3) (R$ 1 mil)	STATUS						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
1	1.1	189	6.054.945,50	4.524.872,54		14	158	10	1	6	189
	1.2	1	199,40	0,00			1				1
	1.3	3	0,00	0,00			3				3
	1.4	4	864,6	864,6			3		1		4
	1.5	2	0,00	0,00		2					2
Sub-Total		199	**6.056.009,50**	**4.525.737,14**		16	165	10	2	6	199
2	2.1	1	0,00	0,00			1				1
	2.2	5	2.850,81	201,11			5				5
	2.3	2	989,48	989,48				1		1	2
Sub-Total		8	**3.840,29**	**1.190,59**			6	1	0	1	8
3	3.1	4	75,00	20,21			4		0	0	4
Sub-Total		4	**75,00**	**20,21**			4		0	0	4
TOTAL		**211**	**6.059.924,79**	**4.526.947,94**		**16**	**175**	**11**	**2**	**7**	**211**

Posição em setembro/2021.
3º Ciclo 2021

Notas:
[1]As convenções utilizadas para identificar diretrizes e objetivos estratégicos são as seguintes: **1-Promover a Competitividade Sistêmica da base produtiva do Nordeste; 1.1** – Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores; **1.2** - Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva; **1.3** - Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes; **1.4**-Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido**; 1.5 –** Fortalecer as administrações públicas; **2-Universalizar o acesso a ativos estratégicos; 2.1.** - Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis; **2.2.** - Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o Semiárido; **2.3**-Promover a sustentabilidade ambiental; **3-Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE; 3.1**-Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências.
[2]Os denominados "Projetos Enquadrados" incluem os apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.
[3]Os dados sobre "Recursos Previstos" consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.
[4] Siglário para Status: INI – A iniciar; CON-Concluído; AND – Em Andamento; ATR – Atrasado; CAN – Cancelado; PAR – Paralisado.

Tabela 2 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo
Programas e Ações do PPA, conforme o andamento até o 3º Ciclo de Monitoramento de 2021

Programa do PPA (1) (Código)	Ação do PPA (1) (Código)	Projetos enquadrados (2) (qtde)	Recursos previstos (3) (R$ 1 mil)	Recursos liberados (3) (R$ 1 mil)	STATUS						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
2029/2017	0355	22	5.955.047,37	4.468.304,11		6	11	4		1	22
	20N7	1	343,59	343,59			1				1
	8689	2	989,48	989,48				1		1	2
	8902	3	1.686,89	339,52			2			1	3
	8917	2	969,57	969,57		1	1				2
	20WQ	10	8.440,18	3.335,84		1	7			2	10
	7K66	115	70.604,77	39.422,62		2	109	3		1	115
	214S	26	15.523,65	10.867,04		2	21	3			26
	8340	13	5.129,80	1.445,72		2	10			1	13
	4640	2	765,00	560,74			2				2
Sub-Total		**196**	**6.059.500,29**	**4.526.578,23**		**14**	**164**	**11**		**7**	**196**
2111/0032	2000	4	**75,00**	**20,21**			4				4
Sub-Total		**4**	**75,00**	**20,21**			**4**				**4**
Ações Internas		11	349,50	349,50		2	7		2		**11**
Sub-Total		**11**	**349,50**	**349,50**		**2**	**7**		**2**		**11**
TOTAL		**211**	**6.059.924,79**	**4.526.947,94**		**16**	**175**	**11**	**2**	**7**	**211**

Posição em Setembro/2021.
3º Ciclo 2021

Notas:
[1]Códigos de Programas e respectivas Ações do PPA 2020-2024: **Programa 2217** - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano (Ações: **20WQ** -Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial; **214S** - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas; **8340** - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação; **8917**- Fortalecimento das Administrações Locais; **7K66 –** Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado -**0355 –** Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do FDNE; **20N7 –** Provimento de Infraestrutura Produtiva para Arranjos Produtivos Locais – Plano Brasil sem Miséria; **8689 –** Elaboração e Implementação de Zoneamento Ecológico-Econômico; **8902 –** Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica - **Ação 4640** - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade; **Programa 2111 – Gestão e Manutenção do Ministério da Integração Nacional** (Ação **2000 –** Administração da Unidade); **Ações internas** - são aquelas que não usarão recursos orçamentários e relacionam-se com o cumprimento de uma atribuição institucional.
[2]Os denominados "Projetos Enquadrados" incluem os apoiados por transferências voluntárias, os financiados pelo FDNE e os considerados estratégicos pela alta administração pois também contribuem para o alcance da missão institucional.[3]Os dados sobre "Recursos Previstos" consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. [4] Recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

Tabela 3 - Distribuição Quantitativa dos Projetos segundo

Unidades administrativas da SUDENE, conforme o andamento até o 3º Ciclo de Monitoramento de 2021

Diretoria	Unidade Adm.	Projetos enquadrados (2) (qtde)	Recursos previstos (3) (R$ 1 mil)	Recursos liberados (3) (R$ 1 mil)	STATUS						
					INI	CON	AND	ATR	CAN	PAR	Total
DPLAN	CGDS	22	8.648,44	4.645,20		3	15	1		3	22
	CGEP	15	3.673,64	1.764,38		2	10		2	1	15
	CGCP	9	8.092,24	2.350,84		1	7			1	9
	COCIC	139	84.388,10	49.863,20		4	128	6		1	139
Sub-Total		**185**	**104.802,42**	**58.623,62**		**10**	**160**	**7**	**2**	**6**	**185**
DFIN	CGDF/FDNE	23	5.955.047,37	4.468.304,11		6	12	4		1	**23**
Sub-Total		**23**	**5.955.047,37**	**4.468.304,11**		**6**	**12**	**4**		**1**	**23**
DAD	CPTCE	1	0,00	0,00			1				**1**
	CGGP	2	75,00	20,21			2				**2**
Sub-Total		**3**	**75,00**	**20,21**			**3**				**3**
TOTAL		**211**	**6.059.924,79**	**4.526.947,94**		**16**	**175**	**11**	**2**	**7**	**211**

Posição em setembro/2021.
3º Ciclo 2021

Notas:
[1]As siglas das unidades administrativas encontram-se no site da SUDENE no endereço: https://www.gov.br/sudene/pt-br/centrais-de-conteudo/siglas-outubro-2019-pdf
[3]Os dados sobre "Recursos Previstos" consideram a participação da SUDENE em um convênio ou na execução direta de um projeto, ou em um empreendimento, no caso de financiamento pelo FDNE. Não inclui os incentivos fiscais. E os recursos liberados retroagem ao início da execução que, em alguns casos, remonta a anos anteriores.

Gráfico 1 - Comparativo dos Projetos nos ciclos anteriores

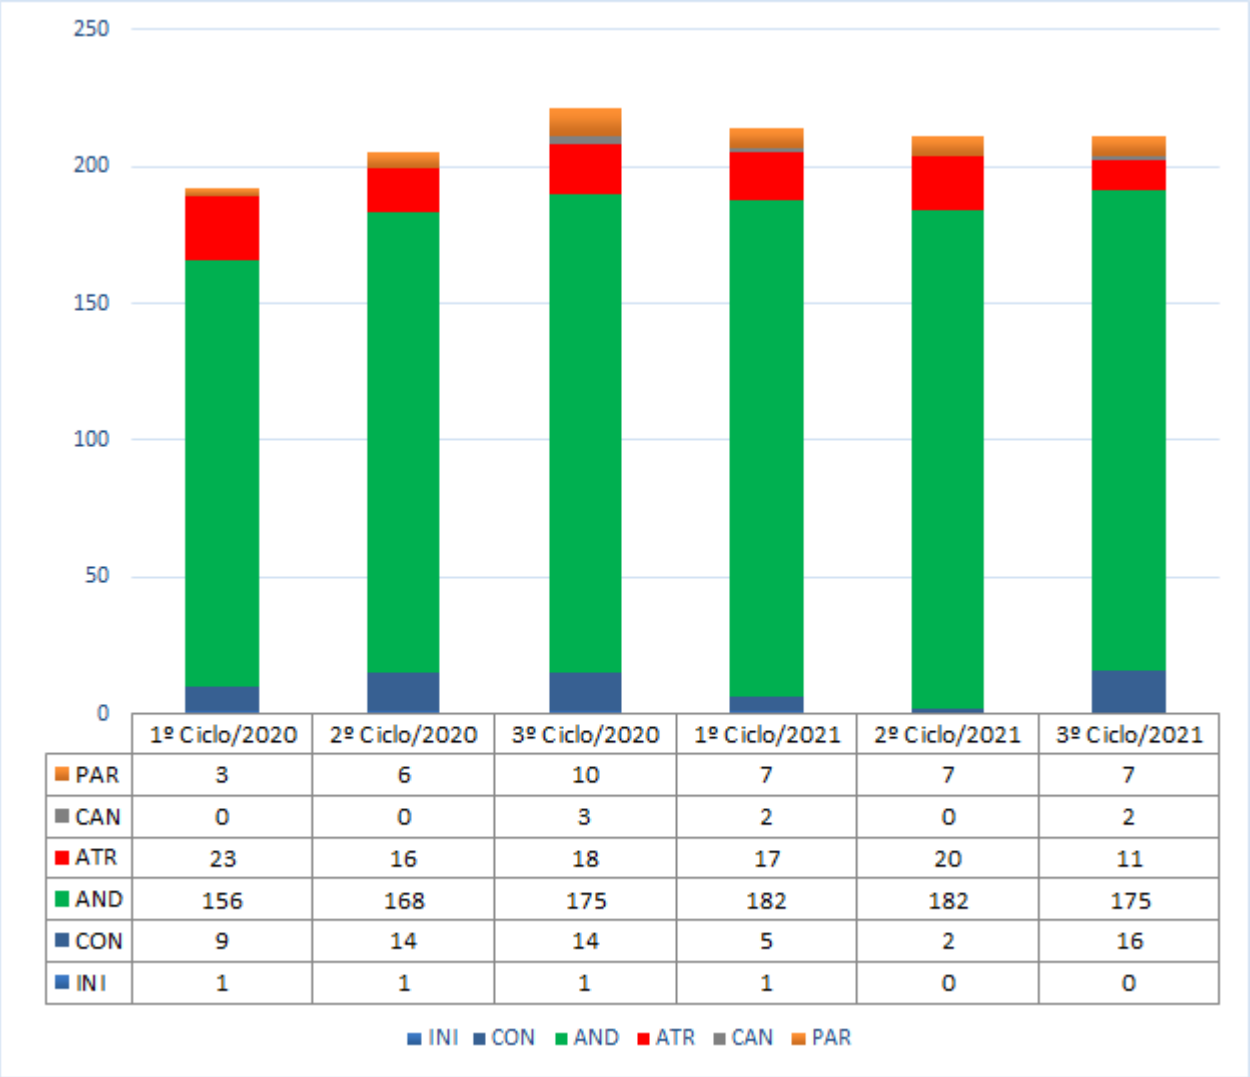

	1º Ciclo/2020	2º Ciclo/2020	3º Ciclo/2020	1º Ciclo/2021	2º Ciclo/2021	3º Ciclo/2021
PAR	3	6	10	7	7	7
CAN	0	0	3	2	0	2
ATR	23	16	18	17	20	11
AND	156	168	175	182	182	175
CON	9	14	14	5	2	16
INI	1	1	1	1	0	0

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

3. Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).

3.1 - Capacidade de Análise de Consultas-Prévias do FDNE (CACP, ex-CACC)

a) Fórmula: Consultas Prévias Analisadas x 100 = 21 x 100 = 100%
Consultas Prévias Protocoladas [1] 21

b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento – CGDF/DFIN.

d) Resultado ideal (%): 100,00%

e) Periodicidade: **Jan a Set/2021.**

f) Comentários: Não informado.

g) Representação gráfica de resultados:

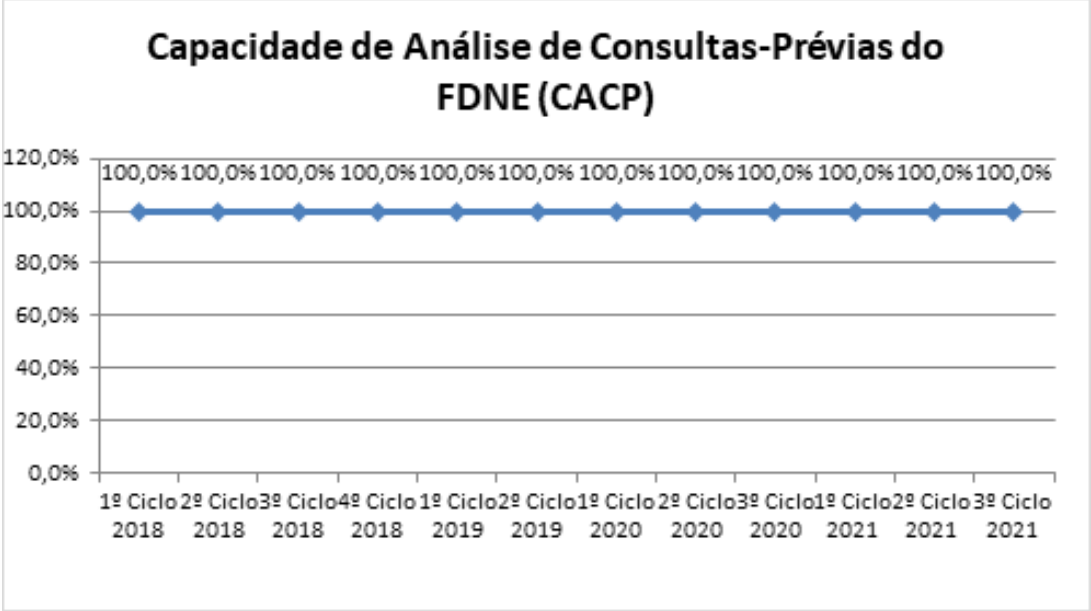

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento.

Nota:[1] até 30 dias antes da data base do monitoramento, excluídas as Consultas Prévias em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise "invadam" o intervalo da contagem.

3.2 - Produtividade da Análise de Consultas Prévias do FDNE (PACP, ex-PACC)

a) Fórmula: Consultas Prévias Analisadas = 21 = 7,00 análises/técnico
Nº de Técnicos 3

b) Objetivo: Aferir a produtividade da equipe técnica na análise de Consultas Prévias no período de monitoramento.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento – CGDF/DFIN.

d) Resultado ideal (índice): (quanto maior melhor).

e) Periodicidade: **Jan a Set/2021.**

f) Comentários: demanda por novos financiamentos reprimida em face da conjuntura econômica e política vigente no período.

g) Representação gráfica dos resultados:

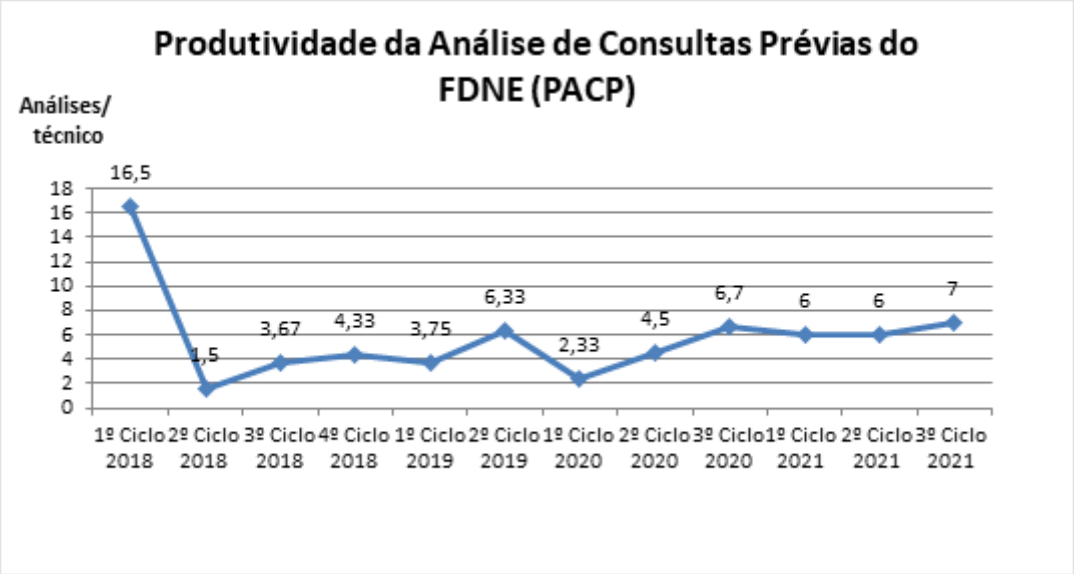

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.

3.3 - Inconsistência das Consultas Prévias Apresentadas ao FDNE (CCPA, ex-CCCA)

a) Fórmula: Consultas Prévias Devolvidas x 100 = 8 x 100 = 38%
Consultas Prévias Protocoladas [1] 21

a. Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos apresentados, ou seja, o quanto, em termos relativos, de consultas prévias protocoladas foram rejeitadas (consideradas fora dos critérios técnicos estabelecidos pela Sudene).

b) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento – CGDF/DFIN.

c) Resultado ideal (%): 0,00% (quanto menor melhor)

d) Periodicidade: **Jan a Set/2021.**

e) Comentários: Não informado.

f) Representação gráfica dos resultados:

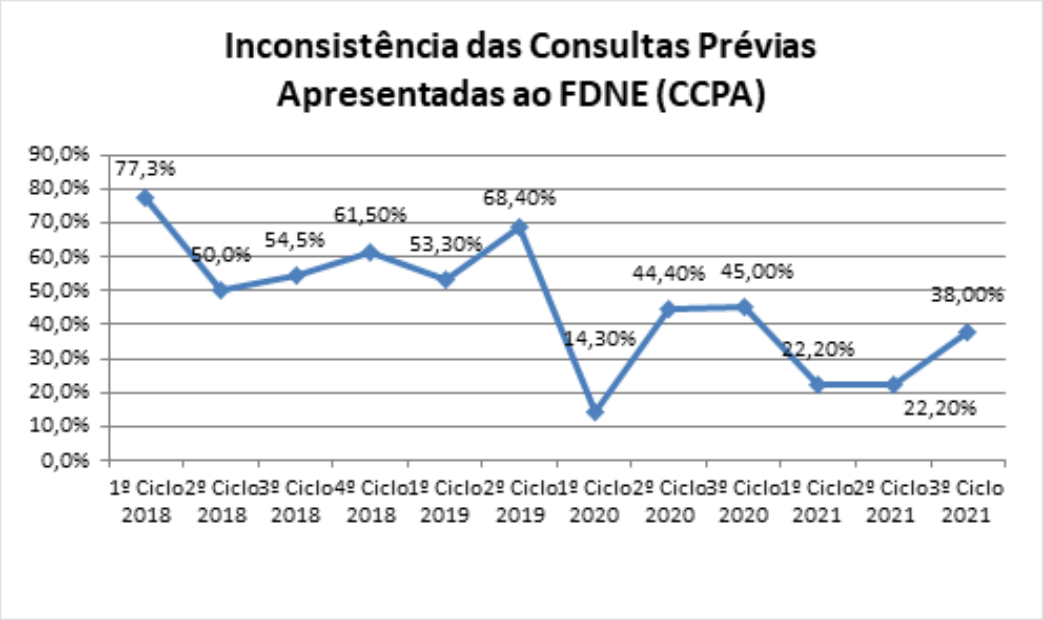

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Nota:
[1] Consideradas as consultas prévias protocoladas até 30 dias antes da data base do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência, não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a Sudene para analisá-las, mas para evitar que pleitos em processo de análise "invadam" o intervalo da contagem.

3.4 – Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador (TAP-Banco Operador)

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

Fórmula: $\frac{\text{Tempo médio de análise (BNB)}}{150 \text{ dias}} = \frac{0{,}0 \text{ dias}}{150 \text{ dias}} = 0{,}00$

a.2) Banco do Brasil – BB

Fórmula: $\frac{\text{Tempo médio de análise (BB)}}{150 \text{ dias}} = \frac{41{,}4 \text{ dias}}{150 \text{ dias}} = 0{,}27$

a.3) Caixa Econômica Federal - CEF

a) Fórmula: Tempo médio de análise (CEF) / 150 dias = 0,0 dias / 150 dias = 0,00

b) Objetivo: Aferir o tempo médio de análise pelo Banco Operador em relação ao limite regulamentar.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento-CGDF/DFIN.

d) Resultado ideal (índice): igual ou menor que 1 (um).

e) Periodicidade: **Jan a Set/2021.**

f) Comentários: O prazo considerado inclui as prorrogações legais previstas (Art. 20 do Regulamento do FDNE aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012). Indicador com sinalização de revisão, inclusive seu nome. A sugestão em estudo: Índice de Performance de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco Operador. Não foram apresentados projetos ao BNB e à CEF.

g) Representação gráfica dos resultados:

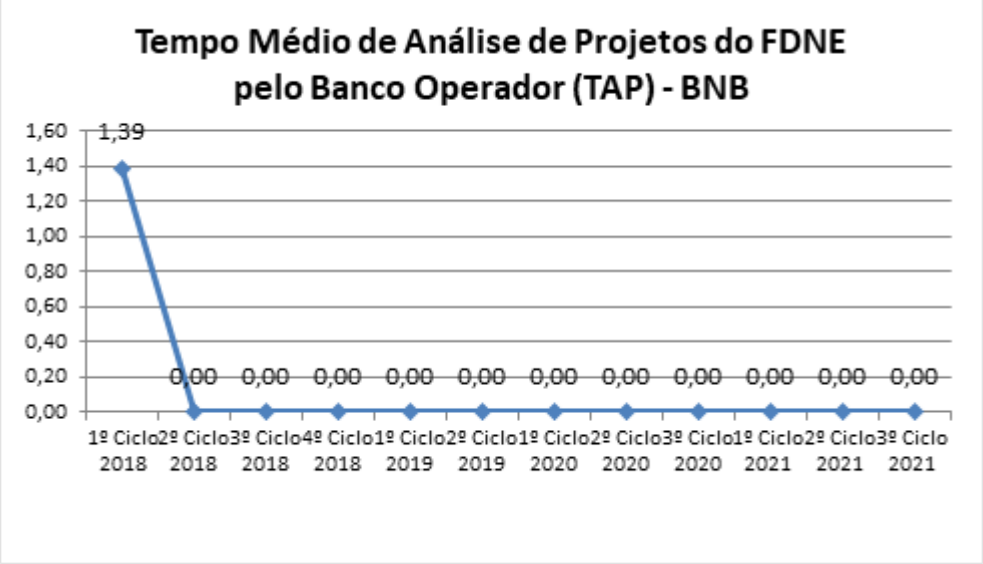

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

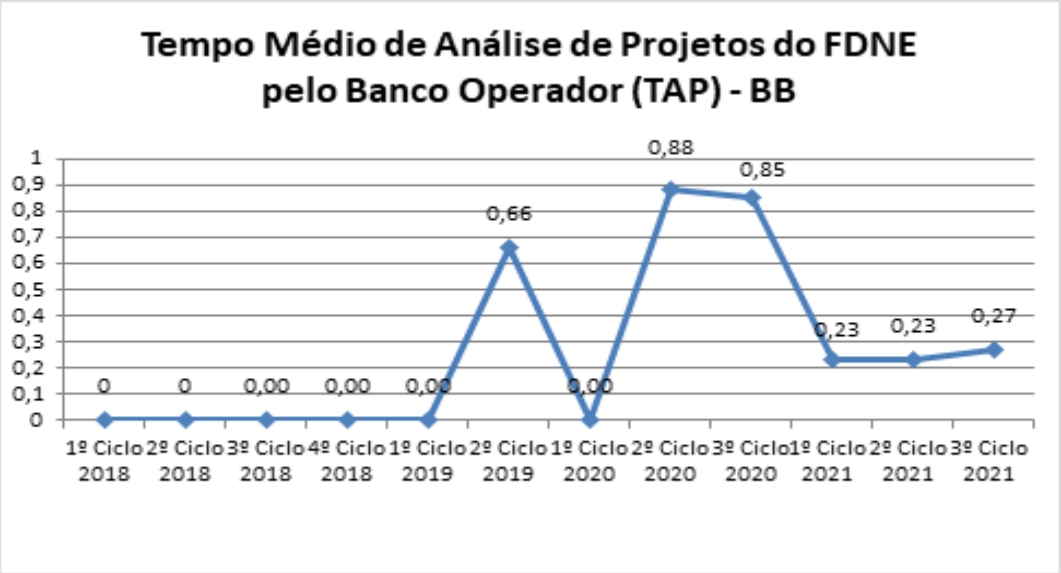

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

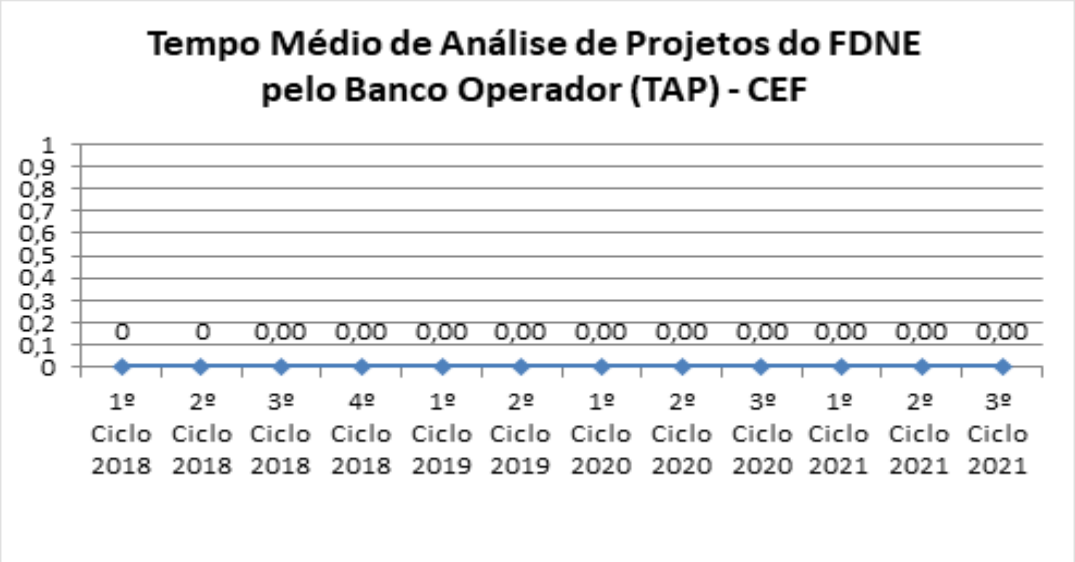

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Notas:

(1) O prazo normal de análise do projeto é de 90 dias contados da data de sua entrada no Agente Operador. Contudo, esse tempo poderá ser ultrapassado a depender das pendências para regularização das informações relativas aos projetos apresentados, podendo estender-se até 150 dias.

(2) O tempo médio de análise é obtido da média aritmética dos tempos despendidos na análise de cada projeto (análises concluídas) no período considerado. Não são computados, naturalmente, os tempos dos projetos ainda em análise.

3.5 - Inconsistências dos Projetos do FDNE Apresentados aos Bancos Operadores (IPA, ex-IPEP).

a.1) Banco do Nordeste do Brasil – BNB

Fórmula: Projetos Arquivados x 100 = 0 x 100 = 0%
Projetos Apresentados 0

a.2) Banco do Brasil – BB

Fórmula: Projetos Arquivados x 100 = 1 x 100 = 33,3%
Projetos Apresentados 3

a.3) Caixa Econômica Federal – CEF

Fórmula: Projetos Arquivados x 100 = 0 x 100 = 0%
Projetos Apresentados 0

b) Objetivo: aferir a inconsistência dos projetos apresentados e analisados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento-CGDF/DFIN.

d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor).

e) Periodicidade: **Jan a Set/2021.**

f) Comentários: Não foram apresentados projetos ao BNB e à CEF. Demanda por novos financiamentos reprimida em face da conjuntura econômica e política vigente no período.

g) Representação gráfica dos resultados:

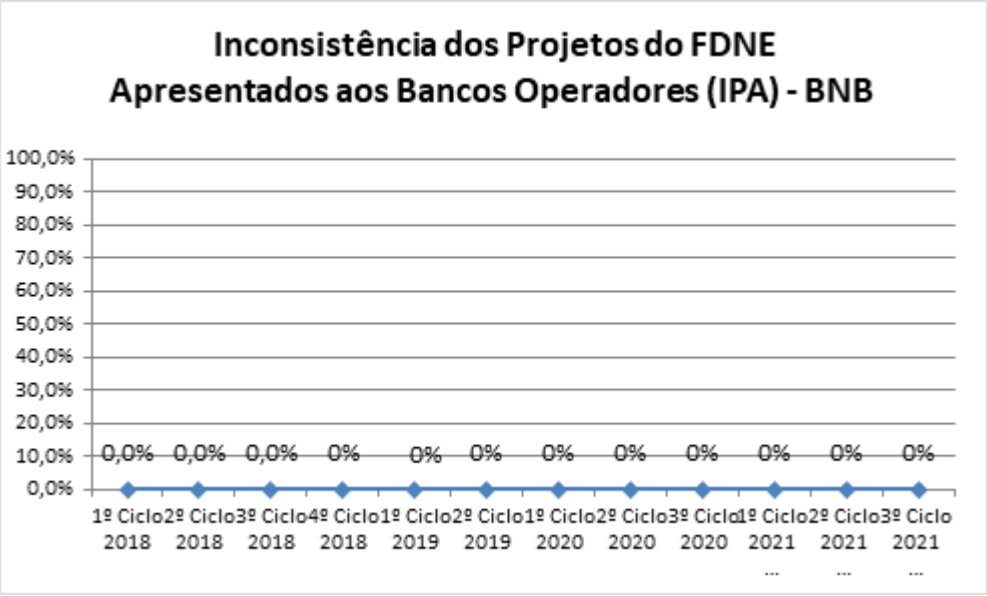

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

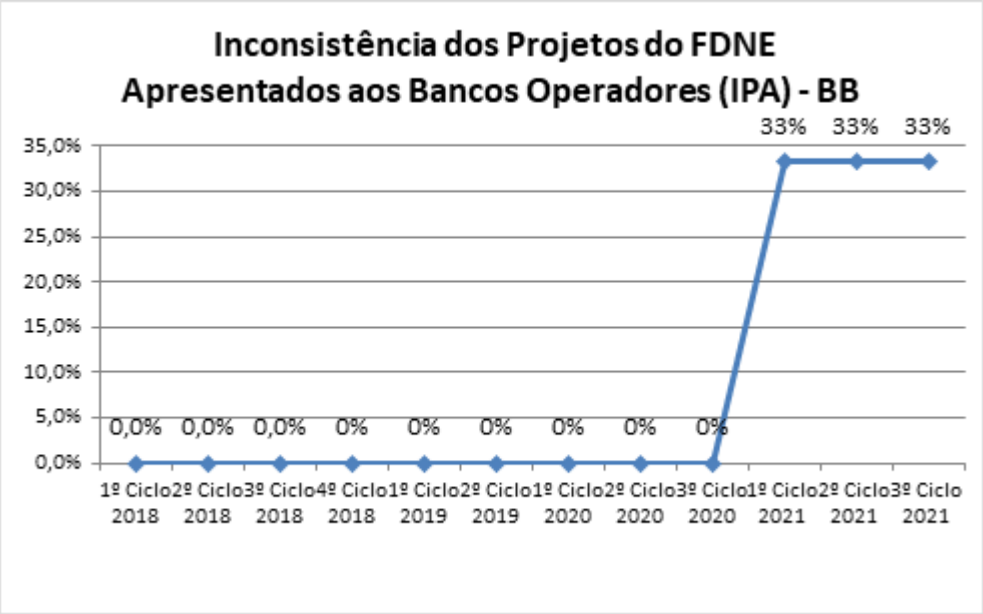

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

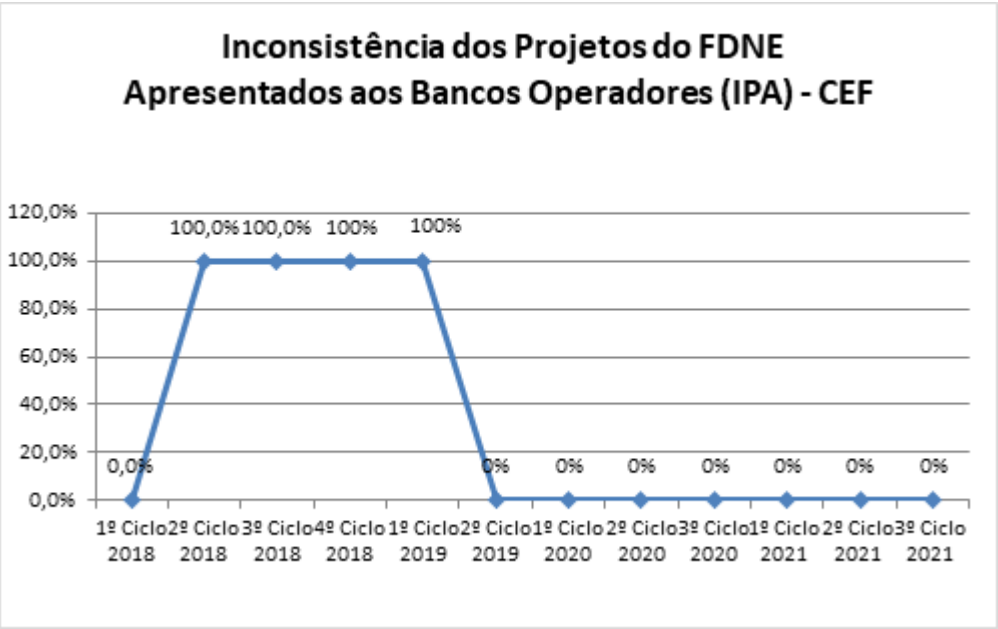

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

3.6 - Execução Orçamentária do FDNE (EORÇ-FDNE).

a) Fórmula: $\frac{\text{Valor empenhado 2021 x 100}}{\text{Dotação 2021}} = \frac{560.760.786,31 \times 100}{990.724.759} = 56,6\%$

b) Objetivo: aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram empenhados no período considerado, face à dotação do FDNE na Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento-CGDF/DFIN.

d) Resultado ideal (%): 100,00 %

e) Periodicidade: **Jan a Set/2021.**

f) Representação gráfica dos resultados:

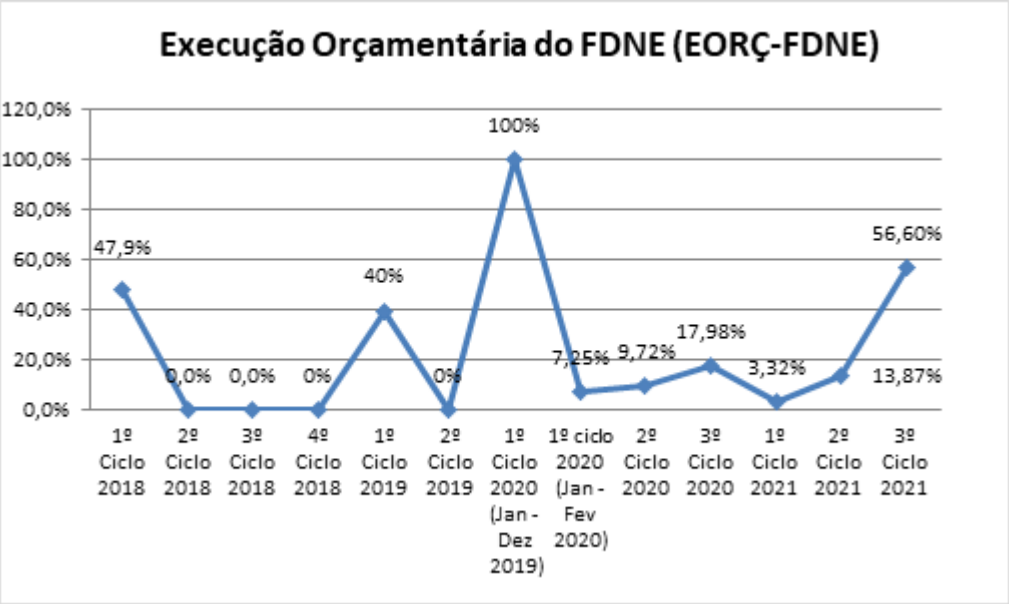

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

3.7 - Execução Financeira do FDNE (EFIN-FDNE).

a) Fórmula: $\frac{\text{Recursos Lib. x 100}}{\text{Total de Recursos Emp.}} = \frac{379.646.855,22 \times 100}{244.0570.993,07} = 15,6\%$

b) Objetivo: Aferir, em termos relativos, o quanto de recursos foram liberados, no exercício ou no período considerado, para os projetos do FDNE face aos recursos empenhados (incluídos os inscritos em Restos a Pagar).

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento CGDF/DFIN.

d) Resultado ideal (%): 100,00 %

e) Referência da aferição: **Jan a Set/2021.**

f) Comentários: Na análise do desempenho a leitura precisa considerar alguns aspectos. É que os recursos são empenhados pelo valor total do projeto, enquanto as liberações obedecem ao cronograma de execução, que normalmente se estende por mais de um exercício civil. Indicador com sinalização de revisão.

g) Representação gráfica dos resultados:

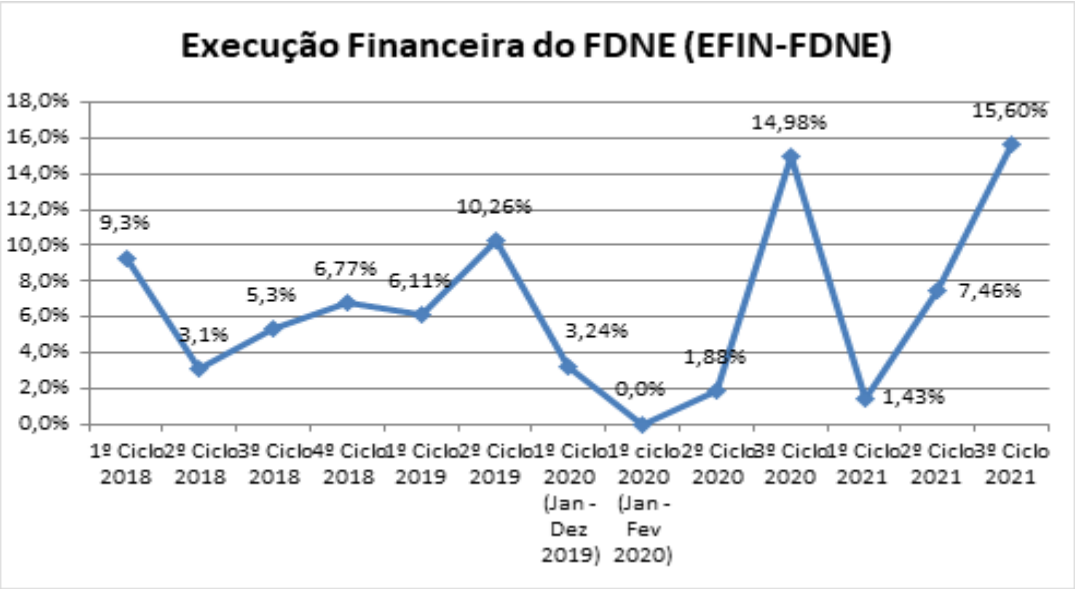

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

3.8 – Tempo Médio para Aprovação dos Projetos do FDNE pela Diretoria Colegiada após aprovação pelos Bancos Operadores (TDDC-FDNE)

a) Fórmula: $\frac{M_1}{30\ dias^1} = \frac{20}{30} = 0,67$

b) Objetivo: Aferir o índice que representa o quanto, em média, do tempo legal foi utilizado entre a aprovação dos projetos pelos Bancos Operadores e a aprovação pela Diretoria Colegiada da SUDENE.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento – CGDF/DFIN.

d) Resultado ideal (índice): < 1 (aprovação dentro do prazo legal. Qto. menor, melhor).

e) Periodicidade: **Jan a Set/2021.**

f) Comentários: demanda por novos financiamentos reprimida em face da conjuntura econômica e política vigente no período.

g) Representação gráfica dos resultados:

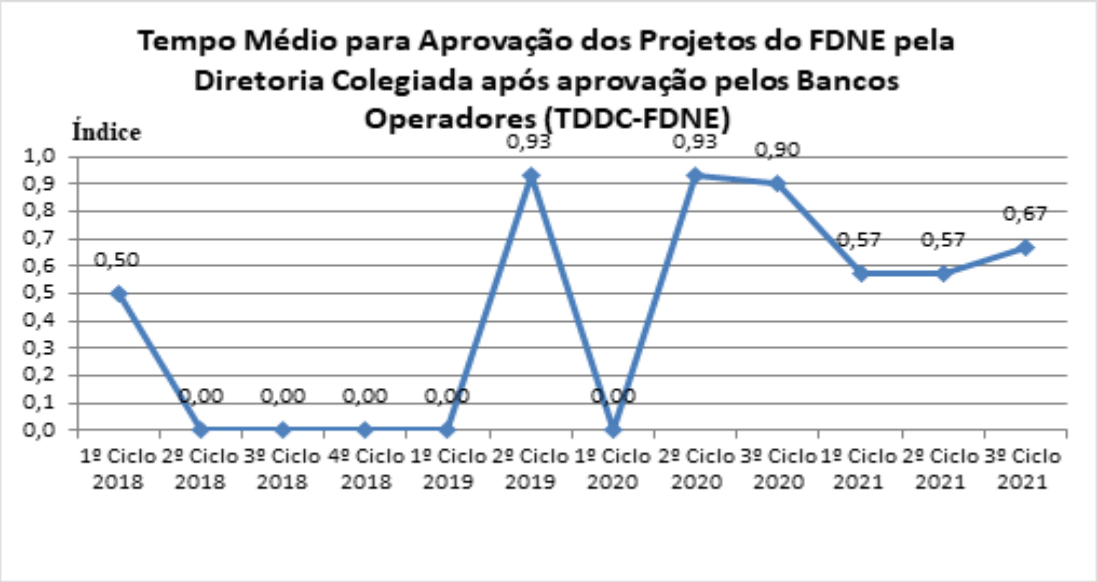

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Convenção:

M_1 – tempo médio, em dias, transcorrido entre a data de entrada do Relatório de Resultado da Análise do projeto, elaborado pelo Banco operador, no protocolo da SUDENE, e a aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada.

Nota:

[1] 30 dias é o prazo legal para aprovação de um projeto. Importante lembrar que o projeto, de acordo com o novo Regulamento do FDNE, é entregue pela empresa diretamente ao Banco Operador.

3.9 – Tempo Médio decorrido entre o Protocolo da Consulta Prévia aprovada e a aprovação do financiamento do Projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE (TMCP-FDNE)

a) Fórmula: $Tm = \frac{T}{N} = \frac{340 \text{dias}}{3} = 113$ dias/financiamento aprovado
financiamentos aprovados

b) Objetivo: Aferir o tempo médio decorrido entre o protocolo da consulta prévia aprovada e a aprovação do financiamento do projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE no exercício.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento – CGDF/DFIN.

d) Resultado ideal: 240 dias (igual ou menor que 240 dias e quanto menor, melhor).

e) Periodicidade: **Jan a Set/2021.**

f) Comentários**:** O tempo de referência adotado não leva em consideração as possíveis prorrogações.

g) Representação gráfica dos resultados:

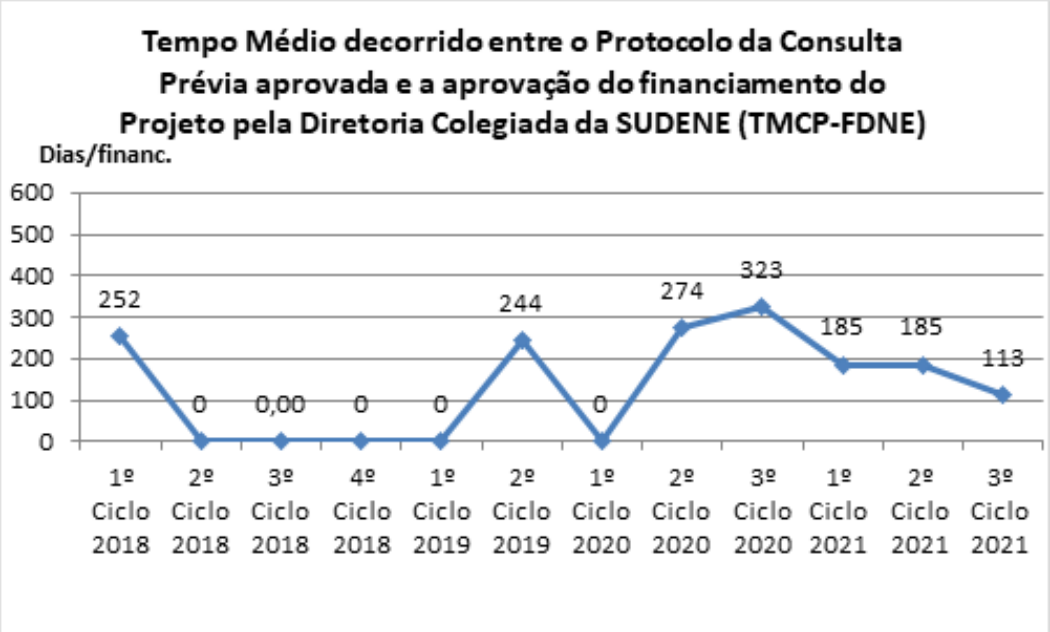

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Notas:
- **Tm** corresponde à soma dos tempos transcorridos entre a data da entrada da Consulta Prévia aprovada e a data de aprovação do financiamento pela Diretoria Colegiada da SUDENE.

- **N** representa o número de financiamentos aprovados no exercício.

- **240 dias é o tempo de referência** (30 dias de análise da CP + 90 dias para a apresentação do projeto + 90 dias para análise pelo banco operador + 30 dias para análise do financiamento pela SUDENE).

3.10 – Índice de Aprovação de Financiamentos do FDNE pela Diretoria Colegiada no Exercício (IAF-FDNE, ex-IAPDC-FDNE)

a) Fórmula: $\frac{\text{Qtde. de financ. aprov. no período pela Dir. Colegiada}}{\text{Qtde. de proj. aprov. no período pelo Agente Operador}} = \frac{3}{3} = 1{,}00$

b) Objetivo: Identificar o índice de aprovação de projetos pela Diretoria Colegiada.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento – CGDF/DFIN.

d) Resultado ideal (índice): 1,00 (Quanto mais próximo de 1 (um) melhor).

e) Periodicidade: **Jan a Set/2021**.

f) Comentários: Não informado.

g) Representação gráfica dos resultados:

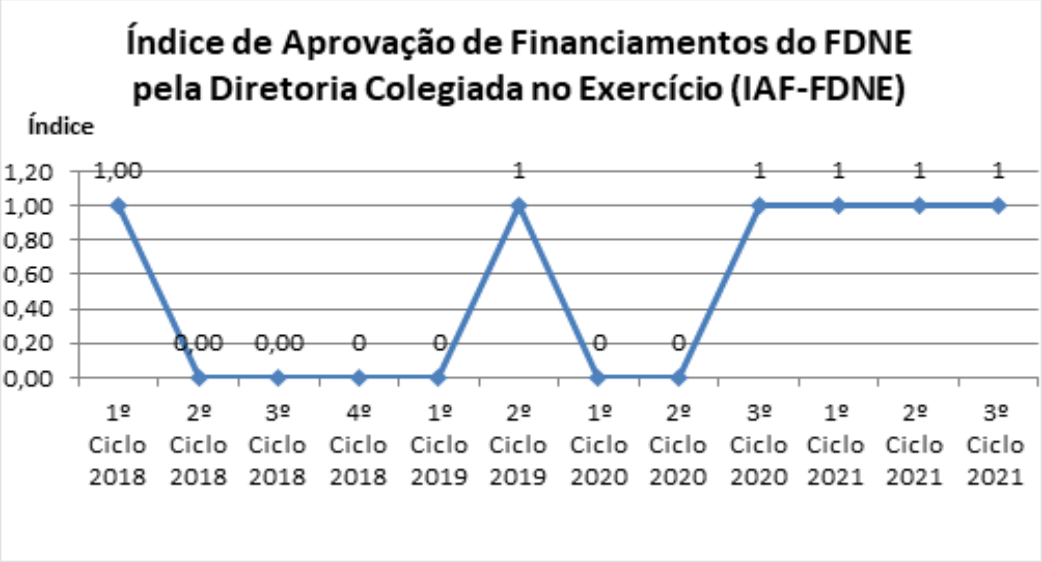

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Nota: resultados processados até 30 dias antes da data inicial do monitoramento, excluídos os projetos em análise na data final do monitoramento. Os 30 dias foram definidos como referência não apenas por tratar-se do prazo de que dispõe a SUDENE para analisá-los, mas para evitar que pleitos em processo de análise "invadam" o intervalo da contagem.

4. Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais

4.1 – Tempo Médio de Espera para a realização da vistoria (TEDV–IF)

a) Fórmula: $\frac{T_1}{N} = \frac{11.202}{130} = 86{,}2$ dias

b) Objetivo: Aferir o tempo médio de espera das vistorias dos pleitos de incentivos fiscais no período.

c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais – CGIF/DFIN.

d) Resultado Ideal (índice): Quanto menor, melhor.

e) Periodicidade: **Jan a set/2021.**

f) Comentários: O presente período de avaliação (janeiro a setembro de 2021) ainda continua com a realização de vistorias virtuais, fruto da Pandemia da COVID-19, que provocou a suspensão das vistorias presenciais a partir de abril de 2020, até o momento em que a Diretoria Colegiada aprovou, em julho de 2020, proposta de vistoria remota feita pela DFIN/CGIF como forma de examinar os pleitos em carteira, em virtude da impossibilidade de presença física por parte dos técnicos. Nada obstante, o prazo também foi afetado pela demora no encaminhamento da

documentação solicitada. Com a aprovação da Resolução nº 622/2020, que entrou em vigor desde 1º de agosto de 2021, foi estabelecido prazo máximo para encaminhamento dos dados solicitados, findo o qual o pleito poderá ser arquivado caso a empresa não cumpra a sua parte. O prazo médio para a realização das vistorias passou de 96,4 dias na antepenúltima avaliação (Jan-mar 2021) para 89,8 dias na penúltima avaliação de janeiro a julho de 2021 e para 86,2 dias na presente avaliação.

g) Representação gráfica dos resultados:

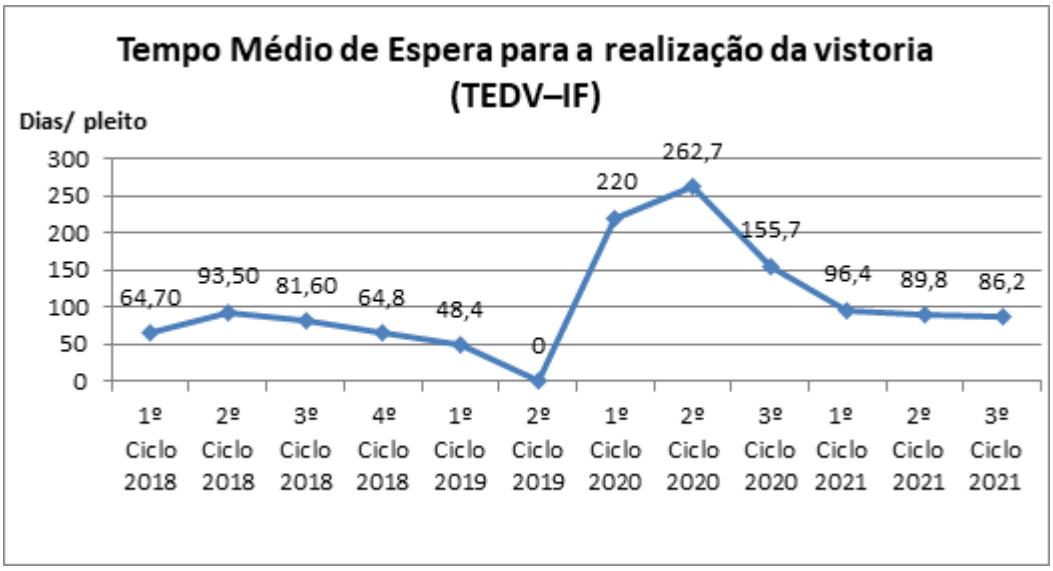

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros
Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Convenções:

T1 = Média aritmética do © do número de dias entre o ingresso dos pleitos e a realização das vistorias desses pleitos no período examinado.

N = Número de processos no período examinado.

4.2- Grau de indeferimento de Pleitos de Incentivos Fiscais (IPIF_UF-IF).

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos (UF) rejeitados no período x 100}}{\text{Pleitos protocolados no período}} = \frac{0 \times 100}{155} = 0\%$

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos incentivos fiscais nos estados da área de atuação da SUDENE, conforme o percentual de rejeição. Os resultados dos estados, após análise comparativa, poderão apontar a necessidade de um trabalho de promoção desse instrumento naqueles com piores resultados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais – CGIF/DFIN.

d) Resultado ideal (%): .... (quanto menor melhor).

e) Periodicidade: **Jan a set/2021.**

f) Comentários: No semestre não ocorreu rejeição de pleitos recebidos vez que todos os encaminhados pelas empresas se enquadram nos normativos existentes.

g) Representação gráfica dos resultados:

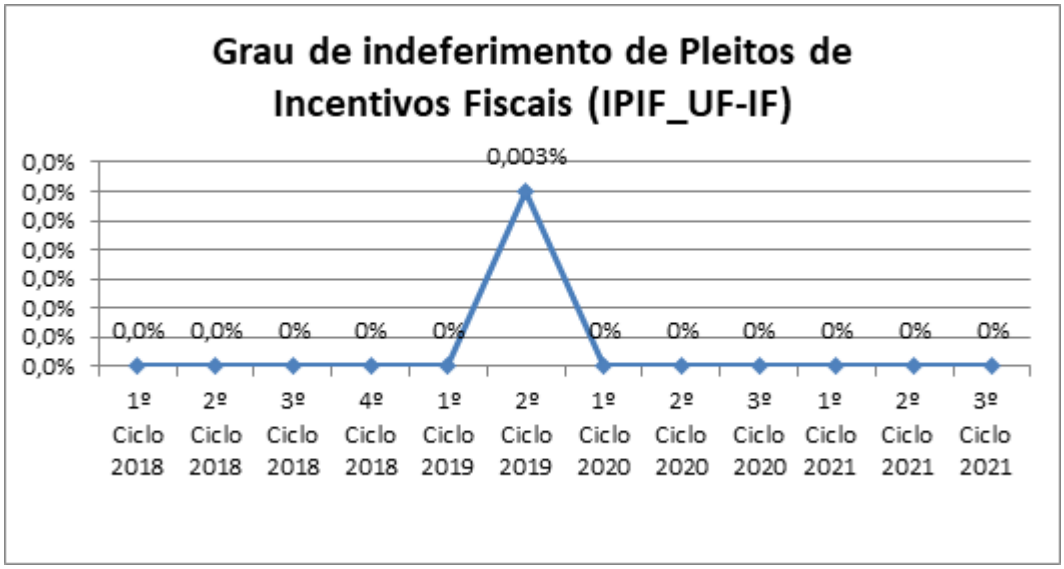

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros.
Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.

Notas:
(1) O cálculo se aplica a pleitos analisados e protocolados no período analisado e poderá ser feito por estado da área de atuação da Autarquia.
(2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento sobre o incentivo por parte da classe empresarial do estado.
(3) Semelhante aplicação poderá ser feita de forma agregada em âmbito regional, por setor econômico, no sentido de se verificar aqueles com mais fraca demanda, para um programa de promoção dos incentivos por setor econômico.
(4) O número de Processos formalizados no período corresponde ao total aprovado entre 1º de janeiro de 2021 até 31 de março de 2021 (31 processos, acrescido dos ainda em exame.

4.3 – Desempenho da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais (APIF-IF).

a) Fórmula: $\frac{\text{nº de análises concluídas no período x 100}}{\text{nº de pleitos protocolados no período}} = \frac{155 \text{ X } 100}{170} = 91{,}1\%$

b) Objetivo: (re)orientar a programação de análise para obtenção de melhores resultados como também, a programação de vistorias.

c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais – CGIF/DFIN.

d) Resultado ideal (%): quanto maior melhor.

e) Periodicidade: **Jan a set/2021.**

f) Comentários: No período, foram concluídas 155 análises de pleitos diversos, o que significou percentual de êxito de 72,4% dos pleitos ingressados. O número de pleitos protocolados no período de 01.01.2021 a 30.09.2021, ainda em exame, totalizaram 59 processos. Por outro lado, dos 155 pleitos aprovados no período, 44 foram protocolados em 2020, fora, portanto, do cálculo e perfazendo assim um total de 170 pleitos protocolados.

g) Representação gráfica dos resultados:

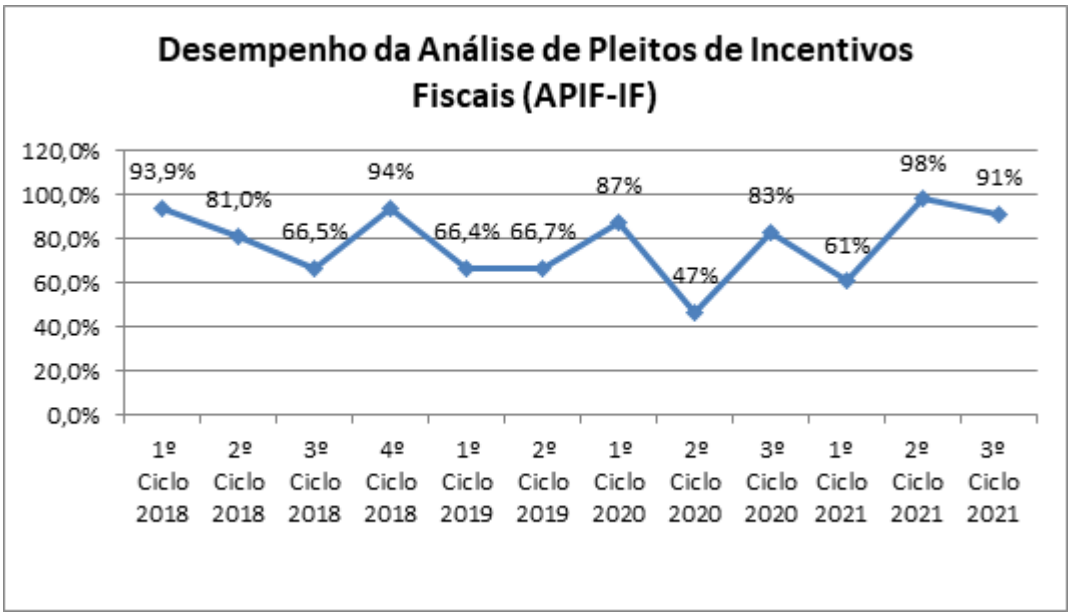

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros.
Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

4.4 – Tempo Médio de Espera para a conclusão da análise dos pleitos de incentivos fiscais (TMEA-IF).

a) Fórmula: $\frac{T1}{N} = \frac{15.255}{155} = 98,4$ dias

b) Objetivo: Aferir o tempo de espera da análise de pleitos de incentivos fiscais.

c) Responsabilidade de aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais – CGIF/DFIN.

d) Resultado ideal (índice): quanto menor melhor.

e) Periodicidade: **Jan a set/2021.**

f) Comentários: aqui vale o mesmo comentário feito para o tempo médio de espera para a realização da vistoria. O prazo médio foi impactado diretamente pelo prazo médio das vistorias uma vez que o processo somente pode ser concluído após a realização da vistoria.

g) Representação gráfica dos resultados:

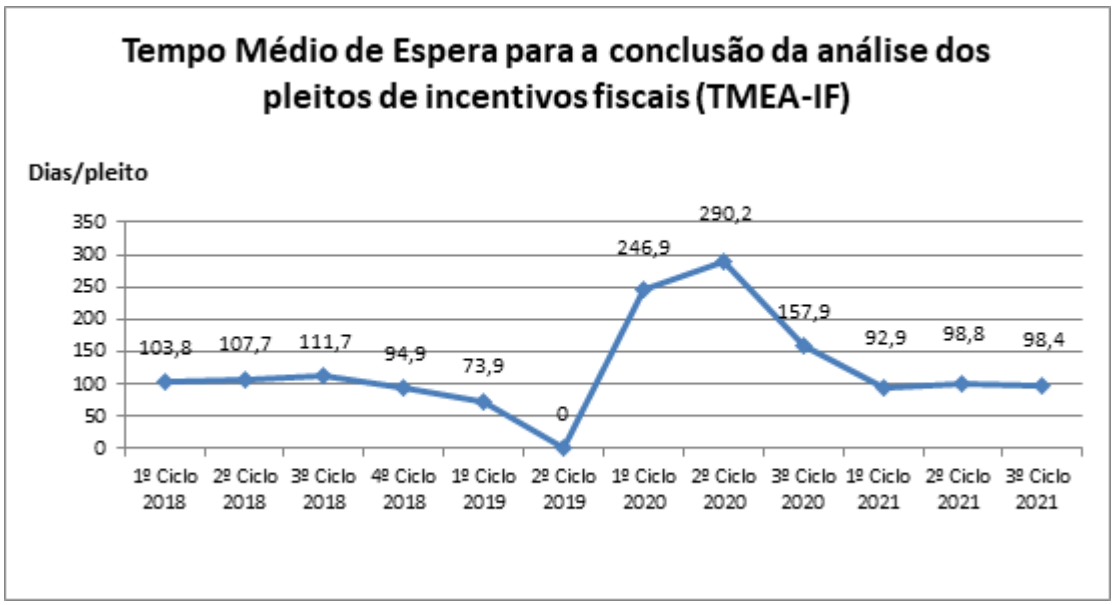

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros
Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Convenção:
T1 = © do número de dias entre a data de entrada dos pleitos (data do protocolo) e a data de conclusão da análise dos mesmos.
N = número de processos protocolados no período examinado.

4.5 – Produtividade da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais no exercício (PAPI-IF).

a) Fórmula: $\frac{\text{nº de análises realizadas no período}}{\text{nº de técnicos}} = \frac{155}{14} = 11{,}1$ análises/técnico

b) Objetivo: (re) orientar a programação de análise ou a (re) organização da equipe de análise para obtenção de melhores resultados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais - CGIF/DFIN.

d) Resultado ideal (índice): quanto maior melhor.

e) Periodicidade: **Jan a set/2021.**

f) Comentários: A partir do avanço dos meses o número de pleitos analisados vai sendo ampliado, com o que o número de análise por técnicos também aumenta.

g) Representação gráfica dos resultados:

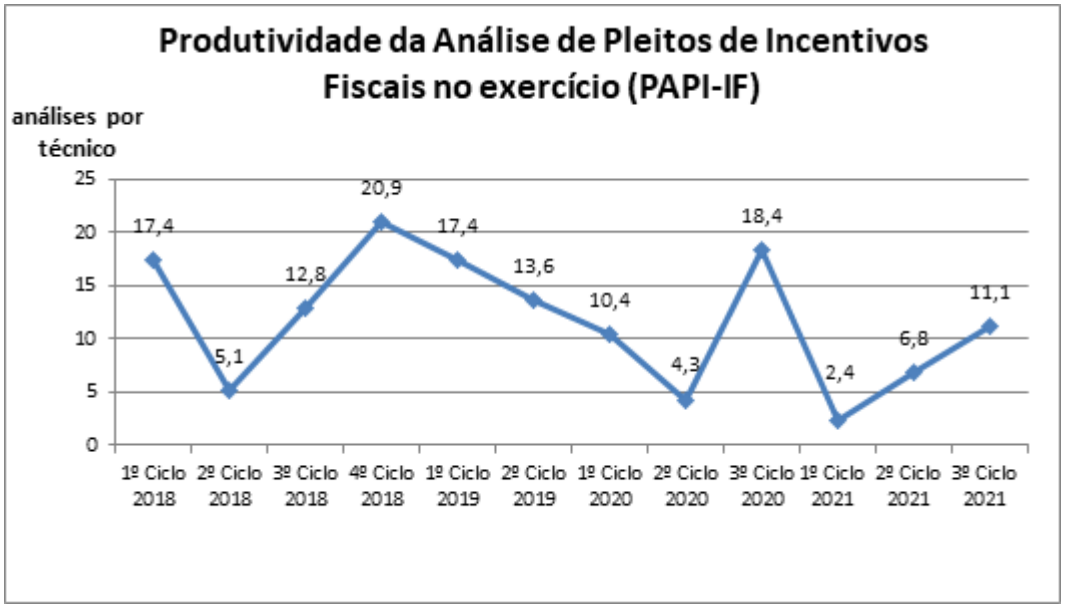

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros.
Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

4.6 – Produtividade das Fiscalizações de Pleitos de Incentivos Fiscais (PFPI-IF)

a) Fórmula: $\frac{\text{nº de vistorias realizadas no período}}{\text{nº de equipes}} = \frac{130}{7} = 18{,}6$ vistorias/equipe

b) Objetivo: (re)orientar a programação de fiscalização ou a (re)organização das equipes de fiscalização para obtenção de melhores resultados.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais - CGIF/DFIN.

d) Resultado ideal (índice): quanto maior melhor.

e) Periodicidade: **Jan a set/2021.**

f) Comentários: Não informado.

g) Representação gráfica dos resultados:

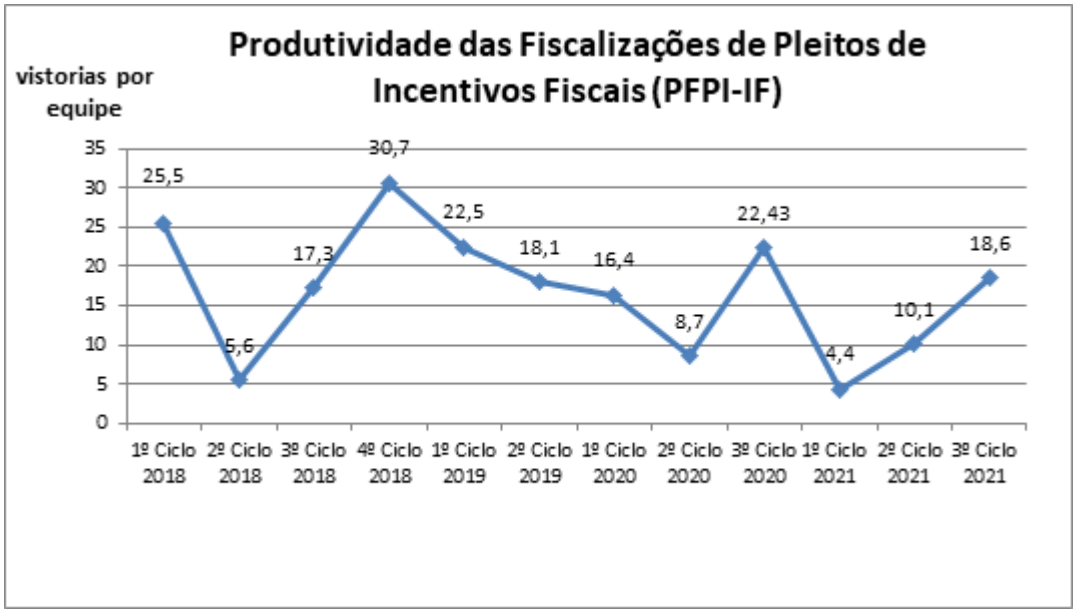

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros
Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Nota: Cada equipe é constituída por 2 técnicos. O resultado observado no início de cada ano é sempre inferior ao observado nos demais períodos por força das férias regulamentares.

5. Indicadores de Gestão de Convênios

5.1 - Capacidade de Análise de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (CAPC).

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos analisados no exercício x 100}}{\text{Pleitos Protocolados no exercício}} = \frac{26 \times 100}{26} = 100\%$

b) Objetivo: Aferir o desempenho da unidade na análise de pleitos de convênios e termos de Cooperação no exercício de sua apresentação, em relação aos pleitos protocolados no SICONV ou simplesmente protocolados no Gabinete da Superintendência.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS/DPLAN.

d) Resultado ideal (%): 100 % (quanto maior melhor).

e) Período da aferição: **Jan a set/2021.**

f) Comentários: Os pleitos protocolados referem-se às propostas de convênios válidos, encaminhadas para análise técnica.

g) Representação gráfica dos resultados:

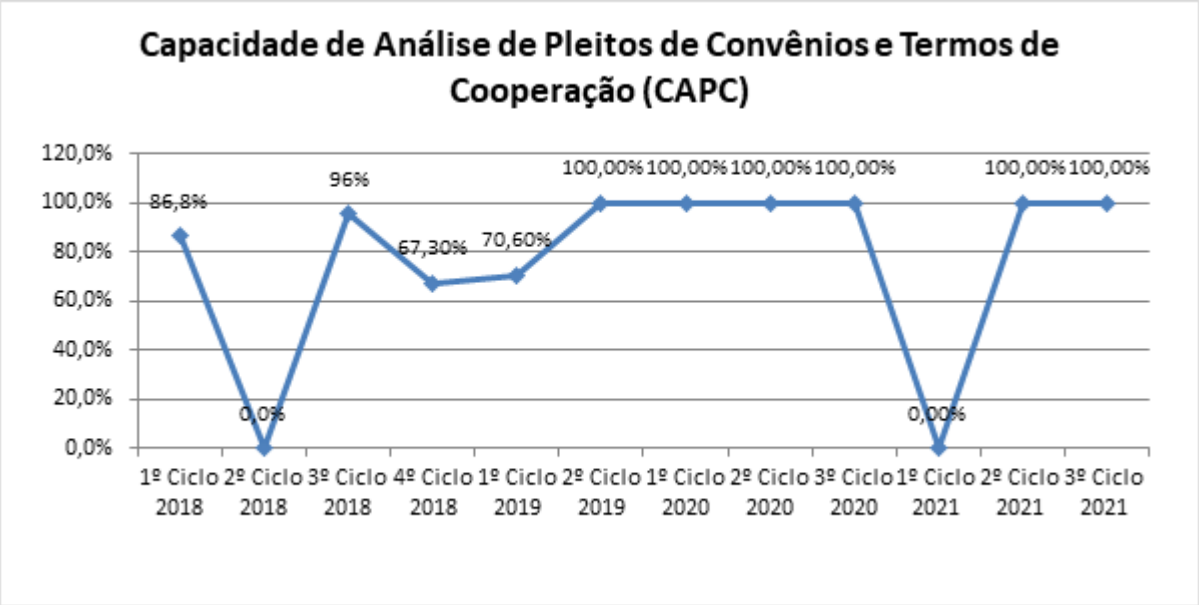

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável
Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado.

5.2 – Consistência dos Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação Apresentados no exercício (CPCA)

a) Fórmula: $\frac{\text{Pleitos Aprovados x 100}}{\text{Pleitos Analisados}} = \frac{14 \times 100}{26} = 53{,}8\%$

b) Objetivo: Aferir a qualidade técnica dos pleitos habilitados para celebração de convênios. Ou seja, o quanto, em termos relativos, de pleitos protocolados no Sistema SICONV ou Termos de Cooperação, analisados, foram habilitados para celebração.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS/DPLAN.

d) Resultado ideal (%): 100 %

e) Período da aferição: **Jan a set/2021.**

a) Comentários: Considera-se aqui que os pleitos protocolados tem o mesmo número dos pleitos analisados que são 26 no total.

f) Representação gráfica dos resultados:

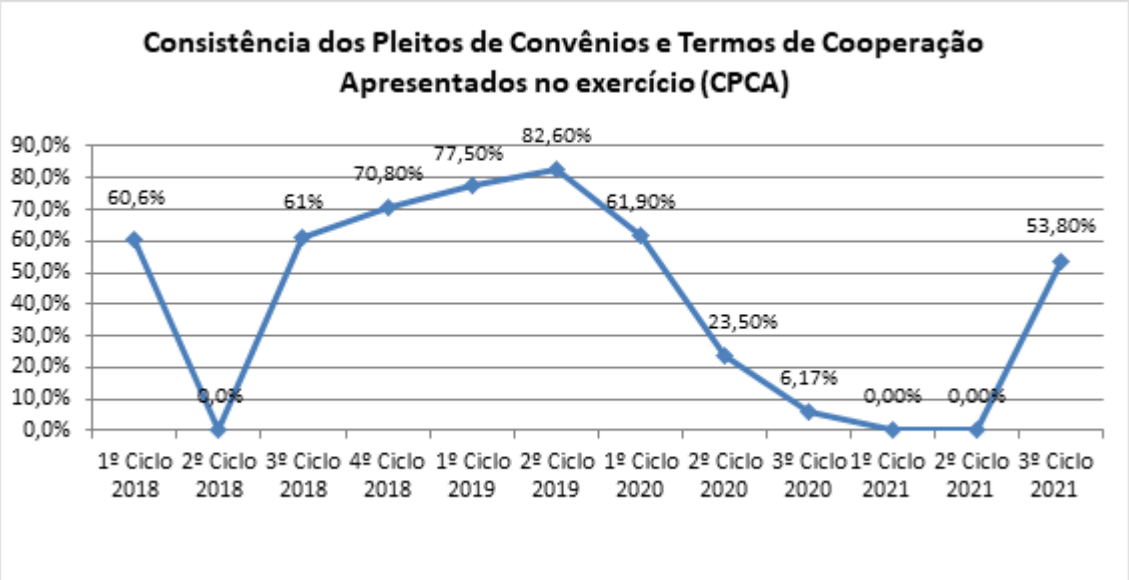

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável
Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado.

5.3 - Grau de indeferimento de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (IIC)

a) Fórmula: Pleitos de Conv. e Termos de Coop. rejeitados no ex. x 100 = 4 X 100 = 15,4
Pleitos protocolados no exercício 26

b) Objetivo: Orientar a necessidade de divulgação/orientação na obtenção dos recursos por transferência voluntária conforme o percentual de rejeição. Os resultados poderão apontar a necessidade de um trabalho conjunto ampliado entre a SUDENE, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Integração na capacitação para o uso do Sistema SICONV.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS/DPLAN.

d) Resultado ideal (%): 0,00 % (quanto menor melhor).

e) Período da aferição: **Jan a set/2021.**

f) Comentários: Os pleitos aprovados, rejeitados e o grau de indeferimento são respectivamente 14 , 4 e 15,4% no período em análise.

g) Representação gráfica dos resultados:

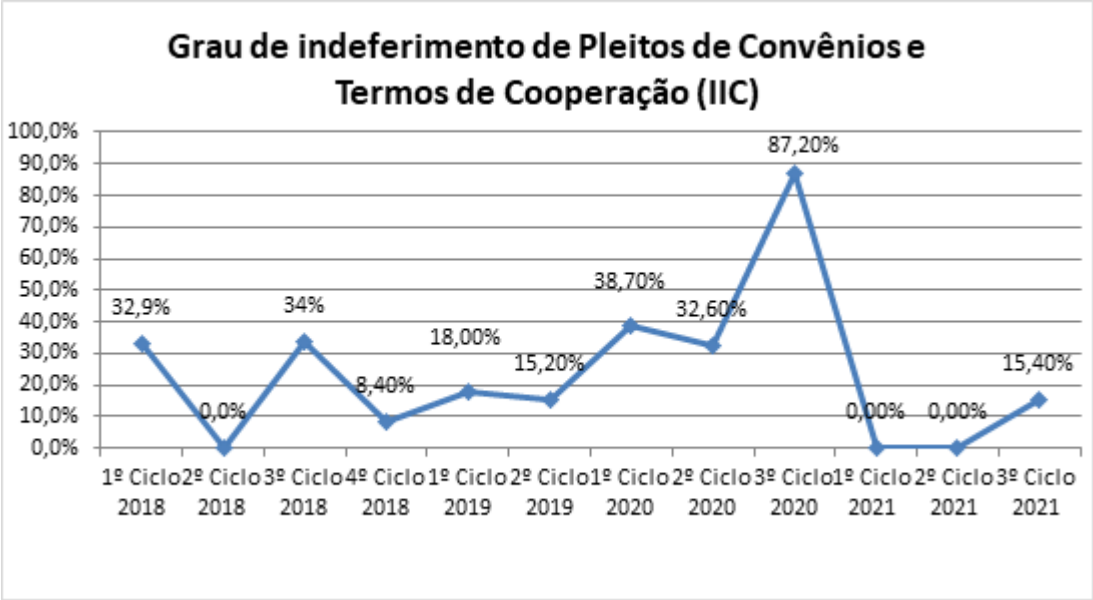

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável
Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

Notas:

(1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados, que foram rejeitados no período.

(2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento, dentro do espaço de atuação da SUDENE, sobre a sistemática de convênios ou Termos de Cooperação por parte dos pleiteantes.

5.4 – Desempenho das Fiscalizações dos convênios e Termos de Cooperação (DFCON)

a) Fórmula: $\frac{\text{Nº de Fiscaliz. realiz. no Exerc. x 100}}{\text{Nº de Fiscaliz. prog. para o Exercício}} = \frac{4 \text{ X } 100}{24} = 16{,}6\%$.

b) Objetivo: Avaliar o grau de planejamento e realização de fiscalizações realizadas no âmbito dos convênios firmados pela Sudene.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS/DPLAN.

d) Resultado Ideal (%): 100%

e) Período da aferição: **Jan a set/2021.**

f) Comentários: Foram realizadas 04 visitas de campo (fiscalizações). Das vinte e quatro visitas programadas, 20 não foram realizadas, em virtude das dificuldades de locomoção causadas pela Pandemia do Covid-19. Destacamos ainda que houveram 21 reuniões virtuais de articulação e acompanhamento realizadas pela CODEM/CGDS junto aos parceiros em TEDs e convênios.

g) Representação gráfica dos resultados:

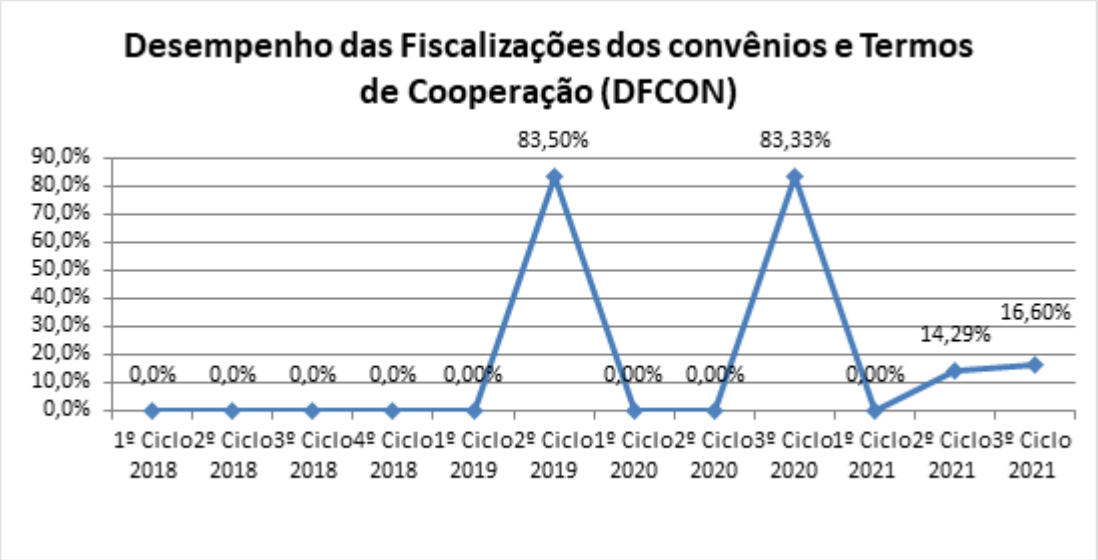

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável
Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

5.5 – Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Convênios (TMTP) Conv

a) Fórmula: $\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}} = \frac{553}{5} = 110{,}6$ dias por pleito

b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de termos de transferências voluntárias.

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres.

d) Resultado ideal (índice): ...dias/pleito (quanto menor melhor).

e) Periodicidade: **Jan a set/2021.**

f) Comentários: Das 26 propostas apresentadas, 5 foram celebradas. Provavelmente no próximo ciclo de avaliação outras serão celebradas.

g) Representação gráfica dos resultados:

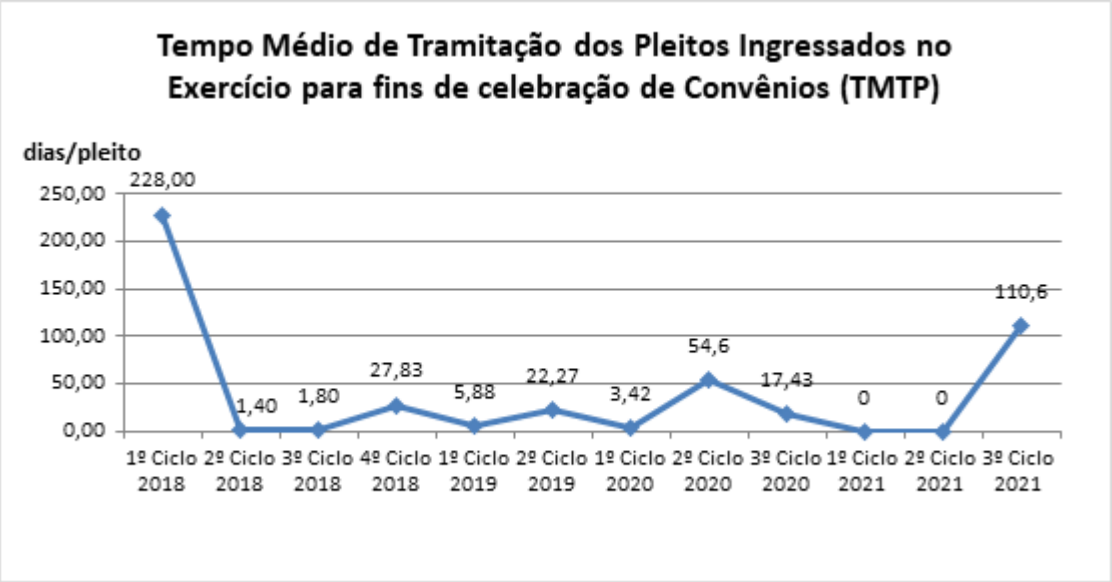

Fonte: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.

Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada do pleito no protocolo da Sudene (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;

- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

5.6 – Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Termos de Cooperação (TMTP)

a) Fórmula: $\frac{T}{\Sigma \text{ de Pleitos ingressados no Exercício}}$ = Não Houve

b) Objetivo: Avaliar o tempo médio de tramitação dos pleitos com vistas à celebração de Termos de Cooperação (Descentralização de Créditos).

c) Responsabilidade da aferição: Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres.

d) Resultado ideal (índice): dias/pleito (quanto menor melhor).

e) Periodicidade: **Jan a set/2021.**

h) Comentários: Entre os meses de Janeiro e Setembro de 2021 não foram recebidos ou realizados pleitos de celebração de termos de cooperação.

f) Representação gráfica dos resultados anteriores:

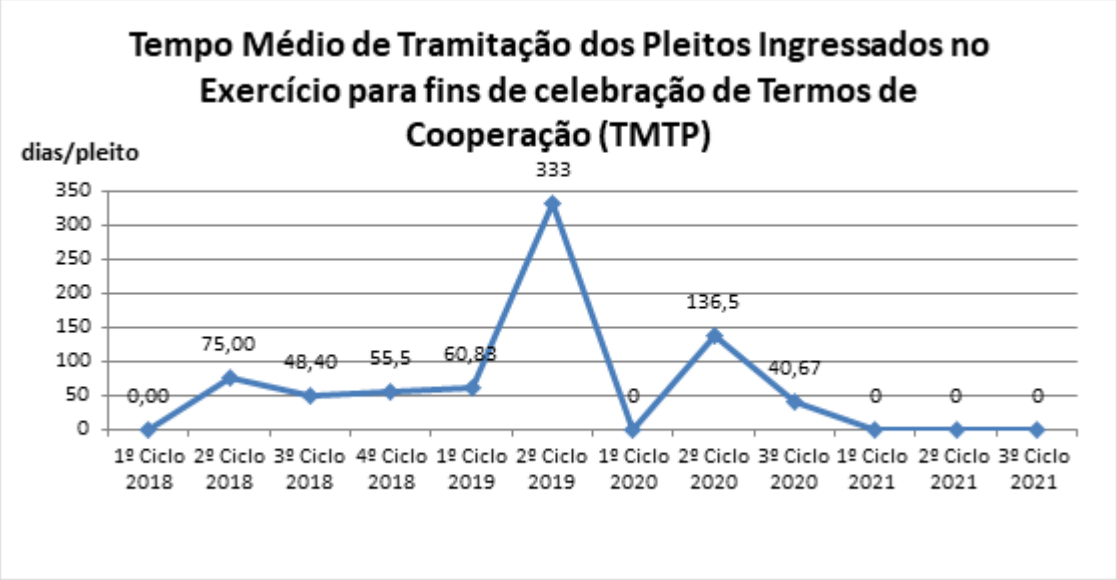

Fonte: Comissão Permanente de Gestão de Convênios, Congêneres, e de Tomada de Contas Especial.
Nota: Não houve linha de tendência para o comportamento acima mostrado.

Convenções:

T – Média aritmética da somatória dos tempos (em dias) de todos os pleitos, tempo esse contado da data de entrada no protocolo da SUDENE (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).

Notas:

- A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício;

- Pleitos rejeitados não devem ser computados porque, muitas das vezes, isso decorre de atraso de documentação cuja responsabilidade é do proponente, e isso leva a falsear o tempo de tramitação T.

6. Indicadores de Gestão de Pessoas

6.1 - Grau de Capacitação de Servidores no Exercício (CSE)

a) Fórmula: Nº de servidores capacitados no exercício x 100 = 46 x 100 = 76,6%
Nº previsto de serv. capacit. para o exercício 60

b) Objetivo: Aferir a meta alcançada para fins de avaliação da estratégia estabelecida pela unidade de gestão de pessoas para o exercício.

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – CGGP/DAD.

d) Resultado Ideal (%): 100%

e) Período da aferição: **Jan a Set/2021.**

f) Comentários: No período de janeiro a setembro de 2021, 46 servidores participaram de eventos de capacitação conforme planejamento do PDP Sudene, 2021. No total foram 159 participações, pois parte dos servidores realizaram mais de uma capacitação no período.

f) Representação gráfica dos resultados:

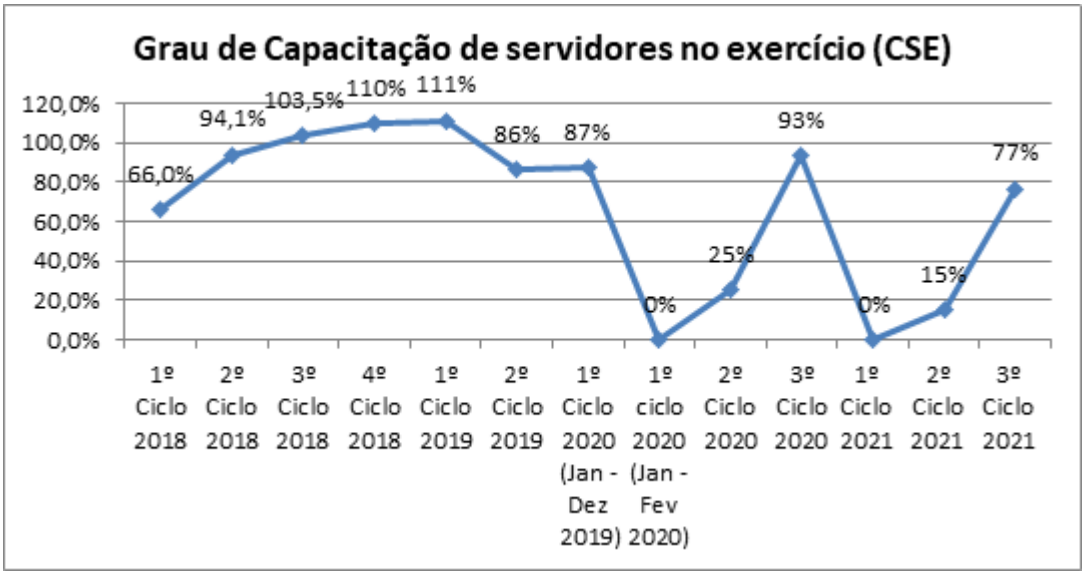

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6.2 - Desempenho da Capacitação no exercício (DCE)

a) Fórmula: $\frac{\text{Nº de capacitações realizadas no exercício x 100}}{\text{Nº previsto de capacitações para o exercício}} = \frac{48 \times 100}{40} = 120\%$

b) Objetivo: Destina-se a aferir a meta estabelecida pela unidade de Gestão de Pessoas quanto ao número de capacitações atendidas em relação ao programado no período considerado, além de complementar o indicador anterior (CSE).

c) Responsabilidade de Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – CGGP/DAD.

d) Resultado Ideal (%): 100 % (quanto maior melhor).

e) Período da aferição: **Jan a Set/2021.**

g) Comentários: Considerando as diferentes turmas dos cursos, foram realizados no total 48 eventos de capacitação, sendo todos os cursos realizados na modalidade de educação à distância.

f) Representação gráfica dos resultados:

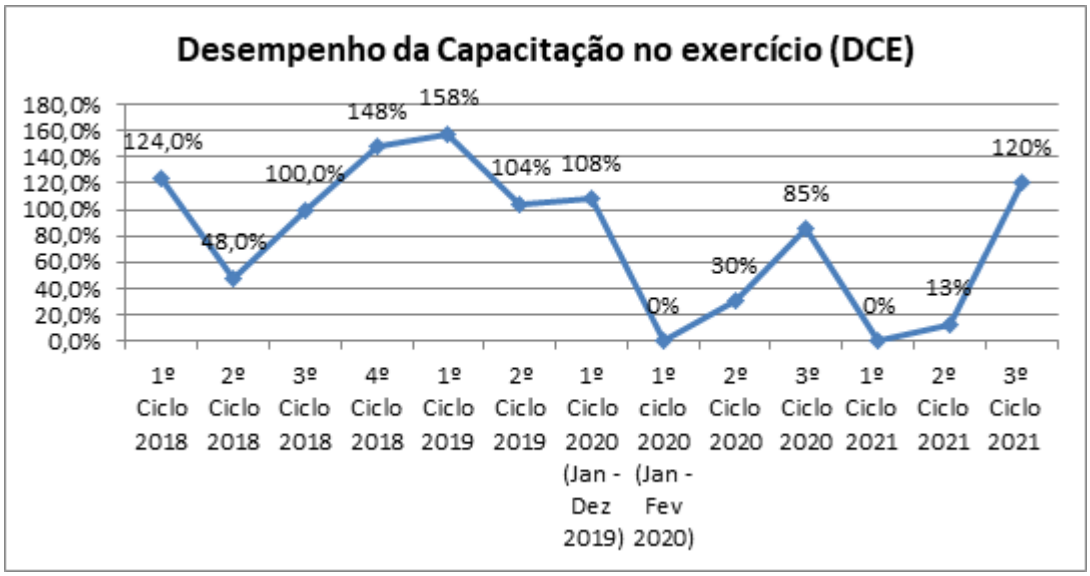

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

6.3 – Nível de Investimento em Capacitação (NIC)

a) Fórmula: $\frac{\text{Valor exec. para capac. no exerc. x 100}}{\text{Limite Aut. para capac. no exerc.}} = \frac{1.440,00 \times 100}{200.000,00} = 0,72\%$

b) Objetivo: Avaliar o percentual aplicado em treinamento/qualificação dos servidores em relação ao limite autorizado para o exercício. Útil também, para legitimar ou realinhar a estratégia de capacitação adotada no ano.

c) Responsabilidade a Aferição: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas – CGGP/DAD.

d) Resultado Ideal (%): 100% (quanto maior melhor).

e) Periodicidade: **Jan a Set/2021.**

f) Comentários: Até o momento os cursos planejados no PDP Sudene 2021 foram realizados, em sua maioria, junto a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) em turmas abertas e na modalidade EAD da EVG, conforme orientações da Manifestação Técnica do órgão Central, não apresentando custo para o órgão com inscrições ou diárias/passagens.

g) Representação gráfica dos resultados:

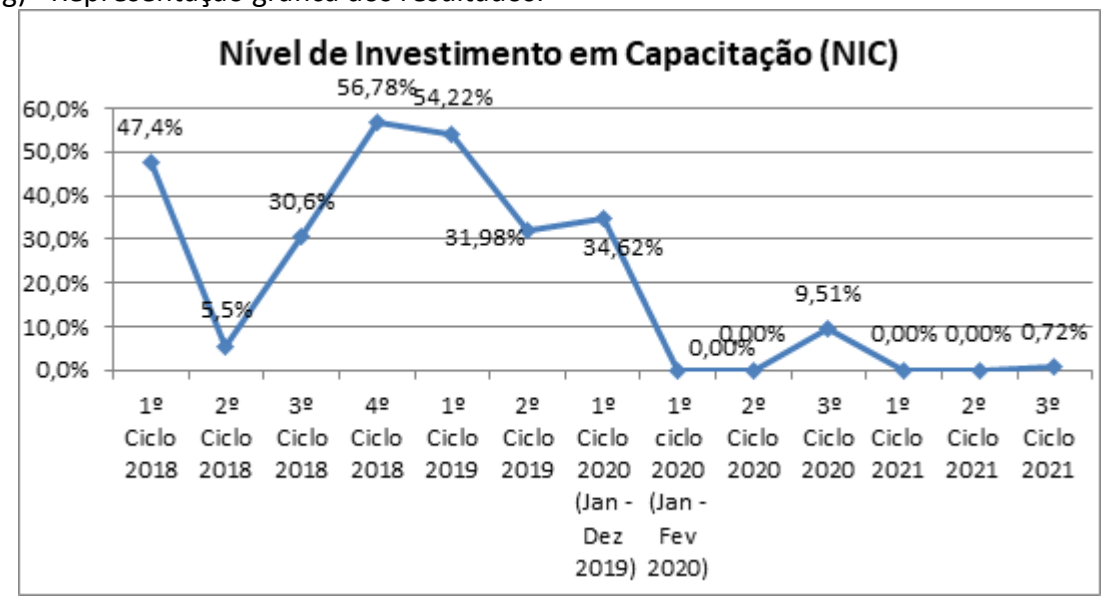

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

7. Indicadores de gestão da Comunicação Social e Marketing Institucional

7.1 - Acesso de usuários ao site da Sudene (AU - site)

a) Fórmula: Média de acessos = **28.514**
(Google Analytics)

b) Objetivo: aferir quantas pessoas visitaram o site da Sudene em um determinado período.

c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.

d) Resultado Ideal: não há consenso sobre um resultado ideal para o acesso a um determinado site. A ideia é fazer a aferição de forma recorrente para, a partir dos resultados alcançados, buscar formas de potencializar o espaço eletrônico como meio didático e eficiente de comunicação pública.

e) Período da aferição: **jan/2021 a set/2021.**

f) Comentários: dados dentro do esperado.

f) Representação gráfica dos resultados:

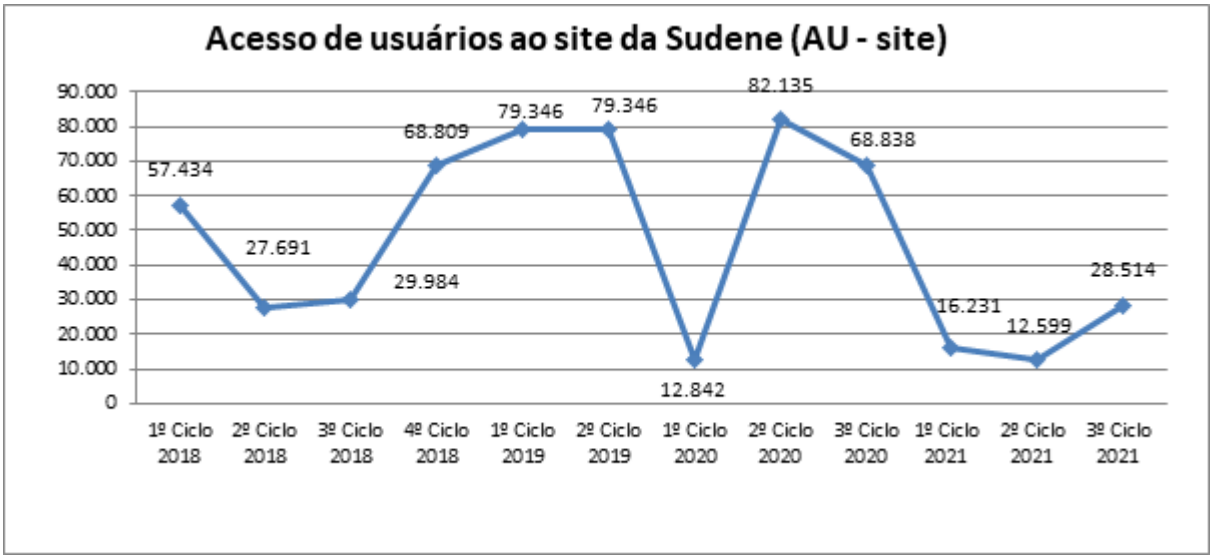

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado.

7.2 - Tempo de permanência no site da Sudene (TP – site).

a) Fórmula: Tempo de permanência = **1'98''**
(Google Analytics)

b) Objetivo: o índice verifica quanto tempo um usuário permanece acessando o site em análise. Presume-se que, quanto mais tempo o usuário permanecer no site, mais atrativo é o conteúdo exibido.

c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional - Ascom.

d) Resultado Ideal (%): após pesquisas, verificou-se que não há consenso sobre qual é o resultado ideal para este índice. Se, por um lado, taxas de permanência elevadas indicam mais tempo de navegação do site, suscitando que o conteúdo exibido está atrativo, por outro lado pode indicar que o usuário está fazendo pesquisas em excesso para encontrar uma informação. A ideia, portanto, é sempre avaliar as variáveis que afetam este resultado, conforme indica este artigo do site Marketing de Conteúdo, e buscar alternativas para melhorar o conteúdo disponibilizado no site da Sudene.

e) Período da aferição: **jan/2021 a set/2021.**

f) Comentários: resultados considerados positivos.

g) Representação gráfica dos resultados:

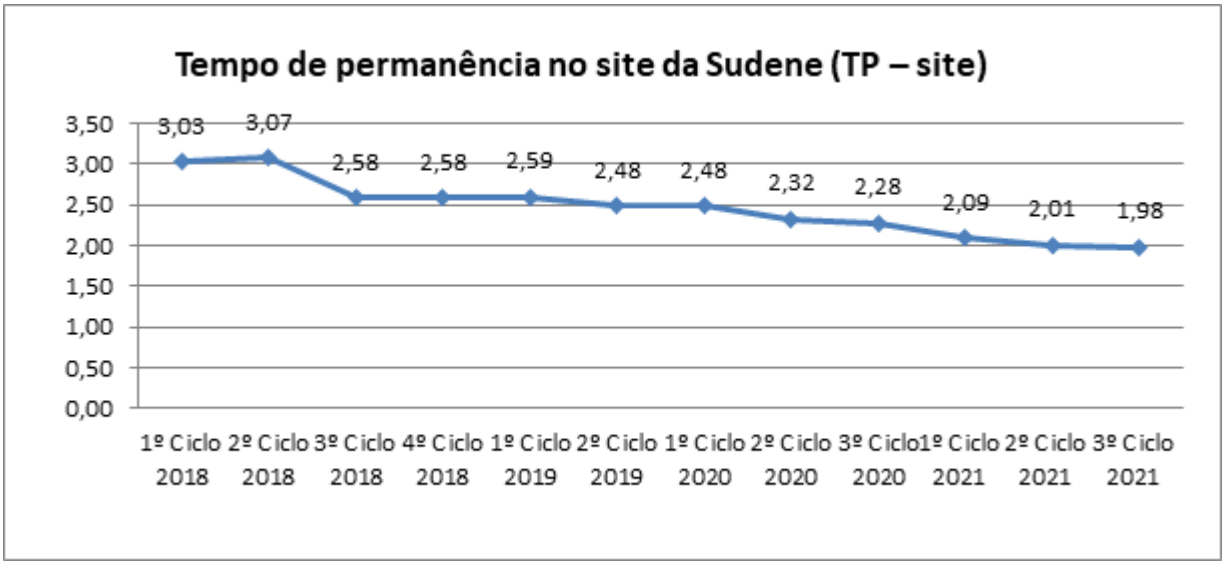

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.

Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

7.3 - Taxa de rejeição ao site da Sudene (TR – site)

a) Fórmula: Taxa de Rejeição = **62,17%**
(Google Analytics)

b) Objetivo: informar a taxa de rejeição ao site, que indica a porcentagem de usuários que o acessam e saem dele sem interagir com qualquer tipo de conteúdo. Sites com informações atrativas e bem dispostas tendem a apresentar taxas de rejeição menores.

c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.

d) Resultado Ideal (%): entre 40% e 60%.
Os resultados ideais para o valor aferido pela taxa de rejeição variam de acordo com o propósito de um site, mercado de atuação, tipo de informação veiculada, entre outros. Um e-commerce, por exemplo, tende a apresentar valores completamente diferentes de um site governamental, já que as instâncias de conteúdo são diferentes. De acordo com o site Marketing de Conteúdo, sites de conteúdo como o da Sudene apresentam taxa de rejeição ideal variando entre 40% e 60%. A ideia é trabalhar para registrar, no mínimo, média coerente com esta variação. A situação ideal é sempre atingir taxas de rejeição menores do que as aferidas nos ciclos anteriores. Para fins práticos, a Ascom adotará como meta o seguinte: nunca apresentar aumento superior a 10% na taxa de rejeição aferida no ciclo anterior.

e) Período da aferição: **jan/2021 a set/2021**.

f) Comentários: ligeiro crescimento, mas dentro da margem tolerável.

g) Representação gráfica dos resultados:

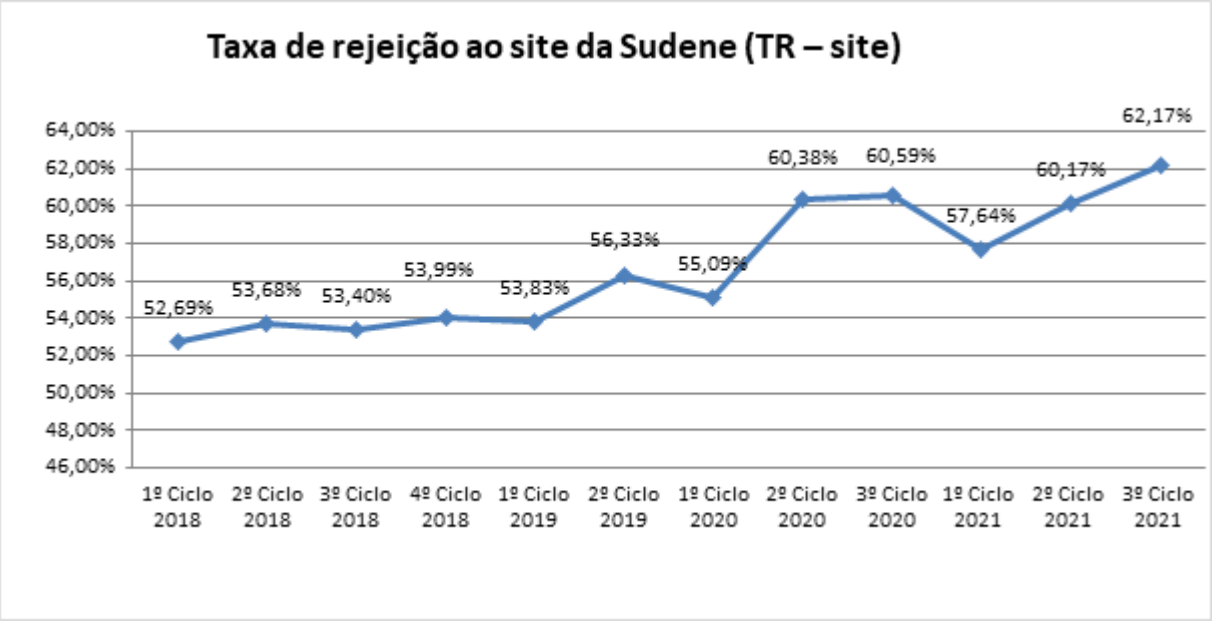

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.
Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

7.4 - Curtidas na página da Sudene no Facebook (FbL – RS)

a) Fórmula: Qtde de Curtidas = **2800.**
(Facebook)

b) Objetivo: avaliar a qualidade dos conteúdos que compõem este espaço, verificando a capacidade desta mídia de reforçar a imagem positiva da Sudene enquanto instituição pública promotora do desenvolvimento de sua área de atuação.

c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional - Ascom.

d) Resultado Ideal (%): não há consenso quanto ao resultado ideal da quantidade de curtidas, uma vez que este valor é extremamente dinâmico: depende do mercado no qual a organização atua, do comportamento dos usuários da rede, da capacidade viral que as publicações devem atingir, do valor dos investimentos financeiros realizados, entre outros. Considerando o fato de que não há perspectivas para celebração de contratos de publicidade para investimentos em anúncios nas redes sociais e a média de crescimento registrada em 2017, a Assessoria de Comunicação da Sudene adotará como meta anual o aumento de 3% na quantidade de curtidas na página da Sudene a cada novo ciclo de monitoramento.

e) Período da aferição: **jan/2021 a set/2021**.

f) Comentários: há algum tempo, nota-se a queda nas interações dos usuários no Facebook em virtude do crescimento de uso de outras redes sociais (IG ou TikTok, por exemplo), que experimentam crescimento mais acentuado. Também se registre a dificuldade de entrega de conteúdo pelo Facebook (tem-se registrado queda no alcance das publicações, mesmo com a alta frequência de publicação). Desta maneira, tem-se concentrado os esforços de comunicação nos perfis de maior engajamento da Sudene (IG e Youtube).

g) Representação gráfica dos resultados:

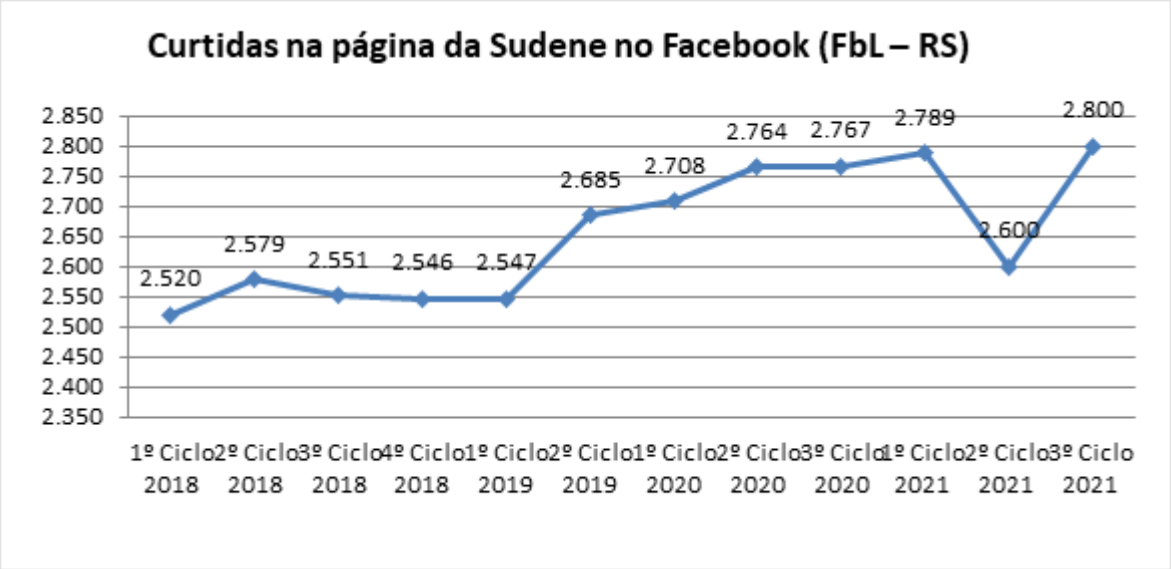

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.

Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

7.5 - Seguidores do Twitter da Sudene (TWT – RS)

a) Fórmula: Qtde de Seguidores = 1.206.
(Twitter)

b) Objetivo: avaliar a qualidade dos conteúdos que compõem este espaço, verificando a capacidade desta mídia de reforçar a imagem positiva da Sudene enquanto instituição pública promotora do desenvolvimento de sua área de atuação.

c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.

d) Resultado Ideal (%): não há consenso quanto ao resultado ideal da quantidade de seguidores, uma vez que este valor, assim como as curtidas no Facebook, é extremamente dinâmico pelos mesmos itens já destacados. Considerando a capacidade de produção de conteúdos específicos para esta rede, bem os resultados alcançados em 2017, a Assessoria de Comunicação vai considerar como meta o aumento de 4% no número de seguidores a cada ciclo.

e) Período da aferição: a) **jan/2021 a set/2021**.

f) Comentários: resultados esperados, comprovando tendência global de predileção dos usuários pelo Instagram em detrimento de outras redes sociais.

g) Representação gráfica dos resultados:

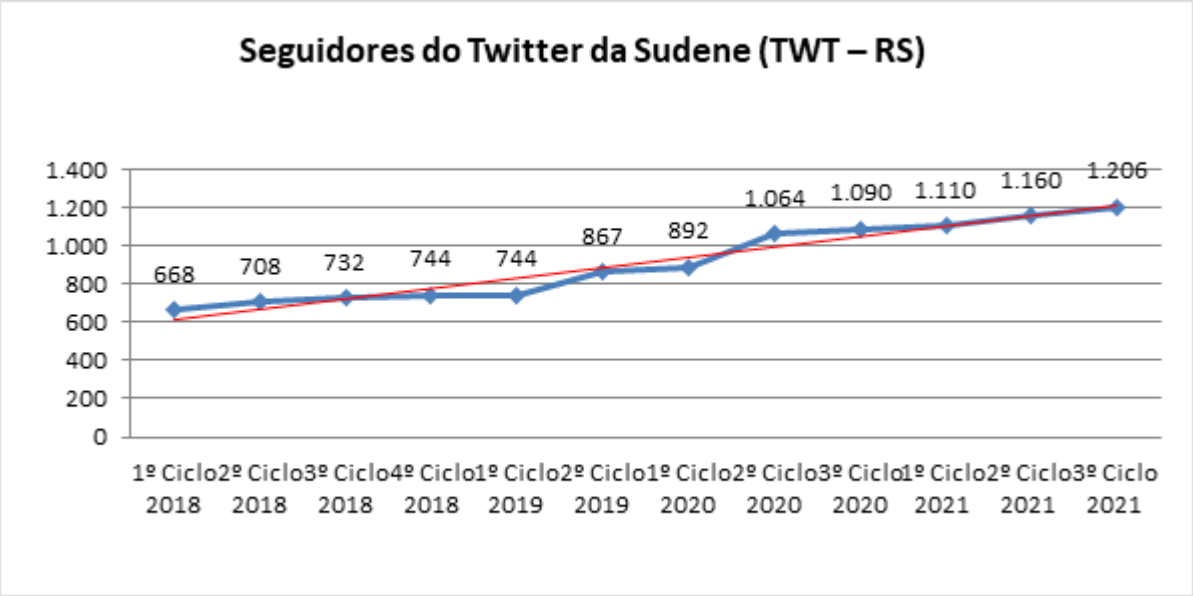

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional
Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

7.6 - Seguidores no Instagram da Sudene

a) Fórmula: quantidade de seguidores no Instagram: **2556**.

b) Objetivo: avaliar a qualidade dos conteúdos que compõem este espaço, verificando a capacidade desta mídia de reforçar a imagem positiva da Sudene enquanto instituição pública promotora do desenvolvimento de sua área de atuação.

c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional.

d) Resultado Ideal (%): registrar crescimento de 3% em relação ao período anterior.

e) Período da aferição: **jan/2021 a set/2021**.

f) Comentários: resultados positivos, evidenciando tendência global de aumento de engajamento no Instagram.

g) Representação gráfica dos resultados:

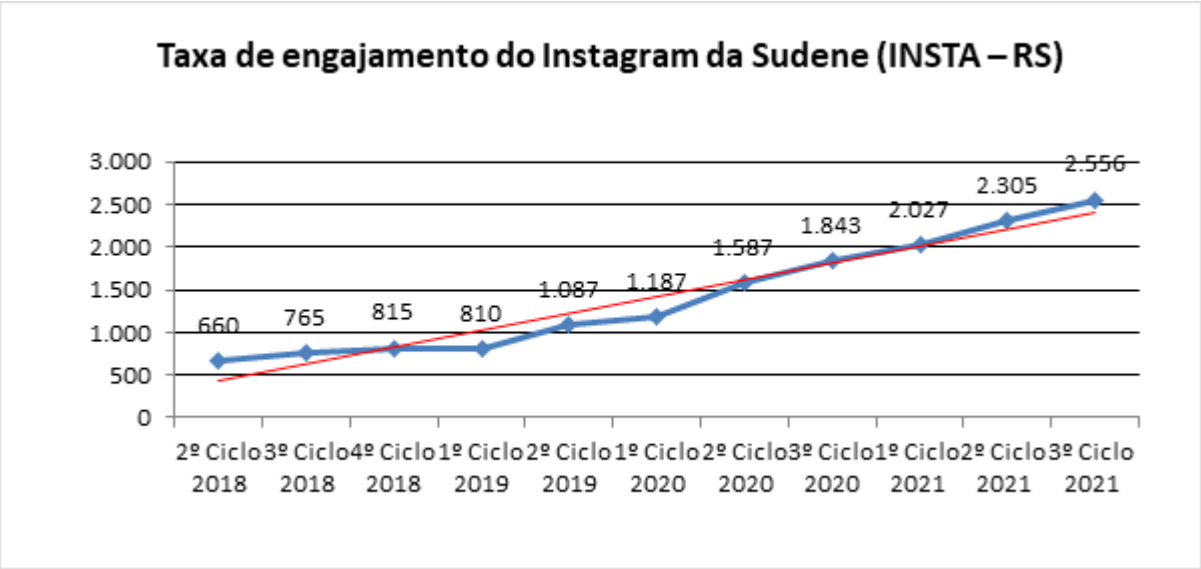

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional
Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

7.7 - Matérias publicadas (MP - JOR)

a) Fórmula: ∑ Matérias Publicadas = **84 na internet + 24 na intranet = 108**
(Internet + Intranet)

b) Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da produção de matérias jornalísticas.

c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional - Ascom.

d) Resultado Ideal (%): produzir, em média, 30 matérias por ciclo (uma matéria a cada dois dias), considerando internet e intranet.

e) Período da aferição: a) **jan/2021 a set/2021.**

f) Comentários: resultados positivos.

g) Representação gráfica dos resultados:

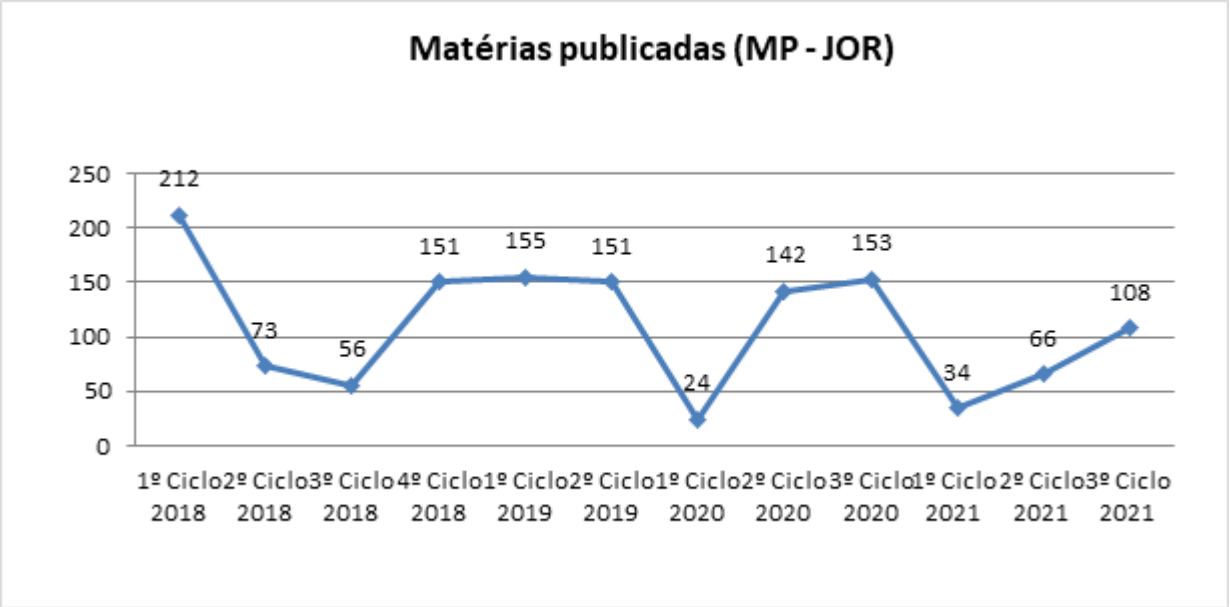

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional
Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

7.8 - Sugestões de pauta enviadas à imprensa (IMP - JOR)

a) Fórmula: ∑ Sugestões de Pauta Publicadas = **56**.

b) Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da sugestão de pautas enviadas ao mailing de jornalistas da área de atuação da Sudene.

c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional - Ascom.

d) Resultado Ideal (%): produzir, em média, 12 sugestões de pauta por ciclo.

e) Período da aferição: **jan/2021 a set/2021.**

f) Comentários: produção dentro do esperado.

g) Representação gráfica dos resultados:

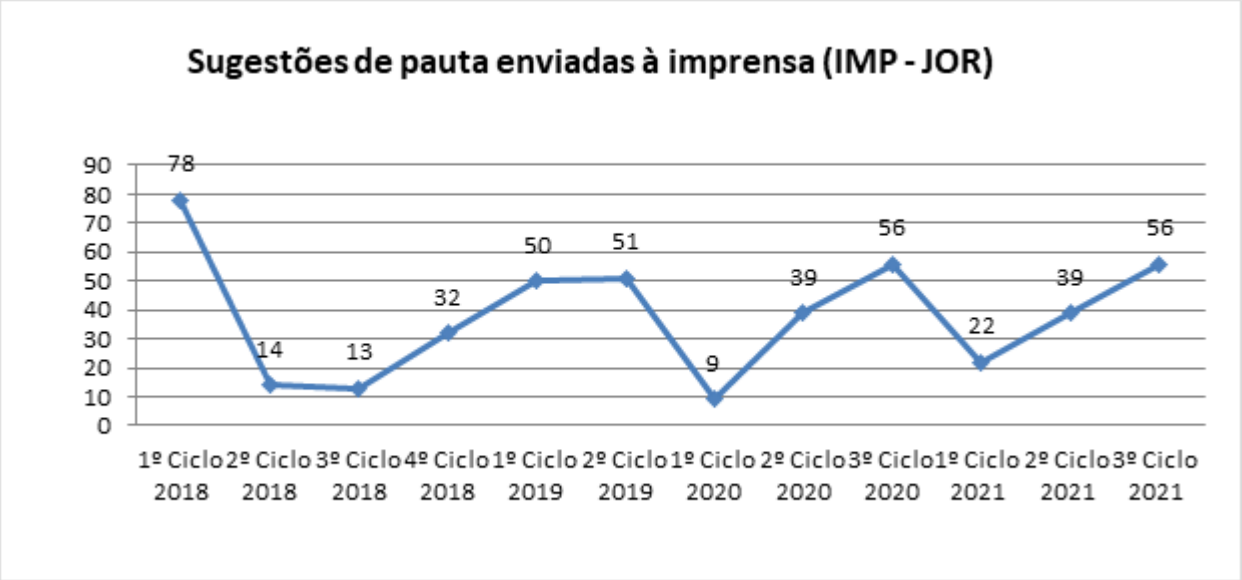

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional
Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

7.9 - Peças audiovisuais (A&V - JOR)

a) Fórmula: ∑ Produções em Vídeo e Áudio = **18 produções.**

b) Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da produção audiovisual.

c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação e Marketing Institucional.

d) Resultado Ideal (%): produzir, em média, 10 produções em áudio ou vídeo.

h) Período da aferição*:* **jan/2021 a set/2021.**

e) Comentários: o período de pandemia dificulta a viabilização de produção audiovisuais em virtude da necessidade de distanciamento e do uso de equipamentos in loco. Espera-se a retomada gradual das produções tão logo os efeitos da pandemia passem.

f) Representação gráfica dos resultados:

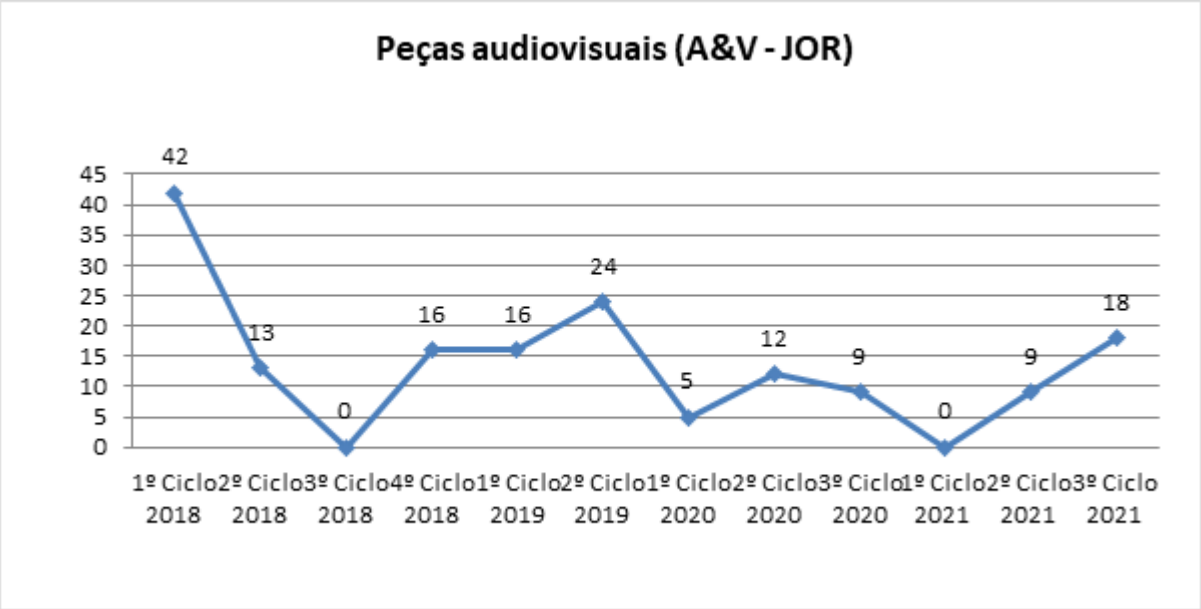

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional
Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado

7.10 - Jobs de publicidade e design (JOBS)

a) Fórmula: ∑ Produções em Ações de Publicidade e Design = **210** (Redes Sociais + Internet e Intranet + Demandas Internas)

b) Objetivo: fortalecer a imagem da Sudene através da produção audiovisual.

c) Responsabilidade de Aferição: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional - Ascom.

d) Resultado Ideal (%): não é possível aferir um índice específico com relação a esta meta, já que fatores externos à Assessoria estão relacionados às produções de publicidade e design. Alguns exemplos: demandas encaminhadas à área (produção de boletins, edição de imagens, campanhas de endomarketing, peças impressas variadas), e peças que funcionam como elementos acessórios em matérias jornalísticas e conteúdos de redes sociais (fotos, infográficos). Desta maneira, traremos neste índice, o quantitativo total de trabalhos com estas referências e monitorar sua produção de acordo com os seguintes parâmetros:

- Produções para conteúdo em redes sociais (marketing digital);
- Produções para jornalismo;
- Produções para demandas internas;
- Ações de publicidade (criação de marcas, produtos, redação publicitária);
- Peças digitais / impressos.

e) Período da aferição: **jan/2021 a set/2021**.

f) Comentários: resultados dentro do esperado.

g) Representação gráfica dos resultados:

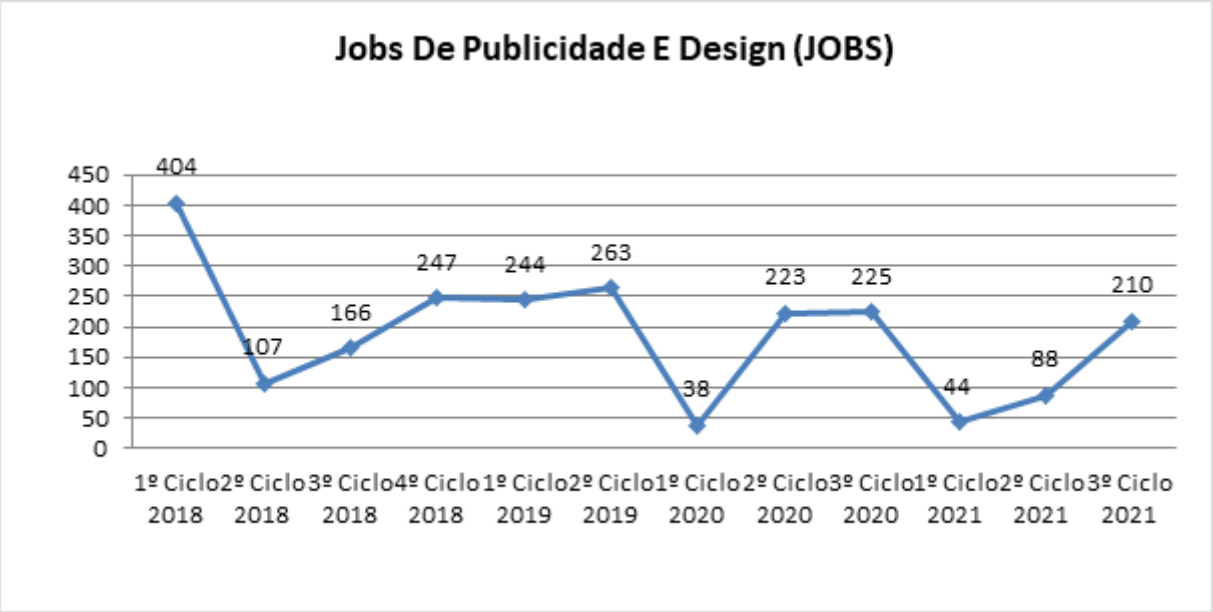

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional
Nota: Não houve linha de tendência plausível para o comportamento acima mostrado.

8. Metas de desempenho institucional para o período out/2020 - set/2021.

O quadro abaixo apresenta o percentual de atingimento das metas de desempenho institucional no período de out/2020 a set/2021. As citadas metas foram publicizadas por meio da Portaria SUDENE nº 91, de 23 de dezembro de 2021, a qual encontra-se disponível no site da Sudene por meio do *link*: https://www.gov.br/sudene/pt-br/centrais-de-conteudo/portaria912020sudene.pdf. Os resultados alcançados pelos projetos que compõem as metas institucionais desse período avaliativo, por sua vez, foram publicizados pela Portaria SUDENE nº 114, de 28 de outubro de 2021, cujo acesso pode ser realizado no endereço https://www.gov.br/sudene/pt-br/centrais-de-conteudo/portaria1142021.pdf.

Quadro 3 - Metas de Desempenho Institucional
Resultado do período out/2020-set/2021 com base na Portaria nº 91, de 23 de dezembro de 2021

Nº Ordem	Diretriz Estratégica SUDENE e/ou Programa PPA	Objetivo Estratégico SUDENE e/ou Ação PPA	Unidade de Medida	Meta Física (Prevista)	Percentual Atingido	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Identificação do Projeto (Conforme Plano Operativo ou relatório apresentado)	Unidade Responsável
1	Diretriz 1 – Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Objetivo 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Nota Técnica	1 (100%) (Meta repactuada na Portaria Sudene nº 100/2021, de 22/09/2021.	100%	80	Projeto: Revisão do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste- PRDNE. PO CGCP/2020001	CGCP/DPLAN
2	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Objetivo 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Nota Técnica	2 (100%) (Meta repactuada na Portaria Sudene nº 100/2021, de 22/09/2021.	100%	80	Projeto: Articulação do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE. PO CGCP/2020003	CGCP/DPLAN

		estruturadores.						
3	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Objetivo 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Contrato Firmado	1 (100%)	100%	80	Contratação de Pessoa Jurídica para Elaboração de Estudo de Complexidade Econômica e Plano de Ação Estratégica para as Bacias do Rio São Francisco, do Rio Parnaíba e área de influência do PISF.	CGCP/DPLAN
4	Diretriz 1 – Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Objetivo 1.5 - Fortalecer as administrações públicas	Painel Divulgado	1 (100%)	100%	80	Projeto: Avaliação da Qualidade dos Gastos Municipais. PO CGEP/2019001	CGEP/DPLAN
5	Diretriz 1 – Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Objetivo 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Relatório Aprovado	1 (100%) (Meta repactuada na Portaria Sudene nº 102, de 24/09/2021).	100%	80	Projeto: Estruturar processos de inteligência necessários ao monitoramento da carteira de programas e projetos do PRDNE - Trilha 3. PO CGEP 0278488.	CGEP/DPLAN
6	Diretriz 1 – Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Objetivo 1.4 - Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao Semiárido	Percentual do Projeto	50%	100%	80	Projeto: Atualizar a delimitação do Semiárido. PO CGEP/2021001	CGEP/DPLAN

7	Diretriz 1 – Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	Objetivo 1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	04 Webinários	4 (100%)	100%	80	Atividade: Realização de eventos de difusão tecnológica e articulação de parceiros: - Webinários abordando temáticas trabalhadas pela CGDS/DPLAN (tecnologias, atividades produtivas, energias renováveis, meio ambiente). PO CGDS/2020004	CGDS/DPLAN
8	D1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste.	Objetivo 1.5. - Fortalecer as Administrações Públicas	Percentual do Plano operativo	48,5% (Escopo e título do Projeto alterados, conforme Portaria Sudene nº 100/2021, de 22/09/2021.).	100%	80	Projeto: Elaboração de proposta de reformulação do "+Gestão Municipal" a partir da PNDR (Programa de Fortalecimento das Capacidades Governativas) e do PRDNE. PO CGDS/2020003	CGDS/DPLAN
9	D1 – Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste		Pleito aprovado	290 (100%) (Meta alterada na Portaria Sudene nº 100/2021, de 22/09/2021).	100% (290 pleitos)	80	Atividade: Aprovação de Pleitos de incentivos Fiscais pela Diretoria Colegiada da Sudene	CGIF/DFIN
10	D1 – Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os a investimentos estruturadores. O1.2 - Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão da cadeia produtiva; O1.3 - Ampliar a captação de investimentos,	Consultas prévias do FDNE analisadas	100%	100%	80	Atividade: Analisar as consultas prévias apresentadas ao FDNE em até 30 (trinta) dias, conforme § 3º, art. 18 do Regulamento do FDNE (aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012)	CGDF/DFIN

		maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes;						
11	D1-Promover a Competitividade Sistêmica da Base Produtiva do Nordeste	O1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os a investimentos estruturadores. O1.2 - Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão da cadeia produtiva; O1.3 - Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes;	Propostas de financiamentos do FDNE analisados	100%	100%	80	Atividade: Analisar os pleitos de financiamento apresentados ao FDNE em até 30 (trinta) dias, conforme § 2º, art. 22 do Regulamento do FDNE (aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012)	CGDF/DFIN
12	D1 – Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	O1.1 - Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando os a investimentos estruturadores. O1.2 - Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive	Relatórios elaborados e aprovados pela Diretoria Colegiada	3 (100%) (Meta alterada na Portaria Sudene nº 102, de 24/09/2021).	100% (2 relatórios aprovados)	80	Atividade: Acompanhar a execução da programação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A (BNB)	CGDF/DFIN

		aquela voltada para a inclusão da cadeia produtiva; O1.3 - Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes;						
13	D3 - Promover a Excelência Técnica e a Qualidade da Gestão	Sub-objetivo 3.3.3 - Valorizar e qualificar os servidores	Percentual do Projeto.	20%	100%	80	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho. PO CGGP/2018001	CGGP/DAD
14	D3 - Promover a Excelência Técnica e a Qualidade da Gestão	Sub-objetivo 3.3.3 - Valorizar e qualificar os servidores	Percentual do Projeto.	45%	133%	80	Projeto Estratégico de Desenvolvimento de Pessoas. PO CGGP/2020001	CGGP/DAD
TOTAL ALCANÇADO (média aritmética)						80		

Fontes: Diretoria de Administração; de Planejamento e Articulação de Políticas; de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional da SUDENE.

9. Conclusão

Neste terceiro ciclo de monitoramento de 2021 observa-se uma evolução em relação aos *status* dos projetos dos ciclos anteriores. Houve um grande número de projetos concluídos e um menor número de projetos atrasados, estes últimos sendo reduzidos quase à metade. Conforme detalhado na tabela de principais alterações nos projetos, parte dessa redução foi fruto da conclusão de projetos de financiamento do FDNE sob responsabilidade da CGDF, que estavam atrasados e foram concluídos neste 3º ciclo de monitoramento. Já os projetos com os *status* "em andamento" também tiveram redução, fruto da conclusão desses projetos pelos setores. Os projetos com status de "paralisados" apresentaram estabilidade em relação ao ciclo anterior.

A pandemia do Covid-19 vem sendo um grande desafio para a Sudene e, conforme observado pelos dados dos projetos e indicadores, teve significativo impacto no andamento dos trabalhos da autarquia, inclusive com a necessidade de se manter projetos paralisados. Mesmo com tal impacto em suas ações, a conclusão deste número elevado de projetos mostra o esforço da organização e sua adaptação às novas condicionantes.

É importante destacar que tiveram projetos com avanço considerável em seu percentual de andamento, a exemplo da Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas - CGGP/DAD, que em seus dois Planos Operativos avançou de 62% (2º ciclo) para 80%; e de 32% (2º ciclo) para 65% neste 3º ciclo. Chama a atenção também a atuação da CGEP/DPLAN em relação aos seus projetos nesse ciclo, por apresentar dois projetos que foram cancelados, um paralisado, dois concluídos e outros que estavam atrasados e tiveram alterações nas suas etapas e prazos, o que resultou nas respectivas mudanças de *status*.

Esta Coordenação-Geral de Gestão Institucional tem analisado e acompanhado os projetos que, por diversos motivos, se mantêm paralisados e/ou atrasados por vários ciclos. Neste terceiro ciclo de monitoramento percebeu-se uma diminuição significativa destes projetos denominados "críticos". Abaixo apresenta-se a lista de tais projetos relacionados no último ciclo e que ainda se mantém na situação supramencionada:

Nome do Projeto	Unidade Responsável	Data de Início	Data de Conclusão Prevista	STATUS
Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	CGDS/DPLAN	20/07/2015	23/05/2018	ATRASADO
Transnordestina Logística S/A - TLSA	CGDF/DFIN	08/08/2008	19/09/2016	PARALISADO
Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	CGDF/DFIN	24/07/2008	15/02/2019	ATRASADO
Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A	CGDF/DFIN	13/07/2011	15/02/2019	ATRASADO
Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	CGDF/DFIN	13/07/2011	15/02/2019	ATRASADO
Eólica Mar e Terra Geração e	CGDF/DFIN	13/07/2011	15/02/2019	ATRASADO

Comercialização de Energia S/A				

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão Institucional

Em relação aos indicadores apresentados neste relatório, destaca-se os indicadores de gestão da Comunicação Social e Marketing Institucional, que em sua quase totalidade tiveram elevação. A CGGP também teve elevação considerável nos índices de capacitação, onde o número de servidores capacitados em relação ao previsto passou de 15% (2º ciclo) para 77%, já o número de capacitações realizados em relação ao previsto subiu de 13% (2º ciclo) para 120% superando a meta estabelecida para todo o ano já neste ciclo que se encerrou em setembro.

Os índices de execução orçamentária e de execução financeira do FDNE também merecem destaque, tendo aumentado neste ciclo em relação ao anterior, respectivamente, de 13,87% para 56,60% e de 7,46% para 15,60%. A produtividade da análise de pleitos de incentivos fiscais, da Coordenação-Geral de Incentivos Fiscais - CGIF/DFIN, manteve a crescente nos seus resultados observada no último ciclo. Por fim, salienta-se que a autarquia permanece em busca de aprimorar o acompanhamento, revisão e ajuste dos projetos para atender aos objetivos de desempenho definidos nas metas institucionais e tornar esse processo de monitoramento mais efetivo para a organização os usuários e a sociedade em geral.

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos**	**Número do Projeto: PO**	**CGDS/2012001**
		Ano:	**2012**
Objetivo estratégico:	**2.3. Promover a sustentabilidade ambiental**	**Processo (s) SEI:**	**59335.000119/2012-95**

Programa:	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano (2217)	**Eixo temático (MDR):**	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	**Objetivo estratégico (MDR):**	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Desatualização da identificação e compreensão dos processos associados à dinâmica da desertificação no Estado de Pernambuco, necessários ao aprimoramento do planejamento sócio-econômico-ambiental da porção semiárida e, consequentemente, à definição e priorização de políticas públicas, bem como, articulação entre as políticas setoriais.		
Projeto:	**Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.**		
Objetivo do projeto:	Realizar o Zoneamento da Desertificação no Estado de Pernambuco, identificando e avaliando o fenômeno em sua porção semiárida, como forma de subsidiar as políticas públicas de desenvolvimento em consonância com o Plano de Ação Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – PAE-PE		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto**	**Valor Total do Projeto**
	100/250	GND 3	30	530.482,50	589.425,00

Cronograma de Desembolso (R$ 1,00)			
MÊS	**CONCEDENTE**	**CONVENENTE**	**TOTAL**
AGO/2013	265.241,25	58.942,50	324.183,75
JUN/2015	265.241,25	--	265.241,25
TOTAL	**530.482,50**	**58.942,50**	**589.425,00**

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	530.482,50
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	530.482,50

Previsão de Conclusão:	**31/12/2021**	**CONVÊNIO Nº 770859/2012 (Proposta SICONV 013341/2012)**
Data Atualização:	**30/09/2021**	**Vigência: 28/12/2012 a 31/12/2021.**

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto		
	Concedente:	Juliana Borges, Vera Assunção, Victor Uchôa Silva - SUDENE
	Convenente:	Sérgio de Azevedo Mendonça - SEMAS/PE

N.E.	**Nome da Etapa**	**Descrição das Atividades/ Etapas**	**Responsável**	**Previsto**			**Realizado**			**Físico %**	**Status**	**Observação/Problemas**	**Providências**
				Início	**Fim**	**Valor**	**Início**	**Fim**	**Valor**				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								**20,0%**	**Concluído**		
1	**Seleção de propostas**	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	20/03/2012	11/05/2012		20/03/2012	11/05/2012		100,0%	**Concluído**		
1.1	**Lançamento do Chamamento Público**	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	20/03/2012	19/04/2012		20/03/2012	19/04/2012		100,0%	**Concluído**		
1.2	**Análise de propostas**	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	20/04/2012	09/05/2012		20/04/2012	09/05/2012		100,0%	**Concluído**		
1.3	**Resultado do Chamamento Público**	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	11/05/2012	11/05/2012		11/05/2012	11/05/2012		100,0%	**Concluído**		
2	**Ajustes do projeto para formalizar convênio**	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	24/04/2012	08/06/2012		24/04/2012	08/06/2012		100,0%	**Concluído**		
3	**Formalização do convênio**	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	09/06/2012	14/12/2012		09/06/2012	14/12/2012		100,0%	**Concluído**		
4	**Assinatura do convênio**	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	28/12/2012	28/12/2012		28/12/2012	28/12/2012		100,0%	**Concluído**		
5	**Publicação do convênio**	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	03/01/2013	03/01/2013		03/01/2013	03/01/2013		100,0%	**Concluído**		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								**80,0%**	**Em Andamento**		
	Liberação da 1ª parcela	Liberação da primeira parcela	SUDENE/CGDS	01/08/2013	31/08/2013	**R$ 265.241,25**	15/08/2013	15/08/2013	R$ 265.241,25	100,0%	**Concluído**		
6	**Realização de proc. Licitatório**	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços no valor de R$ 325.222,88	SEMAS/PE	01/09/2013	24/06/2020	--	15/11/2014	06/12/2019	--	100,0%	**Concluído**	Processo licitatório concluído em dez 2019 para contratação dos serviços de sistematização e confecção do documento final/livro e do Seminário Nordestino.	
7	**Realizar 76 eventos**	META 1 - Realizar 76 eventos de mobilização, sensibilização e validação para o Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco- Valor: R$ 356.560,00	SEMAS/PE	01/07/2014	24/06/2020	--	08/12/2014	--	--	**100,0%**	**Concluído**		

7.1	**Realizar 61 encontros**	META1/ETAPA 1 – Realizar 61 encontros com duração de 2 dias (16h), cada um, no Sertão e Agreste Pernambucano. Valor: R$ 146.400,00	SEMAS/PE	08/12/2014	29/06/2016	--	08/12/2014	29/06/2016	--	100,0%	**Concluído**		
**	**Visita técnica de acompanhamento**	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	10/12/2014	11/12/2014	--	10/12/2014	11/12/2014	--	100,0%	**Concluído**		
	Liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	SUDENE	01/08/2018	31/08/2018	**R$ 265.241,25**	20/08/2018	20/08/2018	R$ 265.241,25	100,0%	**Concluído**	A segunda parcela de recursos ocorreu no dia 20/08/2018.	
7.2	**Realizar quatorze (14) workshops**	META 1/ETAPA 2 – Realizar quatorze (14) workshops com duração de dois (2) dias	SEMAS/PE	09/07/2018	24/06/2020	--	09/07/2018	30/07/2019	--	100,0%	**Concluído**		
7.3	**Realizar Seminário Nordestino**	META1/ETAPA 3 – Realizar Seminário Nordestino com duração de 3 (três) dias para socializar o documento e uniformizar a modelagem de vulnerabilidade da Desertificação na Região Nordeste. Valor: R$ 33.200,00	SEMAS/PE	05/11/2018	24/06/2020	--	--	--	--	40,0%	**Paralisado**	Este evento estava previsto para ser realizado em três dias, envolvendo o dia 28/04/2020. Entretanto, devido a pandemia, este evento teve sua realização adiada, com data a definir.	
8	**Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação**	META 2 - Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação no Estado de Pernambuco. Valor: R$ 232.865,00	SEMAS/PE	01/05/2014	24/06/2020	--	01/05/2014	04/03/2021	--	100,0%	**Concluído**		
8.1	**Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais**	META 2/ ETAPA1 – Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais (Solos, ambientes, cobertura vegetal ,clima e socioeconomia) Mapeamento; Processamento Digital e Verificação da verdade terrestre para finalização dos mapas. Valor: R$ 182.865,00	SEMAS/PE	01/05/2014	15/06/2017	--	01/05/2015	31/10/2017	--	100,0%	**Concluído**	O material produzido nesta Etapa foi apresentado para a equipe técnica da Sudene em 30/05/2019, presencialmente e por meio de videoconferência.	O convênio foi aditivado até 31/12/2021 para finalizar os dois produtos finais: publicação e Seminário Nordestino. Entretanto, é necessário acompanhar a evolução da pandemia causada pelo COVID-19 para, mais adiante, avaliar o real período necessário para a conclusão dos trabalhos. *A situação da pandemia está amenizando e permitindo planejar a realização de eventos presenciais. Assim, será realizado contato com o convenente para organização do seminário nordestino.
8.2	**Confeccionar documento final/ livro**	META2/ ETAPA2 – Confeccionar documento final/ livro contendo os produtos obtidos com a realização das Metas previstas. Valor R$ 50.000,00	SEMAS/PE	01/11/2018	24/06/2020	--	17/02/2020	04/03/2021		100,0%	**Concluído**	Foi realizado em 4/3/2021, o lançamento do documento "Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco" em evento on line promovido pela SEMAS/PE com a participação da SUDENE,nas pessoas do Superintendente e do Coordenador da CODEM/CGDS, Victor Uchôa,.	
***	**Visita técnica final de acompanhamento**	Visita técnica final de acompanhamento.	CGDS/SUDENE	20/03/2019	11/07/2019	--	20/03/2019	11/07/2019	--	100,0%	**Concluído**	Foram realizados acompanhamentos em parte dos workshops (março e julho/2019), assim como, uma reunião técnica com as partes envolvidas, na Embrapa Semiárido (Petrolina/PE), com videoconferência para participação da equipe técnica em Recife/PE (maio/2019).	
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								**0,0%**	**A Iniciar**		
9	**Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.**	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/ SUDENE	01/01/2022	31/12/2022	--	--	--	--	0,0%	**A Iniciar**	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.	
				Valor Previsto:		R$ 530.482,50	**Valor realizado:**		R$ 530.482,50	**77%**	**Paralisado**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado de Pernambuco - SEMAS/PE; Embrapa Semiárido; FUNDAJ/UPE.

Observações:

* Proposta apresentada em resposta ao Chamamento Público Nº 001/2012 / Programa: 5320320120004. Enviada para análise em 13/04/2012; analisada e aprovada, sob o aspecto técnico, com Parecer CGDS, de 26/06/2012. Retornou a CGDS em 12/12/2012 para Parecer Técnico sobre pendências constatadas. Solicitação de ajustes ao Convenente, em 12/12/2012. Envio da resposta pela Convenente em 17/12/2012. Parecer elaborado em 17/12/2012. Encaminhamento a CGC em 18/12/2012 para providências para celebração. Convênio assinado em 28/12/2012 e publicado em 03/01/2013. Primeira liberação ocorreu em 15/08/2013. Em virtude do tempo transcorrido até a primeira liberação, foi concedida uma prorrogação 'de ofício' alterando o término da vigência do convênio para 23/03/2014 (termo de Prorrogação de Ofício, assinado em 21/08/2013). Primeiro Termo Aditivo assinado em 20/03/2014, ampliando o prazo de vigência para 31/12/2014. Segundo Termo Aditivo, assinado em 29/12/2014, prorrogando o prazo de vigência para 31/08/2015. Plano de Trabalho ajustado ao novo período de execução (31/08/2015). Terceiro Termo Aditivo, assinado em 31/08/2015, ampliando a vigência para 30/04/2016. Quarto termo aditivo assinado, ampliando a vigência para 30/12/2016. Plano de trabalho ajustado para a nova vigência de 30/12/2016. Convênio aditado até março de 2018. Ajustes solicitados pelo setor de convênios acerca dos relatórios de execução financeira referentes à primeira parcela de recursos do convênio realizados. Ocorreu reunião com a Semas no dia 14/09/2017 com a convenente para avaliar as medidas cabíveis para dar continuidade ao convênio. Convênio aditado para 30/12/2018, datas das etapas restantes foram repactuadas e atualizadas no PO. A vigência deste Convênio foi ampliada para 30/08/2019. O convênio foi aditivado ampliando a vigência para 24/06/2020. Convênio sofreu aditivo de Ofício, conforme Decreto n.º 10.315/2020, em decorrência da pandemia e o término da nova vigência é 31/12/2020.

Informação registrada em outubro/2021 - Status projeto paralisado: existe a possibilidade de prorrogar prazo de conclusão do projeto para realização do seminário Nordestino.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGDS/2014001 (ex PO 03)**
		Ano:	**2014**
Objetivo estratégico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Processo (s) SEI:**	**59335.000543/2014-00**

Programa:	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano (2217)	**Eixo temático (MDR):**	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20N7 - Provimento de infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	**Objetivo estratégico (MDR):**	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Desenvolver o potencial e a capacidade produtiva dos APLs, visando sua inserção econômica em múltiplas escalas.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulçao de Políticas	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Carência de ações para a consolidação da cadeia produtiva sustentável da caprinocultura leiteira Paraibana, em razão do pouco acesso dos produtores familiares às tecnologias e informações e da consequente baixa remuneração pelo leite e seus derivados.		
Projeto:	**Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinocultura Leiteira no Semiárido Paraibano**		
Objetivo do projeto:	Incrementar e melhorar através da transferência e incorporaçao de conhecimentos e tecnologias, os atuais sistemas de produção de leite caprino na agricultura familiar no semiárido paraibano.		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)**	**Valor Total do Projeto (R$ 1,00)**
	100/250	GND 3 e 430	30	R$ 343.585,70	R$ 361.725,70

Cronograma de Desembolso			
MÊS	**CONCEDENTE**	**CONVENENTE**	**TOTAL**
dez/14	R$ 206.151,42	R$ 10.884,00	R$ 217.035,42
nov/15	R$ 137.434,28	R$ 7.256,00	R$ 144.690,28
	R$ 343.585,70	**R$ 18.140,00**	**R$ 361.725,70**

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	343.585,70
A realizar no exercício RAP	R$	-
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	343.585,70

Previsão de Conclusão:	26/12/2021	**CONVÊNIO Nº 813986/2014**
Data Atualização:	**30/09/2021**	**Vigência até: 26/12/2021**

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Mauro Póvoas Souto/ Vera Lúcia Assunção - EMPAER/PB - Wandrick Haus de Sousa

N.E.	**Nome da Etapa**	**Descrição das Atividades/ Etapas**	**Responsável**	**Previsto**			**Realizado**				**Status**	**Observação/Problemas**	**Providências**
				Início	**Fim**	**Valor**	**Início**	**Fim**	**Valor**	**Físico %**			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								**20,0%**	**Concluído**		
1	**Cadastramento e divulgação**	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	26/02/2014	17/04/2014	-	100%	**Concluído**		
2	**Recebimento de proposta**	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	26/02/2014	17/04/2014	-	15/04/2014	15/04/2014	-	100%	**Concluído**		
3	**Análise da proposta**	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	15/04/2014	15/10/2014	-	15/04/2014	15/10/2014	-	100%	**Concluído**		
4	**Complementação da proposta**	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	15/10/2014	17/10/2014	-	15/10/2014	17/10/2014	-	100%	**Concluído**		
5	**Emissão de parecer técnico final**	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	17/10/2014	18/12/2014	-	17/10/2014	18/12/2014	-	100%	**Concluído**		
6	**Aprovaçao do parecer técnico**	Aprovaçao do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	18/12/2014	23/12/2014	-	18/12/2014	23/12/2014	-	100%	**Concluído**		
7	**Formalização do Convênio**	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	31/12/2014	08/01/2015	-	31/12/2014	08/01/2015	-	100%	**Concluído**	De acordo com as metas institucionais de 2014/2015, que é de apoiar a formalização de 02 projetos para Desenvolvimento Econômico, Social, Cultural e Ambiental para o semiárido (02 formalizações da Rota do Cordeiro).	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								**50,5%**	**Paralisado**		**Este convênio foi aditivado, em função da pandemia, que paralisou algumas de suas atividades. Desta forma, foi aditivado, passando a ter a sua vigência até 26/12/2021.**
8	**Liberação 1ª parcela**	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/12/2014	31/12/2014	R$ 206.151,42	08/04/2015	22/04/2015	R$ 206.151,42	100%	**Concluído**		
9	**Contratação**	Contratação de 02 técnicos de nível médio e 01 de nível superior - (Etapa 01 - Meta 01)	EMPAER-PB	03/08/2015	30/11/2016	-	03/10/2015	03/05/2016	-	100%	**Concluído**	Técnicos contratados e incorporados às atividades do projeto.	
10	**Confecção de 50 blocos multinutricionais**	Confecção de 50 blocos multinutricionais para demonstração nos Núcleos - (Etapa 02 - Meta 01)	EMPAER-PB	21/09/2015	30/11/2016	-	04/11/2015	05/11/2016	-	100%	**Concluído**		
11	**Disponibilização de 48 reprodutores**	Disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças leiteiras - (Etapa 01 - Meta 02)	EMPAER-PB	21/09/2015	22/03/2020	-	24/10/2015		-	96%	**Paralisado**	Foram distribuidos 46 reprodutores caprinos de leite. A previsão era que todos os animais fossem entregues até 22/03/2020. Paralisado devido à pandemia.	
12	**Coleta de sêmen**	Coleta de sêmen (1.200 doses) - (Etapa 02 - Meta 02)	EMPAER-PB	13/10/2015	22/03/2020	-	03/12/2015		-	80%	**Paralisado**	A maior parte das doses já foram coletadas (cerca de 960 doses). No momento, encontra-se paralisado devido à pandemia.	
13	**36 Visitas técnicas para acompanhamento**	36 Visitas técnicas para acompanhamento das atividades de disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças - (Etapa 03 - Meta 02)	EMPAER-PB	21/09/2015	22/12/2019	-	14/09/2015	04/01/2019	-	100%	**Concluído**	Foram realizadas pela as 36 visitas técnicas de acompanhamento	

14	**Realização de 36 cursos de capacitação**	Realização de 36 cursos de capacitação destinados produtores de caprinos leiteiros da base familiar - (Meta 03)	EMEPA-PB	05/10/2015	22/03/2020	-	27/11/2015		-	65%	**Em Andamento**	Foram ministrados os Módulos I e II do curso de Produção e Conservação de Forragens e Manejo da Caatinga para 9 associações; Modulo I e II do Curso do Manejo Alimentar para	*Acompanhamento remoto do projeto; realização de reunião, contatos e/ou entendimentos; recebimento
15	**Visita Técnica de Acompanhamento**	Realização de visita técnica para acompanhamento	CGDS/SUDENE	01/08/2016	05/08/2016	-	10/08/2016	12/08/2016	-	100%	**Concluído**		
16	**Liberação 2ª parcela**	Liberação 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/08/2016	31/08/2016	R$ 137.434,28	23/03/2018	23/03/2018	R$ 137.434,28	100%	**Concluído**	A demora para liberação da segunda parcela ocorreu em função de ajustes para aprovação dos relatórios de execução (parcial) e do plano de trabalho	
17	**Visita Técnica de Acompanhamento**	Realização de visita técnica para acompanhamento para elaboração do Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	-			-	0%	**A Iniciar**	A 2a visita de acompanhamento ainda não foi feita, pois aguarda andamento das atividades restantes, que encontram-se paralizadas devido a pandemia.	A Empaer está sollicitando ajuste no plano de trabalho para finalizar as atividades restantes. Com a conclusão do projeto a equpe fará a visita de acompanhamento.
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								**0,0%**	**A iniciar**		
18	**Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.**	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	22/03/2017	22/03/2020	-			-	0%	**A Iniciar**		
					Valor Previsto:	R$ 343.585,70	**Valor realizado:**		R$ 343.585,70	**70%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

EMEPA/PB - Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba

Observações:

Em decorrência de atrasos motivados por problemas de ordem administrativa (a EMEPA passou por alterações e passou a incorporar uma nova entidade criada pelo Governo da Paraíba) e dificuldades em fazer as licitações para contratação de serviços, a convenente solicitou nova prorrogação do prazo de vigência do convênio em 13/02/2019, a qual foi acatada parcialmente, tendo sido sua vigência prorrogada para **30/09/2019**. Devido à pandemia este convênio foi prorrogado de Ofício até **31/12/2020**, entretanto, a Convenente ainda precisa ajustar o seu Plano de Trabalho para esse novo período de execução.

* Vigência do CV ampliada até 26/12/2021, considerando a pandemia do COVID-19 e a conclusão das atividades pendentes. ** Agendada e realizada reunião de acompanhamento, em19/03/2021, pela manha, entre coordenações técnicas, EMPAER e CODEM/CGDS e equipe técnica CODEM, para saber dos impactos da pandemia na região envolvida e das perspectivas/alternativas de retomada e conclusão das atividades pendentes, paralizadas pela pandemia.

Informação registrada em outubro/2021 - Possivelmente vai ser necessária a prorrogação de vigência do projeto.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos**	**Número do Projeto:**	**PO CGDS/2015001 (ex PO 04)**
		Ano:	**2015**
Objetivo estratégico:	**2.3. Promover a sustentabilidade ambiental**	**Processo (s) SEI:**	**59335.000219/2015-64**

Programa:	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano (2217)	**Eixo temático (MDR):**	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	**Objetivo estratégico (MDR):**	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Fornecer instrumentos relevantes para o ordenamento e a gestão ambiental de áreas selecionadas, visando conhecer as potencialidades e as limitações ambientais e socioeconômicas, a fim de subsidiar o planejamento dos agentes públicos e privados na definição de estratégias/diretrizes orientadoras do processo de uso e ocupação do território		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente - CGDS
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Devido à dinâmica pela qual vem atravessando a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, o cenário existente demanda e justifica a adoção de medidas voltadas para a compatibilização das diversas ocupações, tendo a sustentabilidade como premissa.		
Projeto:	**Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.**		
Objetivo do projeto:	Atualizar e complementar os diagnósticos dos meios físico-biótico, socioeconômico e jurídico-institucional da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, tendo como referência o "Diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco", publicado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2011.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250 / 280	33.90.35	30	R$ 459.000,00	R$ 824.276,25

Previsão de Conclusão:	23/05/2018	**Termo de Execução Descentralizada Nº 002/2015**
Data Atualização:	30/09/2021	**Vigência: 31/03/2017**

Cronograma de Desembolso (R$ 1,00)			
SUDENE	**MMA**	**MÊS**	**TOTAL**
R$ 459.000,00	R$ 365.276,25	nov/15	R$ 824.276,25
			R$ 0,00
R$ 459.000,00	**R$ 365.276,25**	**nov/15**	**R$ 824.276,25**

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	459.000,00
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	459.000,00

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto		
	CGDS / SUDENE	Victor Uchôa Silva
	SRHU / MMA	Bruno Siqueira Abe Saber Miguel / Felipe Barbosa

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								**20,0%**	**Concluído**		
1	**Envio de Ofício À SUDENE**	Envio de Ofício pelo questionando o interesse da SUDENE em desenvolver esta iniciativa	SRHU / MMA	20/07/2015	24/07/2015		20/07/2015	24/07/2015		100%	**Concluído**		
2	**Posicionamento da SUDENE a favor**	Posicionamento da SUDENE a favor e envio de Ofício demonstrando interesse	CGDS/SUDENE	06/08/2015	10/09/2015		06/08/2015	10/09/2015		100%	**Concluído**		
3	**Envio do TR e do TED**	Envio do Termo de Referência e do Termo de Execução Descentralizada (TED)	SRHU / MMA	11/09/2015	25/09/2015		11/09/2015	25/09/2015		100%	**Concluído**		
4	**Análise e elaboração de Nota Técnica**	Análise e elaboração de Nota Técnica	CGDS / SUDENE	28/09/2015	19/10/2015		28/09/2015	19/10/2015		100%	**Concluído**		
5	**Parecer jurídico da Procuradoria**	Parecer jurídico da Procuradoria junto a SUDENE	Procuradoria Federal	20/10/2015	27/10/2015		20/10/2015	27/10/2015		100%	**Concluído**		
6	**Aprovação na DC**	Aprovação na Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada SUDENE	12/11/2016	12/11/2016		12/11/2016	12/11/2016		100%	**Concluído**		
7	**Parecer técnico final**	Parecer técnico final	CGDS / SUDENE	28/10/2016	16/11/2016		28/10/2016	16/11/2016		100%	**Concluído**		
8	**Celebração do TED**	Celebração do Termo de Execução Descentralizada	SUDENE e MMA	17/11/2016	25/11/2016		17/11/2016	25/11/2016		100%	**Concluído**		
9	**Publicação**	Publicação no DOU	CGC/SUDENE	25/11/2016	30/11/2016		30/11/2016	30/11/2016		100%	**Concluído**		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								**60,0%**	**Concluído**		
10	**Liberação da única parcela**	Liberação da primeira e única parcela	COCF/CGAF/SUDENE	25/11/2015	25/11/2015	R$ 459.000,00	25/11/2015	25/11/2015	R$ 459.000,00	100%	**Concluído**		
11	**Mobilização e Planejamento**	Mobilização e Planejamento	MMA	12/02/2016	07/03/2016		12/02/2016	31/03/2016		100%	**Concluído**	Esta Meta compreende o conjunto de ações preparatórias ao diagnóstico a ser realizado, incluindo a mobilização e apresentação da equipe técnica da empresa contratada. Dentre as ações, foram realizadas a Reunião de Partida, com a coordenação da ação no MMA e representantes da empresa contratada, e o Encontro de Articulação com os Atores Estratégicos, que ocorreu em 31/03/2016, com a participação de representantes da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE), do Grupo de Trabalho Permanente para a Execução do Zoneamento Ecológico-Econômico (Consórcio ZEE Brasil), e dos Estados integrantes da bacia hidrográfica do rio São Francisco.	
11.1	**Planejamento do processo e mobilização dos stakeholders**	Planejamento detalhado do processo e mobilização dos stakeholders	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	12/02/2016	07/03/2016		12/02/2016	31/03/2016		100%	**Concluído**		

12	**Visita técnica de acompanhamento**	Reunião/ Visita técnica de acompanhamento	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	31/03/2016	31/03/2016		31/03/2016	31/03/2016		100%	**Concluído**	A SUDENE participou do **Encontro de Articulação com os Atores Estratégicos** indicado acima como partípice do Termo de Execução Descentralizada (TED), para realizar o acompanhamento da atividade prevista neste instrumento, assim como integrante do Consórcio ZEE Brasil.	
13	**Atualização e complementação do diagnóstico do MacroZEE**	Atualização e complementação do diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	12/05/2016	13/09/2016		08/03/2016	14/03/2017		100%	**Concluído**		
13.1	**Atualização e complementação do diagnóstico do meio físico-biótico**	Atualização e complementação do **diagnóstico do meio físico-biótico** da BHSF	MMA	12/05/2016	25/06/2016		08/03/2016	16/11/2016		100%	**Concluído**	Após a realização de ajustes e nova análise pela Comissão Técnica de Acompanhamento, Análise e Avaliação (CTAAA) este relatório foi aprovado.	
13.2	**Atualização e complementação do diagnóstico do meio socioeconômico**	Atualização e complementação do diagnóstico do **meio socioeconômico** da BHSF	MMA	26/06/2016	15/07/2016		22/04/2016	18/07/2016		100%	**Concluído**	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.	
13.3	**Atualização e complementação do diagnóstico do meio jurídico-institucional**	Atualização e complementação do diagnóstico do **meio jurídico-institucional** da BHSF	MMA	16/07/2016	31/03/2017		16/07/2016	23/11/2016		100%	**Concluído**	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.	
13.4	**Análise integrada e crítica sobre a situação atual da BHSF**	Análise integrada e crítica sobre a situação atual da BHSF	MMA	05/08/2016	31/03/2017		05/08/2016	10/02/2017		100%	**Concluído**	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.	
14	**Elaboração do Banco de Dados Geográficos (BDG) do diagnóstico do MacroZEE**	Elaboração do Banco de Dados Geográficos (BDG) do diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	14/09/2016	31/03/2017		14/09/2016	16/02/2017		100%	**Concluído**		
14.1	**Sistematização, estruturação e documentação do BDG**	Sistematização, estruturação e documentação do Banco de Dados Geográficos (BDG)	MMA	14/09/2016	31/03/2017		14/09/2016	16/02/2017		100%	**Concluído**	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.	
15	**Sistematização e divulgação dos resultados**	Sistematização e divulgação dos resultados	MMA	14/10/2016	31/03/2017		14/10/2016	14/03/2017		100%	**Concluído**		
15.1	**Resumo executivo referente ao diagnóstico do MacroZEE**	Preparação de resumo executivo referente ao diagnóstico do MacroZEE da BHSF	MMA	14/10/2016	31/03/2017		14/10/2016	17/02/2017		100%	**Concluído**	Foi apresentada a versão final, que foi aprovada pela CTAAA.	
15.2	**Apresentação dos resultados alcançados**	Apresentação dos resultados alcançados em seminário a ser realizado em Brasília	MMA	03/11/2016	31/03/2017		14/03/2017	14/03/2017		100%	**Concluído**	Foi realizado, Brasília/DF, no dia 14/03/2017 um seminário para apresentação dos resultados alcançados.	
16	**Visita técnica de acompanhamento**	Reunião/ Visita técnica de acompanhamento	SUDENE, MMA, CCZEE, Consórcio ZEE Brasil.	14/03/2017	14/03/2017		14/03/2017	14/03/2017		100%	**Concluído**	Foi realizado o acompanhamento do Seminário indicado acima, realizado em 14/03/2017, em Brasília/DF.	
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								**18,0%**	**Em Andamento**		
17	**Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.**	Análise do Relatório Final, sob o aspecto físico, e emissão de laudo/parecer técnico final.	SUDENE	24/04/2017	23/05/2018		26/04/2017	--		90%	**Em Andamento**	Não foi possível a conclusão do parecer técnico final no período estipulado, devido ao grande volume de produtos a serem analisados, bem como, em função da prioridade apresentada pela elaboração do PRDNE, que demandou a cessão de técnicos desta CGDS/DPLAN para a Força Tarefa, sendo necessário priorizar outras atividades já em andamento, como convênios e emendas, em detrimento de outras. Além disso, este processo teve a sua digitalização concluída recentemente. **A elaboração foi retomada para conclusão do posicionamento técnico final, com previsão de**	
				Valor Previsto:		R$ 459.000,00	**Valor realizado:**		R$ 459.000,00	**98%**	**Atrasado**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano / Ministério do Meio Ambiente (SRHU/MMA), Ministérios integrantes da Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico (CCZEE), instituições do Consórcio ZEE Brasil, Estados integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.
Observações:
O servidor Carlos Almiro Moreira Pinto se aposentou e não está mais acompanhando este projeto. O servidor José Aildo Sabino foi realocado para a Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas (CGEP).

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado

	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGDS/2020005 (ex PO 06)**
		Ano:	**2020**
Objetivo estratégico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Processo (s) SEI:**	**59336.003242/2019-24**

Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	-
Ação:	**4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade**	**Objetivo estratégico (MDR):**	-
Finalidade da ação:	Qualificação de mão de obra especializada para as atividades produtivas por meio de cursos, seminários e oficinas de trabalho, destinados à capacitação de empreendedores e à inovação necessária ao modelo competitivo, incluindo a melhoria da qualidade e produtividade. Essa ação visa suprir demandas especializadas do mercado		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	A carência de mão de obra é sistemática em vários setores da área de TIC, sendo necessário o investimento em infraestrutura para criação de cursos de formação e capacitação nas tecnologias emergente. A área de gerenciamento de Datacenters e desenvolvimento de tecnologias para a Computação em Nuvem são setores que atualmente não contam cursos especializados em Pernambuco		
Projeto:	**Programa de Capacitação para Consolidaçãode de Novas Tecnologias de Computação (Nuvem).**		
Objetivo do projeto:	Formar residentes para atuarem em células de desenvolvimento após a formação baseada em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	-	-	-	R$ 425.000,00	426.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	425.000,00
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício (1)		R$ 319.360,49
Valor liberado no Exercício		R$ 319.360,49
Saldo a liberar	R$	105.639,51
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício		R$ 319.360,49

Previsão de Conclusão:	31/12/2021
Data Atualização:	30/09/2021

Convênio SICONV 893892/2019
Vigência 30/12/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto		
	CGDS/SUDENE:	José Farias, Leonardo Morais
	UPE	Prof. Paulo Hugo, Prof. Bruno Carvalho

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto Inicio	Previsto Fim	Previsto Valor	Realizado Inicio	Realizado Fim	Realizado Valor	Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
1		**PLANEJAMENTO (Peso 20%)**								**20%**	**Concluído**		
1.1	**Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira**	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	11/12/2019	27/12/2019		11/12/2019	27/12/2019		100,0%	**Concluído**		
1.2	**Analise jurídica**	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	26/12/2019	27/12/2019		26/12/2019	27/12/2019		100,0%	**Concluído**		
1.3	**Elaboração do Termo de Convênio**	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	26/12/2019	30/12/2019		26/12/2019	30/121/2019		100,0%	**Concluído**		
1.4	**Assinatura do Convênio**	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	30/12/2019	30/12/2019		30/12/2019	30/12/2019		100,0%	**Concluído**		
1.5	**Publicação do Convênio**	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	17/01/2019	17/01/2019		17/01/2019	17/01/2019		100,0%	**Concluído**		
2		**EXECUÇÃO (Peso 70%)**								**33%**	**Em Andamento**		
2.1	**Liberação da primeira parcela de recursos**	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/04/2021	30/04/2021	**R$ 319.360,49**	20/05/2021	20/05/2021	**R$ 319.360,49**	**100%**	**Concluído**	A liberação da primeira parcela de recursos ocorreu em maio/2021. Diante da pandemia (Covid 19) as ações presenciais sofreram ajustes, sendo remanejadas para o final do primeiro semestre de 2021.	Em função da análise dos processos licitatórios apresentados para análise e aprovação da concedente, houve ajuste no valor liberado na primeira parcela. Reprogramação das ações presenciais e intensificação de ações à distância. Recursos solicitados
2.2	**Meta 1: Realizar um (1) Seminário de Inovação do Polo Mangue Digital.**	Será realizado um Seminário de Inovação do Polo mangue Digital para toda a comunidade TIC de Pernambuco e adjacências. Há uma expectativa de 100 a 150 pessoas no Seminário.	UPE	01/05/2021	30/11/2021		05/02/2020	--		50,0%	**Em Andamento**	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 5/2/2020. 2ª reunião dia 03/03 diversas reuniões, onde foi priorizada a meta de caoacitação que pode ser iniciada à distância. Necesidades de ajustes no PT diante da Pandemia e de ajustes nos recursos. Está sendo analisada a possibilidade de realizar o evento de forma on line.	Evento reprogramado diante da pandemia. Mudança para evento à distância. Solicitado ajustes no PT incluído no Siconv. Seminário estruturado, devendo ocorrer até a primeira quinzena de dezembro/2021.
2.3	**Meta 2: Realizar Jornada de Eventos (8) de Capacitação do Polo Mangue Digital.**	Será realizada uma jornada de 8 eventos em diversas cidades do estado de Pernambuco, preferencialmente em cidades com escolas técnicas que tenham cursos na área de tecnologia e polos econômicos fora da região metropolitana do Recife. Os eventos serão organizados e conduzidos por uma equipe técnica formada por um coordenador, dois pesquisadores e um motorista. A cada evento tem-se uma expectativa de 30 a 60 pessoas por evento.	UPE	01/04/2021	30/10/2021		28/08/2020	--		60,0%	**Em Andamento**	Diante da pandemia (covid 19) as ações presenciais sofreram ajustes, sendo remanejadas para o segundo semestre de 2020 e com a sua continuidade para o primeiro semestre de 2021. Reunião dia 28/08 - ajustes a partir de novo PT, remanejamento de rubricas e perspectivas de finalização da pandemia. Está sendo analisada a possibilidade de realizar as capacitações de forma on line.	Reprogramação das ações presenciais e intensificação de ações à distância. Montado grupo de trabalho para desenho final e mobilização para os eventos. Eventos serão híbridos, presencial com pequena comissão local e on line, à distancia, transmitido pelo Canal da UPE no youtube. Constituição de grupo de trabalho com diversos parceiros para organização dos eventos. Primeiro evento em Agosto/2021. ultimo em outubro, eventos quinzenais. 4 eventos realizados até o dia 30/09/2021. Mais dois programados para o mês de outubro. Diante da nova frequencia e da
2.11	**1ª Prestação de contas parcial**	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	01/04/2021	30/09/2021		30/09/2021			20,0%	**Em Andamento**		
2.4	**Meta 3: Formar (10) residentes em curso de especialização de computação.**	o Programa de Residência será desenvolvido pelo IIT e contará com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada. O local de execução será o prédio do IIT, localizado no Parqtel. O programa terá duração de 12 meses, com 12 módulos de 30hs mesclando	UPE	01/07/2020	30/09/2021		07/01/2021			80,0%	**Em Andamento**	Empresas participantes selecionadas e edital de seleção dos residentes lançado. Residentes selecionados. Aulas iniciadas em janeiro, em andamento, finalização prevista para setembro de 2021.	Solicitada a prorrogação do convênio no Siconv. Aulas com finalização em outubro/2021. Trabalhos apresentados até novembro. Evento de finalização da residência ate a primeira quinzena de dezembro/2021.

2.12	**Liberação da segunda parcela de recursos**	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/07/2021	31/07/2021	**R$ 105.639,51**				20,0%	**Atrasado**	Prestação de contas da primeira parcela em andamento	
2.13	**2ª Prestação de contas parcial**	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	UPE	01/10/2021	10/11/2021					0,0%	**A Iniciar**		
3		**PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 10%)**								**0,0%**	**A Iniciar**		
3.1	**Prestação de contas final**	Envio da prestação de contas final pela convenente.		16/11/2021	30/11/2021		01/12/2021	31/12/2021		0,0%	**A Iniciar**		
3.2	**Elaboração de Relatório Final**	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	01/12/2021	15/12/2021		06/12/2021	31/12/2021		0,0%	**A Iniciar**		
3.3	**Análise da prestação de contas financeiras**	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	16/12/2021	30/12/2021		06/12/2021	31/12/2021		0,0%	**A Iniciar**		
					Valor Previsto:	R$ 425.000,00	**Valor realizado:**		R$ 0,00	53%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
Universidade de Pernambuco - UPE
Observações:
Processo SEI n.º 59336.003242/2019-24

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGDS/2020006 (ex PO 07)**
		Ano:	**2020**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Processo (s) SEI:**	**59336.003248/2019-00**

Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	-
Ação:	**4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade**	**Objetivo estratégico (MDR):**	-
Finalidade da ação:	Qualificação de mão de obra especializada para as atividades produtivas por meio de cursos, seminários e oficinas de trabalho, destinados à capacitação de empreendedores e à inovação necessária ao modelo competitivo, incluindo a melhoria da qualidade e produtividade. Essa ação visa suprir demandas especializadas do mercado de trabalho.		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	A carência de mão de obra é sistemática em vários setores da área de TIC, sendo necessário o investimento em cursos de formação e capacitação em tecnologias emergentes. O estudo e entendimento do processo de digitalizacao da economia e seus impactos na industria 4.0 torna-se fundamental para entender estes impactos, havendo carencia		
Projeto:	**Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas pernambucanas atraves da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação - PE 4.0**		
Objetivo do projeto:	Formar residentes para atuarem em processos de digitalizacao da industria após a formação baseada em conteúdos especificos apresentados pela Universidade de Pernambuco e construcao de planos de acao pratica em10 industrias de setores diversos		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)**	**Valor Total do Projeto (R$ 1,00)**
	-	-		R$ 340.000,00	R$ 341.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	
A realizar no exercício	R$	340.000,00
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício (1)		R$ 241.376,80
Valor liberado no Exercício		R$ 241.376,80
Saldo a liberar	R$	340.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R$	98.623,20
Total Liberado até o exercício		R$ 241.376,80

Previsão de Conclusão:	31/12/2021
Data Atualização:	30/09/2021

Convênio SICONV 893056/2019
Vigência 30/12/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto		
	CGDS/SUDENE:	José Farias, Juliana Borges
	UPE	Prof. Djalma Guimarães

				Previsto			Realizado						
		Descrição das Atividades/ Etapas	**Responsável**	**Inicio**	**Fim**	**Valor**	**Inicio**	**Fim**	**Valor**	**Fisico %**	**Status**	**Observação/Problemas**	**Ações Corretivas**
1		**PLANEJAMENTO (Peso 20%)**								**20%**	**Concluído**		
1.1	**Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira**	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	11/12/2019	27/12/2019		11/12/2019	27/12/2019		100,0%	**Concluído**		
1.2	**Analise jurídica**	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	26/12/2019	27/12/2019		26/12/2019	27/12/2019		100,0%	**Concluído**		
1.3	**Elaboração do Termo de Convênio**	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	26/12/2019	30/12/2019		26/12/2019	30/121/2019		100,0%	**Concluído**		
1.4	**Assinatura do Convênio**	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	30/12/2019	30/12/2019		30/12/2019	30/12/2019		100,0%	**Concluído**		
1.5	**Publicação do Convênio**	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	17/01/2019	17/01/2019		17/01/2019	17/01/2019		100,0%	**Concluído**		
2		**EXECUÇÃO (Peso 70%)**								**41%**	**Em Andamento**		
2.1	**Liberação da primeira parcela de recursos**	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/03/2021	30/03/2021	**R$ 241.376,80**	16/03/2021	16/03/2021	**R$ 241.376,80**	100,0%	**Concluído**	Problemas relacionados à crise do covid19	Primeira parcela liberada em 16/03/2021.
2.2	**Meta 1: Mobilizacao de empresas e aplicacao da metodologia PE 4.0**	Serao identificadas as empresas parceiras e participantes do projeto, escolha dos alunos e gestores a ser capacitados e incio do estudo e aplicacao da metodologia	UPE	30/09/2020	30/05/2020		05/02/2020	15/09/2020		100,0%	**Concluído**	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 5/2/2020. Listagem das empresas parceiras enviada dia 19/02/2020	Programa foi refeito com novas datas
2.3	**Meta 2: Capacitação de Gestores e Elaboração de planos de ação**	o Programa de Residência será desenvolvido pelo IIT e contará com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada. O local de execução será o prédio do IIT, localizado no Parqtel. O programa terá duração de 8 a 12 meses, com 12 módulos de 30hs mesclando atividades acadêmicas, gerenciadas pelo IIT, e atividades de desenvolvimento, gerenciadas em conjunto com as instituições parceiras, com foco em projetos reais apresentados pelas empresas	UPE	30/09/2020	30/08/2021		30/09/2020			90,0%	**Em Andamento**	Lançamento no dia 30/09/2020 Atualmente me fase de seleção dos alunos participantes. Alunos selecionados. Empresas visitadas em dezembro de 2020, com diagnostico inicial realizado. Gestores das empresas indicados para participar do curso. Aulas iniciadas em janeiro/2021	Ajuste no PT inseridas e aprovadas no Siconv. Aulas foram iniciadas em 20/01/2021. Aulas previstas para encerramento em agosto de 2021. Aulas a encerra na primeira semana de outubro. Após será a apresentaçao dos projetos de intervenção nas empresas, no final de outubro ou primeira quinzena de novembro.
2.11	**1ª Prestação de contas parcial**	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	01/04/2021	31/07/2021		05/05/2021			60,0%	**Em Andamento**	Relatório de Pagamentos Realizados em elaborado e em análise.	
2.12	**Liberação da segunda parcela de recursos**	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/06/2021	30/06/2021	**R$ 98.623,20**				0,0%	**Atrasado**	Prestação de contas da primeira parcela em andamento	
2.13	**2ª Prestação de contas parcial**	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	UPE	01/09/2021	30/09/2021					0,0%	**Atrasado**		
3		**PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 10%)**								**0,0%**	**A Iniciar**		
3.1	**Prestação de contas final**	Envio da prestação de contas final pela convenente.		01/10/2021	30/10/2021					0,0%	**A Iniciar**		
3.2	**Elaboração de Relatório Final**	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	01/11/2021	30/11/2021					0,0%	**A Iniciar**		
3.3	**Análise da prestação de contas financeiras**	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	01/12/2021	15/12/2021					0,0%	**A Iniciar**		
				Valor Previsto:		R$ 340.000,00	**Valor realizado:**		R$ 0,00	61%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros Institucionais:
Universidade de Pernambuco - UPE
Observações:
Processo SEI n.º 59336.003248/2019-00

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGDS/2020007 (ex PO 08)**
		Ano:	**2020**
Objetivo estratégico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Processo (s) SEI:**	**59336.003160/2019-80**

Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	-
Ação:	**214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional**	**Objetivo estratégico (MDR):**	-
Finalidade da ação:	Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas, rurais e urbanas, por meio da resolução de gargalos em todos os elos da cadeia produtiva.		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Os provedores na nuvem dependem hoje de data centers distribuídos, que hospedam servidores e dispositivos de rede. Propõe-se a criação da primeira plataforma da América Latina para preparar profissionais e empresas, uma vez que há uma carência de cursos em gerenciamento de Datacenters.		
Projeto:	**Montagem de Plataforma Digital, constituída de 1 (um) Centro de Processamento de Dados Avançados (Datacenter) e 2 (dois) laboratórios móveis para desenvolvimento de soluções em computação em nuvem.**		
Objetivo do projeto:	Capacitar estudantes e profissionais em computacao na nuvem para atuarem em células de desenvolvimento em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	-	-	-	R$ 649.777,57	651.777,57

Previsão de Conclusão:	30/12/2021
Data Atualização:	30/06/2021

Convênio SICONV 892599/2019
Vigência: 30/12/2021

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	649.777,57
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício (1)	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	649.777,57
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto		
	CGDS/SUDENE:	José Farias, Leonardo Morais
	UPE	Bruno Carvalho

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto Início	Previsto Fim	Previsto Valor	Realizado Início	Realizado Fim	Realizado Valor	Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
1		**PLANEJAMENTO (Peso 20%)**								**20%**	**Concluído**		
1.1	**Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira**	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A depender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	11/12/2019	27/12/2019		11/12/2019	27/12/2019		100,0%	**Concluído**		
1.2	**Analise jurídica**	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	26/12/2019	27/12/2019		26/12/2019	27/12/2019		100,0%	**Concluído**		
1.3	**Elaboração do Termo de Convênio**	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	26/12/2019	30/12/2019		26/12/2019	30/121/2019		100,0%	**Concluído**		
1.4	**Assinatura do Convênio**	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	30/12/2019	30/12/2019		30/12/2019	30/12/2019		100,0%	**Concluído**		
1.5	**Publicação do Convênio**	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	17/01/2019	17/01/2019		17/01/2019	17/01/2019		100,0%	**Concluído**		
2		**EXECUÇÃO (Peso 60%)**								**14%**	**Em Andamento**		
2.1	**Liberação da parcela única de recursos**	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/12/2019	30/11/2021	R$ 649.777,57				0,0%	**A Iniciar**		
2.2	**META 1. Estruturação do Datacenter**	ETAPA 1.1. Aquisição dos equipamentos ETAPA 1.2. Instalações e testes	UPE	30/12/2019	30/06/2021		05/02/2020			40,0%	**Em Andamento**	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 5/2/2020. Diante da pandemia e da alta do dólar foram repactuados os prazos deste convênio	Foi refeita a lista dos equipamentos a ser adquiridos, sem perder o objeto e objetivo do convênio
2.3	**META 2. Estruturação dos Laboratórios**	ETAPA 2.1. Aquisição dos equipamentos ETAPA 2.2. Instalações e testes	UPE	01/07/2021	30/11/2021		05/02/2020			50,0%	**Em Andamento**	Divesas reuniões foram realizadas, sendo ultima reunião de acompanhamento: dia 28/08. Processo licitatório em fase final para lançamento da concorrência.	Envio de nova cotação, para início do processo licitatório. Cotação realizada. Processo licitatório a iniciar em outubro.
2.11	**1ª Prestação de contas parcial**	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	01/09/2021	30/09/2021					0,0%	**Atrasado**		
3		**PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)**								**0,0%**	**A Iniciar**		
3.1	**Prestação de contas final**	Envio da prestação de contas final pela convenente.		01/10/2021	30/10/2021					0,0%	**A Iniciar**		
3.2	**Elaboração de Relatório Final**	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	01/11/2021	30/11/2021					0,0%	**A Iniciar**		
3.3	**Análise da prestação de contas financeiras**	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	01/12/2021	15/12/2021					0,0%	**A Iniciar**		
					Valor Previsto:	R$ 649.777,57	**Valor realizado:**		R$ 0,00	34%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
Universidade de Pernambuco - UPE
Observações:
Processo SEI n.º 59336.003160/2019-80

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGDS/2020008**
Objetivo estratégico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2020**
		Processo (s) SEI:	

Programa do PPA:	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano (2217)	**Eixo temático (MDR):**	
Ação do PPA:	**8340 – Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação e 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas**	**Objetivo estratégico (MDR):**	0789 - Promover o desenvolvimento regional e o ordenamento do território brasileiro por meio do planejamento da ocupação e do uso do espaço de forma sustentável e com abordagem territorial.
Objetivo da ação:	Ampliar o fornecimento de tecnologias para integração produtiva, buscando a melhoria da produtividade e competitividade de empreendimentos agros de médio e pequeno porte		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	CODEM/CGDS/DPLAN
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Dificuldades de acesso a tecnologias por empreendimentos agros de médio e pequeno porte		
Projeto:	**Implantação de unidades piloto de aproveitamento bioenergético e fotovoltaico para apoio ao desenvolvimento de empreendimentos agroindustrial de médio e pequeno porte**		
Objetivo do projeto:	Implantar 6 (seis) unidades piloto de produção de biogás adaptadas para empreendimentos agroindustrial de médio e pequeno porte localizados nos estados da Paraíba, Pernambuco, Rio grande do Norte e Ceará para ampliar o fornecimento de tecnologias para integração produtiva.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.30.00.00	TED	R$550.000,00	R$550.000,00

Previsão de Conclusão:	12/22
Data Atualização:	30/09/21

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGDSDPLAN/SUDENE - Amauri Nascimento; Leonardo Morais / INSA: Mônica Tejo.

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	550.000,00
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício (1)	R$	-
Valor liberado no Exercício		
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	550.000,00

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		PLANEJAMENTO (Peso 30%)							-	**30%**	**Concluído**		
1.1	**Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira**	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	**15/12/20**	**23/12/20**		**15/12/20**	**23/12/20**		100,0%	**Concluído**		
1.2	**Analise jurídica**	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	**21/12/20**	**25/12/20**		**21/12/20**	**25/12/20**		100,0%	**Concluído**		
1.3	**Elaboração do Termo de Execução Descentralizada**	Elaboração da minuta do TED	INSA e COCIC/ SUDENE	**17/12/20**	**21/12/22**		**17/12/20**	**21/12/20**		100,0%	**Concluído**		
1.4	**Assinatura do Convênio**	Assinatura do Convênio	GABINETE / INSA	**23/12/20**	**23/12/23**		**23/12/20**	**23/12/20**		100,0%	**Concluído**		
1.5	**Publicação do Convênio**	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	**28/12/20**	**28/12/20**		**28/12/20**	**28/12/20**		100,0%	**Concluído**		
2		**EXECUÇÃO (Peso 60%)**								**12%**	**Em Andamento**		
2.1	**Liberação da parcela única de recursos**	Liberação da parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	**28/12/20**	**28/12/20**	R$ 550.000,00	**28/12/20**	**26/2/21**	R$ 550.000,00	100,0%	**Concluído**	Os recursos previstos, foram inicialmente liberados em 28/12/2020, entretanto, houve uma orientação do MCTIC para que acontecesse a devolução. Desta forma, os recursos foram definitivamente liberados em 26/02/2021.	
2.2	**META 1 – Implantar 2 (duas) unidades piloto de produção de biogás no primeiro semestre de 2021 na PB, em locais a serem definido pelo INSA**	Etapa 1.1 - Realizar a implantação de 2 (duas) unidades piloto de produção de biogás na PB ETAPA 1.2 - Avaliação trimestral da implantação das unidades	INSA	**01/01/21**	**31/12/22**					0,0%	**A Iniciar**	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto realizada em 27/05/2021	Aguardando entrega do relatório e ofício do parceiro indicando o responsável técnico. A previsão era de que fosse entregue 15 dias após a 1a reunião de acompanhamento Até o presente momento não foi recebido nenhum documento pela equipe técnica SUDENE. O processo passou pela Procuradoria e pela CGAF/COCF para tratar de questionamentos de mudança entre os códigos de natureza de despesa.
2.3	**META 2 – Implantar 2 (duas) unidades piloto de produção de biogás no primeiro semestre de 2021 em PE em locais a serem definido pelo INSA**	Etapa 2.1 - Realizar a implantação de 2 (duas) unidades piloto de produção de biogás em PE ETAPA 2.2 - Avaliação trimestral da implantação das unidades	INSA	**01/04/21**	**31/12/22**					0,0%	**A Iniciar**		
2.4	**META 3 – Implantar 1 (uma) unidades piloto de produção de biogás no primeiro semestre de 2021 no CE em local a ser definido pelo INSA**	Etapa 3.1 - Realizar a implantação de 1 (uma) unidade piloto de produção de biogás no CE ETAPA 3.2 - Avaliação trimestral da implantação da unidade	INSA	**01/09/21**	**31/12/22**					0,0%	**A Iniciar**		

3º ciclo 2021

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGDS/2020009**
		Ano:	**2020**
Objetivo estratégico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Processo (s) SEI:**	**59336.001156/2020-11)**

Programa:	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano (2217)	**Objetivo PPA 2020-2023:**	Estimular o desenvolvimento de territórios, cidades e regiões, ampliando a estruturação produtiva e urbana, e a provisão de serviços públicos para a redução das desigualdades socioeconômicas, em múltiplas escalas.
Ação:	Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação (8340) - Programa SUDENE: "Tecnologia e Inovação para Convivência no Semiárido - Reuso de águas cinzas"	**Objetivo estrátegico (MDR):**	Desenvolver a Capacidade Produtiva das Regiões
Finalidade da ação:	Desenvolvimento, incorporação e difusão de novas tecnologias, produtos e serviços, propiciando inserção no mercado e agregação de valor. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a viabilizar condições para implantar estruturas produtivas baseadas na inovação, informação e conhecimento.		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Escassez de água destinada a produção da agricultura familiar devido aos grandes períodos de seca, e a falta de projetos que visem a utilização de tecnologias sustentáveis para o reuso da água em sistemas produtivos no semiárido nordestino.		
Projeto:	**Implantação de sistemas de tratamento e reuso de águas cinzas domiciliares em atividades produtivas no semiárido piauiense.**		**(Convênio n.º 903159/2020. Processo SEI 59336.001156/2020-11)**
Objetivo do projeto:	Possibilitar as famílias beneficiadas, de comunidades quilombolas identificadas, utilizar o aproveitamento das águas cinza com a tecnologia implantada para o sistema de produção da agricultura familiar sustentável ampliando sua produtividade através de tecnologias e conhecimentos técnicos adquiridos.		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)**	**Valor Total do Projeto (R$ 1,00)**
				R$ 476.011,69	R$ 477.011,69

Previsão de Conclusão:	31/12/2023	**CONVÊNIO Nº 903159/2020 (Proposta: 009483/2020)**
Data Atualização:	30/9/2021	**Vigência: 28/12/2020 a 26/07/2023**

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE: **José Farias** e Juliana Borges Município São Raimundo Nonato: **André Santos Landim**

Cronograma de Desembolso			
MÊS	**CONCEDENTE**	**CONVENENTE**	**TOTAL**
dez/20	R$ 476.011,69	R$ 1.000,00	R$ 477.011,69
	R$476.011,69	**R$ 1.000,00**	**R$ 477.011,69**

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior		
A realizar no exercício RAP	R$	-
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	476.011,69
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	476.011,69
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício		

N.E.	**Nome da Etapa**	**Descrição das Atividades/ Etapas**	**Responsável**	**Previsto**			**Realizado**				**Status**	**Observação/Problemas**	**Providências**
				Início	**Fim**	**Valor**	**Início**	**Fim**	**Valor**	**Físico %**			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								**20,0%**	**Concluído**		
1	**Cadastramento e divulgação**	Cadastramento e divulgação do programa 5320320200007	CODEM/CGDS			-	03/06/2020	25/06/2020	-	100%	**Concluído**		
2	**Recebimento de propostas**	Recebimento de proposta	CODEM/CGDS			-	03/06/2020	05/07/2020	-	100%	**Concluído**		
3	**Análise da proposta e do plano de trabalho**	Análise da proposta	CODEM/CGDS			-	06/07/2020	24/07/2020	-	100%	**Concluído**		
4	**Análise complementar e emissão de parecer técnico final**	Emissão de parecer técnico final (analista)	CODEM/CGDS			-	01/08/2020	13/08/2020	-	100%	**Concluído**		
5	**Medidas adm. para celebração**	Medidas diversas/encaminhamentos: pré-convênio, empenho, minuta de convênio, análise jurídica, assinaturas	CGDS - CODEM - COCIC/ PRD/ GAB-SUDENE				12/08/2020	28/12/2020		100%	**Concluído**		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)		01/04/2021	31/12/2021					60%	A iniciar		

6	**Processo licitatório**	Procedimentos administrativos referentes à licitação	Munic.SRN-PI	01/03/2021	30/05/2021		24/08/2021			20%	**Em Andamento**	Definição de prazos e procedimentos para início do processo licitatório	Reunião realizada com a Prefeitura de SRN. Prazos iniciais decididos. Formato do processo licitório em proposta pela Prefeitura até o dia 30/04. Nova reunião realizada, oficio analisado, formato definido. Em 24/8/21, convenente informa que o edital para chamamento público foi publicado. Na Plataforma Mais Brasil, continua mensagem de impedimento para receber transferência (consulta em 21/10/2021)
7	**Análise e parecer de aceite da licitação**	Etapa prevista nos art. 41 e 42 da Portaria n.º 424/2016	CODEM/CGDS	a definir	a definir					0%	**A Iniciar**		
8	**Ajustes do cronograma físico e de desembolso**	Atualização/adequação do plano de trabalho	Munic.SRN-PI	04/05/2021	30/08/2021					0%	**Atrasado**		
9	**Ingresso de contrapartida**	Verificação da contrapartida	Munic.SRN-PI	a definir	a definir					0%	**A iniciar**		
10	**Liberação de Recursos**	Medidas para liberação dos recursos, conforme desembolso	CGDS/SUDENE	01/02/2021	a definir					0%	**A iniciar**		
11	Meta 1. **Divulgação e mobilização do projeto**	Divulgação e mobilização do projeto nas comunidades: Lagoa das Emas, Lagoa dos Moises, Lagoa dos Prazeres, Lagoa do Calango e Lagoa da Firmeza	Munic.SRN-PI	28/12/2020	01/02/2021					0%	**Atrasado**	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
12	**Acompanhamento da Meta 1**	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatorio parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	a definir	a definir					0%	**A iniciar**		
13	Meta 2. **Realização de 15 seminários no município de São Raimundo Nonato**	Realização de 15 seminários com o tema central: Reaproveitamento de águas no município	Munic.SRN-PI	01/02/2021	01/04/2021					0%	**Atrasado**	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
14	**Acompanhamento da Meta 2**	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatorio parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	a definir	a definir					0%	**A iniciar**		
15	Meta 3. **Realização de 15 oficinas voltadas à produção familiar**	Realização de 15 oficinas voltadas à produção familiar. Nº estimado de 100, por tema/grupo de 05.	Munic.SRN-PI	01/04/2021	01/06/2021					0%	**Atrasado**	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
16	**Acompanhamento da Meta 3**	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatorio parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	a definir	a definir					0%	**A iniciar**		
17	Meta 4. **Implantação de 28 Sistemas de Tratamento e Reuso de Águas Cinza**	Implantação de 02 unidades modelo do Sistema de Tratamento e Reuso de águas cinza; Contratação de empresa especializada; Implantação 26 unidades de Sistema.	Munic.SRN-PI	01/06/2021	01/06/2022					0%	**A Iniciar**	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
18	**Acompanhamento da Meta 4**	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatorio parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	a definir	a definir					0%	**A Iniciar**		
19	Meta 5. **Realização de 15 minicursos voltados a Agricultura Familiar**	Realização de 15 minicursos voltados a Agricultura Familiar. Nº estimado de beneficiários: 45, por curso.	Munic.SRN-PI	01/06/2021	01/12/2021					0%	**A Iniciar**	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
20	**Acompanhamento da Meta 5**	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatorio parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	a definir	a definir					0%	**A Iniciar**		
21	Meta 6. **Realização de 01 encontro municipal sobre o Sistema de Tratamento e Reuso de Águas Cinza**	Realização de uma reunião com o comitê de monitoramento e avaliação do projeto e líderes comunitários. Realização de um encontro municipal com os beneficiários do projeto e população em geral e comitê de monitoramento e avaliação do projeto	Munic.SRN-PI	01/06/2022	26/07/2022					0%	**A Iniciar**	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
22	**Acompanhamento da Meta 6**	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatorio parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	a definir	a definir					0%	**A iniciar**		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								**0,0%**	**A iniciar**		
23	**Análise da PTC, sob o aspecto físico, e**	Análise da prestação de contas, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo/Parecer Técnico.	CODEM/CGDS	25/09/2022	25/11/2022	-			-	0%	**A Iniciar**		
					Valor Previsto:	R$ 477.011,69		**Valor realizado:**		**20%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
Município de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí.
Observações:

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente).

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGDS/2020010**
		Ano:	**2020**
Objetivo estratégico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Processo (s) SEI:**	**59336.000878/2020-58**

Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	
Ação:	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	**Objetivo estratégico (MDR):**	
Finalidade da ação:	Formação de parcerias para capacitar recursos humanos (servidores) nos aspectos técnicos e gerenciais, administrativo-organizacionais e financeiro-fiscais, para identificação dos problemas locais e suas causas, propiciando o fortalecimento do planejamento e a democratização da gestão. Busca-se contribuir para a melhoria da capacidade de gestão do poder público local, mediante assistência técnica para o aperfeiçoamento dos recursos humanos, financeiros e organizacionais das prefeituras, em municípios selecionados.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulçao de Políticas	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	É ainda incipiente a incorporação da área de saúde digital na formação dos novos profissionais de saúde, principalmente no interior e nas áreas rurais, bem como para aqueles que já se encontram ativos ou que estão tentando ingressar no mercado de trabalho. É fundamental preparar os profissionais para enfrentar os novos desafios trazidos pela incorporação tecnológica em suas práticas clínicas e ações interventivas no território, criando condições para ampliar o acesso e a qualidade da assistência ao paciente no SUS.		
Projeto:	**Formação em Saúde Digital para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE)**		
Objetivo do projeto:	Capacitar ACS e ACE em saúde digital por meio da telessaúde na área da SUDENE, visando prepará-los para a transformação digital, e contribuir no desenvolvimento regional da cadeia produtiva da saúde com vistas a melhoria da qualidade e ampliação do acesso à assistência à saúde da população no SUS. Contribuir com o Programa de Melhoria da Saúde Pública do PRDNE, compreendido como vetor de desenvolvimento ancorado na PNDR.		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)**	**Valor Total do Projeto (R$ 1,00)**
	250532030	3	90	R$ 969.572,00	R$ 969.572,00

Cronograma de Desembolso			
MÊS	**CONCEDENTE**	**CONVENENTE**	**TOTAL**
dez/20	R$ 969.572,00		R$ 969.572,00
	R$ 969.572,00	**R$ 0,00**	**R$ 969.572,00**

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R$ 969.572,00
A realizar no exercício RAP	
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$ -
Valor Empenhado no Exercício	R$ -
Valor liberado no Exercício	R$ -
Saldo a liberar	R$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R$ -
Total Liberado até o exercício	R$ 969.572,00

Previsão de Conclusão:	13/05/2024	**TED n.º 10/2020**
Data Atualização:	30/09/2021	**Vigência até: 13/5/2023**

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Juliana Borges, Amauri Nascimento e Vera Assunção; coordenação CODEM/CGDS: Victor Uchôa / UFPE: Magdala Novaes (NUTES)

N.E.	**Nome da Etapa**	**Descrição das Atividades/ Etapas**	**Responsável**	**Previsto**			**Realizado**			**Físico %**	**Status**	**Observação/Problemas**	**Providências**
				Início	**Fim**	**Valor**	**Início**	**Fim**	**Valor**				
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								**20,00%**	**Concluído**		
1	**Proposição de apoio de projetos**	Articulação, realização de reuniões e elaboração de nota técnica para subsidiar a Diretoria para abertura de apoio de projetos nessa temática.	CGDS/SUDENE	01/09/2019	31/12/2019		01/09/2019	28/04/2020	-	100%	Concluído	Rota de TIC instalada em junho/2019 a partir de uma oficina de planejamento realizada na Sudene sob a coordenação do MDR. Em set/2019, como desdobramento do Polo Mangue Digital, foram realizadas reuniões na Sudene com o NUTES/UFPE. Foi elaborada Nota técnica º 162/2020 - SEI/SUDENE em conjunto com a CGCP em 13/11/2019 para subsidiar a Diretoria para abertura de projetos nessa temática.	
2	**Recebimento de proposta**	Recebimento de propostas	Nutes/UFPE	01/09/2019	31/12/2019		01/09/2019	28/04/2020	-	100%	Concluído	Proposta inicial do projeto foi apresentada pelo NUTES/UFPE à Sudene em set/2019. Em abril/2020, em decorrência da pandemia, o NUTES/UFPE reformulou o projeto a partir da análise técnica do Ministério da Saúde para apoio da Sudene com recursos da ação orçamentária Fortalecimentodas Adm. Locais (8917).	
3	**Análise da proposta**	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	01/09/2019	31/12/2019		02/06/2020	12/06/2020	-	100%	Concluído	análise do PT do projeto.	
4	**Complementação da proposta**	Complementação da proposta	CODEM/SUDENE	01/09/2019	31/12/2019		12/06/2020	27/07/2020	-	100%	Concluído	toda a área de atuação da Sudene; adequar a plataforma INDU do Nutes para uso do +Gestão Municipal em	
5	**Emissão de parecer técnico final**	Emissão de parecer técnico final (analista)	CODEM/SUDENE	01/09/2019	31/12/2019		27/07/2020	18/08/2020	-	100%	Concluído	ao novo Decreto n.º 10.426/2020 que regulamenta a parceria por meio de TED. Em 18/08/2020, CODEM emite parecer	
6	**Aprovaçao do parecer técnico**	Aprovaçao do parecer técnico (gestor)	CGDS/SUDENE	01/09/2019	31/12/2019		19/08/2020	21/08/2020	-	100%	Concluído	Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada em 21/8/2020 na 363ª Reunião Extraordinária.	
7	**Formalização do TED**	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGDS/SUDENE	01/09/2019	31/12/2019		20/08/2020	16/11/2020	-	100%	Concluído	Extrato publicado em 17/11/2020.	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								**15,00%**	**Em Andamento**		
8	**Descentralização de recursos**	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/11/2020	30/11/2020	R$ 969.572,00	18/11/2020	15/12/2020	R$ 969.572,00	100%	Concluído	O recurso foi descentralizado em 18/11/2020, porém, UG da unidade descentralizada do TED estava incorreta, bem como foi necessário ajustar o PT para adequar linha orçamentária. Após a realização dos ajustes, os recursos foram descentralizados em 15/12/2020.	
9	**Realização de proc. Licitatório**	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	Nutes/UFPE	01/12/2020	31/12/2020		16/11/2020	31/12/2020	--	100%	Concluído	Em 31/12/2020, UFPE publicou no DOU extrato de dispensa de licitação, com justificativa de menor preço ofertado, contratando a Fundação de Apoio da UFPE.	
10	**Reunião de planejamento**	Reunião de planejamento das etapas do projeto pelas equipes técnicas da Sudene e UFPE.	CODEM/SUDENE NUTES/UFPE	01/02/2021	15/3/2021		2/2/2021	3/3/2021		100%	Concluído	Em 3/3/2021, foi realizada a 1ª reunião técnica de acompanhamento, que entre outros pontos de pauta foram tratados a questão da abrangência do projeto e dos municípios alvo em alinhamento com a estratégia territorial do PRDNE (SUDENE), a necessidade de atualização dos prazos das etapas e o lançamento do projeto em um evento on line.	

11	**Reunião de abertura de projeto**	Evento para formalizar o início do projeto	CGDS/SUDENE NUTES/UFPE	01/03/2021	31/03/2021		3/3/2021	12/5/2021		100%	**Concluído**	Em 30/3/2021, em reunião com a Prof.ª Magdala para tratar do webinar sobre saúde digital, foi proposta a data para realização do evento de lançamento do projeto em meados de abril. Transmitido pela plataforma do Nutes/UFPE que está responsável pela produção da arte para divulgação. Os representantes das cidades intermediadoras da área de atuação da Sudene, como também gestores de saúde dos municípios que serão contemplados com o projeto serão convidados. Será avaliada a possibilidade de participação do Ministério da Saúde como convidado do evento. **O evento de lançamento foi realizado em 12/05/2021**	
12	**META 1 - Desenvolver uma estratégia de Capacitação sobre as práticas de saúde digital para ACS e ACE.**	Etapa 1.1: Elaborar o Plano de Ação Pedagógica (PAP)	Nutes/UFPE	01/01/2021	30/04/2021		1/3/2021	--	--	80%	**Em Andamento**	29/6, às 16h, (terça-feira), foi realizada a 2ª reunião de monitoramento do projeto Agente Digital com a equipe técnica de ambos os parceiros. Foram apresentadas as questões limitantes e os avanços realizados até aquela data.	
13		Etapa 1.2: Identificar a capacidade instalada de núcleos e unidades de saúde digital no contexto dos serviços públicos de saúde	Nutes/UFPE	01/01/2021	31/05/2021		1/3/2021	--	--	60%	**Em Andamento**	A identificação dos núcleos de telessaúde da área de atuação da Sudene está em andamento. Conforme 3ª reunião de monitoramento, trará um diagnóstico inicial importante para o desenvolvimento de outras ações.	
14		Etapa 1.3: Modernizar a plataforma de tele-educação INDU para contemplar o Programa +Gestão Municipal e implementação do Curso de Formação em Saúde Digital para ACS/ACE com 40h.	Nutes/UFPE	01/03/2021	30/06/2022		1/3/2021	--	--	80%	**Em Andamento**	A modernização da plataforma Indu está em fase avançada, para início, no 2º semestre de 2021, da 1ª turma do curso que contemplará os estados de PE e PB, programada/reformulada para 03/11/2021	
15	**Acompanhamento Técnico**	Reuniões de acompanamento técnico e análise de relatórios gerenciais serão realizados ao longo do projeto.	CODEM/SUDENE	_	_		1/6/2021	30/9/2021	--	70%	**Em Andamento**	A 3ª reunião de monitoramento foi realizada em 24/9/2021. Foi informado sobre o andamento do processo de inscrição da 1ª turma concluída em 30/9/21.	De acordo com o NUTES/UFPE, na 3ª reunião de Monitoramento e Avaliação, em 24/09/2021, a execução da Meta1, alcançou um percentual de 75%; e um percentual geral de execução do projeto de 43,5%, até aquela data.
16	**META 2 - Ofertar a capacitação para 2000 ACS e ACE na plataforma INDU com tutoria por 3 (três) meses após realização do curso.**	Etapa 2.1: Capacitar os ACS/ACES com tutoria por 3 (três) meses após realização do curso.	Nutes/UFPE	01/05/2021	31/12/2022	--	30/09/2021	--	--	10%	**Em Andamento**	Incrição da primeira turma concluída,até 30/09/2021,e curso programado para início em 03/11/2021.	
17		Etapa 2.2: Realizar estudos, monitorar e avaliar e estratégia de capacitação implementada, visando aperfeiçoar e ampliar a oferta para outros profissionais de nível médio e de nível superior, e disseminar o conhecimento da estratégia de capacitação implementada.	Nutes/UFPE	01/04/2021	13/05/2023	--	--	--	--	0%	**A Iniciar**		
18	**Acompanhamento Técnico**	Reunião de avaliação do projeto	CODEM/SUDENE NUTES/UFPE	_	_	_	_	_	_	0%	**A Iniciar**		De acordo com o NUTERS/UFPE, na 3ª reunião de Monitoramento e Avaliação, em 24/09/2021, a execução da Meta2, alcançou um de cerca de 30% e um percentual geral de execução de 43,5%, até aquela data. Quanto aos cursos, foi estimado um atraso de dois meses, em razão da complexidade do processo, ações de sensibilização, inscrições, validação das inscrições. Conforme reformulação, T1: 03/11/2021; T2: 29/11/2021; T3: 18/02/2022 e T4: 08/03/2022.
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								**0,00%**	**A iniciar**		
19	**Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.**	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação.	CODEM/SUDENE	13/05/2023	13/05/2024	-			-	0%	**A iniciar**		
					Valor Previsto:	R$ 969.572,00		**Valor realizado:**	R$ 969.572,00	**35%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

institucionais:
UFPE/NUTES - Núcleo de Telessaúde da UFPE
Observações:
As articulações para formatação e viabilização de proposta com foco em saúde digital foram iniciadas no ano de 2019, porém, só começaram a se materializar, chegando à formalização desta, em 2020, como demonstrado nas etapas elencadas na "Iniciação". **23/12/2020 - Sudene divulga em seu sítio institucional a parceria com o NUTES/UFPE para realização do projeto.**

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGDS/2020011**
		Ano:	**2020**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Processo (s) SEI:**	**59336.002257/2020-17**

Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	-
Ação:	**214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional**	**Objetivo estrátegico (MDR):**	-
Finalidade da ação:	desenvolvimento e a difusão de novas tecnologias, estudos e projetos técnicos, promoção de capacitações, formação de multiplicadores, intercâmbio de produtores, instalação de unidades demonstrativas, eventos técnicos e de comercialização, e fomento ao associativismo e cooperativismo como opção de organização social e produtiva.		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	A carência de mão de obra é sistemática em vários setores da área de TIC, sendo necessário o investimento em cursos de formação e capacitação em tecnologias emergentes. O estudo e entendimento do processo de digitalizacao da economia e seus impactos na industria 4.0 torna-se fundamental para entender estes impactos, havendo carencia destes curses em Pernambuco e no Nordeste.		
Projeto:	**Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas do Nordeste atraves da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação-NE 4.0**		
Objetivo do projeto:	Formar residentes para atuarem em processos de digitalizacao da industria após a formação baseada em conteúdos específicos apresentados pela Universidade de Pernambuco e Universidades do Nordeste parceiras do projeto e construcao de planos de acao pratica em 40 industrias de setores diversos		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)**	**Valor Total do Projeto (R$ 1,00)**
	-	-	-	R$ 1.264.680,00	1.265.980,00

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R$ -
A realizar no exercício	R$ 1.264.680,00
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R$ -
Valor liberado no Exercício	R$ -
Saldo a liberar	R$ 1.264.680,00
Saldo a Empenhar no exercício	R$ -
Total Liberado até o exercício	R$ -

Previsão de Conclusão:	30/06/2022
Data Atualização:	30/09/2021

Convênio SICONV 907660/2020
Vigência 30/11/2022

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto		
	CGDS/SUDENE:	José Farias, Juliana Borges
	UPE	Prof. Djalma Guimarães, Prof. Alexandre Maciel

		Descrição das Atividades/ Etapas	**Responsável**	**Previsto**			**Realizado**				**Status**	**Observação/Problemas**	**Ações Corretivas**
				Início	**Fim**	**Valor**	**Início**	**Fim**	**Valor**	**Físico %**			
1		**PLANEJAMENTO (Peso 20%)**								**20%**	**Concluído**		
1.1	**Recebimento e análise**	Recebimento da proposta e análise das	CGDS	01/12/2020	30/12/2020		01/12/2020	30/12/2020		100,00%	**Concluído**		
1.2	**Analise jurídica**	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	21/12/2020	29/12/2020		21/12/2020	29/12/2020		100,00%	**Concluído**		
1.3	**Elaboração do Termo de**	Elaboração do minuta do Termo de	CCONT	26/12/2020	30/12/2020		26/12/2020	30/12/2020		100,00%	**Concluído**		
1.4	**Assinatura do Convênio**	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	30/12/2020	30/12/2020		30/12/2020	30/12/2020		100,00%	**Concluído**		
1.5	**Publicação do Convênio**	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	02/01/2020	17/01/2020		02/01/2020	17/01/2020		100,00%	**Concluído**		
2		**EXECUÇÃO (Peso 70%)**								8%	**Em Andamento**		
2.1	**Liberação da primeira parcela de recursos**	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/12/2020	31/12/2020	**1.264.680,00**				0,00%	**Atrasado**		Analise de ofício enviado pela UPE para ajustes no cronograma e valor das parcelas

2.2	**Meta 1: Lançamento do projeto, Mobilizacao de empresas e parceiros e diagnóstico/aplicacao da metodologia NE 4.0**	Serao identificadas as empresas parceiras e participantes do projeto, escolha dos alunos e gestores a ser capacitados e incio do estudo e aplicacao da metodologia	UPE e universidades da Paraíba, Ceará, RGN, Alagoas e Sergipe parceiras do projeto	01/02/2021	30/07/2021		01/02/2021	--		70,00%	**Em Andamento**	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 1/2/2021. Lançamento do projeto programado para 17/02/2021. Reuniões quinzenais com os coordenadores de cada pólo e com o coordenador geral do programa,	Equipe de Coordenadores dos Núcleos Estaduais montada. Identificação de empresas participantes em andamento e em processo de realização da adesão ao programa. Ajustes no termo de referencia, diante da continuidade da pandemia e no processo de adesão ao programa. Parte da Meta 1 ajustada, evento será ao final da capacitação. Diagnóstico programado para iniciar em setembro/outubro. Aulas programadas para novembro/dezembro 2021.
2.3	**Meta 2: Capacitação de Residentes e Gestores**	o Programa de Residência será desenvolvido pelo IIT e contará com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada e universidades federais no Nordeste. Terão 4 núcleos, um em Pernambuco, outro no RGN, outro no Ceará e outro em Sergipe, aulas à distância e presenciais (quando as condições da pandemia permitirem). O programa terá duração de 18 meses, com 12 módulos de 30hs, em cada um dos núcleos atividades acadêmicas, gerenciadas pelo IIT, e atividades de desenvolvimento, gerenciadas em conjunto com as instituições parceiras, com foco em projetos reais apresentados pelas empresas.	UPE	01/10/2021	30/06/2022		--	--		0,00%	**A Iniciar**	Grade finalizada. Inicio das construção do edital de seleção dos alunos; Seleção a se iniciar em agosto. Aulas programadas para inicio em novembro/dezembro de 2021. Convênio prorrogado para final de 2022.	
2.4	**Meta 3: Elaboração de planos de ação**	Realização dos projetos/planos de ação em industria 4.0, como resultado da Residencia, em cada uma das 40 empresas parcipantes	UPE e universidades da Paraíba, Ceará, RGN, Alagoas e Sergipe parceiras do projeto	01/05/2022	30/06/2022					0,00%	**A Iniciar**		
2.5	**1ª Prestação de contas parcial**	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	01/01/2022	28/02/2022					0,00%	**A Iniciar**		
3		**PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 10%)**								**0,00%**	**A Iniciar**		
3.1	**Prestação de contas final**	Envio da prestação de contas final pela convenente.	UPE	01/07/2022	15/08/2022					0,00%	**A Iniciar**		
3.2	**Elaboração de Relatório Final**	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	16/08/2022	30/09/2022					0,00%	**A Iniciar**		
3.3	**Análise da prestação de contas financeiras**	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	01/10/2022	30/10/2022					0,00%	**A Iniciar**		
				Valor Previsto:		R$ 1.264.680,00	**Valor realizado:**		R$ 0,00	28%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
Universidade de Pernambuco - UPE
Observações:
Processo SEI n.º 59336.002257/2020-17

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGDS/2020012**
		Ano:	**2020**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Processo (s) SEI:**	**59336.000769/2020-31**

Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	-
Ação:	**214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional**	**Objetivo estrátegico (MDR):**	-
Finalidade da ação:	Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas, rurais e urbanas, por meio da resolução de gargalos em todos os elos da cadeia produtiva,		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Necessidade de melhoria da qualidade do rebanho da ovinocaprinocultura nos polos do Nordeste e da assistência técnica mais próxima e adequada às necessidades dos produtores rurais		
Projeto:	**Fortalecimento da rede de inovação de polos da Rota do Cordeiro no Nordeste brasileiro por meio da inovação tecnológica**		
Objetivo do projeto:	Instalar um núcleo avançado da Embrapa Caprinos e Ovinos no estado da Bahia, e associar esforços entre a Embrapa e a Sudene para introduzir conhecimentos, tecnologias e serviços para superar os principais gargalos tecnológicos da produção de caprinos e ovinos para o fortalecimento dos polos do Rota do Cordeiro no Nordeste.		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)**	**Valor Total do Projeto (R$ 1,00)**
	-	-	-	426.466,90	426.466,90

Previsão de Conclusão:	30/12/2021
Data Atualização:	30/09/2021

TED processo 59336.000769/2020-31

Vigência: 30/11/2021

Valores Orçamentários/ Financeiros	
Pago até o ano anterior	R$ 426.466,90
A realizar no exercício	R$ -
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$ -
Valor Empenhado no Exercício (1)	R$ -
Valor liberado no Exercício	R$ 0
Saldo a liberar	R$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R$ -
Total Liberado até o exercício	R$ 426.466,90

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto		
	CGDS/SUDENE:	Mauro Póvoas, Mauro Bezerra, Amauri Nascimento.
	Embrapa	Marco Bonfim

		Descrição das Atividades/ Etapas	**Responsável**	**Previsto**			**Realizado**				**Status**	**Observação/Problemas**	**Ações Corretivas**
				Início	**Fim**	**Valor**	**Início**	**Fim**	**Valor**	**Físico %**			
1		**PLANEJAMENTO (Peso 20%)**								**20%**	**Concluído**		
1.1	**Construção do Plano de Trabalho**	Construção do Plano de Trabalho em conjunto com a Embrapa	CGDS	19/05/2020	31/7/2020		19/05/2020	22/6/2020		100,00%	**Concluído**		
1.2	**Analise jurídica**	Análise e parecer juridico	PROCURADORIA	01/07/2020	30/9/2020		01/07/2020	02/09/2020		100,00%	**Concluído**		
1.3	**Elaboração do Plano de Trabalho**	Elaboração do minuta do Plano de Trabalho	CCONT	29/06/2020	29/7/2020		29/06/2020	23/7/2020		100,00%	**Concluído**		
1.4	**Assinatura do TED**	Assinatura	GABINETE / Embrapa	5/19/2020	10/30/2020		05/09/2020	10/20/2020		100,00%	**Concluído**		
2		**EXECUÇÃO (Peso 60%)**								**13%**			
2.1	**Liberação da parcela única de recursos**	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/12/2020	31/12/2020	R$ 426.466,90	25/11/2020	30/12/2020	R$ 426.466,90	100,00%	**Concluído**		
2.2	**META 1. Aquisição de reagentes e serviços de assessoramento nutricional**	Aquisição de diversos reagentes e equipamentos para melhoria da qualidade da produção dos polos Vale do Itaim-PI, Vale do Jacuípe-BA, e do Cariri Paraibano, que fazem parte da Rota do Cordeiro	Embrapa	01/11/2020	30/06/2021		05/02/2020			10,00%	**Atrasado**	Reunião de Acompanhamento realizada em 09/06/2021.	A Sudene solicitou o relatório de acompanhamento a Embrapa Caprinos e Ovinos. Até o encerramento deste ciclo, não foi apresentado o relatório.
2.3	**META 2. Análises e Licenciamentos**	Aquisição de equipamentos e contratação de estagiáriospara melhoria da qualidade da	Embrapa	01/07/2021	30/08/2021					0,00%	**Atrasado**		
2.4	**Meta 3 Capacitações**	Treinamento para uso das tecnologias	Embrapa	01/06/2021	30/09/2022					0,00%	A Iniciar		
2.5	**Meta 4. Apoio a Polos**	Visitas técnicas para acompanhamento dos resultados e disseminação dos resultados	Embrapa e Sudene	01/06/2021	30/12/2021					0,00%	A Iniciar		

3		**PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)**								**0,00%**	**A Iniciar**		
3.1	**Prestação de contas final**	Envio da prestação de contas final pela convenente.		01/10/2022	30/10/2022					0,00%	**A Iniciar**		
3.2	**Elaboração de Relatório Final**	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	01/11/2022	15/11/2022					0,00%	**A Iniciar**		
3.3	**Análise da prestação de contas financeiras**	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	16/11/2022	30/11/2022					0,00%	**A Iniciar**		
				Valor Previsto:		R$ 426.466,90	**Valor realizado:**		426.466,90	33%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	Por meio da apresentação deste projeto realizada no Agrinordeste, pode se constatar que este projeto está em andamento. Entretanto, como o relatório de acompanhamento, apesar de solicitado, não foi apresentado, não foi possível mensurar a execução das Metas indicadas acima, sendo portanto indicadas como atrasadas.

Parceiros institucionais:
Embrapa Ovino e Caprinos
Observações:
Processo SEI n.º 59336.000769/2020-31

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGDS/2020013**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2020**
		Processo (s) SEI:	**59336.001673/2020-90**

Programa do PPA:	Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano (2217)	**Eixo temático (MDR):**	
Ação do PPA:	**8340 – Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação e 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas**	**Objetivo estrátegico (MDR):**	
Objetivo da ação:	Desenvolvimento, incorporação e difusão de novas tecnologias, produtos e serviços, propiciando inserção no mercado e agregação de valor. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a viabilizar condições para implantar estruturas produtivas baseadas na inovação, informação e conhecimento.		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	CODEM/CGDS/DPLAN
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra CGDS/DPLAN
Problema (causa):	A agricultura familiar está sendo impactada pela pandemia do Covid-19. O desconhecimento de técnicas e ferramentas por grande parte dos produtores rurais evidencia a inexistência do papel de empreendedor que agrega valor aos seus produtos e impulsiona seu negócio		
Projeto:	**PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E ACELERAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS RURAIS NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO PÓS PANDEMIA DE COVID-19**		
Objetivo do projeto:	Fortalecer empreendimentos rurais do Semiárido e minimizar os impactos da pandemia por meio de parcerias estratégicas com aplicação de metodologias, ferramentas e formação empreendedora, tendo o propósito de conceder acesso ao conhecimento teórico e prático, promovendo a sustentabilidade econômica e social no Semiárido. Espera-se ainda, oferecer aos empreendimentos diferenciais competitivos que proporcione a estes, melhor posicionamento frente ao seu mercado.		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto**	**Valor Total do Projeto**
	250	3.3.30.00.00	TED 11/2020	R$465.839,00	R$465.839,00

Previsão de Conclusão:	30/04/2022
Data Atualização:	**30/09/21**

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CGDSDPLAN/SUDENE - Vera Lúcia Assunção, Amauri Nascimento/ INSA: Mônica Tejo.

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício (1)	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	465.839,00
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	465.839,00

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		PLANEJAMENTO (Peso 30%)							-	**30%**	**Concluído**		
1.1	**Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira**	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	**15/10/2020**	**24/11/2020**		**15/10/2020**	**24/11/2020**		100,0%	**Concluído**		
1.2	**Analise jurídica**	Análise e parecer juridico	PROCURADORIA	**19/11/2020**	**19/11/2020**		**19/11/2020**	**19/11/2020**		100,0%	**Concluído**		
1.3	**Elaboração do Termo de Execução Descentralizada**	Elaboração da minuta do TED	INSA e COCIC/ SUDENE	**26/11/2020**	**26/11/2020**		**26/11/2020**	**26/11/2020**		100,0%	**Concluído**		
1.4	**Assinatura do TED**	Celebração do TED	GABINETE / INSA	**26/11/2020**	**26/11/2020**		**26/11/2020**	**26/11/2020**		100,0%	**Concluído**		
1.5	**Publicação do TED**	Publicação do extrato do TED celebrado	GABINETE	**30/11/2020**	**30/11/2020**		**30/11/2020**	**30/11/2020**		100,0%	**Concluído**		
2		**EXECUÇÃO (Peso 60%)**								**33%**	**Em Andamento**		
2.1	**Descentralização dos créditos**	Transferencia de creditos orçamentários e desembolso financeiros do total de recursos pactuados	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	**30/11/2020**	**30/11/2020**	R$ 465.839,00	**30/11/2020**	**10/02/2021***	R$ 465.839,00	100,0%	**Concluído**	* De acordo com mensagem Siafi (2021/0090208,de 02/02/2021) o INSA solicita a SUDENE o reenvio do financeiro (total), devolvido a SUDENE ainda em 2020, por meio do documento 533014/2020PF000053, para atender TED 11/2020. Solicitação autorizada pelo Superintendente. Reenvio, conforme programação financeira ocorrida em 10/02/2021.	

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGEP/2019001 (ex PO 13)**
Objetivo estratégico:	**1.5 - Fortalecer as administrações públicas.**	**Ano:**	**2019**
Programa do PPA:	-	**Eixo temático (MDR):**	-
Ação do PPA:	-	**Objetivo estratégico (MDR):**	-
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Falta de avaliação sobre qualidade dos gastos dos municípios na área de atuação da Sudene		
Projeto:	Avaliação Qualidade dos Gastos Municipais (gestão fiscal)		
Objetivo do projeto:	Elaboração de índice sobre gestão fiscal dos Municípios da área de atuação da Sudene		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-	-

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

Previsão de Conclusão:	30/09/2021
Data Atualização:	30/09/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória Sistêlos

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	**Dados**		José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	**01/10/2019**	**31/01/2020**	**-**	**01/10/2019**	**31/01/2020**		**100%**	**Concluído**	**O estudo está sendo realizado para os estados da área de atuação da Sudene.**	
1.1	Identificação do estado do projeto	Identificação dos estados e indicadores para conclusão do projeto	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	01/10/2019	31/10/2019	-	01/10/2019	31/10/2019		100%	**Concluído**		
1.2	Levantamento de dados	Levantamento de dados municipais por Estado	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	31/10/2019	30/11/2019	-	31/10/2019	30/11/2019		100%	**Concluído**		
1.3	Validação dos dados	Verificar a consistência dos dados	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	30/11/2019	31/01/2020		30/11/2019	31/01/2020		100%	**Concluído**		
2.	**Análise**		José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	**31/01/2020**	**01/04/2020**	**-**	**31/01/2020**	**22/05/2020**		**100%**	**Concluído**		
2.1	Padronização dos dados	Normalização dos indicadores selecionados para escala de referência	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	31/01/2020	28/02/2020	-	31/01/2020	28/02/2020		100%	**Concluído**		
2.2	Elaboração de índice	Elaboração de índice sintético composto por indicadores selecionados	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	28/02/2020	13/04/2020	-	28/02/2020	22/05/2020		100%	**Concluído**		
2.3	Validação final do índice	Consolidar rotinas de verificação e correção de erros	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	13/04/2020	03/05/2020		13/04/2020	22/05/2020		100%	**Concluído**		
3.	**Ranking de gestão fiscal**		José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	**03/05/2020**	**30/09/2021**	**-**	**12/05/2020**	**24/09/2021**		**100%**	**Concluído**		
3.1	Ranking de municípios	Elaborar ranking de municípios de acordo com resultado dos indicadores	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	03/05/2020	17/06/2020	-	12/05/2020				**Cancelado**	Conforme determinação da 363ª Reunião de Diretoria Colegiada, houve análise da metodologia e dos objetivos para esta atividade. Considerando o retorno dos Tribunais de Conta dos Estados, identificou-se a inviabilidade de continuidade contemplando esse aspecto, de tal forma que garanta a disponibilização de informações recentes.	O Projeto prosseguirá com outra metodologia, para os 11 estados, adotando a metodologia do Índice elaborado pelo CFA, o qual contempla indicadores utilizados no Ranking.
3.2	Tratativas CFA para IGM - Sudene	Participação na elaboração do ACT com CFA e definição dos recortes e detalhamento do índice para área de atuação da Sudene.	Gabriela Nascimento, Maria da Glória, Tássia Germano e Marina Rogério.	01/07/2020	30/10/2020	-	01/07/2020	30/10/2020		100%	**Concluído**	Considerando a adoção do novo índice (IGM/CFA) foram incluídas as etapas para conclusão do projeto.	
3.3	Tratativas Publicização do Ranking IGM-CFA	Tratativas para publicização do ranking IGM CFA para os estados da área de atuação da Sudene	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento, Tássia Germano e Maria da Glória	01/11/2020	31/12/2020		01/11/2020	18/12/2020		100%	**Concluído**		

3.4	Relatório de análise	Elaborar relatório final	José Luis Alonso, Gabriela Nascimento e Maria da Glória	17/06/2020	30/09/2021	-	11/08/2020	24/09/2021		100%	**Concluído**	Solicitação de postergação do prazo devido as novas determinações da Diretoria Colegiada a respeito do projeto e à priorização do processo 59336.000790/2020-36 (Pesquisa Impacto da Covid-19), do processo 59336.000658/2020-24 (Avaliação dos Incentivos Fiscais) e do processo 59336.001165/2020-10 (avaliação do FNE). Novo prazo acordado: 30/03/2021. O relatório final corresponde ao documento SEI 0276523 e contém o histórico do que ocorreu com o projeto e as colegiadas que aprovaram a mudança de ciclos para a conclusão.	
				Valor Previsto:		R$ -	**Valor realizado:**			R$ -	100%	**Concluído**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

CFA - Conselho Federal de Administração

Observações:

Trata-se de um projeto de continuidade do ciclo anterior, conforme Processo SEI 59336.002609/2019-92

Do total de 11 Estados, 5 foram integralmente conclusos, dos quais 4 foram divulgados e receberam premiação (ciclo 2018/2019) e 1 concluído no ciclo 2019/2020, com resultado a ser divulgado (aguardo fim do defeso eleitoral). Os demais (6 Estados) tiveram índice concluídos, entretando a situação de regularidade das Contas não foram realizadas devido à não resposta dos Tribunais de Contas Estaduais. Devido a inviabilidade da continuidade da ranking considerando a verificação junto aos TCE e por determinação da 363ª Reunião da Diretoria Colegiada, prosseguiu-se com nova metodologia com uso do IGM/CFA. O mesmo apresenta um hall mais amplo de indicadores, considerando diversas dimensões e painel dinâmico.

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos**	**Número do Projeto:**	**PO CGEP/2019002 (ex PO 14)**
Objetivo estratégico:	**2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o Semiárido**	**Ano:**	**2019**
Programa do PPA:	-	**Eixo temático (MDR):**	
Ação do PPA:	-	**Objetivo estratégico (MDR):**	
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Demanda do setor produtivo de palma por colheita mecanizada, a qual diminuirá os custos e aumentará o rendimento da produção		
Projeto:	Desenvolvimento de Máquina Colheitadeira de Palma		
Objetivo do projeto:	Articular atores públicos e privados dos setores produtivos da palma e do setor de mecanização agrícola, para formatar um projeto de construção de uma máquina colheitadeira de palma		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	29/05/2022
Data Atualização:	30/09/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Aildo Sabino; Joyce Silva; Marcelo Saiki

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	**Planejamento**									**100%**	**Concluído**		
1.1	**Reuniões internas para alinhamento do tema**	Reuniões entre técnicos e gestores da Sudene para realizar discussões sobre a demanda pela colheita mecanizada de palma e definir as estratégias para resolução desse gargalo	CGEP / CGDS	01/03/2019	31/03/2019	-	01/03/2019	31/03/2019	-	100%	**Concluído**		
2	**Articulação**									**100%**	**Concluído**		
2.1	**1ª Reunião de Articulação Sudene / Cimatec-BA**	Reunião entre equipe técnica Sudene e SENAI/CIMATEC-BA, para apresentação de proposta de projeto para construção de protótipo de máquina colheitadeira de palma	Ademir Vilaça	15/04/2019	15/04/2019	-	15/04/2019	15/04/2019	-	100%	**Concluído**	Primeiro contato feito entre Sudene e SENAI/CIMATEC-BA para formatação de um projeto para a máquina colheitadeira de palma	
2.2	**2ª Reunião de Articulação - Sudene / Cimatec-BA**	Reunião entre equipe técnica Sudene e SENAI/CIMATEC-BA para apresentação de projeto com orçamento	Aildo Sabino / Robson Brandão	15/08/2019	15/08/2019	-	15/08/2019	15/08/2019	-	100%	**Concluído**	Apresentação de proposta de colheitadeira de palma feita pelo Cimatec-BA (Sr. Diogo Poltronieri)	Levantamento de potenciais fabricantes para a máquina, além de possíveis patrocinadores (Embrapii)
2.3	**Reunião de articulação entre Sudene e Embrapii**	Reunião entre equipe técnica Sudene e Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial)	Aildo Sabino / Robson Brandão	16/10/2019	16/10/2019	-	16/10/2019	16/10/2019		100%	**Concluído**	Articulação entre Sudene e Embrapii, que poderá participar como copatrocinadora do projeto da máquina	Verificação junto à Procuradoria da Sudene quanto ao instrumento adequado para arranjo institucional entre Sudene e Embrapii
2.4	**Levantamento de outros possíveis parceiros institucionais**	Realização de buscas por outros parceiros institucionais ligados à mecanização agrícola interessados em fomentar o projeto da máquina	Aildo / Joyce / Marcelo Saiki	16/10/2019	01/11/2019		16/10/2019	01/11/2019		100%	**Concluído**	Realizados contatos com ABIMAQ, SESI/CNI, INSA, UFPE, EMBRAPA	
2.5	**Levantamento de indústrias com potencial de fabricar a máquina**	Busca e seleção de empresas privadas do setor de mecanização agrícola com potencial para fabricação da colheitadeira de palma	Joyce / Aildo	01/11/2019	31/11/2019		01/11/2019	31/11/2019		100%	**Concluído**		
3	**Planejamento de Evento (Reunião Técnica - TECHPALMA)**									**100%**	**Concluído**		

3.1	**Elaboração de Nota Técnica para Superintendente da Sudene**	Nota técnica com as justificativas para realização de evento na sede da Sudene, voltado para apresentar proposta de projeto de fabricação da colheitadeira para empresários com potencial de fabricação da máquina	Marcelo Saiki / Aildo	01/11/2019	05/11/2019		01/11/2019	05/11/2019		100%	**Concluído**		
3.2	**Programação do evento e elaboração de lista de convidados**	Definição de data prevista para o evento, programação de apresentações, elaboração de lista de convidados	Aildo / Joyce / Marcelo Saiki	01/11/2019	30/11/2019		01/11/2019	30/12/2019		100%	**Concluído**	A lista de convidados foi elaborada com base em contatos feitos com Abimaq e em pesquisas realizadas pela equipe ténica da CGEP	
3.3	**Elaboração de Convite**	Elaboração de arte do convite para o evento TechPalma	ASCOM	06/11/2019	30/11/2019		06/11/2019	18/12/2019		100%	**Concluído**		
3.4	**Envio dos Convites**	Envio dos convites para a lista de potenciais participantes do evento	CGEP / GABINETE	23/12/2019	30/12/2019		23/12/2019	23/12/2019		100%	**Concluído**		
3.5	**Confirmação dos participantes**	Entrar em contato com os convidados para confirmar sua presença	CGEP	22/01/2020	29/01/2020		06/01/2020	31/01/2020		100%	**Concluído**		
3.6	**Realização do Evento (TECHPALMA)**	Realização do evento Techpalma, na sede da Sudene	CGEP / ASCOM	05/02/2020	05/02/2020		05/02/2020	05/02/2020		100%	**Concluído**		
3.7	**Relatório final do Evento**	Elaboração de relatório sobre o evento Techpalma e dos encaminhamentos	Aildo / Joyce / Marcelo Saiki	06/02/2020	12/02/2020		06/02/2020	12/02/2020		100%	**Concluído**		
4	**Acompanhamento**									**80%**	**Em Andamento**		
4.1	**Formalização de Projeto para construção da máquina**	A depender das tratativas entre os partícipes, a Sudene poderá ser copatrocinadora do projeto ou realizará o acompanhamento do seu desenvolvimento junto aos atores envolvidos	CGEP	01/03/2020	01/05/2020		01/03/2020	23/08/2020		100%	**Concluído**	Durante o evento TechPalma foi idetificado a necessidade de um segundo momento para aprofundar as tratativas entre o cimatec e as Empresas. Assim, foi agendado um workshop para os dia 01 e 02 de abril de 2020, na sede do Cimatec em Salvador-BA. Por conta da pandemia, não foi possível a realização deste Workshop na sede do Cimatec. Ele foi realizado por vídeoconferência em 23/08/2020. Percebeu-se que não havia a necessidade de a Sudene financianciar o projeto. Por isto, a etapa de formalização foi dada como concçuída, uma vez que as empresas estão desenvolvendo a colheidora com meios próprios. De forma complementar, a Sudene juntamente com o INSA elaboraram um documento com as referencias culturais para o desenvolvimento da colhedora;	
4.2	**Acompanhamento da execução do projeto**	Acompanhamento do desenvolvimento por parte das empresas interessadas	CGEP	01/05/2020	31/12/2021		23/08/2020			60%	**Em Andamento**	Existem duas empresas desenvolvendo a colheitadeira, a Casale e a Laboremos; Já tivemos reuniões com as duas empresas. Ficou acertado com a Casale a realização de reuniões trimestrais de acompanhamento. Estamos formatando um projeto com o INSA para a avaliação do impacto da colheita mecanizada na cultura da palma. A Casale deverá lancar o equipamento ainda em 2021; PO reprogramado para 2021; Houve duas reuniões com a empresa Laboremos, em 01/06/21 e 08/06/21, nas quais a empresa apresentou o andamento do desenolvimento da plataforma de testes. A próxima etapa consistirá na apresentação de um protótipo e a busca por possíveis parcerias. A Coordenação da COTI não avançou com as tratativas para formatar um projeto com o INSA para a avaliação do impacto da colheita mecanizada na cultura da palma devido a falta de recursos; A Laboremos divulgou vídeo institucional com os textes do prototipo da colheitadeira; A Sudene participou do Palma Tech, oganizado pela Epamig, no sia 22 /09/21; A Casale pretente concluir o projeto do protótipo e construção de modelos para teste e validação de sistemas funcionais do equipamento em 2021;	

5	**Avaliação**									**0%**	**A iniciar**		
5.1	**Avaliação dos resultados do projeto**	Balanço das atividades desenvolvidas no projeto e avaliação do resultado final (produto)	CGEP	01/10/2021	30/03/2022					0%	**A iniciar**	PO reprogramado pois esta etapa depende do desenvolvimento do projeto pelas empresas, que só será concluído no 2o semestre 2021	
5.2	**Elaboração de Relatório Final**	Elaboração de relatório final a ser apresentado à Diretoria Colegiada da Sudene	CGEP	30/03/2022	29/04/2022					0%	**A iniciar**		
5.3	**Divulgação dos resultados do projeto para Diretoria Colegiada**	Apresentação dos resultados do projeto à Diretoria Colegiada da Sudene, para posterior deliberação	CGEP	29/04/2022	29/05/2022					0%	**A iniciar**		
				Valor Previsto:		R$ -	**Valor realizado:**		R$ -	76,0%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
Observações:

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGEP/2019004 (ex PO 16)**
Objetivo estrátegico:	**1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido**	**Ano:**	**2019**

Programa do PPA:	-	**Eixo temático (MDR):**	
Ação do PPA:	-	**Objetivo estrátegico (MDR):**	
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Segurança hídrica: um dos eixos estratégicos destacados do PRDNE; Água é fator chave para o desenvolvimento sustentável da região, especialmente na porção semiárida; No Nordeste, ocorrem frequentes situações críticas de escassez hídrica, nas quais: A demanda por água supera sua oferta; A poluição compromete a qualidade da água; Há redução do seu potencial de uso e aumento do custo com tratamentos; No Semiárido, a renovação das águas subterrâneas e superficiais sofre com os baixos e irregulares índices pluviométricos; A Sudene vem realizando articulações com instituições públicas e privadas para ações norteadoras da segurança hídrica para sua área de atuação, em especial a região semiárida. Uma destas ações consiste na implantação da Rede Estratégica de Poços no Semiárido, articulada juntamente ao Serviço Geológico do Brasil - CPRM		
Projeto:	Rede de Poços e Barragens		
Objetivo do projeto:	Promover a Segurança hídrica para os municípios do Semiárido, de forma mais duradoura e sustentável, minimizando o gasto de recursos com ações emergenciais - entre as quais se destaca a operação Carro-Pipa - e reduzindo significativamente sua dependência.		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto**	**Valor Total do Projeto**

Previsão de Conclusão:	30/12/2021
Data Atualização:	30/09/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Robson, Aildo, Marcelo, Veronilton

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

N.E.	**Nome da Etapa**	**Descrição das Atividades/ Etapas**	**Responsável**	**Previsto**			**Realizado**				**Status**	**Observação/Problemas**	**Providências**
				Início	**Fim**	**Valor**	**Início**	**Fim**	**Valor**	**Físico %**			
1	**Planejamento**									**51%**	**Em Andamento**	Atividade Paralizada devido a não aprovação de recursos.	
1.1	**Minuta do projeto**		CGEP	11/10/2019	21/11/2019		11/10/2019	21/11/2019		100%	**Concluído**		
1.2	**Incorporação de Geólogo à equipe**		CGEP / CGGP	11/10/2019	01/02/2020		11/10/2019			1%	**Cancelado**	o pedido de cesão do Sevidor foi negado	refazer o pedido para lotação em Brasília
2	**Articulações com Parceiros**									**0%**	**Cancelado**		
2.1	**Articulação com CPRM**		CGEP	01/10/2019	31/03/2020		09/10/2019			1%	**Cancelado**	Já foi realizada uma reunião de articulação na Sudene	
2.2	**Articulação com MDR**		CGEP	01/02/2020	30/04/2020					0%	**Cancelado**		
2.3	**Articulação com Comando Militar do Nordeste**		CGEP	01/02/2020	30/04/2020					0%	**Cancelado**		
3	**Formalização do Acordo com CPRM**									**0%**	**Cancelado**		
3.1	**Elaboração do Projeto**		CPRM / CGEP	01/06/2020	01/07/2020					0%	**Cancelado**		
3.2	**Elaboração do Plano de Trabalho**		CPRM / CGEP	01/07/2020	01/08/2020					0%	**Cancelado**		
3.3	**Elaboração do TED**		CCONT / PF / CGEP	01/08/2020	01/09/2020					0%	**Cancelado**		

3.4	**Formalização do Acordo com CPRM**		CCONT / GAB	01/09/2020	30/12/2020					0%	**Cancelado**		
4	**Acompanhamento da Execução**									**0%**	**Cancelado**		
4.1	**diagnóstico**		CPRM / CGEP	01/01/2021	01/03/2021					0%	**Cancelado**		
4.2	**seleção de poços a serem recuperados**		CPRM / CGEP	01/03/2021	01/04/2021					0%	**Cancelado**		
4.3	**execução**		CPRM / CGEP	01/04/2021	30/10/2021					0%	**Cancelado**		
4.4	**avaliação**		CPRM / CGEP	01/11/2021	31/12/2021					0%	**Cancelado**		
				Valor Previsto:		R$ -	**Valor realizado:**		R$ -	12,7%	**Cancelado**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Observações:

PO paralisado devido à não aprovação de recursos e à não incorporação do geólogo à equipe.

Nota: O Senhor Robson, encontra-se ceiddo ao Governo do estado de Alagoas.

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégic	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGEP/2019005 (ex PO 18)**
Objetivo estratégi	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2019**

Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	**Objetivo estratégico (MDR):**	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
Finalidade da ação:	**Articular uma governança regional para implementação do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE**		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas - CGEP
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Necessidade de instrumento voltado para o planejamento do desenvolvimento sustentável		
Projeto:	Estruturar processos de inteligência necessários ao monitoramento da carteira de programas e projetos do PRDNE - Trilha 3		
Objetivo do projeto:	Promover a articulação, convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômico, social e ambiental.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	280	Custeio	20WQ	R$ 1.481.361,00	R$ 1.481.361,00

Cronograma de Desembolso (1)			
SUDENE			TOTAL
R$ 1.481.361,00			R$ 1.481.361,00

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	120.403,17
A realizar no exercício	R$	339.911,25
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício (1)	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	120.403,17

Previsão de Conclusão:	30/12/2020
Data Atualização:	30/09/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Aldo Sabino, Miguel Araújo, Tássia Germano, Gabriela Isabel, Marina Barbosa e Joyce Queiroz.

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	**Análise do Relatório P14**	**P14 - Relatório de necessidades e requisitos de informação para monitoramento do PRDNE (Documento de arquitetura da informação).** A partir de reuniões presenciais na SUDENE, com sua equipe designada, serão realizados trabalhos especializados para elicitação de necessidades de informação para o monitoramento da carteira de projetos relativa ao PRDNE. A partir do consenso sobre as propostas iniciais para as metodologias, e vis-à-vis a demanda de informação preliminarmente identificada será possível elaborar o projeto das relações entre fontes de dados, metodologias de trabalho, informações produzidas e plano de uso dessas informações pela estrutura de governança do PRDNE.	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	02/09/2019	31/10/2019	R$ 139.828,50	Não informado	10/12/2019	R$ 120.403,17	100%	**Concluído**	O estudo está sendo realizado para a área de atuação da Sudene.	
2	**Análise do Relatório P15**	**P15 - Relatório de Metodologia de Monitoramento - Carteira de Projetos PRDNE.** Com a condução de especialista em indicadores e processos de acompanhamento de políticas públicas, a equipe do CGEE irá elaborar, com a participação dos técnicos da SUDENE, o processo e métodos de acompanhamento de carteira de programas e projetos relativos ao PRDNE. Reuniões de trabalho presenciais (pequenos workshops) com participação da equipe da SUDENE serão realizadas como meio de promover a troca de idéias e melhor integrar a metodologia com os procedimentos de trabalho, bem como coletar percepções sobre a melhor cesta de indicadores que permitam dimensionar e equacionalizar a relação recursos versus metas e antever as os esforços e capacidades necessários para seu alcance. O desenho da metodologia, construído em consenso com a Sudene e observando as estruturas de produção de dados e informações dos entes envolvidos com o PRDNE, promoverá, também um detalhamento da necessidade de informação prevista no produto P14.	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	11/11/2019	30/11/2020	R$ 269.514,00	Não informado	11/11/2019	-	50%	**Atrasado**	Foi entregue versão preliminar em fevereiro de 2020. A atividade foi paralisada devido à pandemia e aditivo da carta acordo. A versão final foi enviada à Sudene no dia 18 de dezembro. A apreciação técnica do produto se deu pela COAE/CGEP, com o envio da Nota Técnica 2 (0216636) no dia 05/01/2021. Neste momento, a CGEP e CGCP aguardam o envio do produto revisado e com os ajustes solicitados. Em 31/03/2021, foi realizada reunião com CGEE para alinhar as solicitações realizadas no Nota Técnica 2 (SEI 0216636). Dentre os encaminhamentos da reunião, as partes acordaram que a nova versão do produto com os ajustes apontados na Nota Técnica se dará até o dia 20/04/2021. A segunda versão do Produto 15 foi encaminhada pelo CGEE em 22/04/21. Em razão da priorização de outros projetos que demandaram maior dedicação dos técnicos, a conclusão da análise se deu apenas em 02/06/21 por meio da Técnica 117 (SEI 0247260) , que novamente apontou uma série de recomendações. A terceira versão do Produto 15 foi encaminhada pelo CGEE em 26/06/21, sendo encaminhada a área técnica em 28/06/21. O prazo acordado para o atendimento da demanda é o dia 20/07/2021, conforme consta no Despacho SEI	
3	**Análise do Relatório P16**	**P16 - Capacitação metodológica para monitoramento de carteira de projetos relativa ao PRDNE.** A metodologia de monitoramento de carteira de projetos desenhada será disseminada por meio de uma capacitação para técnicos e gestores da SUDENE a se realizar nas dependências da Superintendência. O trabalho também envolve a elaboração do ementário e material de curso, e contará atuação dos principais formuladores da metodologia. A oportunidade de apresentar a metodologia elaborada será utilizada, também, para coleta de percepções (críticas, sugestões e correções) dos técnicos da SUDENE e melhoria da metodologia. Em vista disso, está previsto o deslocamento de uma pequena equipe (3 pessoas) para a SUDENE durante a realização da capacitação.	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	23/03/2020	31/12/2020	R$ 70.397,25				0%	**Cancelado**	A atividade foi paralisada devido à pandemia e aditivo da carta acordo. No processo 59336.002844/2019-64, consta uma proposta do CGEE referente a um novo cronograma CGEE (SEI 0235976) para os produtos da Carta de Acordo. Sendo assim, as datas de início e fim das atividades foram alteradas. Novo prazo: 12/04/2021 (início) a 21/05/2021 (término). Em 28/04/21, foi enviado ao CGEE o Ofício 873 (SEI 0239369) para tratar sobre o Projeto BRA017/19 – Carta de Acordo entre CGEE e PNUD. O Ofício 873, entre outros pontos, estabelece o cancelamento dos 10, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 conforme encaminhamentos da reunião do dia 14 de abril 2021. Portanto, o produto em questão fora cancelado. Atualmente, está em curso a elaboração de um novo Termo de Referência junto ao Pnud para contratação de produtos que foram previstos na Trilha de Inteligência da Carta de Acordo.	
4	**Análise do Relatório P17**	**P17 - Relatório de Metodologia de Gestão de Fontes de Dados e Informações afeitas ao de monitoramento do PRDNE Atividade resultante dos trabalhos do GT de Sistema de Informação para o PRDNE.** O produto 17 se fundamenta na metodologia de monitoramento de carteira de projetos e na realização de evento reunindo grupo de trabalho do sistema nacional e estadual de informação. O objetivo será a montagem de processo e métodos que contemplem a captura e tratamento de dados e informações, disponibilizadas pelos entes do sistema nacional de informação e estaduais envolvidos com o PRDNE à Sudene, conforme a necessidade de informação prevista metodologia de monitoramento. Esses insumos serão trabalhados pela equipe do CGEE, juntamente com especialista em indicadores e equipe da SUDENE para a definição dos mecanismos e instrumentos (informatizados) para coleta e tratamento de dados advindos de fontes de dados digitais, e armazenamento em repositório digital de dados e informações a ser configurado, também como parte do trabalho.	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	01/11/2020	28/02/2021	R$ 389.177,25				0%	**Cancelado**	Repactuado conforme aditivo à carta acordo.No processo 59336.002844/2019-64, consta uma proposta do CGEE referente a um novo cronograma CGEE (SEI 0235976) para os produtos da Carta de Acordo. Sendo assim, as datas de início e fim das atividades foram alteradas. Novo prazo: 17/05/2021 (início) a 22/09/2021 (término) Em 28/04/21, foi enviado ao CGEE o Ofício 873 (SEI 0239369) para tratar sobre o Projeto BRA017/19 – Carta de Acordo entre CGEE e PNUD. O Ofício 873, entre outros pontos, estabelece o cancelamento dos Produtos 10, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 conforme encaminhamentos da reunião do dia 14 de abril 2021. Portanto, o produto em questão fora cancelado. Atualmente, está em curso a elaboração de um novo Termo de Referência junto ao Pnud para contratação de produtos que foram previstos na Trilha de Inteligência da Carta de Acordo.	

5	**Análise do Relatório P18**	**P18 - Relatório descritivo dos instrumentos e mapas de conhecimento afetos à carteira de projetos do PRDNE.** A equipe do CGEE alocada ao projeto, realizará a adaptação do processo de Inteligência em CTI do CGEE para geração de informação de alto valor agregado com foco na gestão tática do PRDNE e de acompanhamento de indicadores de desenvolvimento regional advindos da metodologia de monitoramento. Em trabalho conjunto com os técnicos da SUDENE, o que envolve reuniões presenciais, será produzido modelo de processo de trabalho que descreve as atividades de geração de informação e conhecimento, a partir de repositórios de dados oriundos da metodologia de Gestão de Fontes de Dados e Informações. Esses processos de trabalho são apoiados por ferramentas automatizadas de visualização de informação, por exemplo, em mapas (georreferenciamento), redes de relacionamento, hierarquias de assuntos e buscas textuais (ferramentas Insight), as quais serão disponibilizadas para a SUDENE. Neste produto constarão as atividades executadas durante o período de operação assistida que consiste no apoio à execução das metodologias e suporte ao uso dos instrumentos	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	01/02/2021	31/05/2021	R$ 355.850,25				0%	**Cancelado**	Repactuado conforme aditivo à carta acordo. No processo 59336.002844/2019-64, consta uma proposta do CGEE referente a um novo cronograma CGEE (SEI 0235976) para os produtos da Carta de Acordo. Sendo assim, as datas de início e fim das atividades foram alteradas. Novo prazo: 02/06/2021 (início) a 11/11/2021 (término) Em 28/04/21, foi enviado ao CGEE o Ofício 873 (SEI 0239369) para tratar sobre o Projeto BRA017/19 – Carta de Acordo entre CGEE e PNUD. O Ofício 873, entre outros pontos, estabelece o cancelamento dos 10, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 conforme encaminhamentos da reunião do dia 14 de abril 2021. Portanto, o produto em questão foi cancelado. Atualmente, está em curso a elaboração de um novo Termo de Referência junto ao Pnud para contratação de produtos que foram previstos na Trilha de Inteligência da Carta de Acordo.	
6	**Análise do Relatório P19**	**P19 - Relatório da capacitação instrumental e operação assistida da metodologia e ferramentas de apoio de monitoramento do PRDNE.** A equipe do CGEE fará a capacitação para até 30 técnicos indicados pela Sudene na utilização de instrumentos de captação de dados e geração de informação previstos nas metodologias de Gestão de Fontes e de Mapas de Conhecimento, nas dependências da SUDENE. Está previsto o deslocamento de uma pequena equipe (3 pessoas) para a SUDENE durante a realização da capacitação, bem como nos momentos posteriores para apoio no implementação da metodologia.	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	01/05/2021	30/06/2021	R$ 94.185,00				0%	**Cancelado**	Repactuado conforme aditivo à carta acordo. No processo 59336.002844/2019-64, consta uma proposta do CGEE referente a um novo cronograma CGEE (SEI 0235976) para os produtos da Carta de Acordo. Sendo assim, as datas de início e fim das atividades foram alteradas. Novo prazo: 11/10/2021 (início) a 18/11/2021 (término). Em 28/04/21, foi enviado ao CGEE o Ofício 873 (SEI 0239369) para tratar sobre o Projeto BRA017/19 – Carta de Acordo entre CGEE e PNUD. O Ofício 873, entre outros pontos, estabelece o cancelamento dos 10, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 conforme encaminhamentos da reunião do dia 14 de abril 2021. Portanto, o produto em questão foi cancelado. Atualmente, está em curso a elaboração de um novo Termo de Referência junto ao Pnud para contratação de produtos que foram previstos na Trilha de Inteligência da Carta de Acordo.	
7	**Análise do Relatório P20**	**P20 - Relatório da Trilha de Inteligência.** A partir de análise crítica da implementação das metodologias e insumos coletados das demais trilhas do projeto, a equipe do CGEE em conjunto com especialista em indicadores irá elaborar o resumo geral das metodologias implantadas e os resultados alcançados, bem como um documento de visão contendo especificações de alto nível de funcionalidades para um sistema de informação fundamentado nas metodologias implantadas. O trabalho irá requerer visita in loco para observação do funcionamento da metodologia, bem como coleta de percepções e discussão com a equipe da SUDENE.	SUDENE/CGEP, PNUD, CGEE	01/05/2021	31/07/2021	R$ 162.408,75				0%	**Cancelado**	Repactuado conforme aditivo à carta acordo. No processo 59336.002844/2019-64, consta uma proposta do CGEE referente a um novo cronograma CGEE (SEI 0235976) para os produtos da Carta de Acordo. Sendo assim, as datas de início e fim das atividades foram alteradas. Novo prazo: 13/09/2021 (início) a 30/11/2021 (término) Em 28/04/21, foi enviado ao CGEE o Ofício 873 (SEI 0239369) para tratar sobre o Projeto BRA017/19 – Carta de Acordo entre CGEE e PNUD. O Ofício 873, entre outros pontos, estabelece o cancelamento dos 10, 13, 16, 17, 18, 19 e 20 conforme encaminhamentos da reunião do dia 14 de abril 2021. Portanto, o produto em questão foi cancelado. Atualmente, está em curso a elaboração de um novo Termo de Referência junto ao Pnud para contratação de produtos que foram previstos na Trilha de Inteligência da Carta de Acordo.	
				Valor Previsto:		R$ 1.481.361,00	**Valor realizado:**		R$ 120.403,17	38%	**Paralisado**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.CGEE - Centro de Gestão e Estudos Estratégicos

Observações:

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGEP/2020001 (ex PO 17)**
Objetivo estratégico:	**1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes**	**Ano:**	**2020**
Programa do PPA:		**Eixo temático (MDR):**	
Ação do PPA:		**Objetivo estratégico (MDR):**	
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Ausência de mapeamento das empresas incentivadas através da redução de 75% do imposto sobre lucro da operação, na área de atuação da Sudene		
Projeto:	Estudo de georeferenciamento das empresas incentivadas na área de atuação da Sudene (Redução de 75%).		
Objetivo do projeto:	Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	30/11/2021
Data Atualização:	30/09/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Marcelo Braga; José Alonso, Ludmila Calado

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	**Análise e Monitoramento dos Incentivos Fiscais (Redução de 75% sobre IRPJ) da Área de Atuação da Sudene**			02/12/2019	30/09/2020		02/12/2019	18/11/2020		**100%**	**Concluído**	A data prevista para conclusão do produto precisou ser alterada em virtude das dificuldades de acessos aos dados e do trabalho remoto, decorrente da Pandemia COVID19.	Previsão de conclusão até 30/12/2020.
1.1	Revisão de Literatura sobre o tema	Fazer revisão de literatura sobre o tema dos últimos 10 anos	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	02/12/2019	31/03/2020	-	02/12/2019	05/03/2020	-	100%	**Concluído**		
1.2	Coleta das variáveis disponíveis no sistema SIBF dos últimos 9 anos	Acessar o sistema SIBF e fazer a coleta dos dados de localização das empresas incentivadas com a redução de 75% do IRPJ para o georreferenciamento e formulação de mapas da Regiões intrmediárias e municipios da parea da Sudene	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/02/2020	31/05/2020	-	03/02/2020	18/11/2020	-	100%	**Concluído**		
1.3	Correlacionar mapas da etapa 1.2 com as cidades-polo e regiões intermediárias	Gerar mapas dos últimos 9 anos com as empresas incentivadas nas regiões intermediárias colocadas no PRDNE e cidades-polo	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/03/2020	30/06/2020	-	03/02/2020	18/11/2020	-	100%	**Concluído**		
1.4	Correlacionar mapas da etapa 1.2 com as cidades-polo e regiões intermediárias e suas atividades econômicas	Gerar tabelas e gráficos com os dados dos últimos 9 anos das principais atividades econômicas	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/04/2020	31/07/2020	-	01/02/2020	18/11/2020		100%	**Concluído**		
1.5	Análise, avaliação descritiva dos resultados encontrados e elaboração de Relatório Final	Fazer análise descritiva das empresas georreferenciadas sobre as áreas de cidades-polo e regiões intermediárias e municípios, e gerar um Relatório Final	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/08/2020	30/09/2020	-	02/03/2020	18/11/2020		100%	**Concluído**		
2	**Análise e Monitoramento dos Incentivos Fiscais (Reinvestimento) da Área de Atuação da Sudene**			02/12/2019	30/09/2020		02/12/2019			**78%**	**Em Andamento**		
2.1	Revisão de Literatura sobre o tema	Fazer revisão de literatura sobre o tema dos últimos 10 anos	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	02/12/2019	31/03/2020	-	02/12/2019	05/03/2020		100%	**Concluído**		
2.2	Coleta das variáveis disponíveis no sistema SIBF dos últimos 9 anos	Acessar o sistema SIBF e fazer a coleta dos dados de localização das empresas incentivadas com o reinvestimento para o georreferenciamento e formulação de mapas da regiões intermediárias e municipais	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/04/2020	30/06/2020	-	03/02/2020	18/11/2020		100%	**Concluído**		

2.3	Correlacionar mapas da etapa 2.2 com as regiões intermediárias	Gerar mapas dos dados dos últimos 9 anos com as empresas incentivadas nas regiões intermediárias colocadas no PRDNE e cidades-polo	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/07/2020	31/07/2020	-	03/02/2020	18/11/2020		100%	**Concluído**		
2.4	Correlacionar mapas da etapa 2.2 com os municípios da área da Sudene	Gerar mapas dos últimos 9 anos com as empresas incentivadas pelo Reinvestimento dos municípios da área de atuação da Sudene	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/08/2020	30/08/2020	-	01/02/2020	18/11/2020		100%	**Concluído**		
2.5	Análise, avaliação descritiva dos resultados encontrados e elaboração de Relatório Final	Fazer análise descritiva dos mapas com as áreas das regiões intermediárias e municípios e gerar um Relatório Final	Mauro Bezerra; Marcelo Braga; Robson Brandão; Douglas Santana; Thais Silva	01/08/2020	30/09/2020	-	02/03/2020	18/11/2020		100%	**Concluído**	Existem inconsistências nos dados de Reinvestimentos do SIBF, que estão relacionados no relatório final	
2.6	Consultar e coletar dados no Banco de Dados SIBF para verificação de informações	Analisar, através de consultas, a base de dados SBIF para buscar informações que subsidiam a conclusão do relatório,	Gloria Cané, Ludmilla Calado, José Luis Alonso, Thais Silva	13/09/2021	22/10/2021					100%	**Concluído**	Modificações na equipe envolvida em virtude de movimentações de servidores entre coordenações.	
2.7	Tabular e tratar dados coletados no Banco de Dados SIBF	Desenvolver a tabulação e tratamento dos dados, adequando-os para inclusão no Relatório	Gloria Cané, Ludmilla Calado, José Luis Alonso, Thais Silva	25/10/2021	05/11/2021					0%	**A Iniciar**		
2.8	Discutir os resultados e ajustes na organização do documento	Fazer uma discussão dos resultados e promover os ajustes necessários para finalização do Relatório	Marcos Falcão, Gloria Cané, Ludmilla Calado, José Luis Alonso	13/09/2021	19/11/2021		10/09/2021			25%	**Em Andamento**	Etapa de discussão do Relatório Final acrescentada; Alterações na organização do documento, com ajustes necessários para sua finalização.	
2.9	Relatório Final	Elaboração do relatório final do estudo.	Marcos Falcão e Gloria Cané	13/09/2021	30/11/2021		10/09/2021			25%	**Em Andamento**		
				Valor Previsto:		R$ -	**Valor realizado:**		R$ -	89,1%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
Observações:
Foi alterada a data de conclusão do projeto para 30/09/2021 em função da mudança de servidores que necessitou de ajustes no projeto

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

3º ciclo 2021

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**2 - Universalizar o acesso a ativos estratégicos**	**Número do Projeto:**	**PO CGEP/2020002 (ex PO 19)**
Objetivo estratégico:	**2.1 - Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis**	**Ano:**	**2020**

Programa do PPA:	-	**Eixo temático (MDR):**	-
Ação do PPA:	-	**Objetivo estratégico (MDR):**	-
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Necessidade de regionalização das políticas públicas de educação		
Projeto:	IDEB como instrumento direcionador regional das Políticas Públicas da Educação		
Objetivo do projeto:	Elaboração de um índice que norteie a regionalização de Políticas Públicas de Educação		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	-	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	31/12/2021
Data Atualização:	30/09/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Glória Sistelos, Joyce, Gabriela Isabel.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	**Dados**		Glória Sistelos	**01/01/2020**	**30/10/2020**	**-**	**01/01/2020**	**04/09/2020**		**100%**	**Concluído**		
1.1	Definição de indicadores	Discussão para definição de indicadores	Glória Sistelos	01/01/2020	28/02/2020	-	01/01/2020	28/02/2020		100%	**Concluído**		
1.2	Levantamento de dados	Levantamento de dados municipais por Estado	Glória Sistelos, Gabriela Isabel	01/01/2020	30/10/2020	-	01/01/2020	13/10/2020		100%	**Concluído**	Em virtude da divulgação do resltado do IDEB 2019 em 15/09/20, sentiu-se a necessidade de incluir os novos dados no levantamento	
1.3	Validação dos dados	Verificar a consistência dos dados	Glória Sistelos	01/01/2020	30/10/2020	-	01/01/2020	13/10/2020		100%	**Concluído**		
1.4	Relatório parcial	Consolidar resultados parciais	Joyce, Gabriela Isabel	01/01/2020	30/10/2020	-	01/01/2020	04/09/2020		100%	**Concluído**	Relatório parcial com dados até 2017. Será atualizado com dados IDEB 2019	
2.	**Análise**		Glória Sistelos	**02/03/2020**	**30/01/2021**	**-**	**24/02/2020**	**30/01/2021**		**100%**	**Concluído**		
2.1	Elaboração de índice	Elaboração de índice sintético de descumprimento da meta IDEB	Glória Sistelos, Gabriela Isabel	02/03/2020	30/11/2020	-	24/02/2020	13/10/2020		100%	**Concluído**		
2.2	Elaboração do ranking IDEB	Elaboração de ranking da diferença entre o IDEB Alcançado e a meta IDEB projetada	Glória Sistelos, Gabriela Isabel	02/03/2020	30/11/2020	-	24/02/2020	13/10/2020		100%	**Concluído**		
2.3	Elaboração de gráficos	Elaboração de gráficos do IDEB realizado vs IDEB projetado	Gabriela Isabel, Joyce	02/03/2020	30/11/2020	-	24/02/2020	30/01/2021		100%	**Concluído**	Solicitação de postergação do prazo devido à priorização do processo 59336.000790/2020-36 (Estudo de mercado do Covid-19), do processo 59336.000658/2020-24 (Avaliação dos Incentivos Fiscais) e do processo 59336.001165/2020-10 (avaliação do FNE). Novo prazo acordado: 25/10/2020	
2.4	Elaboração dos Mapas	Elaboração de mapas com o índice de descumprimento do IDEB	Robson Brandão	02/03/2020	30/11/2020	-	13/10/2020	28/10/2020		100%	**Concluído**	Os mapas foram resultados do IDEB 2019	
2.5	Validação dos resultados	Consolidar rotinas de verificação e correção de erros	Gabriela Isabel, Joyce	01/04/2020	30/11/2020	-	28/10/2020	30/01/2021		100%	**Concluído**		
2.6	Relatório parcial	Consolidar resultados parciais	Joyce, Gabriela Isabel	01/04/2020	30/12/2020	-	24/02/2020	30/01/2021		100%	**Concluído**	Falta incluir os dados do IDEB 2019	
2.7	Revisão do Relatório Parcial	Revisar Relatório Parcial	Glória Sistelos	04/09/2020	30/01/2021		04/09/2020	30/01/2021		100%	**Concluído**	Foi sentida a necessidade de se realizar uma revisão do Relatório Parcial entregue em 04/09/2020, razão pela qual foi incluída esta atividade no PO	
3.	**Panorama de Políticas Públicas de Educação**		Glória Sistelos, Gabriela Isabel, Joyce	**13/07/2020**	**30/01/2021**	**-**	**13/07/2020**	**30/01/2021**		**100%**	**Concluído**		
3.1	Revisão Bibliográfica	Levantamento de Políticas Públicas de Educação relacionadas ao cumprimento do IDEB	Joyce	13/07/2020	30/01/2021	-	13/07/2020	30/01/2021		100%	**Concluído**		
3.2	Análise Qualitativa	Análise qualitativa da relação entre os índices construídos e as políticas encontradas	Joyce	01/08/2020	30/01/2021	-	01/08/2020	30/01/2021		100%	**Concluído**		

3.2	Relatório parcial	Consolidar resultados parciais	Gabriela Isabel e Joyce	01/08/2020	30/01/2021	-	01/08/2020	30/01/2021		100%	**Concluído**		
4	**Relatório final**		Glória Sistelos, Gabriela Isabel, Joyce	**01/02/2021**	30/12/2021	**-**	**13/07/2020**			**30%**	**Em Andamento**	**Solicitação de postergação do prazo devido à priorização do processo 59336.000790/2020-36 (Estudo de mercado do Covid-19). Novo prazo acordado: 30/07/2021. Solicitação de nova postergação do prazo devido à priorização dos processos : Estudo de mercado do Covid-19 (Processo SEI 59336.000790/2020-36); Avaliação do FNE (Processo SEI 59336.001165/2020-10); Estudo de Complexidade Econômica (Processo SEI 59336.000928/2020-05); Trilha da Inteligência Produto 15 (Processo SEI 59336.002520/2020-60); Delimitação do Semiárido (Processo SEI 59336.000463/2020-84) Novo prazo acordado: 31/12/2021**	
4.1	Consolidação	Consolidação dos Relatórios Parciais	Glória Sistelos, Gabriela Isabel, Joyce	01/02/2021	31/12/2021	-	13/07/2020			60%	**Em Andamento**		
4.2	Revisão	Revisão do Relatório Final	Glória Sistelos	01/03/2021	31/12/2021	-				0%	**A Iniciar**		
				Valor Previsto:		R$ -	**Valor realizado:**		R$ -	83%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Observações:

Em virtude da divulgação do resltado do IDEB 2019 em 15/09/20, foram ajustados os prazos e os percentuais de entrega das atividades, pois algumas delas precisarão ser refeitas

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGEP/2020003 (EX PO 20)**
Objetivo estratégico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2020**

Programa do PPA:	Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	**Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação**	**Objetivo estratégico (MDR):**	I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismos econômico e social
Objetivo da ação:	Desenvolvimento, incorporação e difusão de novas tecnologias, produtos e serviços, propiciando inserção no mercado e agregação de valor. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a viabilizar condições para implantar estruturas produtivas baseadas na inovação, informação		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Importância da cultura da Palma para o Semiárido		
Projeto:	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO EM MELHORAMENTO GENÉTICO E CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS DIRECIONADOS PARA FORTALECIMENTO DA CULTURA DA PALMA NO SEMIARIDO		
Objetivo do projeto:	fitossanitários.		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto**	**Valor Total do Projeto**
	250 e 280	3	90	R$ 441.438,94	R$ 441.438,94
	250 e 280	4	90	R$ 38.410,15	R$ 38.410,15
					R$ 479.849,09

Ata 360o Reunião de Diretoria Colegiada

Previsão de Conclusão:	31/03/2024
Data Atualização:	30/06/2021

Processo 59336.000816/2020-46 (TED Sudene/INSA nº 002/2020)

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	211.365,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$	350.707,09
Valor Empenhado no Exercício	R$	350.707,09
Valor liberado no Exercício	R$	211.365,09
Saldo a liberar	R$	268.484,00
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	211.365,09

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto		
	CGEP/SUDENE:	Marcelo Saiki e Aildo Sabino
	INSA:	JUCILENE SILVA ARAUJO

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1		**PLANEJAMENTO (Peso 20%)**								**20%**	**Concluído**		
1.1	**Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira**	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	21/05/2020	11/08/2020		21/05/2020	11/08/2020		100,0%	**Concluído**		
1.2	**Analise jurídica**	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	11/08/2020	27/08/2020		11/08/2020	27/08/2020		100,0%	**Concluído**		
1.3	**Elaboração da minuta do TED**	Elaboração do minuta do TED	COCIC	28/08/2020	29/09/2020		28/08/2020	29/09/2020		100,0%	**Concluído**	A minuta do TED precisou ser alterada devido a aprovação do DECRETO Nº 10.426, DE 16 DE JULHO DE 2020. Foi necessário também alterar a minuta padrão de TED e de Plano de Trabalho	
1.4	**Assinatura do TED**	Assinatura do TED	GABINETE / INSA	30/09/2020	09/10/2020		05/10/2020	05/10/2020		100,0%	**Concluído**		
1.5	**Publicação do TED**	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	30/09/2020	09/10/2020		07/10/2020	07/10/2020		100,0%	**Concluído**		
2		**EXECUÇÃO (Peso 60%)**								**23%**	**Em Andamento**		
2.1	**Liberação da primeira parcela de recursos**	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	09/10/2020	16/10/2020	**R$ 211.365,09**	08/10/2020	14/10/2020	**R$ 211.365,09**	100,0%	**Concluído**	O Orçamentário foi disponibilizado em 14/10/2020; o Financeiro foi solicitado em 29/01/21	
2.2	**Subprojeto 1**	**Caracterização e uso de germoplasma e melhoramento genético de opuntia spp visando a sua utilização como forrageira e prospectando novas potencialidades a partir da coleção do INSA.**		16/10/2020	01/10/2023	R$ 193.711,83				15,1%	**Em Andamento**		
2.2.1	**Meta 1: Caracterização de 142 acessos de Opuntia spp. do banco de germoplasma do INSA, com base em características morfoagronômicas e bromatológicas e disponibilizá-los ao programas de melhoramento genético.**	Produto: 142 acessos de Opuntia spp. caracterizados	INSA	16/10/2020	12/08/2021	R$ 13.600,00	11/02/2021			90,0%	**Em Andamento**		
2.2.2	**Meta 2: Avaliação da diversidade genética entre e dentro de espécies de Opuntias do banco de germoplasma do INSA, com base em marcador molecular e indicar pelos menos 10 potenciais genitores para o programa de hibridação.**	Produto: 10 genitores identificados para usar em programa de hibridação	INSA	16/10/2020	08/07/2022	R$ 8.500,00	11/02/2021			20,0%	**Em Andamento**		

2.2.3	**Meta 3: Determinação do nível de ploidia de 142 acessos do banco de germoplasma por meio de citometria de fluxo e/ou contagem do número de cromossomos.**	Produto: 142 acessos caracterizados quanto ao nível de ploidia	INSA	16/10/2020	09/01/2022	R$ 15.000,00	11/02/2021			20,0%	**Em Andamento**		
2.2.4	**Meta 4: Caracterização bioquímica dos perfis enzimáticos e compostos de interesse em cladódios, frutas e sementes de 142 acessos de palma forrageira, visando uma possível utilização futura na indústria**	Produto: 142 acessos caracterizados bioqumicamente para seleção dos que apresentam potencial de uso na industria	INSA	16/10/2020	09/01/2022	R$ 28.400,00	01/02/2021			7,0%	**Em Andamento**		
2.2.5	**Meta 5: Selecionar de 10 matrizes de palma forrageira mais produtivas e resistentes a Cochonilha-do-carmim e de escama e promover sua autofecundação.**	Produto: 10 matrizes selecionadas para a realização de autofecundação	INSA	10/11/2021	08/07/2022	R$ 15.000,00				0,0%	**A Iniciar**		
2.2.6	**Meta 6: Selecionar 10 matrizes promissoras de palma forrageira voltada para a qualidade fisico-química de fruto (coloração mais avermelhada) e que sejam resistentes a doenças e promover sua autofecundação para produção de linhagens S1.**	Produto: Linhagens S1 produzidas	INSA	14/01/2021	08/07/2022	R$ 10.000,00				0,0%	**A Iniciar**		
2.2.7	**Meta 7: Avaliar 400 linhagens S1 quanto e selecionar as mais produtivas e resistentes as principais pragas e doenças.**	Produto: Seleção de linhagens dentro de S1 produtivas e resistentes a pragas e doenças	INSA	11/09/2021	01/10/2023	R$ 25.000,00				0,0%	**A Iniciar**		
2.2.8	**Meta 8: Desenvolver 20 clones inter- e intraespecíficos mais produtivos de palma forrageira para ampliar a base genética do programa de melhoramento da cultura.**	Produto: 0 clones clones inter- e intraespecíficos desenvolvidos	INSA	08/07/2022	01/10/2023	R$ 35.000,00				0,0%	**A Iniciar**		
2.2.9	**Meta 9: Induzir 20 linhagens haplóides por meios biotecnologicos usando cultura de micrósporo (androgenese) e óvulos não-fertilizados (ginogenese).**	Produto: 20 linhagens haploides induzidas	INSA	13/02/2021	07/08/2022	R$ 10.000,00				0,0%	**A Iniciar**		
2.2.10	**Meta 10: Produzir 20 linhagens poliploides a partir de plantas diplóides por meios biotecnológicos (cultivo in vitro) usando agentes anti-mitóticos (colchicina, orizalina e trifluralina).**	Produto: 20 linhagens poliploides produzidas	INSA	13/02/2021	07/08/2022	R$ 13.000,00	01/06/2021			15,0%	**Em Andamento**		
2.2.11	**Meta 11: Reduzir o tempo de juvenilidade pelo menos 20% das plântulas derivadas de cruzamentos inter- e intraespecíficos por meio de enxertia.**	Produto: Pelo menos 20% de plantas apresentando tempo reduzido de juvenilidade	INSA	14/05/2021	10/11/2021	R$ 6.611,83	01/09/2021			5,0%	**Em Andamento**		
2.2.12	**Meta 12: Avaliar todos os clones e progênies S1 selecionados em diferentes condições ambientais e no Estado da Paraíba.**	Produto: Campos instalados com clones e progenies S1 em diferentes condições ambientais no Estado da Paraíba	INSA	14/04/2021	01/10/2023	R$ 7.600,00	01/06/2021			10,0%	**Em Andamento**		
2.2.13	**Meta 13: Realizar pelo menos 03 ações de desenvolvimento de produtos e mercado (dia de campo) da palma forrageira com diversas finalidades: forragem, frutífera, salada, medicinal e ornamental.**	Produto: Dias de campo realizado	INSA	11/10/2021	01/10/2023	R$ 6.000,00				0,0%	**A Iniciar**		
2.2.14	**Meta 14: Formação de recursos humanos em fitomelhoramento, 01 Mestrando e 01 Doutorando, do Programa de Pós-graduação em Agronomia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba.**	Produto: Uma Tese e uma Dissertação realizada e artigos publicados para o subprojeto como um todo	INSA	16/10/2020	01/10/2023	Não se aplica	11/02/2021			45,0%	**Em Andamento**		
2.3	**Subprojeto 2**	Estratégia de manejo para controle da cochonilha-de-escama em palma forrageira.		16/10/2020	01/10/2023	R$ 167.850,26				13,9%	**Em Andamento**		
2.3.1	**Meta 1: Determinação do nível de infestação da Cochonilha-de-escama**	Produto: Nível de infestação da Cochonilha-de-escama determinado nos municipios e propriedades selecionadas para o estudo	INSA	16/10/2020	03/06/2023	R$ 15.000,00	11/03/2021			40,0%	**Em Andamento**		
2.3.2	**Meta 2: Biologia de Diaspis echinocacti criada em diferentes variedades de palma forrageira**	Produto: Parâmetros biológicos determinados	INSA	15/03/2021	04/05/2023	R$ 25.000,00	01/04/2021			40,0%	**Em Andamento**		

2.3.3	**Meta 3: Seleção de pelo menos um material resistente à Cochonilha-de-escama**	Produto:Material selecionado com resistência a Cochonilha-de-escama	INSA	13/07/2021	04/01/2023	R$ 35.850,24	01/09/2021			5,0%	**Em Andamento**		
2.3.4	**Meta 4: Avaliação da eficiência de óleos vegetais sobre a Cochonilha-de-escama e seletividade à joaninha**	Produto: Óleo vegetais selecionados	INSA	13/07/2021	04/04/2023	R$ 15.000,00	01/09/2021			2,0%	**Em Andamento**		
2.3.5	**Meta 5: Técnica para criação da joaninha para controle biológico da Cochonilha-de-escama**	Produto: Técnica desenvolvida	INSA	09/05/2022	03/07/2023	R$ 25.000,00	01/05/2021			5,0%	**Em Andamento**		
2.3.6	**Meta 6: Uso do consórcio da palma com sorgo forrageiro**	Produto: Campos implantados	INSA	14/01/2021	03/02/2023	R$ 27.000,00				0,0%	**A Iniciar**		
2.3.7	**Meta 7: Uso de indutor de resistência na palma forrageira**	Produto: Indutor de resistência aplicado e artigos publicados para o subprojeto como um todo	INSA	14/04/2021	01/10/2023	R$ 25.000,02	01/10/2021			5,0%	**Em Andamento**		
2.4	**Subprojeto 3**	Manejo integrado de doenças em palma forrageira no semiárido.		16/10/2020	01/10/2023	R$ 118.287,00				23,3%	**Em Andamento**		
2.4.1	**Meta 1: Identificar todos os organismos fitopatogênicos associados à cultura da palma nas propriedades amostradas e confirmar sua patogenicidade**	Produto: Organismos fitopatogênicos identificados e caracterizados	INSA	16/10/2020	10/11/2021	R$ 31.153,40	11/02/2021			90,0%	**Em Andamento**		
2.4.2	**Meta 2: Realizar em três anos, estudo epidemiológico para as principais doenças encontradas em associação com a palma forrageira**	Produto: Unidades experimentais instaladas e nivel de severidade das doenças determinados	INSA	13/06/2021	05/12/2022	R$ 41.240,00	15/08/2021			30,0%	**Em Andamento**		
2.4.3	**Meta 3: Identificar, ao menos, dois extratos vegetais eficientes no controle de fungos fitopatogênicos da palma forrageira**	Produto: Óleos vegetais com efeito fungicida identificados	INSA	06/10/2022	04/04/2023	R$ 21.946,00				0,0%	**A Iniciar**		
2.4.4	**Meta 4: Determinar pelo menos um antagonista capaz de controlar patógenos em palma forrageira**	Produto:Experimento instalado e antagonista identificado	INSA	05/11/2022	04/05/2023	R$ 9.333,60				0,0%	**A Iniciar**		
2.4.5	**Meta 5: Identificar ao menos um genótipo de palma forrageira com resistência a nematoides**	Produto: Genótipo de palma identificado com resistência a nematóide	INSA	05/11/2022	02/08/2023	R$ 14.614,00	15/08/2021			10,0%	**Em Andamento**		
2.4.6	**Meta 6: Transferir conhecimentos através da publicação de ao menos dois artigos cientificos, um manual de identificação dos principais agentes etiológicos de doenças em palma forrageira e um relatório a cada ano do projeto**	Produto: Artigos e manuais publicados para o subprojeto como um todo	INSA	13/06/2021	01/10/2023	Não se aplica	30/09/2021			10,0%	**Em Andamento**		
2.5	**1ª Prestação de contas parcial**	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	01/01/2021	30/01/2021	-	01/04/2021	14/04/2021		100,0%	**Concluído**	O INSA encaminhou o 1o Relatório Técnico Parcial em 14/04/2021. Este foi analisado e aprovado em 23/06/2021, pelo Parecer Técnico 160.	
2.6	**Liberação da segunda parcela de recursos**	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/02/2021	28/02/2021	**R$ 139.342,00**				0,0%	**Atrasado**		
2.7	**2ª Prestação de contas parcial**	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	01/01/2022	30/01/2022		27/07/2021	18/10/2021		100,0%	**Concluído**	O 2º Relatório Técnico Parcial foi enviado em 27/07/2021	
2.8	**Liberação da terceira parcela de recursos**	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/02/2022	28/02/2022	**R$ 129.142,00**				0,0%	**A Iniciar**		
2.9	**3ª Prestação de contas parcial**	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 3ª parcela	INSA/CGEP	01/01/2023	30/01/2023					0,0%	**A Iniciar**		
3		**PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)**								**0,0%**	**A Iniciar**		
3.1	**Prestação de contas final**	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	INSA	01/10/2023	30/11/2023					0,0%	**A Iniciar**		
3.2	**Elaboração de Relatório Final**	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	01/12/2023	30/01/2024					0,0%	**A Iniciar**		
3.3	**Análise da prestação de contas financeiras**	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	31/01/2024	31/03/2024					0,0%	**A Iniciar**		
				Valor Previsto:		R$ 479.849,09	**Valor realizado:**		R$ 211.365,09	43%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
INSA
Observações:
Processo SEI n.º 59336.000816/2020-46 - TED INSA PALMA
Observação: Todas as datas do status "em andamento" foram atualizadas com a ajuda da Sra. Jucilene Araújo, tecnologista MCTI/Instituto Nacional do Semiário.

Fonte: CGEP

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGEP/2020004 (EX PO 21)**
Objetivo estratégico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2020**

Programa do PPA:	Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	**Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação**	**Objetivo estratégico (MDR):**	I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismos econômico e social
Objetivo da ação:	Desenvolvimento, incorporação e difusão de novas tecnologias, produtos e serviços, propiciando inserção no mercado e agregação de valor. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a viabilizar condições para implantar estruturas produtivas baseadas na inovação, informa		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Necessidade de difusão de tecnologias e capacitação dos agricultores, familiares e técnicos atuantes nas comunidades dos municípios de Cajazeirinhas, Coremas, Paulista, Pombal e São Bento, no Estado da Paraíba, Jardim de Piranhas, Jucurutu e Itajá no Estado do Rio Grande do Norte, localizados na bacia hic		
Projeto:	Diagnóstico Produtivo, Análises Zootécnicas, Aspectos Gerenciais e Propostas de Soluções para a Bovinocultura de Leite da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, Brasil		
Objetivo do projeto:	Conhecer os sistemas de produção da bovinocultura de leite, seus aspectos zootécnicos e gerenciais, para propor soluções de manejo adequadas para os diversos sistemas produtivos, adequando-os às condições edafo-climáticas da bacia hidrográfica do Rio Piranhas-Açu e, levando capacitação e novas		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto**	**Valor Total do Projeto**
	250 e 280	3	90	R$ 251.412,28	R$ 251.412,28
	250 e 280	4	90	R$ 47.520,00	R$ 47.520,00
					R$ 298.932,28

Ata 360o Reunião de Diretoria Colegiada

Previsão de Conclusão:	04/08/2023
Data Atualização:	30/09/2021

Processo 59336.001084/2020-10 - TED Sudene INSA nº 001/2020

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício (2020 e 2021)	R$	218.511,98
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$	218.511,98
Valor Empenhado no Exercício (2020 e 2021)		218.511,98
Valor liberado no Exercício		218.511,98
Saldo a liberar		
Saldo a Empenhar no exercício		
Total Liberado até o exercício	R$	218.511,98

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto		
	CGEP/SUDENE:	Mauro Bezerra e Aildo Sabino
	INSA:	GEOVERGUE RODRIGUES DE MEDEIROS

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1		**PLANEJAMENTO (Peso 20%)**								**20%**	**Concluído**		
1.1	**Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira**	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	13/07/2020	11/08/2020		13/07/2020	11/08/2020		100,0%	**Concluído**		
1.2	**Analise jurídica**	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	11/08/2020	01/09/2020		11/08/2020	01/09/2020		100,0%	**Concluído**		
1.3	**Elaboração da minuta do TED**	Elaboração do minuta do TED	COCIC	01/09/2020	29/09/2020		01/09/2020	29/09/2020		100,0%	**Concluído**	A minuta do TED precisou ser alterada devido a aprovação do DECRETO Nº 10.426, DE 16 DE JULHO DE 2020. Foi necessário também alterar a minuta padrão de TED e de Plano de Trabalho	
1.4	**Assinatura do TED**	Assinatura do TED	GABINETE / INSA	30/09/2020	09/10/2020		05/10/2020	05/10/2020		100,0%	**Concluído**		
1.5	**Publicação do TED**	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	30/09/2020	09/10/2020		07/10/2020	07/10/2020		100,0%	**Concluído**		
2		**EXECUÇÃO (Peso 60%)**								**21%**	**A Iniciar**		
2.1	**Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros**		CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	09/10/2020	16/10/2020	R$ 75.397,01	14/10/2020	19/02/2021	R$ 75.397,01	100,0%	**Concluído**	Em 14/10/2020 foi feita a primeira descentralização de crédito 2020NC000002 no valor de R$ 75.397,01. O recurso foi transferido para o INSA no mês de outubro/2020, porém, devido aos trâmites documentais para contratar a fundação de apoio, não houve tempo hábil para o valor da primeira parcela do TED ser empenhado e, no final do mês de dezembro, o recurso foi devolvido para a SUDENE. Em 19/02/2021, por solicitação do INSA foi realizada nova descentralização financeira conforme Doc SIAFI conforme Doc SEI 0224589, pasta VII do Proc 59336.001084/2020-10.	

2.2	**Meta 1: Realização de um diagnóstico sobre os sistemas de produção em propriedades localizadas na bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu nas cidades de Cajazeirinhas, Coremas, Paulista, Pombal e São Bento, no Estado da Paraíba, Jardim de Piranhas, Jucurutu e Itajá no Estado do Rio Grande do Norte**	Produto:diagnóstico sobre os sistemas de produção	INSA	16/10/2020	12/08/2021	R$ 26.570,08	19/02/2021			75,0%	**Em Andamento**	Cada etapa da meta, quando finalizada equivale a 20%. 5 etapas x 20 = 100% Etapa 1.1. – está sendo feito o levantamento bibliográfico = 10% realizada; Etapa 1.2. Todos os atores (produtores, secretários e secretárias municipais e técnicos já foram mobilizados) – 20% realizado Etapa 1.3. Já foram realizada as entrevistas dos municípios de Cajazeirinhas, Paulista, Pombal, São Bento e Coremas, no Estado da Paraíba, Jardim de Piranhas, Jucurutu e Itajá no Estado do Rio Grande do Norte, totalizando 182	
2.3	**Meta 2: Avaliação dos aspectos zootécnicos e tecnológicos da produção de leite das propriedades rurais da bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu**	Produto: Avaliação dos aspectos zootécnicos e tecnológicos da produção de leite	INSA	15/03/2021	08/06/2022	R$ 12.687,37				0,0%	**A Iniciar**	Meta ainda não iniciada. De acordo com a metodologia, será iniciada quando todos as entrevistas forem realizadas e das 200 (duzentas) propriedades abrangidas pelo projeto, serão selecionadas 100 (cem) propriedades para a realização desta meta	
2.4	**Meta 3: Avaliação da composição químico bromatológica das dietas que são utilizadas nos períodos seco e chuvoso para os animais em produção em pelo menos 100 propriedades rurais estudadas**	Produto: Avaliação da composição químico bromatológica das dietas	INSA	14/01/2021	05/11/2022	R$ 22.720,81				0,0%	**A Iniciar**	Meta ainda não iniciada. De acordo com a metodologia, será iniciada quando todos as entrevistas forem realizadas e das 200 (duzentas) propriedades abrangidas pelo projeto, serão selecionadas 100 (cem) propriedades para a realização desta meta	
2.5	**Meta 4: Avaliação os aspectos de gestão das propriedades estudadas em função do tipo de sistema de produção adotado**	Produto: Avaliação os aspectos de gestão das propriedades estudadas	INSA	13/02/2021	09/05/2022	R$ 6.300,13				0,0%	**A Iniciar**	Meta ainda não iniciada. De acordo com a metodologia, será iniciada quando todos as entrevistas forem realizadas e das 200 (duzentas) propriedades abrangidas pelo projeto, serão selecionadas 100 (cem) propriedades para a realização desta meta	
2.6	**Meta 5: Avaliação da qualidade físico química, microbiológica e perfil de ácidos graxos do leite produzido nas propriedades estudadas**	Produto: Avaliação da qualidade físico química, microbiológica e perfil de ácidos graxos	INSA	14/01/2021	15/04/2022	R$ 75.004,62				0,0%	**A Iniciar**	Meta ainda não iniciada. De acordo com a metodologia, será iniciada quando todos as entrevistas forem realizadas e das 200 (duzentas) propriedades abrangidas pelo projeto, serão selecionadas 100 (cem) propriedades para a realização desta meta	
2.7	**Meta 6: Capacitação de produtores, técnicos e estudantes sobre a produção e o estoque de forragens para a melhoria do manejo alimentar de bovinos leiteiros**	Produto: Capacitação de produtores, técnicos e estudantes	INSA	13/07/2021	09/05/2022	R$ 22.530,00				0,0%	**A Iniciar**		
2.8	**Meta 7: Realização de dois eventos sobre a melhoria dos sistemas de produção de leite na região da bacia do rio Piranhas-Açu**	Produto: Dois eventos sobre a melhoria dos sistemas de produção de leite na região da bacia do rio Piranhas-Açu	INSA		04/01/2023	R$ 23.726,04				0,0%	**A Iniciar**		
2.9	**Meta 8: Publicação de pelo menos três artigos científicos; três documentos técnicos (boletim, cartilha ou comunicado técnico) e 2 vídeos orientadores com informações sobre o manejo dos animais, manejo das pastagens e sobre os sistemas de produção mais adequados para a região da bacia hidrográfica Piranhas-Açu**	Produto: Três artigos científicos	INSA	13/06/2021	03/02/2023	R$ 4.500,00				0,0%	**A Iniciar**		
2.10	**Meta 9: Seleção da equipe de bolsistas para participar do estudo e realização, em conjunto com a equipe técnica responsável, do diagnóstico e das atividades do projeto**	Produto: Seleção de equipe	INSA	15/12/2020	14/01/2021	R$ 75.000,00	05/03/2021	28/04/2021		100,0%	**Concluído**	Bolsistas selecionados: a) Lucas Assis Lourenço e Thamires Queiroga dos Santos – Bolsa Longa duração no país BLD-IT - Iniciação Tecnológica, com vigência de 01/05/2021 a 01/08/2023, por meio do Edital nº 005/2021 - Processo Seletivo Simplificado – SEI INSA (6713726) b) Wendel Pires Carneiro - Bolsa Longa duração no país/BLD-DT- Desenvolvimento Tecnológico, com de vigência de 01/05/2021 a 01/08/2023, por meio do Edital nº 009/2021 - SEI INSA (6999729)	
2.11	**Meta 10: Elaboração de relatórios de acompanhamento trimestrais e relatório final.**	Produto: Relatórios	INSA	14/01/2021	08/06/2022	Não se aplica	19/02/2021			20,0%	**Em Andamento**	Já foi enviado o Primeiro e Segundo Relatório Trimestral referente ao período de janeiro a junho/2021 SEI INSA (7198432). O terceiro relatório trimestral, referente a julho-setembro/2021 esta sendo elaborado	
2.12	**1ª Prestação de contas parcial**	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	01/01/2021	30/01/2021	-	01/03/2021	25/03/2021		100,0%	**Concluído**	O primeiro relatório trimestral foi encaminhado pelo INSA em 25/03/2021. O documento foi analisado pela equipe técnica e aprovado em 25/05/2021 pelo Parecer Técnico 28.	
2.13	**Liberação da segunda parcela de recursos**	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/02/2021	28/02/2021	**R$ 143.114,97**	19/08/2021	23/09/2021	**R$ 143.114,97**	100,0%	**Concluído**		

2.14	**2ª Prestação de contas parcial**	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	INSA/CGEP	01/01/2022	30/01/2022						**A Iniciar**		
2.15	**Liberação da terceira parcela de recursos**	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/02/2022	28/02/2022	**R$ 80.420,30**				0,0%	**A Iniciar**		
3		**PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)**								**0,0%**	**A Iniciar**		
3.1	**Prestação de contas final**	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	INSA	03/02/2023	04/04/2023					0,0%	**A Iniciar**		
3.2	**Elaboração de Relatório Final**	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	05/04/2023	04/06/2023					0,0%	**A Iniciar**		
3.3	**Análise da prestação de contas financeiras**	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	05/06/2023	04/08/2023					0,0%	**A Iniciar**		
				Valor Previsto:		R$ 298.932,28	**Valor realizado:**		R$ 218.511,98	41%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
INSA
Observações:
Processo SEI n.º 59336.001084/2020-10 - TED INSA LEITE. A diferença de R$ 29.893,23 entre o valor previsto e o valor total do projeto diz respeito aos custos administrativos não inclusos no Plano de Trabalho original (Plano de Trabalho CGEP SEI 0184994)

Fonte: CGEP

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGEP/2020006 (EX PO 23)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2020**

Programa do PPA:	-	**Eixo temático (MDR):**	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	-	**Objetivo estrátegico (MDR):**	econômico e social
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Anexo I ao Decreto nº 8.276/2014 Art. 4º Ao Conselho Deliberativo compete: XIII - em relação ao Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE: d) definir os critérios de aplicação dos recursos destinados ao custeio de atividades em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia de interesse do desenvolvimento regional, correspondentes a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), calculado sobre o produto do retorno das operações de financiamentos concedidos pelo FNDE [sic].		
Projeto:	INOVA + NE: Edital de subvenção econômica para inovação com o recurso correspondentes a 1,5% calculado sobre o produto do retorno das operações de financiamentos concedidos pelo FNDE		
Objetivo do projeto:	Propor ao Condel critérios de aplicação dos recursos destinados ao custeio de atividades em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia de interesse do desenvolvimento regional, correspondentes a 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), calculado sobre o produto do retorno das operações de		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	02/03/2023
Data Atualização:	30/09/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Aildo Sabino, Joyce Queiroz e Marcus Paz

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	**Planejamento**									**70%**	**Em Andamento**		
1.1	**Nota Técnica conjunta com proposta de critérios e prioridades ao Condel**	Definição dos critérios para aplicação da parcela de 1,5% do retorno do FDNE destinados para custeio de atividades em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia de interesse desenvolvimento regional.	CGCP, CGEP	01/06/2020	12/06/2020		01/06/2020	12/06/2020		100%	**Concluído**		
1.2	**Aprovação da Nota Técnica em Diretoria Colegiada**		CGEP	10/08/2020	10/08/2020		10/08/2020	10/08/2020		100%	**Concluído**	362ª ReuniãoExtraordinária daDiretoria Colegiada	
1.3	**Articulações com Parceiros (BNB, Confap, FINEP)**	Proposta de parceria com o Programa Centelha	CGEP	13/06/2020	30/10/2020		13/06/2020	10/11/2020		100%	**Concluído**	Foi definido pelo superintendente que não se iria colocar no Regulamento a ser aprovado no Condel a questão da delegação de competências de acompanhamento e fiscalização para o BNB e que a questão de editais conjuntos seriam definidos a posteriori. Assim, foi considerada como última reunião de articulação a de 11/10/2020 e as demais etapas foram paralisadas. Além disso, em conversa com o BNB, este indicou a impossibilidade de realização de edital conjunto no 1o semestre de 2021.	
1.4	**Nota Técnica complementar com proposta de critérios e prioridades ao Condel**		CGCP, CGEP	23/09/2020	23/10/2020		23/09/2020			50%	**Paralisado**	PO será reprogramado, após negociações com parceiros	
1.5	**Reunião de fechamento com parceiros para validação dos critérios**		CGEP	23/10/2020	30/10/2020					0%	**Paralisado**	PO será reprogramado, após negociações com parceiros	
1.6	**Aprovação da NT Complementar em Diretoria Colegiada e envio para aprovação AD REFEREDUM**		CGEP/Gabinete	01/11/2020	30/11/2020					0%	**Paralisado**	PO será reprogramado, após negociações com parceiros	
2	**Formalização**									**0%**	**A Iniciar**		
2.1	**Assintura de ACT Sudene, FINEP, BNB, CONFAP**		CGEP, BNB, FINEP, CONFAP	01/11/2020	31/12/2020					0%	**Paralisado**	PO será reprogramado, após negociações com parceiros	
2.3	**Preparação de Edital Conjunto Sudene-BNB**		CGEP, BNB	01/11/2020	31/01/2021					0%	**Paralisado**		
3	**Execução**									**0%**	**A Iniciar**		
3.1	**Lançamento do Edital Conjunto Sudene-BNB**		CGEP, BNB	01/02/2021	10/06/2021					0%	**Cancelado**		

3.2	**Contratação dos projetos de fomento**		BNB	10/06/2021	09/08/2021					0%	**Cancelado**		
3.3	**Acompanhamento dos projetos contratados**		CGEP, BNB	09/08/2021	04/08/2022					0%	**Cancelado**		
3.4	**Avaliação técnica final**		CGEP, BNB	04/08/2022	03/10/2022					0%	**Cancelado**		
4	**Prestação de Contas**									**0%**	**Cancelado**		
4.1	**Prestação de contas final**	Envio da prestação de contas final pelo BNB	BNB	03/10/2022	02/12/2022					0%	**Cancelado**		
4.2	**Elaboração de Relatório Final**	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	02/12/2022	02/03/2023					0%	**Cancelado**		
				Valor Previsto:		R$ -	**Valor realizado:**		R$ -	17,5%	**Cancelado**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Observações:

Observação: Nova estratégia está em processo de implementação e este Plano Operativo será reescrito.

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1 - Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste.**	**Número do Projeto:**	**PO CGEP/2020007 (EX PO 24)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias de APLs, estimulando inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.**	**Ano:**	**2020**

Programa do PPA:	-	**Eixo temático (MDR):**	-
Ação do PPA:	-	**Objetivo estrátegico (MDR):**	-
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Escassez de estudos com recortes regionais abrangentes que, ao mesmo tempo, permitam obter um entendimento com maior precisão dos efeitos adversos da pandemia nos territórios e obter uma visão consolidada sobre os desafios do setor produtivo e o impacto social da crise.		
Projeto:	Pesquisa de opnião sobre os efeitos decorrentes da Pandemia Covid-19 na área de atuação da Sudene - Processo nº 59336.000790/2020-36		
Objetivo do projeto:	Levantar informações sobre a atual situação do setor produtivo da região e seus desdobramentos para a sociedade, bem como quais são os desafios, demandas e perspectivas, para nortear as ações da Sudene para o adequado enfrentamento e superação da crise na região, crise essa que tem consequências tanto econômicas quanto sociais.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	280	3 - Outras despesas correntes	90	R$ 349.500,00	R$ 349.500,00

Previsão de Conclusão:	06/08/2021
Data Atualização:	30/09/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Maria da Glória Sistêlos, Gabriela Nascimento, Tássia Germano, Marina Rogério e Miguel Vieira

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R$ -
A realizar no exercício	R$ 349.500,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$ 349.500,00
Valor Empenhado no Exercício	
Valor liberado no Exercício	R$ 349.500,00
Saldo a liberar	R$ -
Saldo a Empenhar no exercício	
Total Liberado até o exercício	R$ 349.500,00

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	**Abertura do Projeto**			**18/05/2020**	**20/05/2020**	-	**18/05/2020**	**20/05/2020**		**100%**	**Concluído**		
1.1	Análise técnica da proposta inicial	Análise técnida da proposta de Estudo de Pesquisa de Opinião	CGEP	18/05/2020	20/05/2020	-	18/05/2020	20/05/2020		100%	**Concluído**		
2.	**Trâmites de contratação**			**02/06/2020**	**03/12/2020**	-	**02/06/2020**			**100%**	**Concluído**	**Considerando a revogação do 1º Edital, a coluna K contempla as datas de execução final tanto dos documentos que não necessitaram de alteração quanto daqueles relativos à tramitação do 2º edital. Ocorreu reprogramação dos prazos deste último, os quais iniciam no item 2.7. Considerando a revogação do 2º Edital (SEI 0193555)**	
2.1	Documentação de Formalização da Demanda	Elaboração do Documento de Formalização da Demanda	CGEP/DPLAN	02/06/2020	23/06/2020	-	02/06/2020	27/07/2020		100%	**Concluído**	A entrega da primeira versão foi realizada em 23/06/2020. Entretanto, foram solicitados ajustes e adequações quanto ao	
2.2	Mapeamento de Riscos	Elaboração do mapeamento de riscos do projeto	CGEP	02/06/2020	23/06/2020	-	02/06/2020	27/07/2020		100%	**Concluído**	A entrega da primeira versão foi realizada em 23/06/2020. Entretanto, foram solicitados ajustes e adequações quanto ao conteúdo e forma.	
2.3	Estudo Técnico Preliminar	Elaboração do Estudo Técnico Preliminar, contemplando metodologia da pesquisa, cotação de preços	CGEP	02/06/2020	23/06/2020		02/06/2020	23/10/2020		100%	**Concluído**		
2.4	Termo de Referência	Elaboração do Termo de Referência	CGEP	02/06/2020	23/06/2020		02/06/2020	23/10/2020		100%	**Concluído**		
2.5	Edital	Elaboração do Edital com base com TR	COLIC	23/06/2020	13/07/2020		06/08/2020	27/10/2020		100%	**Concluído**	Minuta do Edital	
2.6	Análise jurídica do Edital	Análise jurídica do Edital	Procuradoria	13/07/2020	28/07/2020		14/08/2020	06/11/2020		100%	**Concluído**		
2.7	Ajustes do Edital	Ajustes do Edital, de acordo com as recomendações da Procuradoria, se houver.	COLIC/CGEP	06/11/2020	09/11/2020		06/11/2020	06/11/2020		100%	**Concluído**	Datas reprogramadas a partir desta atividade	
2.8	Abertura do Processo Licitatório	Abertura do Processo Licitatório e respostas a possíveis questionamentos	COLIC/CGEP	10/11/2020	19/11/2020		09/11/2020	19/11/2020		100%	**Concluído**		
2.9	Qualificação do licitante	Análise da Qualificação Financeira e Técnica do Licitante	CGEP/COLIC	19/11/2020	23/11/2020		19/11/2020	16/12/2020		100%	**Concluído**	Essa etapa durou mais do que o esperado, uma vez que houve a necessidade de analisar a documentação de habilitação técnica de 8 empresas	
2.10	Finalização do Processo Licitatório	Finalização do Processo Licitatório - Homologação e Adjudicação	COLIC	23/11/2020	27/11/2020		16/12/2020	16/12/2020		100%	**Concluído**		
2.11	Assinatura do Contrato	Assinatura do Contrato	COLIC	27/11/2020	03/12/2020	R$ 349.500,00	22/12/2020	25/08/2021	R$ 349.500,00	100%	**Concluído**	valor empenhado em 17/12/2020. o valor será pago com a entrega dos produtos.	
3	**Acompanhamento da execução**			**03/12/2020**	**06/08/2021**	-	**25/08/2021**	**11/08/2021**		**100%**	**Concluído**	**Considerando a data da assinatura do Contrato (22/12/2020) e solicitação justificada da Contratada para reprogramação dos prazos (Doc SEI 0216910), as datas das atividades abaixo foram reprogramadas. De acordo com os documentos SEI (0229350, 0229351, 0229438, 0233780) houve necessidade de uma nova reprogramação das datas devido a fatores não previstos que envolviam a coleta de dados e que impactaram na execução do projeto. Destaque-se que a reprogramação se deu para as etapas seguintes do projeto, incluindo a própria etapa de coleta de dados. Conforme os documentos SEI (0253728 e 0253678), houve necessidade de uma nova reprogramação de datas devido a fatores não previstos que envolviam a coleta de dados e que impactaram na execução do projeto.**	

3.1	Planejamento	Acompanhamento e validação do cronograma de execução, roteiros e questionários da pesquisa	CGEP	23/12/2020	24/01/2021		23/12/2020	25/01/2021		100%	**Concluído**		
3.2	Pré - teste	Acompanhamento e validação do teste do instrumento da coleta de dados e respectivo relatório	CGEP	25/01/2021	08/02/2021		28/01/2021	04/03/2021		100%	**Concluído**	Datas reprogramadas	
3.3	Coleta de Dados	Acompanhamento e validação da coleta de dados e respectivo relatório	CGEP	09/02/2021	09/07/2021		09/02/2021	29/06/2021		100%	**Concluído**	Datas reprogramadas	
3.4	Base de Dados	Acompanhamento e validação da base de dados	CGEP	09/02/2021	09/07/2021		09/02/2021	06/08/2021		100%	**Concluído**	Datas reprogramadas	
3.5	Relatório de resultados	Validação dos relatórios com resultados da pesquisa (Sudene e UFs)	CGEP	13/04/2021	09/07/2021	-	21/05/2021	11/08/2021		100%	**Concluído**	Datas reprogramadas	
3.2	Resumo Executivo e Apresentação	Validação do Resumo Executivo e apresentação	CGEP	14/05/2021	06/08/2021	-	17/06/2021	06/08/2021		100%	**Concluído**	Datas reprogramadas	
				Valor Previsto:		R$ 349.500,00	**Valor realizado:**		R$ 349.500,00	100%	**Concluído**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Observações:

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGEP/2020008 (EX PO 28)**
Objetivo estrátegico:	**1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes**	**Ano:**	**2020**
Programa do PPA:		**Eixo temático (MDR):**	
Ação do PPA:		**Objetivo estrátegico (MDR):**	
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	efetividade desses recursos. A Portaria Interministerial Nº 7, de 20 de julho de 2020, do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Ministério da Economia, definiu as diretrizes para essas atividades de avaliação.		
Projeto:	Avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE.		
Objetivo do projeto:	Aferir a eficácia, a eficiência, a efetividade e o retorno econômico e social da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional do Nordeste na área de atuação da Sudene.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	170	3 - Outras Despesas Correntes	90	A definir	A definir

Previsão de Conclusão:	15/11/2021
Data Atualização:	30/09/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Tássia Germano e Gabriela Isabel

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercicio	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1.	**Planejamento - Elaboração de Plano de Trabalho FNE - 2020/21 (Peso 30%)**									**30%**	**Concluído**		
1.1	Elaboração do Plano de Trabalho	Elaboração do Plano de Trabalho referente ao 1º ano do ciclo de avaliçãoes do FNE (2020/21) em resposta à Portaria Interministerial Nº 7, de 20 de julho de 2020. O	COAE/CGEP	29/07/2020	30/10/2020	-	29/07/2020	28/10/2020	-	100%	**Concluído**	A Sudene encaminhou o Plano de Trabalho ao MDR por meio do Ofício nº 2319/2020-GAB/SUDENE, de 28 de outubro de 2020.	
1.2	Ratificação do Plano de Trabalho pelo MDR e ME	Ratificação ou sugestão de mudanças do Plano de Trabalho pelos Ministérios do Desenvolvimento Regional e da Economia	MDR e ME	30/10/2020	30/11/2020	-	30/10/2020	04/02/2021		100%	**Concluído**	Seguindo os prazos da Portaria Interministerial Nº 7, de 20 de julho de 2020, do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Ministério da Economia, os ministérios deveriam enviar a análise do Plano de Trabalho em até 30 dias. Contudo, não houve resposta no tempo estimado. Em 04 de fevereiro de 2021, por meio do Ofício nº 11/2021/SFI/Gabinete SE-MDR, os Ministérios encaminharam o resultado da apreciação conjunta dos Ministérios.	Em 22 de dezembro de 2020, por meio do Ofício Nº 2849/2020/GAB/SUDENE, a Sudene encaminhou diretamente ao ME o Plano de Trabalho enviado ao MDR em 28/10/2020 e informou que aguardava posicionamento quanto ao novo prazo de apreciação conjunta do MDR/ME.
1.3	Alterações no Plano de Trabalho das avaliações do FNE - 2020/21	Alterações no Plano de Trabalho referente ao 1º ano do ciclo de avaliçãoes do FNE (2020/21) para inserção das considerações realizadas pelo MDR e ME.	COAE/CGEP	30/11/2020	04/12/2020		01/03/2021	19/03/2021		100%	**Concluído**	Por meio do OFÍCIO Nº 573/2021/GAB/SUDENE, de 19 de março de 2021, a Sudene respondeu às considerações apontadas no Ofício nº 11/2021/SFI/Gabinete SE-MDR, de fevereiro de 2021, e encaminhou nova versão do Plano de	Em paralelo à análise das considerações para aprimoramento do Plano Trabalho sobre a avaliação do FNE neste primeiro ano, que foram apontadas no Ofício nº 11/2021/SFI/Gabinete SE-
2.	**Planejamento - Edital e seleção de parceiro(s) para execução das avaliações do FNE (Peso 70%)**									**13%**			
2.1	Elaboração de Termo de Abertura do Projeto - TAP e apresentação de proposta	Elaborar e apresentar TAP com a descrição dos objetivos, estratégias e etapas a serem seguidas para a contratação das avaliações definidas. É necessário aprovação do escopo pela Coordenação-Geral.	COAE/CGEP	17/02/2021	19/02/2021					0%	**Cancelado**	As atividades foram comprometidas devido a priorização para dar seguimento aos projetos: (i) Pesquisa sobre os efeitos da Covid-19 na área de atuação da Sudene (Processo 59336.000790/2020-36); (ii) Índice de Confiança do Consumidor e de Expectativa do Empresário Industrial para os estados da região Nordeste; (iii) Plano de Ações e estudo sobre os desafios e potencialidades do setor têxtil em Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe. Além disso, no mês de março uma das servidoras alocadas no projeto gozou férias e a outra esteve envolvida com as atividades dos Cursos Modelo de Excelência em Gestão	

2.2	Solicitação de autorização da DPLAN para prosseguir com as tratativas para elaboração e lançamento de edital de chamamento público	Elaborar e enviar documento solicitando autorização da DPLAN para seguir com as tratativas necessárias elaboração e publicação de edital de chamamento público para seleção de parceiro(s) executor(es) para as avaliações do FNE do 1º ano do ciclo de avaliações (Plano de Trabalho 2020/2021).	COAE/CGEP	22/02/2021	23/02/2021					0%	**Cancelado**	dos Órgãos e Entidades que Operam Transferências da União – MEG-Tr e de Planejamento Estratégico. Em razão de todas as etapas e prazos de análise e autorização internos que eram necessários para o lançamento de Edital de Chamamento Público e somado ao comprometimento dos técnicos com uma série de outras projetos e atividades, optou-se por não seguir neste ano com o Edital de Chamamento Público para seleção de proposta(s) para execução das avaliações do FNE, referente ao 1º ano do ciclo de avaliações. Em consulta realizada à Procuradoria junto à Sudene, em 26/05/2021, por videoconferência, houve orientação de que poderiam ser encaminhados Ofícios a Instituições, solicitando propostas de orçamento e metodologias, de modo a simplificar o processo diante das muitas demandas, obtendo alternativas como forma de melhor aquilatar quais as diversas possibilidades de se levar a avaliação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE a cabo. Assim, em 11 de junho de 2021, a CGEP encaminhou para a DPLAN 17 ofícios endereçados às Universidades Federais com solicitação de propostas de metodologia e orçamento, visando à celebração de parceria e formalização de Termo de Execução Descentralizada (Despachos SEI 0250225 e 0249586), os quais foram encaminhados para o Gabinete na mesma data (Despacho 0250255) sendo encaminhados às Universidades em 16 de junho. Conforme explicitado nos Ofícios (ver Processo SEI 59336.001165/2020-10), foi designado um prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento do ofício, para recebimento da proposta de metodologias visando à execução das avaliações, para que se possa analisar a viabilidade de formalização de parceria com alguma Universidade, em alinhamento ao orçamento da Sudene e, em caso positivo, produzir documento a ser submetido à apreciação das alçadas competentes desta Superintendência. A avaliação pretendida, a ser implementada por meio da parceria, deve abordar as análises de eficiência, eficácia e efetividade, conforme determinado na Lei Nº 7.827 e na Portaria Interministerial Nº 7, além da análise do retorno econômico e social da aplicação dos recursos do FNE. Para construção das avaliações foi previsto um prazo de 12 meses para a vigência do TED a ser celebrado com a instituição(ões) com a(s) proposta(s) vencedora(s).	
2.3	Apreciação da solicitação para abertura de Edital de Chamamento Público pela Diretoria Colegiada	Seguida a aprovação da DPLAN, o assunto deverá ser encaminhado ao Gabinete para ser apreciado e aprovado em reunião de Diretoria Colegiada, se for o caso.	DPLAN e Gabinete	23/02/2021	03/03/2021					0%	**Cancelado**		
2.4	Pesquisa e análise de documentos para subsidiar a elaboração de Edital de Chamamento Público	Pesquisa e análise de documentos para subsidiar a elaboração de Edital para chamamento público que visa selecionar parceiro(s) para a execução das avaliações do FNE desenhadas no Plano de Trabalho 2020/21.	COAE/CGEP	22/02/2021	26/02/2021					0%	**Cancelado**		
2.5	Reunião com a ASCOM para tratar sobre a divulgação do Edital	Apresentar a ASCOM os objetivos gerais do projeto e informar sobre a necessidade de divulgação da seleção nas redes das Sudene quando o edital estiver concluído.	COAE/CGEP e ASCOM	01/03/2021	01/03/2021					0%	**Cancelado**		
2.6	Elaboração de Edital de chamamento público	Elaborar edital de chamamento público a fim de selecionar entidade(s)/orgão(s) da União para executar as avaliações	COAE/CGEP	01/03/2021	12/03/2021					0%	**Cancelado**		
2.7	Estimativa de preços e elaboração	Consulta de preços para estimar os custos do projeto e	COAE/CGEP	08/03/2021	12/03/2021					0%	**Cancelado**		
2.8	Apreciação do Edital pela Coordenação-Geral e DPLAN	Encaminhar o Edital para apreciação e deliberação da Coordenação-Geral da CGEP e, após, a Dplan	CGEP e DPLAN	15/03/2021	17/03/2021					0%	**Cancelado**		
2.9	Ajustes no Edital	Adequações no Edital após apreciação da CGEP e DPLAN, caso	COAE/CGEP	18/03/2021	22/03/2021					0%	**Cancelado**		
2.10	Definição da comissão técnica para	técnica para avaliação das propostas juntamente com	CGEP	18/03/2021	25/03/2021					0%	**Cancelado**		
2.11	Solicitação para a publicação do Edital	Elaboração de texto sobre o projeto e lançamento do edital para subsidiar a matéria de divulgação da ASCOM. Deve-se encaminhar o Edital para o Gabinete/Sudene e a ASCOM para divulgação no Diário Oficial e no site da	COAE/CGEP	22/03/2021	23/03/2021					0%	**Cancelado**		
2.12	Publicação do Edital	Publicação do Edital no site da Sudene e no DOU	GABINETE/SUDENE e ASCOM	24/03/2021	26/03/2021					0%	**Cancelado**		
2.13	Divulgação do Edital de Chamamento Público	Divulgação do Edital no site e nas redes sociais da Sudene. Mobilização de possíveis parceiros por e-mail também.	ASCOM e COAE/CGEP	26/03/2021	09/04/2021					0%	**Cancelado**	Não se seguiu com o Edital de Chamamento Público para recepção de propostas de avaliação, mas sim, foi feita realizada solicitação às Universidades via Ofício e encaminhado e-mail às reitorias e coordenações de Pós-Graduação em Economia, em 16 de junho de 2021.	
2.14	Recebimento das propostas	Recebimento das propostas (técnica e financeira)	COAE/CGEP	29/03/2021	30/04/2021		16/06/2021	01/07/2021		100%	**Concluído**	Em razão de todas as etapas e prazos de análise e autorização internos que eram necessários para o lançamento de Edital de Chamamento Público e somado ao comprometimento dos técnicos com uma série de outras projetos e atividades, optou-se por não seguir neste ano com o Edital de Chamamento Público para seleção de proposta(s) para execução das avaliações do FNE, referente ao 1º ano do ciclo de avaliações. Em consulta realizada à Procuradoria junto à Sudene, em 26/05/2021, por videoconferência, houve orientação de que poderiam ser encaminhados Ofícios a Instituições, solicitando propostas de orçamento e metodologias, de modo a simplificar o processo diante das muitas demandas, obtendo alternativas como forma de melhor aquilatar quais as diversas possibilidades de se levar a avaliação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE a cabo. Assim, em 11 de junho de 2021, a CGEP encaminhou para a DPLAN 17 ofícios endereçados às Universidades Federais com solicitação de propostas de metodologia e orçamento, visando à celebração de parceria e formalização de Termo de Execução Descentralizada (Despachos SEI 0250225 e 0249586), os quais foram encaminhados para o Gabinete na mesma data (Despacho 0250255) sendo encaminhados às Universidades em 16 de	

2.15	Audiência prévia	Videoconferência com possíveis interessados para apresentar os objetivos do projeto e sanar possíveis dúvidas.	COAE/CGEP	09/04/2021	09/04/2021		16/06/2021	30/06/2021		100%	**Concluído**	Dado que se optou por não se seguir com a publicação de Edital de Chamamento Público, não houve a realização de consulta pública. Contudo, foi disponibilizado canal para tirar dúvidas via a Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação - CGEP, por meio do e-mail (coae@sudene.gov.br). Algumas universidades que receberam o Ofício da Sudene com a solicitação de propostas para as avaliações do FNE encaminharam dúvidas por e-mail, sendo respondidas pelo mesmo canal. Duas universidades solicitaram uma videoconferência para tratar de dúvidas e foram ouvidas. Outras, mantiveram contato telefônico direto com o Coordenador-Geral da CGEP.	
2.16	Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	COAE/CGEP	09/04/2021	13/04/2021		16/06/2021	30/06/2021		100%	**Concluído**		
2.17	Repostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	Repostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	COAE/CGEP	13/04/2021	16/04/2021		16/06/2021	30/06/2021		100%	**Concluído**		
2.18	Análise técnica das propostas	Análise técnica das propostas e emissão de parecer técnico com a justificativa para celebração de TED para a(s) proposta(s) selecionada(s).	COAE/CGEP	12/07/2021	06/10/2021		12/07/2021			65%	**Em Andamento**	Em 16 de junho de 2021, foram encaminhados Ofícios às Universidades. A recepção das propostas se deu até o dia 03/07/2021. É necessário considerar um prazo maior para essa análise técnica, pois essa etapa também envolve possíveis negociações e considerações de ajustes das propostas recebidas e nova avaliação das propostas. Ao final desse processo, será emitido parecer técnico com as justificativas para celebração de TED em relação a(s) proposta(s) mais vantajosa. Estima-se adotar dois critérios para avaliação, primeiro a questão técnica para avaliar a qualidade da proposta e em seguida a análise da proposta financeira. Em razão do cronograma de conclusão e encaminhamento de outros projetos em curso, o prazo limite estimado pela Coordenação para análise das propostas foi o dia 16 de agosto de 2021 (SEI 0256752 - Processo 59336.001165/2020-10). Contudo, o prazo inicialmente estabelecido não pôde ser cumprido em face da priorização de outros projetos. A análise das propostas e os trâmites necessários para celebração do TED teve início programado para agosto de	
2.19	Análise e aprovação das propostas selecionadas para celebração de TED - CGEP e DPLAN	Solicitação de autorização da DPLAN para celebração de TED das propostas selecionadas.	CGEP e DPLAN	09/10/2021	10/10/2021					0%	**A Iniciar**	O recebimento das propostas das universidades para as avaliações do FNE ocorreu entre o final de junho e os primeiros dias de julho. Em face da priorização de outros projetos, a análise das propostas e os trâmites necessários para celebração do TED teve início programado para agosto de 2021.	
2.20	Análise e aprovação das propostas selecionadas em Diretoria Colegiada	Aprovação das propostas selecionadas em Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	11/10/2021	18/10/2021					0%	**A Iniciar**		
2.21	Apreciação jurídica do processo pela Procuradoria Federal junto à Sudene	Elaborar parecer jurídico sobre a celebração do instrumento	Procuradoria Federal junto à Sudene	18/10/2021	01/11/2021					0%	**A Iniciar**		
2.22	Emissão de Parecer técnico final	Elaborar parecer técnico após a apreciação da Procuradoria Federal junto à Sudene	COAE/Sudene	01/11/2021	03/11/2021					0%	**A Iniciar**		
2.23	Análise e trâmites para celebração de TED relacionados ao setor de contratos e convênios	Análise e trâmites para contratação relacionados ao setor de convênios	COCIC/Sudene	18/10/2021	01/11/2021					0%	**A Iniciar**		
2.24	Elaboração do TED e checagem de documentos	Elaboração do TED e checagem de documentos para assinatura do instrumento	COCIC/Sudene	01/11/2021	06/11/2021					0%	**A Iniciar**		
2.25	Celebração do instrumento para contratação das avaliações	Assinatura do TED	Gabinete/Sudene e Parceiro executor	06/11/2021	10/11/2021					0%	**A Iniciar**		
2.26	Publicação do extrato do TED	Publicação do instrumento no Diário Oficial e no site da Sudene	Gabinete e ASCOM/Sudene	13/11/2021	15/11/2021					0%	**A Iniciar**		
				Valor Previsto:		R$ -	**Valor realizado:**		R$ -	21,3%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Observações:

Foram alteradas as datas de conclusão a partir da etapa 2.18 em função do atraso do MDR em definir pela aprovação do plano de trabalho. Data geral de conclusão também alterada para 15/11/2021.

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGEP/2020009 (EX PO 29)**
Objetivo estrátegico:	**1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido.**	**Ano:**	**2020**

Programa do PPA:	Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	**Ação 20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial**	**Objetivo estrátegico (MDR):**	1194 - Estimular o desenvolvimento de territórios, cidades e regiões, ampliando a estruturação produtiva e urbana e a provisão de serviços públicos para a redução das desigualdades socioeconômicas em múltiplas escalas
Objetivo da ação:	Monitoramento e avaliação periódica de planos, programas, políticas públicas, ações e projetos de desenvolvimento regional, incluídos os instrumento de financiamento (FNE, FDNE).		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Segurança hídrica no semiárido		
Projeto:	EFEITOS DO PROGRAMA CISTERNAS 1ª ÁGUA SOBRE INDICADORES DE MERCADO DE TRABALHO E SAÚDE DOS BENEFICIADOS		
Objetivo do projeto:	Avaliar o Programa Cisternas Efeitos do Programa Cisternas 1ª Água por meio de indicadores de mercado de trabalho e de saúde dos beneficiados.		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto**	**Valor Total do Projeto**
	280	-	90	R$ 384.000,00	R$ 384.000,00

Ata 372ª Reunião de Diretoria Colegiada

Previsão de Conclusão:	23/04/2022
Data Atualização:	30/09/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto		
	CGEP/SUDENE	Marina Barbosa; Miguel Araújo.
	UFPE	Breno Ramos Sampaio

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	384.000,00
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)		
Valor Empenhado/Descentralizado no Exercício		
Valor liberado/repassado no Exercício		
Saldo a liberar		
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	384.000,00

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1		**PLANEJAMENTO (Peso 20%)**								**20%**	**Concluído**		
1.1	**Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira**	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Decreto 10.426/2020 e elaboração de pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	11/11/2020	04/12/2020		11/11/2020	04/12/2020		100,0%	**Concluído**		
1.2	**Analise jurídica**	Análise e parecer juridico	PROCURADORIA	07/12/2020	22/12/2020		07/12/2020	22/12/2020		100,0%	**Concluído**		
1.3	**Elaboração da minuta do TED**	Elaboração do minuta do TED	COCIC	07/12/2020	07/12/2020		07/12/2020	07/12/2020		100,0%	**Concluído**		
1.4	**Assinatura do TED**	Assinatura do TED	GABINETE / UFPE	23/12/2020	23/12/2020		23/12/2020	23/12/2020		100,0%	**Concluído**		
1.5	**Publicação do TED**	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	24/12/2020	28/12/2020		24/12/2020	28/12/2020		100,0%	**Concluído**		
2		**EXECUÇÃO (Peso 60%)**								**15%**	**Em Andamento**		
2.1	**Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros**	Recursos liberados em parcela única	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	31/12/2020	31/12/2020	**R$ 384.000,00**	28/12/2020	28/12/2020	**R$ 384.000,00**	100,0%	**Concluído**		
2.2	**Meta 1: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de mercado de trabalho**	Relatório parcial: relatório parcial deve conter tabelas de dados descritivos, tabelas de resultados, gráficos, figuras e mapas, para todos os outcomes previstos (resultados preliminares e sujeitos a mudanças até o relatório final, dado feedback da equipes da UFPE e da SUDENE)	UFPE	01/01/2021	30/06/2021		01/01/2021	30/06/2021		100,0%	**Concluído**	No dia 25 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 17/2020, firmado com a UFPE. O Professor responsável pelo projeto, Breno Sampaio, juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. Em 30/06/2021, conforme previsto, o Relatório parcial foi entregue pela UFPE.	
2.3	**Análise**	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	30/06/2021	30/09/2021		01/07/2021	10/09/2021		100,0%	**Concluído**	Conforme o Despacho CGEP 0255150, o prazo para realização da análise foi redefinido para 30/09/2021.	
2.4	**Ajustes**	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	01/10/2021	16/10/2021		20/09/2021			55,0%	**Em Andamento**	Conforme o Despacho CGEP 0275255, o prazo para realização dos ajustes foi pactuado para 08/10/2021.	
2.5	**Aprovação**	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	17/10/2021	31/10/2021					0,0%	**A Iniciar**		
2.6	**Meta 2: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de saúde**	Relatório parcial: relatório parcial deve conter tabelas de dados descritivos, tabelas de resultados, gráficos, figuras e mapas, para todos os outcomes previstos (resultados preliminares e sujeitos a mudanças até o relatório final, dado feedback da equipes da UFPE e da SUDENE).	UFPE	01/01/2021	30/09/2021		01/01/2021	30/09/2021		100,0%	**Concluído**	No dia 25 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 17/2020, firmado com a UFPE. O Professor responsável pelo projeto, Breno Sampaio, juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. Em 30/09/2021, conforme previsto, o relatório parcial foi entregue pela UFPE.	

2.7	**Análise**	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	01/10/2021	31/10/2021					0,0%	**A Iniciar**		
2.8	**Ajustes**	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	01/11/2021	16/11/2021					0,0%	**A Iniciar**		
2.9	**Aprovação**	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	17/11/2021	02/12/2021					0,0%	**A Iniciar**		
2.10	**Meta 1: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de mercado de trabalho**	Relatório final: relatório final deve conter introdução, descrição dos dados e tabelas de dados descritivos, metodologia detalhada, apresentação dos resultados, descrição dos resultados, tabelas de resultados, gráficos, figuras e mapas, conclusões e implicações políticas.	UFPE	01/01/2021	31/12/2021		01/01/2021			60,0%	**Em Andamento**	No dia 25 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 17/2020, firmado com a UFPE. O Professor responsável pelo projeto, Breno Sampaio, juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. No dia 20 de setembro de 2021 foi realizada a segunda reunião de acompanhamento do TED 17/2020. O Projeto segue conforme previsto.	
2.11	**Meta 1: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de mercado de trabalho**	Seminário técnico para apresentação do relatório final, contando pdf da apresentação	UFPE	01/10/2021	31/12/2021					0,0%	**A Iniciar**		
2.12	**Meta 1: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de mercado de trabalho**	Resumo executivo	UFPE	01/10/2021	31/12/2021					0,0%	**A Iniciar**		
2.13	**Análise**	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	01/01/2022	31/01/2022					0,0%	**A Iniciar**		
2.14	**Ajustes**	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	01/02/2022	15/02/2022					0,0%	**A Iniciar**		
2.15	**Aprovação**	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	16/02/2022	03/03/2022					0,0%	**A Iniciar**		
2.16	**Meta 2: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de saúde**	Relatório final: relatório final deve conter introdução, descrição dos dados e tabelas de dados descritivos, metodologia detalhada, apresentação dos resultados, descrição dos resultados, tabelas de resultados, gráficos, figuras e mapas, conclusões e implicações políticas.	UFPE	01/01/2021	31/12/2021		01/01/2021			40,0%	**Em Andamento**	No dia 25 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 17/2020, firmado com a UFPE. O Professor responsável pelo projeto, Breno Sampaio, juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. No dia 20 de setembro de 2021 foi realizada a segunda reunião de acompanhamento do TED 17/2020. O Projeto segue conforme previsto.	
2.17	**Meta 2: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de**	Seminário técnico para apresentação do relatório final, contando pdf da apresentação	UFPE	01/10/2021	31/12/2021					0,0%	**A Iniciar**		
2.18	**Meta 2: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de saúde**	Resumo executivo	UFPE	01/10/2021	31/12/2021					0,0%	**A Iniciar**		
2.19	**Análise**	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	01/01/2022	31/01/2022					0,0%	**A Iniciar**		
2.20	**Ajustes**	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	01/02/2022	16/02/2022					0,0%	**A Iniciar**		
2.21	**Aprovação**	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	17/02/2022	04/03/2022					0,0%	**A Iniciar**		
2.22	**Realização do Seminário Técnico**	Seminário técnico da UFPE para a Sudene para apresentação dos resultados finais do projeto	UFPE e CGEP	31/12/2021	31/12/2021					0,0%	**A Iniciar**		
3		**PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)**								**0,0%**	**A Iniciar**		
3.1	**Prestação de contas final**	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	UFPE	01/01/2022	02/03/2022					0,0%	**A Iniciar**		
3.2	**Elaboração de Relatório Final**	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	03/03/2022	02/05/2022					0,0%	**A Iniciar**		
3.3	**Análise da prestação de contas financeiras**	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	03/05/2022	02/07/2022					0,0%	**A Iniciar**		
				Valor Previsto:		R$ 384.000,00	**Valor realizado:**		R$ 384.000,00	35%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
Universidade Federal de Pernambuco
Observações:
Processo SEI 59336.001886/2020-11

Fonte: CGEP

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGEP/2020010 (EX PO 30)**
Objetivo estrátegico:	**1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido.**	**Ano:**	**2020**

Programa do PPA:	Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	**Ação 20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial**	**Objetivo estrátegico (MDR):**	1194 - Estimular o desenvolvimento de territórios, cidades e regiões, ampliando a estruturação produtiva e urbana e a provisão de serviços públicos para a redução das desigualdades socioeconômicas em múltiplas escalas
Objetivo da ação:	Monitoramento e avaliação periódica de planos, programas, políticas públicas, ações e projetos de desenvolvimento regional, incluídos os instrumento de financiamento (FNE, FDNE).		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Necessidade de avaliar políticas públicas voltadas para o desenvolvimento regional		
Projeto:	AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: IMPACTO DA COTA-PARTE MUNICIPAL DO ICMS NA EDUCAÇÃO; EDUCAÇÃO INFANTIL: OFERTA, DEMANDA E MEDIDAS DE QUALIDADE; E, NORDESTE PACÍFICO		
Objetivo do projeto:	Avaliar:O impacto do Mecanismo de Repartição dos recursos da Cota-Parte Municipal do ICMS nos resultados educacionais do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais; Os efeitos da Educação da Infantil sobre a alfabetização e, ainda, analisar a relação entre a Oferta e as Metas do PNE, a Demanda e as		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto**	**Valor Total do Projeto**
	250 e 280	-	90	R$ 480.600,00	R$ 480.600,00

Ata 372ª Reunião de Diretoria Colegiada

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	480.600,00
A realizar no exercício		
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)		
Valor Empenhado/Descentralizado no Exercício		
Valor liberado/repassado no Exercício		
Saldo a liberar		
Saldo a Empenhar no exercício		
Total Liberado até o exercício	R$	480.600,00

Previsão de Conclusão:	21/06/2022
Data Atualização:	30/09/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto		
	CGEP/SUDENE	Tássia Germano; Marina Rogério; Miguel Vieira.
	UFC	Guilherme Diniz Irffi

N.E.	**Nome da Etapa**	**Descrição das Atividades/ Etapas**	**Responsável**	**Previsto**			**Realizado**				**Status**	**Observação/Problemas**	**Ações Corretivas**
				Início	**Fim**	**Valor**	**Início**	**Fim**	**Valor**	**Físico %**			
1		**PLANEJAMENTO (Peso 20%)**								**20%**	**Concluído**		
1.1	**Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira**	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Decreto 10.426/2020 e elaboração de pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	04/12/2020	16/12/2020		04/12/2020	16/12/2020		100,0%	**Concluído**		
1.2	**Analise jurídica**	Análise e parecer juridico	PROCURADORIA	17/12/2020	22/12/2020		17/12/2020	22/12/2020		100,0%	**Concluído**		
1.3	**Elaboração da minuta do TED**	Elaboração do minuta do TED	COCIC	16/12/2020	23/12/2020		16/12/2020	23/12/2020		100,0%	**Concluído**		
1.4	**Assinatura do TED**	Assinatura do TED	GABINETE / UFC	23/12/2020	23/12/2020		23/12/2020	23/12/2020		100,0%	**Concluído**		
1.5	**Publicação do TED**	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	23/12/2020	28/12/2020		23/12/2020	28/12/2020		100,0%	**Concluído**		
2		**EXECUÇÃO (Peso 60%)**								**15%**	**Em Andamento**		
2.1	**Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros**	Recursos liberados em parcela única	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	31/12/2020	31/12/2020	**R$ 480.600,00**	28/12/2020	28/12/2020	**R$ 480.600,00**	100,0%	**Concluído**		

2.2	**Meta 2: Educação Infantil: Oferta, Demanda e as Medidas de Qualidade da Educação Infantil**	Produto 1: Relatório contendo estudo sobre as Metas do PNE para educação Infantil (matrículas em creche e pré escola) por Unidades da Federação	UFC	01/01/2021	30/04/2021		01/01/2021	29/04/2021		100,0%	**Concluído**	No dia 04 de março de 2021 foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. O Produto 1 da Meta 2 foi encaminhado à Coordenação dentro do previsto, cujo prazo limite acordado era 30 de abril de 2021.	
2.3	**Análise**	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	18/10/2021	29/10/2021					0,0%	**A Iniciar**	Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por orientações da Coordenação, a análise desse Produto foi postergada. A data limite acordada para conclusão da análise técnica é o dia 30/07/2021 (Despacho SEI 0251383)	
2.4	**Ajustes**	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	30/10/2021	14/11/2021					0,0%	**A Iniciar**	Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização da análise foi redefinido para 29/10/2021	
2.5	**Aprovação**	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	15/11/2021	29/11/2021					0,0%	**A Iniciar**		
2.6	**Meta 1: Avaliar os impactos da Cota-Parte Municipal do ICMS na Educação**	**Produto 1: Relatório contendo estudo sobre as legislações das Unidades da Federação (Estados e Distrito Federal) sobro o modelo de repartição da cota parte do ICMS com os municípios.**	UFC	01/01/2021	30/05/2021		01/01/2021	29/04/2021		100,0%	**Concluído**	No dia 04 de março de 2021 foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. O Produto 1 da Meta 1 foi encaminhado à Coordenação cerca de um mês antes do previsto, cujo prazo limite acordado era 31 de maio de 2021.	
2.7	**Análise**	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	04/10/2021	15/10/2021					0,0%	**A Iniciar**	Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por orientações da Coordenação, a análise desse Produto foi postergada. A data limite acordada para conclusão da análise técnica é o dia 30/07/2021 (Despacho SEI 0251383)	
2.8	**Ajustes**	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	16/10/2021	31/10/2021					0,0%	**A Iniciar**		
2.9	**Aprovação**	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	01/11/2021	15/11/2021					0,0%	**A Iniciar**	Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização da análise foi redefinido para 15/10/2021	
2.10	**Meta 3: Nordeste Pacífico: Perda de Capital humano e econômica no Brasil a partir dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI)**	**Produto 1: Relatório contendo a identificação/descrição do perfil das vítimas de CVLI para o Brasil com foco nos estados do Nordeste**	UFC	01/01/2021	31/05/2021		01/01/2021	31/05/2021		100,0%	**Concluído**	No dia 04 de março de 2021 foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. O Produto 1 da Meta 3 foi encaminhado à Coordenação dentro do previsto, cujo prazo limite acordado era 31 de maio de 2021.	
2.11	**Análise**	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	01/11/2021	12/11/2021					0,0%	**A Iniciar**	Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por orientações da Coordenação, a análise desse Produto foi postergada. A data limite acordada para conclusão da análise técnica é o dia 30/07/2021 (Despacho SEI 0251383)	
2.12	**Ajustes**	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	13/11/2021	28/11/2021					0,0%	**A Iniciar**		
2.13	**Aprovação**	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	29/11/2021	13/12/2021					0,0%	**A Iniciar**	Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização da análise foi redefinido para 12/11/2021	

2.14	**Meta 1: Avaliar os impactos da Cota-Parte Municipal do ICMS na Educação**	**Produto 2: Relatório descrevendo e analisando os indicadores educacionais dos municípios nordestinos, além dos municípios mineiros e capixabas. Além de estatísticas de desempenho educacional com base no IDEB (a partir de 2005) dos municípios.**	UFC	01/01/2021	30/06/2021		01/01/2021	30/06/2021		100,0%	**Concluído**	No dia 04 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. O Produto 2 da Meta 1 foi encaminhado à Coordenação dentro do previsto, cujo prazo limite acordado era 30 de junho de 2021.	
2.15	**Análise**	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	16/11/2021	23/11/2021					0,0%	**A Iniciar**	Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por orientações da Coordenação, a análise dos Produtos 2 das Metas 1, 2 e 3 foi postergada. A data limite acordada para conclusão da análise técnica é o dia 30/09/2021 (Despacho SEI 0255067)	
2.16	**Ajustes**	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	24/11/2021	09/12/2021					0,0%	**A Iniciar**		
2.17	**Aprovação**	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	10/12/2021	24/12/2021					0,0%	**A Iniciar**	Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização da análise foi redefinido para 23/11/2021	
2.18	**Meta 2: Educação Infantil: Oferta, Demanda e as Medidas de Qualidade da Educação Infantil**	**Produto 2: Relatório descrevendo e analisando os indicadores de Educação Infantil dos municípios nordestinos, além dos municípios mineiros e capixabas. Além de estatísticas de desempenho educacional, Alfabetização - 2º ano, dos municípios em 2014 e 2016. Análise da demanda por educação infantil (PNAD 2015).**	UFC	01/01/2021	30/06/2021		01/01/2021	30/06/2021		100,0%	**Concluído**	No dia 04 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. O Produto 2 da Meta 2 foi encaminhado à Coordenação dentro do previsto, cujo prazo limite acordado era 30 de junho de 2021.	
2.19	**Análise**	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	24/11/2021	01/12/2021					0,0%	**A Iniciar**	Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por orientações da Coordenação, a análise dos Produtos 2 das Metas 1, 2 e 3 foi postergada. A data limite acordada para conclusão da análise técnica é o dia 30/09/2021 (Despacho SEI 0255067)	
2.20	**Ajustes**	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	02/12/2021	17/12/2021					0,0%	**A Iniciar**		
2.21	**Aprovação**	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	18/12/2021	01/01/2022					0,0%	**A Iniciar**	Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização da análise foi redefinido para 01/12/2021	
2.22	**Meta 3: Nordeste Pacífico: Perda de Capital humano e econômica no Brasil a partir dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI)**	**Produto 2: Relatório contendo as estimações de perdas econômica e de capital humano usando a medida de APVP para o Brasil com foco nos estados da região Nordeste**	UFC	01/01/2021	30/06/2021		01/01/2021	30/06/2021		100,0%	**Concluído**	No dia 04 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. O Produto 2 da Meta 3 foi encaminhado à Coordenação dentro do previsto, cujo prazo limite acordado era 30 de junho de 2021.	
2.23	**Análise**	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	02/12/2021	15/12/2021					0,0%	**A Iniciar**	Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por orientações da Coordenação, a análise dos Produtos 2 das Metas 1, 2 e 3 foi postergada. A data limite acordada para conclusão da análise técnica é o dia 30/09/2021 (Despacho SEI 0255067)	
2.24	**Ajustes**	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	16/12/2021	31/12/2021					0,0%	**A Iniciar**		
2.25	**Aprovação**	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	01/01/2022	15/01/2022					0,0%	**A Iniciar**	Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização da análise foi redefinido para 15/12/2021	

2.26	**Meta 1: Avaliar os impactos da Cota-Parte Municipal do ICMS na Educação**	**Produto 3: Relatório sobre as evidências da literatura em relação aos efeitos dos mecanismos de incentivos à educação, foco em análises de impacto na política de distribuição de cota parte municipal do ICMS, estratégia de identifição e estimação dos efeitos causais (avaliação de impacto) da distribuição de recursos da cota parte municipal do ICMS com base em resultados educacinais.**	UFC	01/04/2021	20/12/2021		01/04/2021			50,0%	**Em Andamento**		
2.27	**Meta 2: Educação Infantil: Oferta, Demanda e as Medidas de Qualidade da Educação Infantil**	**Produto 3: Análise de impacto da Educação Infantil sobre os indicadores de: 1) Alfabetização no Ensino Fundamental I e 2) Medidas de rendimento dos anos iniciais do Ensino Fundamental**	UFC	01/04/2021	20/12/2021		01/04/2021			50,0%	**Em Andamento**		
2.28	**Meta 3: Nordeste Pacífico: Perda de Capital humano e econômica no**	**Produto 3: Relatório contendo a avaliação de impacto das políticas**	UFC	01/04/2021	20/12/2021		01/04/2021			50,0%	**Em Andamento**		
2.29	**Meta 1: Avaliar os impactos da Cota-Parte Municipal do ICMS na Educação**	**Produto 4: Divulgação dos Resultados e sumário executivo**	UFC	01/11/2021	15/12/2021					0,0%	**A Iniciar**		
2.30	**Meta 2: Educação Infantil: Oferta, Demanda e as Medidas de Qualidade da Educação Infantil**	**Produto 4: Divulgação dos Resultados e sumário executivo**	UFC	01/11/2021	15/12/2021					0,0%	**A Iniciar**		
2.31	**Meta 3: Nordeste Pacífico: Perda de Capital humano e econômica no Brasil a partir dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI)**	**Produto 4: Divulgação dos Resultados e sumário executivo**	UFC	01/11/2021	15/12/2021					0,0%	**A Iniciar**		
2.32	**Análise**	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	21/12/2021	04/02/2022					0,0%	**A Iniciar**		
2.33	**Ajustes**	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	05/02/2022	20/02/2022					0,0%	**A Iniciar**		
2.34	**Aprovação**	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	21/02/2022	07/03/2022					0,0%	**A Iniciar**		
3		**PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)**								**0,0%**	**A Iniciar**		
3.1	**Prestação de contas final**	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	UFC	21/12/2021	19/02/2022					0,0%	**A Iniciar**		
3.2	**Elaboração de Relatório Final**	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	20/02/2022	21/04/2022					0,0%	**A Iniciar**		
3.3	**Análise da prestação de contas financeiras**	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	22/04/2022	21/06/2022					0,0%	**A Iniciar**		
				Valor Previsto:		R$ 480.600,00	**Valor realizado:**		R$ 480.600,00	35%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
Universidade Federal do Ceará
Observações:
Processo SEI 59336.002083/2020-84

Fonte: CGEP

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGEP/2021001 (ex PO CGEP/2019003)**
Objetivo estratégico:	**1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido**	**Ano:**	**2021**

Programa do PPA:	-	**Eixo temático (MDR):**	
Ação do PPA:	-	**Objetivo estratégico (MDR):**	
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Com base na proposição nº 105/2017, feita pela Sudene ao CONDEL, em seu Art. 3º, o qual diz que: os critérios técnicos e científicos utilizados para delimitação do Semiárido, bem como a resolução do CONDEL que os aprovou, serão revistos em 2021 e a cada década, a partir de então.		
Projeto:	Redelimitação do Semiárido		
Objetivo do projeto:	Apresentar relatório, a ser apresentado ao Conselho Deliberati vo da Sudene, com a relação de municípios que comporão a sub-região Semiárida inscrita na área de atuação da Sudene, inclusive a metodologia e os critérios técnicos e científi cos aplicados.		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto**	**Valor Total do Projeto**

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

Previsão de Conclusão:	19/12/2021
Data Atualização:	30/09/2021

Processo 59336.000463/2020-84

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Marcos falção Gonçalves (CGEP); Beatriz Lyra (CGDS); Renato Arruda (CGCP)

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
I – Instalação dos trabalhos		-								**100%**	**Concluído**		
1.1	Identificação da equipe constituinte do trabalho	**Encaminhamentos administrativos internos.**	Coordenador-Geral CGEP	04/08/2021	07/08/2021		28/07/2021	04/08/2021		100%	**Concluído**		
1.2	Formalização das indicações junto ao Diretor da DPLAN;		Coordenador-Geral CGEP	08/08/2021	10/08/2021		04/08/2021	05/08/2021		100%	**Concluído**		
1.3	Institucionalização do trabalho por portaria da Sudene e aprovação simultânea do plano de trabalho, incluindo publicação no DOU;		Superintendente da Sudene	11/08/2021	13/08/2021		20/07/2021	04/08/2021		100%	**Concluído**	Portaria nº 80/2021 assinada em 27/07/2021 e publicada na Seção 1, p. 118 do DOU de 04/08/2021 (Docs SEI 0262868, p1 e 0262870 p2 - pasta V).	
II – Desenvolvimento das atividades de delimitação		-								**50%**	**Em Andamento**		
2.1	Mapeamento da metodologia, incluindo revisão de literatura, e das instituições de importância para o trabalho;		Técnicos da CGEP, CGDS e CGEP,	14/08/2021	23/08/2021		27/05/2021	04/08/2021		100%	**Concluído**	Informações disponíveis e armazenadas no Processo 59336.000463/2020-84. Inclui reuniões para nivelamento da reprogramação trazida pela Portaria Sudene nº 80/2021.	
2.2	Comunicação formal do trabalho e convite aos potenciais parceiros externos		Diretor da DPLAN, Coordenador-Geral da CGEP	24/08/2021	28/08/2021		15/08/2021	15/08/2021		100%	**Concluído**	Em 13 de agosto foram assinados e enviados os ofícios 1694/2021 (para ANA), 1695 (para INPE) e 1696 (para INMET) (Doc SEI 0263246 - Pasta VI), do processo antes mencionado.	
2.3	Apresentação da proposta de trabalho aos participantes;		Diretor da DPLAN e Coordenador-Geral CGEP	24/08/2021	07/09/2021		11/08/2021	17/08/2021		100%	**Concluído**	Inclui reuniões com a equipe interna para abordagens metodológicas, reflexões técnicas, críticas, delegação de tarefas e nivelamento de posições, seleção de parceiros externos e emissão de convite.	Reuniões internas para essa etapa, visando discutir aproximção técnica e elaboração de estratégia de cooperação com os principais parceiros externos e utros, realizadas dias 11, 17 (incluiu INPE, ANA e INMET).
2.4	Reuniões para discussão da metodologia, definição dos dados e identificação de responsabilidades para o processamento;		Coordenadores-Gerais da CGEP e CGDS	08/09/2021	22/09/2021		19/08/2021	09/09/2021		100%	**Concluído**	Inclui reuniões sucessivas para discussão das opções adotadas em 2017, simulações, escolhas metodológicas e de parametrizações.	Reuniões para essa etapa realizadas em 19/08, 23/08 e 09/09 (incluindo INPE, ANA e INMET) e interna em 25/08/2021.

2.5	Apresentação e crítica dos primeiros resultados;	**Encaminhamentos institucionais, reuniões, abordagens metodológicas, processamentos tabulares, simulações e entregas preliminares**	Técnicos da CGDS e CGEP	23/09/2021	07/10/2021		09/09/2021	27/09/2021		100%	**Concluído**	Inclui planejamento, processamentos INPE, ANA e INMET, simulaçoes, geração de grades com definição de graus de latitude e longitude, resultados preliminares e apresentação à Sudene.	Na reunião de 09/09/21 INPE e ANA informaram a disponibilidade de dados e intercâmbio que já vinha ocorrendo para análise das primeiras simulações. Em e-mail de 22/09, Caio Coelho (INPE) compartilhou com a Sudene os dados processados de precipitação, aridez e deficit hídrico. Em reunião de 27/09 a ANA (Geraldo Lucatelli) apresentou os resultados do geoprocessamento com base em precipitação igiual ou inferior a 800mm, indice de aridez, defcit hídrico. Após o processamento dos dados de todos os municípios da área da Sudene,o resultado revelou 1.354 municípios, dos quais 1.213 são os mesmos de 2017, 141 são novos e 49 da relação de 2017 não se confirmaram. Em 2017 foram 1.262 municípios, nessa conta incluem-se 73 municípios por deicsão do Condel (49 que recorreram da decisão à epoca e 24 outros, de estados que alegaram municípios fronteiriços ao polígono).
2.6	Ajustes/validações metodológicas;		Técnicos da CGDS e CGEP	08/10/2021	17/10/2021					0%	**A Iniciar**	Discussões técnicas entre INPE e ANA sobre processos, métodos e população estatística, ajustes de população por meio de interpolação para verificação de continuidade da mancha semiárida, outras medidas de solução de problemas técnicos caso necessário.	
2.7	Emissão das tabulações especiais finais;		Técnicos da CGDS e CGEP	18/10/2021	01/11/2021					0%	**A Iniciar**	Inclui tabelas com relação de municípios habilitados segundo critérios em formato de planilha, inclusive infográficos.	
2.8	Elaboração de relatório preliminar;		Técnicos da CGDS e CGEP	02/11/2021	16/11/2021					0%	**A Iniciar**	Elaboração de relatório refletindo os estudos e propostas considerados no trabalho, a metodologia, inclusive os critérios técnicos e científicos conforme base atualizada, o estabelecimento de periodicidade para futuras atualizações, se couber, a relação de municípios que passará a integrar a região semiárido brasileira, inclusive mapa que expresse a extensão total da área contígua delimitada.	
2.9	Reunião para discussão da primeira versão do relatório;		Técnicos da CGDS e CGEP	17/11/2021	21/11/2021					0%	**A Iniciar**	Reunião para apresentação do texto, críticas e sugestões de ajuste.	
2.10	Redação da versão final do relatório;		Técnicos da CGDS e CGEP	22/11/2021	26/11/2021					0%	**A Iniciar**	Redação final de texto que expresse os resultados encontrados, explicações necessárias, sugestões sobre futuras delimitações etc.	
III – Institucionalização da proposta		-								0%	**A Iniciar**		
3.1	Apresentação da versão final do relatório aos participantes, ao Superintendente e Diretores;	**Entrega de versão consolidada, elaboração de proposta para apreciação de colegiados, deliberações e divulgação de resultados.**	Coordenadores-Gerais da CGEP e CGDS	27/11/2021	29/11/2021					0%	**A Iniciar**	Apresentação dos resultados previamente ao Superintendente e Diretores da Sudene, e na sequência, a outras instituições para as quais os resultados da delimitação são essenciais em suas políticas de desenvolvimento setorial, local, subregional, regional ou nacional.	
3.2	Aprovação do relatório final pela Diretoria Colegiada com recomendação de encaminhamento ao Condel para Deliberação;		Diretoria Colegiada da Sudene	30/11/2021	06/12/2021					0%	**A Iniciar**	Para fins de validação oficial o relatório deve ser submetido ao Conselho Deliberativo para apreciação e deliberação em conformidade com o previsto no inciso V, art. 10 da Lei Complementar nº 125, de 03/01/2007. Para isso, os resultados devem ser submetidos à Diretoria Colegiada da Sudene, para encaminhamento aos Conselheirosw do Condel.	
3.3	Preparação de Proposição e minuta de Resolução ao Condel para deliberação, com prazo para apresentação, apreciação de recursos e deliberação na reunião seguinte;		Coordenadores-Gerais da CGEP e CGDS	07/12/2021	09/12/2021					0%	**A Iniciar**	A minuta de proposição e de Reoslução ao Condel será preparada pela Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação após adeliberação da Diretoria Colegiada da Sudene, e encaminhada ao Gabinete para composição do portfólio de assuntos a serem apreciados pelo Condel.	
3.4	Apreciação do assunto pelo Comitê Técnico do Condel;		Superintendente da Sudene	10/12/2021	14/12/2021					0%	**A Iniciar**	A proposta de delimitação objeto de relatório específicos, será apreciada pelo Comitê Técnico do Condel, instância destinada a previamente discutir e consensuar encaminhamentos e, quando necessário, estratégias políticas para discussão da pauta.	
3.5	Apreciação e deliberação pelo Condel;		Secretaria Executiva da Sudene	15/12/2021	15/12/2021					0%	**A Iniciar**	O assunto será apresentado pelo Secretário Executivo do Condel, papel exercido pelo Superintendente da Sudene, e posto em votação para deliberação por maioria simples.	
3.6	Publicação da Resolução do Condel no DOU e envio de comunicação ao Senado, à Câmara dos Deputados, aos Governadores dos Estados e demais membros do Condel.		ASCOM e GAB/Sudene	16/12/2021	18/12/2021					0%	**A Iniciar**	A publicação da Resolução do Condel no DOU é medida que visa dar publicidade. Além disso, ela será publicizada também, no site da Sudene, em página eletrônica dedicada ao Condel.	
3.7	Publicação dos resultados no site da Sudene via ASCOM.		ASCOM/Sudene	19/12/2021	19/12/2021					0%	**A Iniciar**	Medida de rotina para todas as decisões do Condel.	
				Valor Previsto:		R$ -	**Valor realizado:**		R$ -	50,0%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Observações:
Prazos repactudados. Parceiros que deverão ser convidados pela Sudene para a nova delimitação serão, a princípio, os mesmos que compuseram o GT-2017 (MDR, MMA, DNOCS, Codevasf, ANA, Ibama, INPE, INSA, INMET, BNB e Cemaden), não sendo esta uma lista exaustiva."
Obs.: O presente PO considera que a fase de planejamento teve que ser readequada e reprogramada em razão de diferentes fatores como equipe e estratégia, inclusive por que técnicos apontados no processo inicial hoje estão cedidos a outros órgãos.
Nota: Este Plano Operativo substitui o PO CGEP 2019003 em razão do estabelecimento de novos referenciais para condução dos trabalhos conforme Portaria Sudene nº 80/2021, publicada no DOU, Seção 1, de 04/08/2021.

Nota: Os representates da unidades envolvidas responsáveis pelo projeto sã Paula Aragão de Souza, Lautemy Cavalcanti Canel (CGCP); Mauro José Gonçalves Bezerra, Mauro Luciano Povoas Souto (CGDS); José Aildo, Marcelo Saiki, (CGEP Gabriela Isabel, Ludmila Calado (CGEP)

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGCP/2020001 (EX PO 31)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2021**

Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	**Objetivo estrátegico (MDR):**	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
Finalidade da ação:	**Revisão do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE**		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Renato Arruda Vaz de Oliveira
Problema (causa):	Os municípios necessitam de instrumento de planejamento voltado para o desenvolvimento sustentável de curto, médio e longo prazos por enfrentarem problemas e desafios nas questões de mobilidade e desigualdade econômico e social e de infraestrutura.		
Projeto:	Revisão do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE		
Objetivo do projeto:	Planejar e promover a convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômico, social e ambiental.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	280	Custeio		R$ 1.644.040,39	R$ 1.644.040,39

Cronograma de Desembolso (1)			
SUDENE			TOTAL
R$ 1.644.040,39			R$ 1.644.040,39

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	708.040,89
A realizar no exercício	R$	935.999,50
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício (1)	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	708.040,89

Previsão de Conclusão:	31/12/2021
Data Atualização:	30/09/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Fisico %			
1	**Relatório de planejamento da estrutura de execução. articulação e monitoramento do PRDNE**	Este relatório produto 1 planejará em detalhe as atividades consoantes entre as três trilhas e aprofundará os conteúdos previstos para cada produto, planejando a articulação de atores e o cronograma sincronizados de atividades; especificando os vínculos dos processos de articulação do PRDNE à trilha de inteligência.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	29/7/2019	27/9/2019	R$ 205.154,25	29/7/2019	18/11/2019	R$ 205.154,25	100%	**Concluído**		
2	**Relatório estratégico de internalização do PRDNE nos Grupo de Trabalho Sudene**	O produto 2 tem como alvo a internalização na Sudene da estruturação do plano à luz dos seis eixos estratégicos; constituindo uma experiência que se materializa com a formação e consolidação de grupos de trabalho (GT PRDNE Sudene) e discussão em detalhes dos eixos do PRDNE e os programas e projetos acordados nos plano.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	2/9/2019	15/10/2019	R$ 359.231,25	2/9/2019	18/11/2019	R$ 347.781,25	100%	**Concluído**		
3	**Relatório da estratégia de articulação e comunicação do PRDNE na região**	O produto 3 levará em consideração os seis eixos estratégicos e apresentará uma propostas para a comunicação e o desenvolvimento de ações, em articulação com os estados e atores no escopo de atuação da Sudene.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	23/9/2019	31/10/2019	R$ 207.690,00	1/11/2019	10/12/2019	R$ 155.105,39	100%	**Concluído**		
4	**Detalhamento dos Projetos Prioritários**	O produto 4 organiza em Fichas Técnicas os projetos prioritários do PRDNE, conforme modelo aprovado por Sudene e CGEE. Reuniões técnicas entre CGEE e os GTs da Sudene serão realizadas para aprovar as Fichas Técnicas preenchidas. Tais Fichas servirão como instrumentos de negociação além de insumos para a consolidação da metodologia de monitoramento entregue no processo de gestão da Trilha de Inteligência do PRDNE, compromisso esse firmado entre o CGEE e a Sudene. Tem como objetivo central organizar 60 (sessenta) Fichas de Projetos priorizados pelos GTs da Sudene.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	9/7/2021	17/9/2021	R$ 385.500,25	1/8/2020			30%	**Atrasado**	O Produto 4 deveria ter sido entregue em 17/09/2021 (Aditivo), porém, houve atraso na elaboração do P6 (entregue apenas em 18/10/2021) e a contratada atrasou a elaboração deste produto. **As datas previstas para inicio e fim desta etapa foram atualizadas.**	Foi assinado um novo Termo Aditivo (SEI 277353), onde foram retirados os produtos 7,10,13,16,17,18,19,20 da Carta de Acordo. Foi solicitado esclarecimentos da contratada quanto ao atraso do produto 4 e o novo prazo para entrega.
5	**Relatório de Reposicionamento Estratégico do PRDNE Revisado**	O produto 5 é um relatório com revisão do PRDNE, analisando a pertinência das ações, a consistência interna e a viabilidade técnica, levando em conta eventuais mudanças no cenário do contexto externo. Será avaliado se a estratégia do Plano está adequada para reposicionar as prioridades, considerando as medidas formuladas pelo Governo Federal para a Região Nordeste e os esforços conjuntos das instituições, empresas e da sociedade civil que podem contribuir para alcançar resultados para a Região. O produto tem como objetivo apresentar a proposta de revisão do PRDNE, por eixo estratégico à luz da nova realidade.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	1/7/2020	30/11/2020	R$ 197.909,25	1/7/2020	5/7/2021	R$ 197.014,34	100%	**Concluído**	O Produto 5 foi aprovado tecnicamente pela equipe da Sudene em 05/07/2021.	
6	**Relatório contendo insumos para revisão do PRDNE**	O produto 6 será um relatório com recomendações para revisão anual do PRDNE com base em Consulta Estruturada utilizando a ferramenta Insight Survey do CGEE junto aos principais stakeholders da SUDENE em preparação a nova pactuação do PRDNE. As equipes técnicas, os consultores e equipes internas dos grupos técnicos da SUDENE dialogarão com representantes de governos dos estados da região de abrangência do PRDNE e colherão subsídios adicionais para validação das propostas. Constituem objetivo do produto a coletar insumos para revisão do PRDNE validando propostas e descrever recomendações para revisão do PRDNE com base nos insumos e inferências compiladas através de processo de Consulta Estruturada (instituições, sociedade civil, associações, IES, bancos, etc.) constituem o objetivo central deste produto.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	1/8/2020	30/1/2020	R$ 352.590,00	1/8/2020			90%	**Atrasado**	Um dos insumos do produto é a consulta estruturada, que foi realizada entre os dias 04/12/2020 a 15/12/2020. Porém, o objetivo da consulta não foi alcançado uma vez que houve pouca participação de atores estratégicos. Está em curso uma nova proposta de consulta estruturada, após formalização do aditivo. O Produto 6 revisado foi recebido pela equipe da Sudene em 18/10/2021. Atualmente está em análise técnica.	Foi assinado um novo Termo Aditivo (SEI 277353), onde foram retirados os produtos 7,10,13,16,17,18,19,20 da Carta de Acordo.

7	**Nova Versão Revisada do PRDNE**	O produto 7 será um relatório de revisão completa do PRDNE. Apresentará uma análise por eixo estratégico do plano, assim como uma revisão no desenvolvimento das conquistas do PRDNE e seu alcance face ao novo cenário e seus impactos, contemplando a Revisão dos indicadores e das metas de resultado dos programas do Plano e avaliação da aderência do PRDNE com a ENDES e a PNDR, em especial, ao foco em reposicionar o desenvolvimento do Nordeste pela via da inovação e à estratégia territorial. É prevista a apresentação e discussão da nova versão nas Câmaras Temáticas, a não apresentação, no entanto, não implicará em prejuízo ou trará impactos na conclusão e entrega deste produto.	SUDENE/CGCP, PNUD, CGEE	1/12/2020	30/6/2021	R$ 259.854,00	-	-	-	0%	**Cancelado**	A iniciar	
				Valor Previsto:		R$ 1.644.040,39		**Valor realizado:**	R$ 905.055,23	74%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolviemento; CGEE - Centro de Gestão e Estudos Estratégicos e outros órgãos federais e estaduais afeitos ao tema.

Observações:

Fonte: CGCP (Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGCP/2020002 (ex PO 32)**
Objetivo estratégico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2021**

Programa:	ação não orçamentária	**Eixo temático (MDR):**	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	ação não orçamentária	**Objetivo estratégico (MDR):**	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
Finalidade da ação:	**Articular e coordenar acordos de cooperação técnica com instituições financeiras com o objetivo de priorizar e estruturar os projetos do PRDNE**		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Renato Arruda Vaz de Oliveira
Problema (causa):	Necessidade da otimização da prospecção de investimentos com impacto potencial sobre a economia e a qualidade de vida da população nordestina.		
Projeto:	Acordo de Cooperação Técnica com instituições financeiras.		
Objetivo do projeto:	Planejamento preliminar e implementação de ações conjuntas voltadas para a viabilização de projetos previstos no Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	ação não orçamentária				

Cronograma de Desembolso (1)			
SUDENE	BNDES		TOTAL
R$ 0,00	**R$ 0,00**		R$ 0,00

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício (1)	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

Previsão de Conclusão:	12/12/2022
Data Atualização:	30/09/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	**Minuta de Acordo de Cooperação**	Documento Oficial do BNDES que propõe Acordo de Cooperação Técnica.	SUDENE/GAB	1/10/2019	30/10/2019	R$ 0,00	30/10/2019	27/11/2019	R$ 0,00	100%	**Concluído**		
2	**Elaboração de Nota Técnica**	Elaboração de Nota Técnica referente ao Acordo de Cooperação Técnica	SUDENE DPLAN/CGCP	30/10/2019	30/11/2019	R$ 0,00	27/11/2019	28/11/2019	R$ 0,00	100%	**Concluído**	Parecer Técnico nº 329/2019	
3	**Elaboração de Plano de Trabalho específico.**	Elaboração de Plano de Trabalho específico (Equipe CGCP) sobre o Acordo de Cooperação, incluindo metodologias, prazos, articulações, recursos, metas, desenho do monitoramento, produtos e mudanças esperadas para a execução do Acordo	SUDENE DPLAN/CGCP	30/10/2019	30/1/2020	R$ 0,00	17/1/2020	13/7/2020	R$ 0,00	100%	**Concluído**	O Plano de Trabalho elaborado foi aprovado na 360ª Diretoria Colegiada.	
4	**Assinatura de Parceiros Signatários** (4)	Ata de assinatura de Parceiros Signatários do Acordo de Cooperação	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada	30/10/2019	30/1/2020	R$ 0,00	19/12/2019	19/12/2019	R$ 0,00	100%	**Concluído**		
5	**Acompanhamento do Plano de Trabalho do ACT**	Desenvolvimento de atividades de execução e coordenação do Plano de Trabalho previsto no ACT.	SUDENE DPLAN/CGCP	1/2/2020	12/12/2022	R$ 0,00	6/1/2020			60%	**Em Andamento**	Trata-se de uma atividade contínua. Desde o primeiro trimestre de 2020 não houve avanço nesta pauta. Como os projetos do PRDNE não estão detalhados suficientemente, foi considerado dar continuidade nas atividades do ACT após elaboração de Sumários Executivos ou Business Cases dos projetos prioritários.	O novo termo aditivo da Carta de Acordo com o CGEE manteve o P4 (Fichas de Projetos) e retirou o P10 (Sumários Executivos). Após recebimento do P4, será possível avaliar necessidade ou não de nova contratação para suprir informações de projetos e retomar contato com o BNDES com vistas a articulação para estruturação.
6	**Avaliação do ACT**	Avaliação das atividades executadas no escopo do ACT.	SUDENE DPLAN/CGCP	1/6/2022	30/7/2022	R$ 0,00				0%	**A Iniciar**		
7	**Prorrogação ou encerramento do ACT**	Decisão sobre prorrogação ou encerramento do ACT em conjunto com o BNDES.	SUDENE DPLAN/CGCP	1/12/2022	12/12/2022	R$ 0,00				0%	**A Iniciar**		
				Valor Previsto:		R$ 0,00	**Valor realizado:**		R$ 0,00	66%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
BNDES
Observações:
(1) Parecer Técnico nº 329/2019 (SEI nº 0123625)

(2) Para o ano Ciclo de Avaliação 2020, foram consideradas as atividades previstas no cronograma com prazo até 30/09/2020, tendo em vista a vigência de 2 anos do ACT, e haverão etapas a serem realizadas em 2021 e 2022, constarão como metas institucionais para os próximos ciclos de avaliação.

Fonte: CGCP (Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado

	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGCP 2021001**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2021**

Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	8340- Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	**Objetivo estrátegico (MDR):**	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
Finalidade da ação:	**Apoio a projetos de tecnologia e inovação que fortaleçam e integrem a rede regional de inovação, propiciando melhoria nos processos produtivos, aumentos da competitividade, incorporação de tecnologias e inovação social e incremento tecnológico e inovativo para melhorias dos serviços públicos. Implantação de núcleos de apoio à inovação, identificação espacial dos focos emergentes e empecilhos à competitividade, articulação de empreendedores e fontes de financiamento da inovação**		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Renato Arruda Vaz de Oliveira
Problema (causa):	Problemas de segurança pública podem ser resolvidos com a utilização de tecnologias, de forma a potencializar a melhoria da qualidade de vida do cidadão. Campina Grande vem demonstrando nos últimos anos queda na taxa de homicídios, apresentando 13,2% em 2019 e no primeiro semestre de 2020 houve um pequeno		
Projeto:	Projeto Cidades Inteligentes 4.0 - Campina Grande - Convênio com ABDI		
Objetivo do projeto:	Implementar uma área de demonstração de tecnologias de Cidades Inteligentes, com foco em segurança pública, contemplando: centro de comando e operações, reconhecimento facial, reconhecimento de placas e inteligência artificial no município de Campina Grande/PB. A proposta visa contribuir com o desenvolvimento urbano sustentável, a melhoria da qualidade de vida do cidadão e a cadeia produtiva associada ao mercado de soluções de Cidades Inteligentes.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
		Capital		R$ 1.998.021,94	2.091.862.94

Cronograma de Desembolso (1)			
SUDENE			TOTAL
R$ 1.998.021,94			R$ 1.998.021,94

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	1.998.021,94
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	1.998.021,94
Valor Empenhado no Exercício (1)	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	1.998.021,94
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	1.998.021,94

Previsão de Conclusão:	30/3/2023
Data Atualização:	30/9/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1		**PLANEJAMENTO (Peso 20%)**								**20%**	**Concluído**		
1.1	**Abertura do Programa SICONV**	Abertura do Programa no Siconv para recebimento de proposta	CGCP	15/11/2020	02/12/2020	R$ 0,00	15/11/2020	02/12/2020	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**		
1.2	**Análise e aprovação de propostas**	Análise e aprovação das propostas enviadas pelo Siconv	CGCP	03/12/2020	10/12/2020	R$ 0,00	03/12/2020	10/12/2020	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**		
1.2	**Analise jurídica**	Análise e parecer juridico	PROCURADORIA	11/12/2020	20/12/2020	R$ 0,00	11/12/2020	20/12/2020	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**		
1.3	**Elaboração da minuta do Convênio**	Elaboração do minuta do Convênio	COCIC	21/12/2020	24/12/2020	R$ 0,00	21/12/2020	24/12/2020	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**		
1.4	**Assinatura do Convênio**	Assinatura do Convênio	Superintendente	28/12/2020	30/12/2020	R$ 0,00	28/12/2020	30/12/2020	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**		
1.5	**Publicação do Convênio**	Publicação do Convênio	GABINETE/ASCOM	31/12/2020	31/12/2020	R$ 0,00	31/12/2020	31/12/2020	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**		
2		**EXECUÇÃO (Peso 60%)**								**38%**	**Em Andamento**		
2.1	**Meta 1: 01 (uma) área de demonstração de soluções tecnológicas de Cidades Inteligentes definida, com foco em segurança pública, em Campina Grande.**	Produto: Elaboração do diagnóstico contendo: área de demonstração, perfil do município, requisitos técnicos para a implementação das soluções tecnológicas, constituição da governança local e definição de indicadores de resultados.	ABDI	01/01/2021	30/06/2021	R$ 0,00	01/01/2021	30/06/2021	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**	Aceite dado pela NOTA TÉCNICA Nº 104/2021	
2.2	**Meta 2: 50 (cinquenta) gestores públicos de Campina Grande capacitados em temas de Cidades Inteligentes, com disseminação de informações, projetos e ações relacionadas a temática**	Produto: 50 gestores capacitados	ABDI	01/03/2021	30/11/2021	R$ 0,00	01/03/2021			66,00%	**Em Andamento**	Foram realizadas capacitações nos temas Cidades Inteligentes (13/07, 20/07 e 27/07) e Sandbox (18/08 e 25/08). Resta uma última capacitação prevista para ocorrer até 30/11/2021. **A data prevista para início desta etapa foi antecipada.**	

2.3	**Meta 3: 01 (uma) área de demonstração de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes implementada, com foco em segurança pública, em Campina Grande.**	Produto: Aquisição de equipamentos conforme Termo de Referência	ABDI	01/02/2021	31/10/2021	R$ 0,00	01/02/2021			80,00%	**Em Andamento**	Houve atraso por parte de Prefeitura de Campina Grande na disponibilização de conexões de internet e de energia em locais de instalação dos equipamentos. **A data prevista para final desta etapa foi alterada.**	Em reunião no dia 20/10/2021 e 22/10/2021 fomos informados que até 29/10/2021 todos os equipamentos ativos e disponíveis para inauguração.
2.4	**Aceite do processo licitarório**	Emissão de parecer sobre o processo licitatório da Meta 3	CGCP	01/08/2021	15/08/2021	R$ 0,00	23/07/2021	30/07/2021	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**		
2.5	**Liberação da Parcela Única**	Liberação da Parcela Única	CGCP	16/08/2021	30/08/2021	R$ 1.998.021,94	30/07/2021	14/09/2021	R$ 1.998.021,94	100,00%	**Concluído**		
2.6	**Meta 4: 04 (quatro) relatórios de monitoramento dos indicadores relacionados a melhoria da qualidade de vida do cidadão com foco em segurança pública**	Produto: relatórios de monitoramento dos indicadores relacionados a melhoria da qualidade de vida do cidadão com foco em segurança pública	ABDI	01/08/2021	31/12/2022	R$ 0,00				0,00%	**Em Andamento**		
2.7	**Meta 5: 05 (cinco) visitas guiadas, direcionadas a gestores públicos, para divulgação da área de demonstração e promoção da cadeia produtiva associada ao mercado de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes.**	Produto: visitas guiadas, direcionadas a gestores públicos, para divulgação da área de demonstração e promoção da cadeia produtiva associada ao mercado de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes	ABDI	01/01/2022	31/12/2022	R$ 0,00				0,00%	**A Iniciar**		
3		**PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)**								**0,00%**	**A Iniciar**		
3.1	**Prestação de contas final**	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	ABDI	01/01/2023	31/01/2023	R$ 0,00				0,00%	**A Iniciar**		
3.2	**Elaboração de Relatório Final**	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGCP	01/02/2023	28/02/2023	R$ 0,00				0,00%	**A Iniciar**		
3.3	**Análise da prestação de contas financeiras**	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	01/03/2023	30/03/2023	R$ 0,00				0,00%	**A Iniciar**		
				Valor Previsto:		R$ 2.091.862,94	**Valor realizado:**		R$ 0,00	60%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
ABDI
Observações:

Fonte: CGCP (Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos**	**Número do Projeto:**	**PO CGCP 2021003**
Objetivo estratégico:	**2.2. Promover a sustentabilidade Ambiental**	**Ano:**	**2021**
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20WQ -Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	**Objetivo estratégico (MDR):**	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
Finalidade da ação:	**O objeto desse trabalho é a elaboração do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PIGIRS) do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas - CODANORTE, nos termos do artigo 19 da Lei 12.305 de 2010, para um horizonte de 20 anos com revisões a cada 4 (quatro) anos, nos 31 municípios do semiárido da abrangência da SUDENE.**		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Renato Arruda Vaz de Oliveira
Problema (causa):	**Propor instrumento de gestão proporcionando destinação e disposição adequadas de resíduos; mitigar os efeitos dos passivos ambientais; promover condições de sustentabilidade financeira e econômica aos municípios e buscar inovação tecnológica para o tratamento dos resíduos.**		
Projeto:	Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos dos 31 municípios do semiárido mineiro do CODANORTE		
Objetivo do projeto:	Melhorar a qualidade dos serviços públicos prestados no manejo dos resíduos sólidos; Atender a legislação relacionada ao saneamento/resíduos sólidos; Atender 100% da área urbana e rural com eficiência nos serviços prestados; Propor ferramentas de melhorias da gestão dos resíduos sólidos; Implementar soluções inovadoras e tecnológicas no tratamento dos resíduos; Mitigação do passivo ambiental nos municípios do CODANORTE no território da SUDENE		

Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)	Contrapartida (R$ 1,00)
		280	Custeio		R$725.810,00	R$728.480,00	R$ 2.670,00
Término da Vigência do Convênio:	30/6/2022						
Término da Prestação de Contas:	29/8/2022	**Convênio nº**	907282/2020				
Data Atualização:	30/09/2021	**Processo SEI**	59336.002461/2020-20				

Cronograma de Desembolso (1)			
Parcela única - SUDENE			TOTAL
R$725.810,00			R$ 725.810,00

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	725.810,00
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício (1)	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	725.810,00
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	725.810,00

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Isis Moreira e Danilo Campêlo.

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1		**PLANEJAMENTO (Peso 20%)**								**20%**	**Concluído**		
1.1	**Abertura do Programa SICONV**	Autorização da Diretoria Colegiada para abertura de chamada de projetos, elaboração de edital de	CGCP	21/10/20	11/11/20	R$ 0,00	21/10/20	11/11/20	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**	Processo: 59336.001698/2020-93. Relatório do Processo de Chamada SEI Nº 0217183	
1.2	**Seleção e análise das propostas**	A análise das propostas enviadas para o Programa	CGCP	30/11/20	31/12/20	R$ 0,00	30/11/20	31/12/20	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**		
1.2	**Analise jurídica**	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	24/12/20	31/12/20	R$ 0,00	24/12/20	31/12/20	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**		
1.3	**Elaboração da minuta do Convênio**	Elaboração do minuta do Convênio	COCIC	24/12/20	31/12/20	R$ 0,00	24/12/20	31/12/20	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**		
1.4	**Assinatura do Convênio**	Assinatura do Convênio	Superintendente	31/12/20	31/12/20	R$ 0,00	31/12/20	31/12/20	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**		
1.5	**Publicação do Convênio**	Publicação do Convênio	GABINETE/ASCOM	31/12/20	05/01/21	R$ 0,00	31/12/20	05/01/21	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**		
2		**EXECUÇÃO (Peso 60%)**								**24%**	**Em Andamento**		
2.1	**Análise do Termo de Referência**	Elaboração do Termo de Referência pela equipe técnica do convenente, reuniões de orientações e ajustes e elaboração de pareceres de análise do Termo de Referência, ajustes do Plano de Trabalho.	CODANORTE e Equipe Técnica CGCP	23/12/20	27/05/21	R$ 0,00	23/12/20	27/05/21	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**	Pareceres Técnicos de Análise do TR: Parecer Técnico 82 (0237986), Parecer Técnico Nº 116 (0246441)	
2.2	**Processo Licitatório**	Elaboração dos procedimentos para realização do	CODANORTE	27/05/21	25/08/21	R$ 0,00	27/05/21	10/09/21	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**		
2.3	**Aceite do processo licitatório**	Emissão de parecer técnico sobre o aceite do processo licitatório	Equipe Técnica CGCP	25/08/21	30/08/21	R$ 0,00	10/09/21	01/10/21	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**	Parecer Técnico 319 (278927)	
2.4	**Liberação da Parcela Única**	Liberação da Parcela Unica	CGAF	30/08/21	30/08/21	R$ 725.810,00	01/10/21	01/10/21	R$ 725.810,00	100,00%	**Concluído**	SEI 281376	
2.5	**META 01 - Projeto de Mobilização Social e Divulgação do PIGIRS**	Etapa 1.1 - Formação do Grupo de Trabalho, Etapa 1.2 - Evento de divulgação do plano de trabalho para elaboração do PIGIRS, Etapa 1.3 - Elaboração da Caracterização dos municípios que compõe a área da SUDENE e fazem parte do agrupamento regionalizado	CODANORTE	30/08/21	28/12/21	R$ 0,00				0,00%	**Atrasado**		
2.6	**META 02 - Diagnóstico dos Resíduos Sólidos do PIGIRS**	Etapa 2.1 - Elaboração do Diagnóstico Técnico Participativo da Gestão Intermunicipal de Resíduos Sólidos, Etapa 2.2 - Realização de Audiências Públicas para a apresentação do Diagnóstico Técnico Participativo da Gestão Intermunicipal de Resíduos Sólido	CODANORTE	28/12/21	27/04/22	R$ 0,00				0,00%	**A Iniciar**		

2.7	**Acompanhamento e Fiscalização Metas 1 e 2**	Realização de reuniões, acompanhamento da execução das metas, elaboração de pareceres	Equipe Técnica CGCP	30/08/21	27/04/22	R$ 0,00				0,00%	**Atrasado**		
2.8	**META 03 - Prognóstico e Planejamento das Ações do CODANORTE**	Etapa 3.1 - Realização de Audiências Públicas microrregionais para apresentação do Prognóstico contendo as metas, programas e ações da Gestão	CODANORTE	27/04/22	27/05/22	R$ 0,00				0,00%	**A Iniciar**		
2.9	**META 04 - Publicação e Divulgação do PIGIRS do CODANORTE**	Etapa 4.1 - Publicação do Plano Intermunicipal de gestão Integrada da Região do CODANORTE, Etapa 4.2 - Conferência Regional para Divulgação	CODANORTE	27/05/22	30/06/22	R$ 0,00				0,00%	**A Iniciar**		
2.10	**Acompanhamento e Fiscalização Metas 3 e 4**	Realização de reuniões, acompanhamento da execução das metas, elaboração de pareceres	Equipe Técnica CGCP	27/04/22	30/06/22	R$ 0,00				0,00%	**A Iniciar**		
3		**PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)**								**0,00%**	**A Iniciar**		
3.1	**Prestação de contas final**	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	CODANORTE	30/06/22	30/07/22	R$ 0,00				0,00%	**A Iniciar**		
3.2	**Elaboração de Relatório Final**	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGCP	30/07/22	14/08/22	R$ 0,00				0,00%	**A Iniciar**		
3.3	**Análise da prestação de contas financeiras**	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	30/06/22	29/08/22	R$ 0,00				0,00%	**A Iniciar**		
				Valor Previsto:		R$ 725.810,00	**Valor realizado:**		R$ 0,00	49%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
Codanorte
Observações:

Fonte: CGCP (Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos**	**Número do Projeto:**	**PO CGCP 2021004**
Objetivo estrátegico:	**2.2. Promover a sustentabilidade Ambiental**	**Ano:**	**2021**
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	**Objetivo estrátegico (MDR):**	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
Finalidade da ação:	**Elaboração de Plano de Desenvolvimento Sustentável para o Município de Guarabira – PB**		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Renato Arruda Vaz de Oliveira
Problema (causa):	**Guarabira é considerada uma cidade estratégica do estado da Paraíba. Diante deste contexto, faz-se necessária a elaboração de um Plano de Desenvolvimento Sustentável do Município de Guarabira com o objetivo de melhor compreender quais as Dimensões desse raio de influência, mensurar os**		
Projeto:	Plano de Desenvolvimento Sustentável de Guarabira-PB		
Objetivo do projeto:	Elaborar Plano de Desenvolvimento Sustentável do Município de Guarabira, visando compreender o atual quadro econômico e social, bem como apontar para iniciativas e diretrizes gerais que possibilitem um desenvolvimento em base sustentável vis-à-vis as oportunidades e os desafios vislumbrados.		

Dados Orçamentários		**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)**	**Valor Total do Projeto (R$ 1,00)**	**Contrapartida (R$ 1,00)**
		280	Custeio		R$481.189,57	R$483.189,57	R$ 2.000,00
Término da Vigência do Convênio:	31/12/2021						
Término da Prestação de Contas:	1/3/2022	**Convênio nº**	907457/2020				
Data Atualização:	30/09/2021	**Processo SEI**	59336.002483/2020-90				

Cronograma de Desembolso (1)			
Parcela única - SUDENE			TOTAL
R$481.189,57			R$ 481.189,57

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	481.189,57
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício (1)	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	-R$	481.189,57
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Teresa Barbosa e Paula Aragão

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1		**PLANEJAMENTO (Peso 20%)**								**20%**	**Concluído**		
1.1	**Abertura do Programa SICONV**	Autorização da Diretoria Colegiada para abertura de chamada de projetos, elaboração de edital de	CGCP	21/10/20	11/11/20	R$ 0,00	21/10/20	11/11/20	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**	Processo: 59336.001698/2020-93. Relatório do Processo de Chamada SEI Nº 0217183	
1.2	**Selção e análise das propostas**	A análise das propostas enviadas para o Programa 5320320200012 foi realizada pela equipe técnica	CGCP	30/11/20	31/12/20	R$ 0,00	30/11/20	31/12/20	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**		
1.2	**Analise jurídica**	Análise e parecer juridico	PROCURADORIA	24/12/20	31/12/20	R$ 0,00	24/12/20	31/12/20	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**		
1.3	**Elaboração da minuta do Convênio**	Elaboração do minuta do Convênio	COCIC	24/12/20	31/12/20	R$ 0,00	24/12/20	31/12/20	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**		
1.4	**Assinatura do Convênio**	Assinatura do Convênio	Superintendente	31/12/20	31/12/20	R$ 0,00	31/12/20	31/12/20	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**		
1.5	**Publicação do Convênio**	Publicação do Convênio	GABINETE/ASCOM	31/12/20	05/01/21	R$ 0,00	31/12/20	05/01/21	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**		
2		**EXECUÇÃO (Peso 60%)**								**11%**	**Em Andamento**		
2.1	**Análise do Termo de Referência**	Elaboração do Termo de Referência pela equipe técnica do convenente, reuniões de orientações e ajustes e elaboração de pareceres de análise do Termo de Referência, ajustes do Plano de Trabalho.	Equipe Técnica do Município de Guarabira e Equipe Técnica CGCP	23/12/20	29/06/21	R$ 0,00	23/12/20	29/06/21	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**	Pareceres Técnicos de Análise do TR: Parecer Técnico 164 (0254046)	Pelo tempo decorrido na elaboração do TR do convênio, será necessário fazer um Termo Aditivo para ampliação da vigência. A partir do T.A. as datas serão repactuadas
2.2	**Processo Licitatório**	Elaboração dos procedimentos para realização do Processo Licitatório	Equipe Técnica do Município de Guarabira	29/06/21	27/09/21	R$ 0,00	29/06/21			80,00%	**Atrasado**	Segundo informado pela Prefeitura foi dado início ao procedimento licitatório porém houve contestação por um dos concorrentes.	COLOCAR AQUI UMA AÇÃO CORRETIVA, CASO TENHA TIDO.
2.3	**Aceite do processo licitatório**	Emissão de parecer técnico sobre o aceite do processo licitatório	Equipe Técnica CGCP	27/09/21	02/10/21	R$ 0,00				0,00%	**Atrasado**	Segundo informado pela Prefeitura foi dado início ao procedimento licitatório porém houve contestação por um dos concorrentes.	COLOCAR AQUI UMA AÇÃO CORRETIVA, CASO TENHA TIDO.
2.4	**Liberação da Parcela Única**	Liberação da Parcela Única	CGAF	02/10/21	02/10/21	R$ 483.189,57				0,00%	**A Iniciar**		
2.5	**Etapa 1**	ELABORAÇÃO DA METODOLOGIA E MOBILIZAÇÃO SOCIAL	Equipe Técnica do Município de Guarabira	02/10/21	22/10/21	R$ 0,00				0,00%	**A Iniciar**		

2.6	**Etapa 2**	CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	Equipe Técnica do Município de Guarabira	22/10/21	11/11/21	R$ 0,00				0,00%	**A Iniciar**		
2.7	**Acompanhamento e Fiscalização Etapas 1 e 2**	Realização de reuniões, acompanhamento da execução das metas, elaboração de pareceres	Equipe Técnica CGCP	02/10/21	11/11/21	R$ 0,00				0,00%	**A Iniciar**		
2.8	**Etapa 3**	DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS E PROPOSIÇÕES	Equipe Técnica do Município de	11/11/21	11/12/21	R$ 0,00				0,00%	**A Iniciar**		
2.9	**Etapa 4**	ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA	Equipe Técnica do Município de Guarabira	11/12/21	31/12/21	R$ 0,00				0,00%	**A Iniciar**		
2.10	**Acompanhamento e Fiscalização Etapa 3 e 4**	Realização de reuniões, acompanhamento da execução das metas, elaboração de pareceres	Equipe Técnica CGCP	11/11/21	31/12/21	R$ 0,00				0,00%	**A Iniciar**		
3		**PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)**								**0,00%**	**A Iniciar**		
3.1	**Prestação de contas final**	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	Município de Guarabira	31/12/21	30/01/22	R$ 0,00				0,00%	**A Iniciar**		
3.2	**Elaboração de Relatório Final**	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGCP	30/01/22	14/02/22	R$ 0,00				0,00%	**A Iniciar**		
3.3	**Análise da prestação de contas financeiras**	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	31/12/21	01/03/22	R$ 0,00				0,00%	**A Iniciar**		
				Valor Previsto:		R$ 483.189,57	**Valor realizado:**		R$ 0,00	38%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
Município de Guarabira
Observações:

Fonte: CGCP (Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos**	**Número do Projeto:**	**PO CGCP 2021005**
Objetivo estrátegico:	**2.2. Promover a sustentabilidade Ambiental**	**Ano:**	**2021**

Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	**Objetivo estrátegico (MDR):**	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
Finalidade da ação:	**Elaboração de estudo de vocações e potencialidades específico sobre Estado da Paraíba, no intuito de identificar os eixos estratégicos para o desenvolvimento econômico, visando aperfeiçoar a atuação da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (CINEP) nos municípios e Arranjos Produtivos Locais (APL's), assim como nortear a elaboração de políticas públicas e alocação de recursos financeiros que visem ampliar a eficiência e gerar desenvolvimento no Estado da Paraíba**		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Renato Arruda Vaz de Oliveira
Problema (causa):	**Baixa especificidade dos setores estratégicos ao desenvolvimento no estado da Paraíba.**		
Projeto:	Estudo de Vocações e Potencialidades para o estado da Paraíba		
Objetivo do projeto:	Diagnosticar os principais setores da economia paraibana e priorizar um destes setores como um "Eixo Prioritário" de desenvolvimento do estado, prevendo planos táticos que indiquem o que é preciso ser realizado em termos de políticas públicas, investimentos estruturantes e apoio institucional que permita o fortalecimento deste Eixo Prioritário na Paraíba, de tal forma a permitir a inserção competitiva do estado no cenário Regional, Nacional e Global nesta área específica.		

Dados Orçamentários		Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)	Contrapartida (R$ 1,00)
		280	Custeio		R$750.000,00	R$780.000,00	R$ 30.000,00
Término da Vigência do Convênio:	31/12/2021						
Término da Prestação de Contas:	1/3/2022	**Convênio nº**	907743/2020				
Data Atualização:	30/09/2021	**Processo SEI**	59336.002462/2020-74				

Cronograma de Desembolso (1)			
Parcela única - SUDENE			TOTAL
R$750.000,00			R$ 750.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	750.000,00
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício (1)	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	-R$	750.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Teresa Barbosa e Danilo Cesar

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado			Físico %	Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor				
1		**PLANEJAMENTO (Peso 20%)**								**20%**	**Concluído**		
1.1	**Abertura do Programa SICONV**	Autorização da Diretoria Colegiada para abertura de chamada de projetos, elaboração de edital de	CGCP	21/10/20	11/11/20	R$ 0,00	21/10/20	11/11/20	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**	Processo: 59336.001698/2020-93. Relatório do Processo de Chamada SEI Nº 0217183	
1.2	**Seção e análise das propostas**	A análise das propostas enviadas para o Programa 5320320200012 foi realizada pela equipe técnica	CGCP	30/11/20	31/12/20	R$ 0,00	30/11/20	31/12/20	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**		
1.2	**Analise jurídica**	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	24/12/20	31/12/20	R$ 0,00	24/12/20	31/12/20	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**		
1.3	**Elaboração da minuta do Convênio**	Elaboração do minuta do Convênio	COCIC	24/12/20	31/12/20	R$ 0,00	24/12/20	31/12/20	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**		
1.4	**Assinatura do Convênio**	Assinatura do Convênio	Superintendente	31/12/20	31/12/20	R$ 0,00	31/12/20	31/12/20	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**		
1.5	**Publicação do Convênio**	Publicação do Convênio	GABINETE/ASCOM	31/12/20	05/01/21	R$ 0,00	31/12/20	05/01/21	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**		
2		**EXECUÇÃO (Peso 60%)**								**11%**	**Em Andamento**		
2.1	**Análise do Termo de Referência**	Elaboração do Termo de Referência pela equipe técnica do convenente, reuniões de orientações e ajustes e elaboração de pareceres de análise do Termo de Referência, ajustes do Plano de Trabalho.	Equipe Técnica da CINEP e Equipe Técnica CGCP	23/12/20	30/06/21	R$ 0,00	23/12/20	30/06/21	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**	Pareceres Técnicos de Análise do TR: Parecer Técnico 23 (0220716), 136 (0249542), 171 (0254469) e Nota Técnica 24 (0224241)	Pelo tempo decorrido na elaboração do TR do convênio, será necessário fazer um Termo Aditivo para ampliação da vigência. A partir do T.A. as datas serão repactuadas
2.2	**Ajustes no Plano de Trabalho**	Incorporação dos ajustes executados no Termo de Referência ao Sistema da Plataforma +Brasil e elaboração de Termo Aditivo	Equipe Técnica da CINEP e Equipe Técnica CGCP	30/06/21	31/07/21	R$ 0,00	30/06/21	09/08/21	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**		
2.3	**Processo Licitatório**	Elaboração dos procedimentos para realização do Processo Licitatório	Equipe Técnica da CINEP	30/06/21	31/08/21	R$ 0,00				0,00%	**Atrasado**	Em 26/10/2021, foi publicado no DOU o Aviso de Licitação, com data marcada para 11/01/2022.	Será formalizado pelo convente solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma.

2.4	**Aceite do processo licitatório**	Emissão de parecer técnico sobre o aceite do processo licitatório	Equipe Técnica CGCP	31/08/21	05/09/21	R$ 0,00				0,00%	**Atrasado**	Em 26/10/2021, foi publicado no DOU o Aviso de Licitação, com data marcada para 11/01/2022.	Será formalizado pelo convente solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, devido a atraso no procedimento licitatório.
2.5	**Liberação da Parcela Única**	Liberação da Parcela Única	CGAF	05/09/21	05/09/21	R$ 750.000,00				0,00%	**Atrasado**	Em 26/10/2021, foi publicado no DOU o Aviso de Licitação, com data marcada para 11/01/2022.	Será formalizado pelo convente solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, devido a atraso no procedimento licitatório.
2.6	**Meta 1**	Preparatória: Detalhamento Metodológico	Equipe Técnica da CINEP	05/09/21	05/10/21	R$ 0,00				0,00%	**Atrasado**	Em 26/10/2021, foi publicado no DOU o Aviso de Licitação, com data marcada para 11/01/2022.	Será formalizado pelo convente solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, devido a atraso no procedimento licitatório.

2.7	**Meta 2**	Mapeamento das vocações e potencialidades da Paraíba	Equipe Técnica da CINEP	05/09/21	04/11/21	R$ 0,00				0,00%	**Atrasado**	Em 26/10/2021, foi publicado no DOU o Aviso de Licitação, com data marcada para 11/01/2022.	Será formalizado pelo convente solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, devido a atraso no procedimento licitatório.
2.8	**Meta 3**	Priorização do Eixo Estratégico e seu diganóstico	Equipe Técnica CGCP	04/11/21	04/12/21	R$ 0,00				0,00%	**A Iniciar**		
2.9	**Meta 4**	Cenarização e carteira estratégica do eixo	Equipe Técnica da CINEP	04/12/21	02/02/22	R$ 0,00				0,00%	**A Iniciar**		
2.10	**Meta 5**	Planos táticos para o eixo prioritário	Equipe Técnica da CINEP	02/02/22	02/07/22	R$ 0,00				0,00%	**A Iniciar**		
2.11	**Acompanhamento e Fiscalização**	Realização de reuniões, acompanhamento da execução das metas, elaboração de pareceres	Equipe Técnica CGCP	30/06/21	02/07/22	R$ 0,00				0,00%	**A Iniciar**		
3		**PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)**								**0,00%**	**A Iniciar**		
3.1	**Prestação de contas final**	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	Equipe Técnica da CINEP	02/07/22	01/08/22	R$ 0,00				0,00%	**A Iniciar**		
3.2	**Elaboração de Relatório Final**	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGCP	01/08/22	16/08/22	R$ 0,00				0,00%	**A Iniciar**		
3.3	**Análise da prestação de contas financeiras**	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	02/07/22	01/03/22	R$ 0,00				0,00%	**A Iniciar**		
				Valor Previsto:		R$ 750.000,00	**Valor realizado:**		R$ 0,00	37%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
CINEP - Companhia de Desenvolvimento da Paraíba
Observações:

Fonte: CGCP (Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos**	**Número do Projeto:**	**PO CGCP 2021006**
Objetivo estrátegico:	**2.2. Promover a sustentabilidade Ambiental**	**Ano:**	**2021**

Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	20WQ - Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	**Objetivo estrátegico (MDR):**	Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores
Finalidade da ação:	**Subsídiar a Sudene e o Ministério para elaborar instrumentos de planejamento de desenvolvimento regional sustentável e articulação dos atores sociais representativos da Região Nordeste**		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Renato Arruda Vaz de Oliveira
Problema (causa):	Necessidade de obter informações sobre aspotencialidades econômicos que contribuam para o aperfeiçoamento das políticas públicas de desenvolvimento regional		
Projeto:	Elaboração de um Estudo de Complexidade Econômica, um Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio São Francisco e área de influência do Projeto de Integração do São Francisco (PISF) e elaboração de um Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio Parnaíba		
Objetivo do projeto:	Planejamento de ações estratégicas para as Bacias Hidrográficas mais importantes do Nordeste		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)**	**Valor Total do Projeto (R$ 1,00)**	**Contrapartida (R$ 1,00)**
	280	Custeio		R$893.809,13	R$893.809,13	-

Término do Contrato	10/4/2022	**PRODOC SUDENE PNUD**	BRA/17
Data Atualização:	30/09/2021	**Processo SEI**	59336.000928/2020-05

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Danilo Campêlo, Isis Moreira, Gabriela Isabel Nascimento, Marina Barbosa

Cronograma de Desembolso (1)				
Produto 1	Produto 2	Produto 3	TOTAL
R$22.345,23	**R$ 178.761,83**	**R$ 245.797,51**	R$ 893.809,13
Produto 4	Produto 5	Produto 6	Produto 7
R$ 44.690,46	**R$ 44.690,46**	**R$ 178.761,83**	**R$ 178.761,81**

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	893.809,13
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$	-
Valor Empenhado no Exercício (1)	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	201.107,06
Saldo a liberar	-R$	692.702,07
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	201.107,06

	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1		**PLANEJAMENTO (Peso 20%)**								**20%**	**Concluído**		
1.1	**Processo de Início de Projeto**	Recebimento de demanda, elaboração e aprovação do TAP, Elaboraçaõ de notas técnicas	DPLAN/CGCP	08/05/20	01/09/20	R$ 0,00	08/05/20	01/09/20	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**	Nota Técnica 187 (0173494), Plano de Gerenciamento de Projeto (PGP) CGCP 0183823	
1.2	**Elaboração do Termo de Referência**	Elaboração dos documentos de requisição de compras (Termo de Referência, Memória de	CGCP/PNUD	02/09/20	28/09/20	R$ 0,00	02/09/20	28/09/20	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**		
1.2	**Abertura de Edital**	Abertura do edital, recebimento de propostas, audiências prévias	JOF/PNUD/CGCP	06/10/20	09/11/2020	R$ 0,00	06/10/20	04/12/2020	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**		
1.3	**Seleção das propostas**	Definição de equipe, seleção das propostas em 2 fases (técnica e financeira). Validação da	Comissão de Avaliação/JOF	04/12/20	05/03/21	R$ 0,00	04/12/20	05/03/21	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**	Portaria 80 (0200601), Processo 59336.000244/2021-86, Nota Técnica 4 (0217167) ,	
1.4	**Assinatura do Contrato**	Assinatura do Contrato	PNUD/JOF/Consórcio RHA	15/04/21	15/04/21	R$ 0,00	15/04/21	15/04/21	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**	CONTRATO - PNUD-RHA (0237685)	
2		**EXECUÇÃO (Peso 60%)**								**23%**	**Em Andamento**		
2.1	**Reuniões de acompanhamento técnico - Quinzenal**	Reuniões de apresentação das equipes e estabalecimento de acordos sobre a dinâmica do acompanhamento, reuniões de ajuste e validação de conteúdo e cronograma.	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	15/04/21	10/04/22	R$ 0,00	15/04/21	10/04/22	R$ 0,00	100,00%	**Concluído**		
2.2	**Produto 1 - Detalhamento Metodológico**	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Consórcio RHA-VERTRAG	15/04/21	05/05/21	R$22.345,23	15/04/21	05/05/21	R$22.345,23	100,00%	**Concluído**	Aprovado mediante Nota Técnica 104/2021 de 17/05/2021.	
2.3	**Produto 2 - Documento Preliminar de Estudo de Complexidade Econômica**	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Consórcio RHA-VERTRAG	05/06/21	18/08/21	R$178.761,83	05/06/21	29/09/21	R$178.761,83	100,00%	**Concluído**		
2.4	**Produto 3 - Documento Final de Estudo de Complexidade Econômica**	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Consórcio RHA-VERTRAG	05/07/21	17/09/21	R$245.797,51	05/07/21			0,00%	**Em Andamento**		
2.5	**Produto 4 - Análise Integrada das Políticas Públicas da Bacia São Francisco e PISF**	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Consórcio RHA-VERTRAG	18/06/21	16/10/21	R$44.690,46	18/06/21			0,00%	**Em Andamento**		

2.6	**Produto 5 - Análise Integrada das Políticas Públicas da Bacia do Parnaíba**	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Consórcio RHA-VERTRAG	18/06/21	16/10/21	R$44.690,46	18/06/21			0,00%	**Em Andamento**		
2.7	**Produto 6 - Plano de Ação Estratégico para a Bacia do São Francisco e PISF**	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Consórcio RHA-VERTRAG	02/10/21	05/12/21	R$178.761,83				0,00%	**A Iniciar**		
2.8	**Produto 7 - Plano de Ação Estratégico para a Bacia do Parnaíba**	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Consórcio RHA-VERTRAG	01/11/21	03/01/22	R$178.761,81				0,00%	**A Iniciar**		
3		**PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 20%)**								**0,00%**	**A Iniciar**		
3.1	**Encerramento do Projeto**	Relatório Final de Encerramento do Projeto	Consórcio RHA-VERTRAG	03/01/22	04/03/22	R$ 0,00				0,00%	**A Iniciar**		
3.2	**Elaboração de Relatório Final**	Análise e elaboração de parecer final de Projeto	Sudene/PNUD	04/03/22	19/03/22	R$ 0,00				0,00%	**A Iniciar**		
				Valor Previsto:		R$893.809,13	**Valor realizado:**		R$201.107,06	48%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

PNUD, CONSÓRCIO RHA, VERTRAG

Observações:

Fonte: CGCP (Coordenação-Geral de Cooperação e Articulação de Políticas)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**		**CGDF/2008001 (ex PO 34)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**		**Ano: 2008**
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MDR):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	**Gestor da subunidade:**	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):	O TCU, em 25/01/2017, suspendeu o repasse de recursos para as obras da Transnordestina (Ácordão 67/2017).		
Projeto:	Transnordestina Logística S/A - TLSA		
Objetivo do projeto:	Construção da Ferrovia Transnordestina - 1728 Km de implantação/remodelação e 550 km de recuperação (Alagoas, Ceará, Pernambuco e Piauí)		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	3.876.491.700,00	7.541.642.373,08

Previsão de Conclusão Física:	19/09/2016
Previsão de Conclusão ADM:	Não informado
Data Atualização:	30/09/2021
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva

Data prevista para implantação do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	3.065.105.668,00
A realizar no exercício	R$	811.386.032,00
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	811.386.032,00
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	3.065.105.668,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Villeneuve (SUDENE/DFIN)	08/08/08	07/09/08	-	08/08/08	08/09/08	-	100,00%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Villeneuve e Cassimiro (SUDENE/DFIN)	23/09/08	23/10/08	-	23/09/08	09/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise na SUDENE,antes de set/09 (30 dias) e depois de set/09 (60 dias).	
3	Análise de Projeto	José Leorne (CENOP/BNB)	09/10/08	06/02/09	-	09/10/08	28/10/08	-	100,00%	Concluído	A análise é feita no Banco do Nordeste do Brasil.	
4	Aprovação do projeto no montante de R$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R$ 53.576.481,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	29/10/08	28/11/08	-	29/10/08	24/11/08	-	100,00%	Concluído	Resolução Diretoria Colegiada SUDENE nº 24/2008.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**08/08/08**	**28/11/08**	**0,00**	**08/08/08**	**24/11/08**	**0,00**	**100%**	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	12/01/10	11/02/10	336.647.184,00	12/01/10	12/01/10	336.647.184,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 1 - pós configuração modular - Resolução da Diretoria Colegiada nº 28, de 16/12/2009).	
6	Liberação 2	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/11/10	29/12/10	350.270.386,00	29/11/10	29/11/10	350.270.386,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 2 (parcela 1 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
7	Liberação 3	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/12/10	31/12/10	338.035.512,00	01/12/10	02/12/10	338.035.512,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38/2010, de 28/10/2010). Liberação inferior à prevista no cronograma.	
8	Liberação 4	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	27/09/11	27/10/11	468.293.037,00	27/09/11	06/10/11	468.293.037,00	100,00%	Concluído	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
9	Liberação 5	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	29/08/12	28/09/12	121.859.549,00	29/08/12	20/09/12	121.859.549,00	100,00%	Concluído	Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação. (Vide obs4).	Liberação parcial, proporcional às comprovações. A previsão inicial era de liberar R$ 176,9 milhões. Cronograma reformulado.

10	Desmodularização do projeto	Norberto Scopel (SUDENE/DFIN)	01/09/12	01/10/12	0,00	01/09/12	21/09/12		100,00%	**Concluído**	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 21.09.12, aprovou a desmodularização do projeto.	
11	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	06/02/13	08/03/13	0,00	06/02/13	27/02/12		100,00%	**Concluído**	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 27.02.13, aprovou a adequação do cronograma de desembolso do projeto.	
12	Liberação 6	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/02/13	03/03/13	650.000.000,00	01/02/13	24/06/13	650.000.000,00	100,00%	**Concluído**	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2013/147, de 17.05.2013) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	A SUDENE apontou impropriedades no Relatório do BNB, que foram sanadas por meio do Ofício DIRET-2013/152, de 22.05.2013.
13	Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	15/10/12	13/04/13	0,00	15/10/12	03/07/14	-	100,00%	**Concluído**	Aditado no valor de R$1.204.091.700,00(resolução nº 190/2014).	
14	Liberação 7	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/13	01/12/13	800.000.000,00	23/07/14	11/08/14	800.000.000,00	100,00%	**Concluído**	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2014/146, de 21.06.2014) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	
15	Liberação 8	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/11/14	01/12/14	500.000.000,00	-	-		0,00%	**Paralisado**	Liberações suspensas por determinação do TCU (Ácordão 67/2017).	
16	Liberação 9	SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	01/05/15	31/05/15	311.386.032,00	-	-		0,00%	**Paralisado**	Liberações suspensas por determinação do TCU (Ácordão 67/2017).	
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**12/01/10**	**31/05/15**	**3.876.491.700,00**	**-**	**-**	**3.065.105.668,00**	**83%**	**Paralisado**		
	Competência da SUDENE /Banco								**92%**	**Paralisado**		
17	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado					0,00%	**A Iniciar**		
18	Emissão do Certificado de Empreend. Implantado	BNB	Não informado	Não informado					0,00%	**A Iniciar**		
	Encerramento (Banco)		**-**	**-**	**0,00**			**0,00**	**0%**	**A Iniciar**		
	Resultado Geral do Projeto		**Valor Previsto:**		**3.876.491.700,00**			**3.065.105.668,00**	**77,78%**	**Paralisado**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: O projeto Transnordestina é dividido por Módulos que são : Módulo I - Salgueiro (PE)-Suape (PE); Salgueiro (PE)-Missão Velha (CE); Salgueiro (PE)-Trindade (PE)/ Módulo II - Eliseu Martins (PI) - Trindade (PE)./ Módulo III - Missão Velha (CE) - Pecém (CE).

Obs3: Atraso na implantação do empreendimento, em face de problemas na execução das obras, em especial os problemas de desapropriação e adequações técnicas no projeto.

Obs4: Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação.

Obs5: Aprovado pela Diretoria Colegiada da SUDENE, conforme Resolução nº 115/2012, de 22/05/2012, alteração do cronograma de desembolso e reembolso do Projeto.

Obs6: Agente Operador solicitou liberação parcial, no valor de R$121.869.549,00. Recursos foram transferidos pela SUDENE ao BNB em 20.09.12.

Obs7: Desmodularização do projeto aprovada pela Diretoria Colegiada da SUDENE em 21.09.12.

Obs8: Alteraçao de cronograma de desembolso aprovada pela SUDENE em 27/02/2013.

Obs9: Serão realizados estudos para revisão orçamentária e do cronograma de investimentos - adequação do projeto, com aporte adicional de recursos do FDNE.

Obs10: Por meio do Ofício nº 0676/2013/DFIN/SUDENE, de 22.05.2013, a SUDENE solicitou a disponibilização dos recursos por intermédio do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

Obs11: As obras estão paralisadas e só serão retomadas após a aprovação das adequações do projeto, incluindo aporte adicional de recursos, revisão do cronograma de desembolso e reembolso, assinatura de TAC, Acordo de Acionistas e revisão dos respectivos contratos pertinentes ao financiamento.

Obs12: Os Acordos de Acionistas e Investimentos foram assinados, repactuando condições de financiamento dos envolvidos no projeto

Obs13: As obras estão em andamento e a SUDENE aguarda posição do banco em relação à comprovação de aplicação dos recursos no projeto

Obs14: O TCU, em 25/01/2017, suspendeu o repasse de recursos para as obras da Transnordestina (Ácordão 67/2017).

Obs15: Após pedido da empresa o BNB analisou e aprovou o pedido de repactuação das condições financeiras do financiamento do FDNE (prazo de carência e novo cronograma de reembolso). O pedido agora encontra-se em análise pela SUDENE.

Obs16: A SUDENE negou o pedido de repactuação das condições financeiras do financiamento do FDNE (ver Obs.15).

Obs17: A TLSA efetuou a recomposição do saldo da conta reserva em 23/10/19, no valor de R$ 112.647.260,64.

Obs18: Foi concedida prorrogação, pelo prazo de 30 dias, do vencimento da amortização programada para 19/09/2020, em caráter cautelar, conforme Resolução da Diretoria Colegiada da Sudene nº 569/2020 (SEI nº 0182999).

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGDF/2008002 (ex PO 35)**
Objetivo estratégico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2008**
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estratégico (MDR):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	**Gestor da subunidade:**	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):			
Projeto:	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)		
Objetivo do projeto:	Geração de energia termoelétrica - 290 MW - Candeias/BA		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	61.728.156,00	591.065.604,06

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	30/09/2021
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva

Data prevista para implantação do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	61.728.156,00
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	61.728.156,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Norberto Scopel (SUDENE/DGFI)	24/07/08	23/08/08	-	24/07/08	25/08/08	-	100,0%	Concluído	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/01/09	06/02/09	-	10/09/08	15/10/08	-	100,0%	Concluído	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias	
3	Análise de Projeto	Francisco (CENAP/BNB)	15/10/08	12/02/09	-	15/10/08	01/08/11	-	100,0%	Concluído	O projeto permaneceu em análise no Banco do Nordeste por 45 meses	
4	Aprovação do projeto (O valor do projeto é de R$ 591.065.604,06 e a participação do FDNE é de R$ 61.728.156,00)	Diretoria Colegiada da SUDENE	01/08/11	31/08/11	-	01/08/11	15/08/11	-	100,0%	Concluído	Resolução SUDENE n. 87/2011.	Ofício nº 669/2012/DFIN-SUDENE, de 07/05/12, solicitando providências do BNB junto à Empresa para liberação dos recursos. Aguardando retorno.
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**24/07/08**	**31/08/11**	**0,00**	**24/07/08**	**15/08/11**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		
5	Liberação (parcela única)	SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	21/03/12	20/04/12	61.728.156,00	21/03/12	01/06/12	61.728.156,00	100,0%	Concluído	Liberação concluída. Ofício ANGPF-2012/575-16, de 31.05.2012 (BNB), comunica à SUDENE que foram atendidas condições para liberação dos recursos. Ordem Bancária nº 2012OB00001, de 01/06/2012.	
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**21/03/12**	**20/04/12**	**61.728.156,00**	**21/03/12**	**01/06/12**	**61.728.156,00**	**100%**	**Concluído**		
	Competência da SUDENE /Banco								**100%**	**Concluído**		
6	Fiscalizações	BNB	17/06/14	17/06/14		17/06/14	17/06/14		100,0%	Concluído		

7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,0%	Atrasado	O BNB emitiu CCE com erro na legislação do Fundo, se referindo ao decreto 7838 ao invés do 6952. Foi solicitada alteração em março de 2020, mas o banco não enviou o documento.
Encerramento (Banco)			**17/06/14**	**15/02/19**	**0,00**	**17/06/14**	**-**	**0,00**	**50%**	**Atrasado**	

Resultado Geral do Projeto	**Valor Previsto:**	**61.728.156,00**	**Valor realizado:**	**61.728.156,00**	**85,71%**	**Atrasado**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs:1 O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs:2 A Sudene aprovou em 28/10/2018, a incorporação da Candeias Energia S/A ("CESA") pela Companhia Energética Candeias ("CEC").

Obs:3 Aguardando a emissão da versão final do CCE.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGDF/2011001 (ex PO 36)**
Objetivo estratégico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2011**
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estratégico (MDR):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	**Gestor da subunidade:**	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):			
Projeto:	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 25,2 MW - Trairí/CE		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto**	**Valor Total do Projeto**
	100	5	90	59.700.000,00	111.433.000,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	30/09/2021
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	59.700.000,00
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	59.700.000,00

N.E.	**Atividades/ Etapas**	**Responsável**	**Previsto**			**Realizado**				**Status**	**Observação/Problemas**	**Providências**
			Início	**Fim**	**Valor**	**Início**	**Fim**	**Valor**	**Físico %**			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (SUDENE/DGFI)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	**Concluído**		
2	Pré-análise	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	**Concluído**		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	**Concluído**	Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	**Concluído**	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	**Concluído**	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 151/2013.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**13/07/11**	**24/04/13**	**0,00**	**13/07/11**	**22/05/13**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	**Concluído**		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	18/02/14	20/03/14	42.723.785,57	18/02/14	12/03/14	42.723.785,57	100,00%	**Concluído**		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/07/14	31/07/14	16.976.214,43	26/12/14	02/02/15	16.976.214,43	100,00%	**Concluído**	Liberações concluidas.	
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**22/05/13**	**31/07/14**	**59.700.000,00**	**22/05/13**	**02/02/15**	**59.700.000,00**	**100%**	**Concluído**		
	Competência da SUDENE /Banco								**100%**	**Concluído**		

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		100,00%	**Concluído**		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,00%	**Atrasado**	Foi realizada reunião com o BNB no dia 14/10/2021 para dirimir dúvidas em relação à emissão dos CCEs	
	Encerramento (Banco)		**-**	**15/02/19**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**50%**	**Atrasado**		
	Resultado Geral do Projeto		**Valor Previsto:**		**59.700.000,00**	**Valor realizado:**		**59.700.000,00**	**90,00%**	**Atrasado**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, do Conselho Monetário Nacional (CMN) em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs6:	Aguardando a emissão da versão final do CCE pelo Banco.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGDF/2011002 (ex PO 37)**
Objetivo estratégico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2011**
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estratégico (MDR):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	**Gestor da subunidade:**	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 27,3 MW- Areia Branca/RN		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	54.900.000,00	111.820.000,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018	Data prevista para implantação do empreendimento.
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019	
Data Atualização:	30/09/2021	
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva	

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	54.900.000,00
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	54.900.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Casimiro (SUDENE/DGFI)	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	19/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB (a definir)	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 461/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	24/03/13	-	24/12/12	25/03/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	25/03/13	24/04/13	-	25/03/13	22/05/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 154/2013.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**13/07/11**	**24/04/13**	**0,00**	**13/07/11**	**22/05/13**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05/13	31/05/13		22/05/13	24/05/13		100,00%	Concluído		
7	Liberação 1	SUDENE/BNB	01/01/14	31/01/14	53.635.943,87	01/01/14	24/01/14	53.635.943,87	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/05/14	31/05/14	1.264.056,13	12/01/16	15/02/16	1.264.056,13	100,00%	Concluído		
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**22/05/13**	**31/05/14**	**54.900.000,00**	**22/05/13**	**15/02/16**	**54.900.000,00**	**100%**	**Concluído**		
	Competência da SUDENE /Banco								**100%**	**Concluído**		

9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		100,00%	Concluído	
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,00%	Atrasado	Foi realizada reunião com o BNB no dia 14/10/2021 para dirimir dúvidas em relação à emissão dos CCEs
	Encerramento (Banco)		**-**	**15/02/19**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**50%**	**Atrasado**	

Resultado Geral do Projeto	**Valor Previsto:**	**54.900.000,00**	**Valor realizado:**	**54.900.000,00**	**90,00%**	**Atrasado**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs6:	Aguardando a emissão da versão final do CCE pelo Banco.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGDF/2011003 (ex PO 38)**
Objetivo estratégico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2011**

Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MDR):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	**Gestor da subunidade:**	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):			
Projeto:	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A		
Objetivo do projeto:	Geração de Energia Eólica - 23,1 MW - Areia Branca/RN		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto**	**Valor Total do Projeto**
	100	5	90	50.000.000,00	98.445.000,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	30/09/2021
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	50.000.000,00
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	50.000.000,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Carta-consulta	Casimiro/Norberto	13/07/11	11/09/11	-	13/07/11	28/07/11	-	100,00%	Concluído		
2	Pré-análise	Mauro	11/11/11	10/01/12	-	11/11/11	22/12/11	-	100,00%	Concluído		
3	Análise de Projeto	BNB/A definir	29/12/11	10/02/13	-	29/12/11	-	-	100,00%	Concluído	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 462/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
4	Análise de Projeto - novos prazos	BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	24/12/12	23/05/13	-	24/12/12	08/05/13	-	100,00%	Concluído	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
5	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/05/13	07/06/13	-	08/05/13	22/05//13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 152/2013.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**13/07/11**	**07/06/13**	**0,00**	**13/07/11**	**22/05//13**	**0,00**	**100%**	Concluído		
6	Contratação do banco operador	SUDENE/BNB	22/05//13	31/05/13		22/05//13	24/0513		100,00%	Concluído		
7	Liberação1	SUDENE/BNB	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	01/02/14	03/03/14	46.786.085,39	100,00%	Concluído		
8	Liberação 2	SUDENE/BNB	01/04/14	01/05/14	3.213.914,61	12/01/16	15/02/16	3.213.914,61	100,00%	Concluído		
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**22/05//13**	**01/05/14**	**50.000.000,00**	**22/05//13**	**15/02/16**	**50.000.000,00**	**100%**	Concluído		
	Competência da SUDENE /Banco								**100%**	Concluído		
9	Fiscalizações	BNB	Não informado	Não informado		-	-		100,00%	Concluído		
10	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BNB	17/12/18	15/02/19		-	-		0,00%	Atrasado	Foi realizada reunião com o BNB no dia 14/10/2021 para dirimir dúvidas em relação à emissão dos CCEs	
	Encerramento (Banco)		**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**50%**	Atrasado		

Resultado Geral do Projeto	**Valor Previsto:**	**50.000.000,00**	**Valor realizado:**	**50.000.000,00**	**90,00%**	Atrasado	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2:	Após a prorrogação do prazo inicial - 30 dias ,concedido pelo BNB, a Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise e o prazo foi acatado pela SUDENE.
Obs3:	Prorrogado o prazo de análise por mais 60 dias, a pedido da Empresa, para atender exigências da análise.
Obs4:	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012, estabelece que ficam sobrestados os prazos para prosseguimento dos processos relativos ao FDNE, até que sejam publicados os atos normativos correspondentes.
Obs5:	Com a publicação da Resolução nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.
Obs6:	Aguardando a emissão da versão final do CCE pelo Banco.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGDF/2012002 (ex PO 40)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2012**
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MDR):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	**Gestor da subunidade:**	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):	As liberações estão paralisadas devido ao descumprimento de cláusulas contratuais por parte da empresa junto ao Banco do Brasil.		
Projeto:	Natulab Laboratório S.A.		
Objetivo do projeto:	Laboratório de Farmacos para Humanos		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	19.539.983,88	63.051.003,61

Previsão de Conclusão Física:	31/12/2016	Data prevista para conclusão do empreendimento.
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019	
Data Atualização:	30/09/2021	
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva	

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	19.539.983,88
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	19.539.983,88

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	06/09/12	05/11/12	-	06/09/12	19/12/12	-	100,00%	Concluído	Ocorreu o sobrestamento dos prazos do Fdne até a publicação a publicação da resolução do Conselho Monetário Nacional, conforme resolução nº 121/12.	
2	Análise de Projeto	BB	25/03/13	23/06/13	-	25/03/13	17/06/13	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	17/06/13	16/08/13	-	17/06/13	20/06/13	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 161/2013.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**06/09/12**	**16/08/13**	**0,00**	**06/09/12**	**20/06/13**	**0,00**	**100%**	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	20/06/13	19/08/13		20/06/13	28/06/13	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/06/14	01/07/14	13.862.197,00	08/05/14	09/06/14	13.862.197,00	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	09/03/15	08/04/15	5.677.786,88	09/03/15	18/06/15	5.677.786,88	100,00%	Concluído		
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**20/06/13**	**#REF!**	**19.539.983,88**	**20/06/13**	**#REF!**	**19.539.983,88**	**100%**	Concluído		
	Competência da SUDENE /Banco								**100%**	Concluído		

#REF!	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	100,00%	**Concluído**	
#REF!	Emissão de Certificado de Empreend.	BB	17/12/18	15/02/19		-	30/08/21		100,00%	**Concluído**	Parecer encaminhado pelo BB
Encerramento (Banco)			**Não informado**	**15/02/19**	**0,00**	**-**	**30/08/21**	**0,00**	**100%**	**Concluído**	

Resultado Geral do Projeto	**Valor Previsto:**	**19.539.983,88**	**Valor realizado:**	**19.539.983,88**	**100,00%**	**Concluído**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Obs3: Adequação do cronograma de desembolso.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGDF/2012003 (ex PO 41)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2012**
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MDR):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	**Gestor da subunidade:**	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):			
Projeto:	Deten Química S.A.		
Objetivo do projeto:	Ampliação da Produção de Produtos Químicos		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto**	**Valor Total do Projeto**
	100	5	90	31.256.000,00	78.140.000,00

Previsão de Conclusão Física:	28/12/2017
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	30/09/2021
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	31.256.000,00
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	31.256.000,00

N.E.	**Atividades/ Etapas**	**Responsável**	**Previsto**			**Realizado**				**Status**	**Observação/Problemas**	**Providências**
			Início	**Fim**	**Valor**	**Início**	**Fim**	**Valor**	**Físico %**			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	05/02/13	06/04/13	-	05/02/13	28/02/13	-	100,00%	**Concluído**		
2	Análise de Projeto	BB	15/04/13	12/09/13	-	15/04/13	21/08/13	-	100,00%	**Concluído**		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	27/08/13	26/10/13	-	27/08/13	10/09/13	-	100,00%	**Concluído**	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 167/2013.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**05/02/13**	**26/10/13**	**0,00**	**05/02/13**	**10/09/13**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	10/09/13	30/04/14		10/09/13	26/09/13	-	100,00%	**Concluído**		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/05/14	31/05/14	15.447.600,00	14/08/14	02/09/14	15.447.600,00	100,00%	**Concluído**	Liberado um valor maior do que o inicialmente previsto.	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/06/17	01/07/17	15.808.400,00	14/06/17	15/05/18	15.808.400,00	100,00%	**Concluído**	Está em análise uma adequação do projeto originalmente aprovado. O BB já emitiu Parecer favorável. Após essa fase a Proposta de Liberação será analisada.	
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**10/09/13**	**01/07/17**	**31.256.000,00**	**10/09/13**	**15/05/18**	**31.256.000,00**	**100%**	**Concluído**		
	Competência da SUDENE /Banco								**100%**	**Concluído**		
11	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	100,00%	**Concluído**		
12	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	17/12/18	15/02/19		-	30/08/21		100,00%	**Concluído**	Parecer encaminhado pelo BB	

Encerramento (Banco)	**Não informado**	**15/02/19**	**0,00**	**-**	**30/08/21**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		

Resultado Geral do Projeto	**Valor Previsto:**	**31.256.000,00**	**Valor realizado:**	**31.256.000,00**	**100,00%**	**Concluído**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Foi apresentado pelo BB uma nova versão do QUF do empreendimento. Após a apreciação e deliberação do assunto por parte da SUDENE, o pleito foi aprovado, restando pendente a emissão do CCE por parte do Banco.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGDF/2012004 (ex PO 42)**
Objetivo estratégico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2012**
Programa:	2217- Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estratégico (MDR):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	**Gestor da subunidade:**	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):			
Projeto:	Braskem S.A.		
Objetivo do projeto:	Modernização da Central de Petroquímicos Básicos		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto**	**Valor Total do Projeto**
	100	5	90	50.000.000,00	478.494.548,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	30/09/2021
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva

Data prevista para conclusão do empreendimento.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	50.000.000,00
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício (RAP)	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	50.000.000,00

N.E.	**Atividades/ Etapas**	**Responsável**	**Previsto**			**Realizado**				**Status**	**Observação/Problemas**	**Providências**
			Início	**Fim**	**Valor**	**Início**	**Fim**	**Valor**	**Físico %**			
1	Consulta prévia	Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	03/09/13	03/10/13	-	03/09/13	27/09/13	-	100,00%	**Concluído**		
2	Análise de Projeto	BB	13/11/13	12/04/14	-	13/11/13	11/04/14	-	100,00%	**Concluído**		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	09/05/14	08/06/14	-	09/05/14	12/05/14	-	100,00%	**Concluído**	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 186/2014.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**03/09/13**	**08/06/14**	**0,00**	**03/09/13**	**12/05/14**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	12/05/14	11/07/14		16/05/14	10/06/14	-	100,00%	**Concluído**		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/08/14	31/08/14	50.000.000,00	23/07/14	22/08/14	50.000.000,00	100,00%	**Concluído**	Liberações concluídas.	
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**12/05/14**	**31/08/14**	**50.000.000,00**	**16/05/14**	**22/08/14**	**50.000.000,00**	**100%**	**Concluído**		
	Competência da SUDENE /Banco								**100%**	**Concluído**		
6	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		Não informado	Não informado	-	100,00%	**Concluído**		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	17/12/18	15/02/19		-	30/08/21	-	100,00%	**Concluído**	Parecer encaminhado pelo BB	
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**15/02/19**	**0,00**	**Não informado**	**30/08/21**	**0,00**	**100%**	**Concluído**		
	Resultado Geral do Projeto		**Valor Previsto:**		**50.000.000,00**	**Valor realizado:**		**50.000.000,00**	**100,00%**	**Concluído**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
Observações:
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: Aguardando a confirmação de conclusão do Agente Operador.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto: PO**	**CGDF/2014001 (ex PO 43)**
Objetivo estratégico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2014**

Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estratégico (MDR):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	**Gestor da subunidade:**	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):			
Projeto:	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A.)		
Objetivo do projeto:	Implantação e recuperação dos sistemas de esgotamento sanitário		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto**	**Valor Total do Projeto**
	100	5	90	415.582.562,52	960.220.031,88

Previsão de Conclusão Física:	31/12/2021
Previsão de Conclusão ADM:	30/06/2022
Data Atualização:	30/09/2021
	Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	323.510.889,33
A realizar no exercício	R$	18.917.623,86
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício		74.497.533,01
Saldo a liberar	R$	17.574.140,18
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	323.510.889,33

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Mauro Póvoas (SUDENE/DGFI)	03/05/13	31/05/13	-	03/05/13	03/06/13	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	CEF	03/06/13	31/10/13	-	19/08/13	18/02/14	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	18/02/14	20/03/14	-	20/02/14	21/02/14	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 183/2014.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**03/05/13**	**20/03/14**	**0,00**	**03/05/13**	**21/02/14**	**0,00**	**100,00%**	**Concluído**		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/CEF	21/02/14	22/04/14		21/02/14	22/08/14	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/CEF	01/01/14	31/01/14	70.152.822,60	10/12/14	26/12/14	70.152.822,60	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/CEF	01/06/14	01/07/14	108.469.901,94	-	30/09/15	108.469.901,94	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/CEF	01/12/15	31/12/15	59.034.909,19	10/12/15	25/01/16	59.034.909,19	100,00%	Concluído		
8	Liberação 4	SUDENE/CEF	01/02/16	02/03/16	8.848.709,00	-	19/05/16	8.848.709,00	100,00%	Concluído		
9	Liberação 5	SUDENE/CEF	01/12/16	31/12/16	77.004.546,60	05/12/16	29/12/17	77.004.546,60	100,00%	Concluído		
11	Liberação 6	SUDENE/CEF	15/12/20	14/01/21	5.675.760,33	08/07/21	22/09/21	74.497.533,01	100,00%	Concluído	A liberação demorou devido à inconsistência das informações prestadas pela empresa.	
12	Liberação 7	SUDENE/CEF	01/05/21	31/05/21	86.395.912,86	-	-	-	0,00%	Atrasado	A empresa ainda não solicitou a liberção do recurso.	
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**21/02/14**	**31/05/21**	**415.582.562,52**	**21/02/14**	**-**	**398.008.422,34**	**87,50%**	**Em Andamento**		
	Competência da SUDENE /Banco								**94%**	**Em Andamento**		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	**A Iniciar**		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	**A Iniciar**	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores.	
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00%**	**A Iniciar**		

Resultado Geral do Projeto	**Valor Previsto:**	**R$**	**415.582.562,52**	**Valor realizado:**	**R$**	**398.008.422,34**	**79%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	A Sudene aprovou a reestruturação societária da empresa.
Obs3:	A SUDENE aprovou uma alteração nas condições do financiamento do FDNE (carência e prazo). Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.
Obs4:	Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.
Obs5:	
Obs5:	

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:** PO	**CGDF/2015001 (ex PO 44)**
Objetivo estratégico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2015**

Programa do PPA:	2217 -Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estratégico (MDR):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	**Gestor da subunidade:**	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):			
Projeto:	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.		
Objetivo do projeto:	Ampliação e modernização de um complexo turístico		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	39.800.940,00	89.333.589,00

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	30/09/2021
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	39.800.940,00
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	39.800.940,00

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Cláudia da Silva (SUDENE/DFIN)	29/06/15	29/07/15	-	29/06/15	15/07/15	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	27/08/15	24/01/16	-	27/08/15	03/11/15	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	03/11/15	03/12/15	-	03/11/15	12/11/15	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 232/2015.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**29/06/15**	**03/12/15**	**0,00**	**29/06/15**	**12/11/15**	**0,00**	**100,00%**	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	16/11/15	15/03/16	-	-	-	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/12/15	31/12/15	39.800.940,00	23/05/16	13/06/16	39.800.940,00	100,00%	Concluído		
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**16/11/15**	**31/12/15**	**39.800.940,00**	**-**	**13/06/16**	**39.800.940,00**	**100,00%**	Concluído		
	Competência da SUDENE /Banco								**100%**	Concluído		
6	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		Não informado	Não informado	-	100,00%	Concluído		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	17/12/18	15/02/19		-	-	-	100,00%	Concluído		
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**15/02/19**	**0,00**	**Não informado**	**-**	**0,00**	**100,00%**	Concluído		
	Resultado Geral do Projeto		**Valor Previsto:**		**R$ 39.800.940,00**	**Valor realizado:**		**R$ 39.800.940,00**	**100%**	Concluído	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Obs2: Foi enviado ofício ao BB em 06/09/2018, notificando esse agente operador para cumprimento integral do Regulamento do Fundo (pendências constatadas em trabalhos de Auditoria por meio do RAUDINT Nº 012/2017 PRELIMINAR).

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto: PO**	**CGDF/2016001 (ex PO 45)**
Objetivo estratégico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2016**

Programa do PPA:	2217- Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDN	**Objetivo estratégico (MDR):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	**Gestor da subunidade:**	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):			
Projeto:	Brametal S.A		
Objetivo do projeto:	Implantação de fazendas para cultivo de eucalipto		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto**	**Valor Total do Projeto**
	100	5	90	4.095.556,81	8.319.446,01

Previsão de Conclusão Física:	04/04/2018
Previsão de Conclusão ADM:	15/02/2019
Data Atualização:	30/09/2021
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	4.095.556,81
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	4.095.556,81

N.E.	**Atividades/ Etapas**	**Responsável**	**Previsto**			**Realizado**				**Status**	**Observação/Problemas**	**Providências**
			Início	**Fim**	**Valor**	**Início**	**Fim**	**Valor**	**Físico %**			
1	Consulta prévia	Ademir (SUDENE/DFIN	27/08/15	26/09/15	-	27/08/15	23/09/16	-	100,00%	**Concluído**		
2	Análise de Projeto	BB	25/02/16	24/07/16	-	25/02/16	15/07/16	-	100,00%	**Concluído**		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	21/07/16	20/08/16	-	21/07/16	01/08/16	-	100,00%	**Concluído**		
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**27/08/15**	**20/08/16**	**0,00**	**27/08/15**	**01/08/16**	**0,00**	**100,00%**	**Concluído**		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	12/08/16	17/10/16	-	-	-	-	100,00%	**Concluído**		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/09/16	30/09/16	4.095.556,81	31/07/17	25/09/17	4.095.556,81	100,00%	**Concluído**		
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**12/08/16**	**30/09/16**	**4.095.556,81**	**-**	**25/09/17**	**4.095.556,81**	**100,00%**	**Concluído**		
	Competência da SUDENE /Banco								**100%**	**Concluído**		

6	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	100,00%	**A Iniciar**		
7	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	17/12/18	15/02/19		-	-	-	100,00%	**Concluído**	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores. Os bancos possuem um prazo de 60 dias a partir da publicação desta Resolução para emitir o	
Encerramento (Banco)			**Não informado**	**15/02/19**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**100,00%**	**Concluído**		
Resultado Geral do Projeto			**Valor Previsto:**		**R$ 4.095.556,81**		**Valor realizado:**	**R$ 4.095.556,81**	**100%**	**Concluído**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGDF/2019001 (EX PO 48)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2019**

Programa do PPA:	2217- Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MDR):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	**Gestor da subunidade:**	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):			
Projeto:	Vila Piauí 1 Empreendimentos e Participações S.A.		
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto**	**Valor Total do Projeto**
	100	5	90	85.228.754,84	142.047.924,74

Previsão de Conclusão Física:	31/01/2021
Previsão de Conclusão ADM:	Não informado
Data Atualização:	30/09/2021
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	85.228.132,65
A realizar no exercício	#REF!	
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício		
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	85.228.132,65

N.E.	**Atividades/ Etapas**	**Responsável**	**Previsto**			**Realizado**				**Status**	**Observação/Problemas**	**Providências**
			Início	**Fim**	**Valor**	**Início**	**Fim**	**Valor**	**Físico %**			
1	Consulta prévia	Diego Verás Emerenciano (SUDENE/CGDF)	19/12/18	18/01/19	-	19/12/18	20/12/18	-	100,00%	**Concluído**		
2	Análise de Projeto	BB	20/05/19	17/10/19	-	20/05/19	18/07/19	-	100,00%	**Concluído**		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	23/07/19	22/08/19	-	23/07/19	23/08/19	-	100,00%	**Concluído**	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 529/2019.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**19/12/18**	**22/08/19**	**0,00**	**19/12/18**	**23/08/19**	**0,00**	**100,00%**	**Concluído**		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	23/08/19	22/10/19		23/08/19	23/09/19	-	100,00%	**Concluído**		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	23/10/19	22/11/19	14.279.547,22	23/10/19	08/11/19	14.279.547,22	100,00%	**Concluído**		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	08/01/20	07/02/20	8.103.276,36	08/01/20	03/03/20	8.103.276,36	100,00%	**Concluído**		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	20/04/20	20/05/20	6.458.271,68	20/04/20	29/04/20	6.458.271,68	100,00%	**Concluído**		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	02/07/20	01/08/20	4.138.815,59	02/07/20	12/08/20	4.138.815,59	100,00%	**Concluído**		
8	Liberação 5	SUDENE/BB	01/10/20	31/10/20	52.248.843,99	30/10/20	12/11/20	52.248.221,80	100,00%	**Concluído**	Resta um saldo de R$ 622,19 a ser desembolsado. Conforme contato mantido com o BB, provavelmente o valor não será solicitado.	
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**23/08/19**	**31/10/20**	**85.228.754,84**	**23/08/19**	**12/11/20**	**85.228.132,65**	**100,00%**	**Concluído**		
	Competência da SUDENE /Banco								**100%**	**Concluído**		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	100,00%	**Concluído**			
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	100,00%	**Concluído**			
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**100,00%**	**A Iniciar**			

Resultado Geral do Projeto	**Valor Previsto:**	**R$**	**85.228.754,84**	**Valor realizado:**	**R$**	**85.228.132,65**	**100%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:
Observações:
Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2: A Sudene aprovou a reestruturação societária da empresa.
Obs3: A SUDENE aprovou uma alteração nas condições do financiamento do FDNE (carência e prazo). Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.
Obs4: Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.
Obs5: A CEF manifestou-se favoravelmente quanto ao pleito da empresa (reestrututação dos investimentos e adequação da carência). A COFD sugeriu consulta à PRD acerca da possibilidade da Sudene acatar o pleito da empresa após o término da carência do financiamento.
Obs5: A SUDENE aprovou a alteração do quadro de usos e fontes, do cronograma físico-financeiro e de desembolso do projeto.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGDF/2019002 (EX PO 49)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2019**

Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MDR):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	**Gestor da subunidade:**	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):			
Projeto:	Vila Piauí 2 Empreendimentos e Participações S.A.		
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto**	**Valor Total do Projeto**
	100	5	90	85.228.754,84	142.047.924,74

Previsão de Conclusão Física:	31/01/2021
Previsão de Conclusão ADM:	Não informado
Data Atualização:	30/09/2021
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	83.252.534,84
A realizar no exercício	#REF!	
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício		
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	83.252.534,84

N.E.	**Atividades/ Etapas**	**Responsável**	**Previsto**			**Realizado**				**Status**	**Observação/Problemas**	**Providências**
			Início	**Fim**	**Valor**	**Início**	**Fim**	**Valor**	**Físico %**			
1	Consulta prévia	Diego Verás Emerenciano (SUDENE/CGDF)	19/12/18	18/01/19	-	19/12/18	20/12/18	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	20/05/19	17/10/19	-	20/05/19	18/07/19	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	23/07/19	22/08/19	-	23/07/19	23/08/19	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 530/2019.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**19/12/18**	**22/08/19**	**0,00**	**19/12/18**	**23/08/19**	**0,00**	**100,00%**	Concluído		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	23/08/19	22/10/19		23/08/19	23/09/19	-	100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	23/10/19	22/11/19	13.544.355,92	23/10/19	11/11/19	13.544.355,92	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	08/01/20	07/02/20	4.798.767,68	08/01/20	03/03/20	4.798.767,68	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	20/04/20	20/05/20	9.283.704,42	20/04/20	29/04/20	9.283.704,42	100,00%	Concluído		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	02/07/20	01/08/20	442.945,84	02/07/20	12/08/20	442.945,84	100,00%	Concluído		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/10/20	31/10/20	57.158.980,98	30/10/20	12/11/20	55.182.760,98	100,00%	Concluído	Resta um saldo de R$ 1.976.220,00 a ser desembolsado. Conforme contato mantido com o BB, provavelmente o valor não será solicitado.	
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**23/08/19**	**31/10/20**	**85.228.754,84**	**23/08/19**	**12/11/20**	**83.252.534,84**	**100,00%**	Concluído		
	Competência da SUDENE /Banco								**100%**	Concluído		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	100,00%	**Concluído**		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	100,00%	**Concluído**		
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**100,00%**	**Concluído**		

Resultado Geral do Projeto	**Valor Previsto:**	**R$**	**85.228.754,84**	**Valor realizado:**	**R$**	**83.252.534,84**	**100%**	**Concluído**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	A Sudene aprovou a reestruturação societária da empresa.
Obs3:	A SUDENE aprovou uma alteração nas condições do financiamento do FDNE (carência e prazo). Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.
Obs4:	Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.
Obs5:	A CEF manifestou-se favoravelmente quanto ao pleito da empresa (reestrututação dos investimentos e adequação da carência). A COFD sugeriu consulta à PRD acerca da possibilidade da Sudene acatar o pleito da empresa após o término da carência do financiamento.
Obs5:	A SUDENE aprovou a alteração do quadro de usos e fontes, do cronograma físico-financeiro e de desembolso do projeto.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGDF/2020002 (EX PO 51)**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2020**

Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MDR):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	**Gestor da subunidade:**	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):			
Projeto:	Ventos de São Fernando IV Energia S/A		
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto**	**Valor Total do Projeto**
	100	5	90	228.672.439,20	361.120.732,00

Previsão de Conclusão Física:	31/03/2021
Previsão de Conclusão ADM:	30/09/2021
Data Atualização:	30/09/2021
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	186.977.152,86
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	41.695.286,34
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	228.672.439,20

N.E.	**Atividades/ Etapas**	**Responsável**	**Previsto**			**Realizado**				**Status**	**Observação/Problemas**	**Providências**
			Início	**Fim**	**Valor**	**Início**	**Fim**	**Valor**	**Físico %**			
1	Consulta prévia	Anita Riquelme	11/12/19	10/01/20	-	11/12/19	27/12/20	-	100,00%	**Concluído**		
2	Análise de Projeto	BB	26/05/20	23/10/20	-	26/05/20	13/08/20	-	100,00%	**Concluído**		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	13/08/20	12/09/20	-	13/08/20	11/09/20	-	100,00%	**Concluído**	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 545/2019.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**11/12/19**	**12/09/20**	**0,00**	**11/12/19**	**11/09/20**	**0,00**	**100,00%**	**Concluído**		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	11/09/20	10/11/20		11/09/20	22/09/20		100,00%	**Concluído**		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	27/10/20	26/11/20	105.116.695,74	27/10/20	12/11/20	105.116.695,74	100,00%	**Concluído**		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	13/11/20	13/12/20	37.312.882,51	13/11/20	26/11/20	37.312.882,51	100,00%	**Concluído**		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	03/12/20	02/01/21	44.547.574,61	03/12/20	28/12/20	44.547.574,61	100,00%	**Concluído**		
8	Liberação 4	SUDENE/BB	22/01/21	21/02/21	21.149.995,99	22/01/21	05/02/21	21.149.995,99	100,00%	**Concluído**		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	11/02/21	13/03/21	5.497.253,53	11/02/21	26/02/21	5.497.253,53	100,00%	**Concluído**		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	30/04/21	30/05/21	15.048.036,82	30/04/21	20/05/21	15.048.036,82	100,00%	**Concluído**		
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**11/09/20**	**13/03/21**	**228.672.439,20**	**11/09/20**	**20/05/21**	**228.672.439,20**	**100,00%**	**Concluído**		
	Competência da SUDENE /Banco								**100%**	**Concluído**		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	**A Iniciar**		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	**A Iniciar**		
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00%**	**A Iniciar**		

Resultado Geral do Projeto	**Valor Previsto:**	**R$**	**228.672.439,20**	**Valor realizado:**	**R$**	**228.672.439,20**	**83%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	A Sudene aprovou a reestruturação societária da empresa.
Obs3:	A SUDENE aprovou uma alteração nas condições do financiamento do FDNE (carência e prazo). Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.
Obs4:	Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.
Obs5:	A CEF manifestou-se favoravelmente quanto ao pleito da empresa (reestrututação dos investimentos e adequação da carência). A COFD sugeriu consulta à PRD acerca da possibilidade da Sudene acatar o pleito da empresa após o término da carência do financiamento.
Obs5:	A SUDENE aprovou a alteração do quadro de usos e fontes, do cronograma físico-financeiro e de desembolso do projeto.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGDF/2020003**
Objetivo estratégico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2020**

Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estratégico (MDR):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	**Gestor da subunidade:**	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):			
Projeto:	CENTRAL EOLICA BOQUEIRAO I S.A		
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto**	**Valor Total do Projeto**
	100	5	90	113.680.904,39	189.470.934,65

Previsão de Conclusão Física:	31/10/2023
Previsão de Conclusão ADM:	31/12/2023
Data Atualização:	30/09/2021
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	113.680.904,39
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício		
Saldo a liberar	R$	113.680.904,39
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Anita Riquelme	11/12/19	10/01/20	-	11/12/19	26/12/19	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	22/05/20	19/10/20	-	22/05/20	18/09/20	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	19/09/20	19/10/20	-	19/09/20	19/10/20	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 576/2020.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**11/12/19**	**19/10/20**	**0,00**	**11/12/19**	**19/10/20**	**0,00**	**100,00%**	**Concluído**		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/10/20	18/12/20		19/10/20	04/12/20		100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/01/21	02/03/21	13.834.000,00				0,00%	Atrasado	O banco tem que apresentar documentos pendentes	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/04/21	31/05/21	4.001.000,00				0,00%	Atrasado	A empresa ainda não solicitou a liberção do recurso.	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/07/21	30/08/21	18.483.000,00				0,00%	Atrasado	A empresa ainda não solicitou a liberção do recurso.	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/10/21	30/11/21	7.593.000,00				0,00%	A Iniciar		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/01/22	02/03/22	35.299.000,00				0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/04/22	31/05/22	23.567.000,00				0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/07/22	30/08/22	10.061.000,00				0,00%	A Iniciar		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	01/10/22	30/11/22	841.000,00				0,00%	A Iniciar		
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**19/10/20**	**18/12/20**	**113.679.000,00**	**19/10/20**	**04/12/20**	**0,00**	**11,11%**	**Em Andamento**		
	Competência da SUDENE /Banco								**56%**	**Em Andamento**		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	**A Iniciar**		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	**A Iniciar**		
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00%**	**A Iniciar**		

Resultado Geral do Projeto	**Valor Previsto:**	**R$**	**113.680.904,39**	**Valor realizado:**	**R$**	**-**	**37%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	A Sudene aprovou a reestruturação societária da empresa.
Obs3:	A SUDENE aprovou uma alteração nas condições do financiamento do FDNE (carência e prazo). Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.
Obs4:	Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.
Obs5:	A CEF manifestou-se favoravelmente quanto ao pleito da empresa (reestrututação dos investimentos e adequação da carência). A COFD sugeriu consulta à PRD acerca da possibilidade da Sudene acatar o pleito da empresa após o término da carência do financiamento.
Obs5:	A SUDENE aprovou a alteração do quadro de usos e fontes, do cronograma físico-financeiro e de desembolso do projeto.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGDF/2020004**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2020**

Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MDR):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	**Gestor da subunidade:**	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):			
Projeto:	CENTRAL EOLICA BOQUEIRAO II S.A		
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto**	**Valor Total do Projeto**
	100	5	90	102.312.813,95	170.523.841,18

Previsão de Conclusão Física:	31/10/2023
Previsão de Conclusão ADM:	31/12/2023
Data Atualização:	30/09/2021
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	39.521.000,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	102.312.813,95
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	#REF!	

N.E.	**Atividades/ Etapas**	**Responsável**	**Previsto**			**Realizado**				**Status**	**Observação/Problemas**	**Providências**
			Início	**Fim**	**Valor**	**Início**	**Fim**	**Valor**	**Físico %**			
1	Consulta prévia	Anita Riquelme	11/12/19	10/01/20	-	11/12/19	26/12/19	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	22/05/20	19/10/20	-	22/05/20	18/09/20	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	19/09/20	19/10/20	-	19/09/20	19/10/20	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 576/2020.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**11/12/19**	**19/10/20**	**0,00**	**11/12/19**	**19/10/20**	**0,00**	**100,00%**	**Concluído**		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	19/10/20	18/12/20		19/10/20	04/12/20		100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/01/21	02/03/21	12.451.000,00				0,00%	Atrasado	O banco tem que apresentar documentos pendentes	
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/03/21	30/04/21	3.601.000,00				0,00%	Atrasado	A empresa ainda não solicitou a liberção do recurso.	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/07/21	30/08/21	16.635.000,00				0,00%	Atrasado	A empresa ainda não solicitou a liberção do recurso.	
8	Liberação 4	SUDENE/BB	01/10/21	30/11/21	6.834.000,00				0,00%	A Iniciar		
9	Liberação 5	SUDENE/BB	01/01/22	02/03/22	31.769.000,00				0,00%	A Iniciar		
10	Liberação 6	SUDENE/BB	01/04/22	31/05/22	21.210.000,00				0,00%	A Iniciar		
11	Liberação 7	SUDENE/BB	01/07/22	30/08/22	9.055.000,00				0,00%	A Iniciar		
12	Liberação 8	SUDENE/BB	01/10/2022	30/11/22	757.000,00				0,00%	A Iniciar		
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**19/10/20**	**18/12/20**	**102.312.000,00**	**19/10/20**	**04/12/20**	**0,00**	**11,11%**	**Em Andamento**		
	Competência da SUDENE /Banco								**56%**	**Em Andamento**		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	**A Iniciar**		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	**A Iniciar**		
Encerramento (Banco)			**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00%**	**A Iniciar**		

Resultado Geral do Projeto	**Valor Previsto:**	**R$**	**102.312.813,95**	**Valor realizado:**	**R$**	**-**	**37%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	A Sudene aprovou a reestruturação societária da empresa.
Obs3:	A SUDENE aprovou uma alteração nas condições do financiamento do FDNE (carência e prazo). Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.
Obs4:	Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.
Obs5:	A CEF manifestou-se favoravelmente quanto ao pleito da empresa (reestrututação dos investimentos e adequação da carência). A COFD sugeriu consulta à PRD acerca da possibilidade da Sudene acatar o pleito da empresa após o término da carência do financiamento.
Obs5:	A SUDENE aprovou a alteração do quadro de usos e fontes, do cronograma físico-financeiro e de desembolso do projeto.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGDF/2020005**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2020**

Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MDR):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	**Gestor da subunidade:**	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):			
Projeto:	VILA ESPÍRITO SANTO 1 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.		
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto**	**Valor Total do Projeto**
	100	5	90	103.459.637,40	172.432.729,00

Previsão de Conclusão Física:	01/01/2022
Previsão de Conclusão ADM:	01/01/2022
Data Atualização:	30/09/2021
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior		
A realizar no exercício	R$	13.555.945,92
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	89.903.691,48
Saldo a liberar	R$	13.555.945,92
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	89.903.691,48

N.E.	**Atividades/ Etapas**	**Responsável**	**Previsto**			**Realizado**				**Status**	**Observação/Problemas**	**Providências**
			Início	**Fim**	**Valor**	**Início**	**Fim**	**Valor**	**Físico %**			
1	Consulta prévia	Diego Veras	29/11/19	29/12/19	-	29/11/19	29/12/19	-	100,00%	**Concluído**		
2	Análise de Projeto	BB	22/05/20	19/10/20	-	22/05/20	19/10/20	-	100,00%	**Concluído**		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	19/10/20	18/11/20	-	19/10/20	17/11/20	-	100,00%	**Concluído**	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 540/2019.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**29/11/19**	**18/11/20**	**0,00**	**29/11/19**	**17/11/20**	**0,00**	**100,00%**	**Concluído**		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	17/11/20	16/01/21		17/11/20	07/12/20		100,00%	**Concluído**		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	19/03/21	18/04/21	70.157.041,59	19/03/21	06/04/21	70.157.041,59	100,00%	**Concluído**		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/05/21	31/05/21	25.425.490,00	02/07/21	19/07/21	19.746.649,89	100,00%	**Concluído**		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/10/21	31/10/21	7.877.105,81				0,00%	**A Iniciar**		
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**17/11/20**	**31/10/21**	**70.157.041,59**	**17/11/20**	**19/07/21**	**89.903.691,48**	**75,00%**	**Em Andamento**		
	Competência da SUDENE /Banco								**88%**	**Em Andamento**		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	**A Iniciar**		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	**A Iniciar**		
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00%**	**A Iniciar**		

Resultado Geral do Projeto	**Valor Previsto:**	**R$**	**103.459.637,40**	**Valor realizado:**	**R$**	**89.903.691,48**	**56%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	A Sudene aprovou a reestruturação societária da empresa.
Obs3:	A SUDENE aprovou uma alteração nas condições do financiamento do FDNE (carência e prazo). Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.
Obs4:	Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.
Obs5:	A CEF manifestou-se favoravelmente quanto ao pleito da empresa (reestrututação dos investimentos e adequação da carência). A COFD sugeriu consulta à PRD acerca da possibilidade da Sudene acatar o pleito da empresa após o término da carência do financiamento.
Obs5:	A SUDENE aprovou a alteração do quadro de usos e fontes, do cronograma físico-financeiro e de desembolso do projeto.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGDF/2020006**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2020**

Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MDR):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	**Gestor da subunidade:**	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):			
Projeto:	VILA ESPÍRITO SANTO 2 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.		
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	90.858.400,56	151.430.667,60

Previsão de Conclusão Física:	01/01/2022
Previsão de Conclusão ADM:	01/01/2022
Data Atualização:	30/09/2021
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	24.029.289,61
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	66.829.110,95
Saldo a liberar	R$	24.029.289,61
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	66.829.110,95

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Anita Riquelme	29/11/19	29/12/19	-	29/11/19	20/12/19	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	22/05/20	19/10/20	-	22/05/20	15/10/20	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	19/10/20	18/11/20	-	19/10/20	17/11/20	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 541/2019.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**29/11/19**	**18/11/20**	**0,00**	**29/11/19**	**17/11/20**	**0,00**	**100,00%**	**Concluído**		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	17/11/20	16/01/21		17/11/20	07/12/20		100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	19/03/21	18/04/21	19.807.254,22	19/03/21	06/04/21	19.807.254,22	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/05/21	31/05/21	43.167.800,00	02/07/21	19/07/21	47.021.856,73	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/10/21	31/10/21	27.883.346,34				0,00%	A Iniciar		
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**17/11/20**	**31/10/21**	**90.858.400,56**	**17/11/20**	**19/07/21**	**66.829.110,95**	**75,00%**	**Em Andamento**		
	Competência da SUDENE /Banco								**88%**	**Em Andamento**		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	**A Iniciar**		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	**A Iniciar**		
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00%**	**A Iniciar**		

Resultado Geral do Projeto	**Valor Previsto:**	**R$**	**90.858.400,56**	**Valor realizado:**	**R$**	**66.829.110,95**	**44%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	A Sudene aprovou a reestruturação societária da empresa.
Obs3:	A SUDENE aprovou uma alteração nas condições do financiamento do FDNE (carência e prazo). Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.
Obs4:	Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.
Obs5:	A CEF manifestou-se favoravelmente quanto ao pleito da empresa (reestrututação dos investimentos e adequação da carência). A COFD sugeriu consulta à PRD acerca da possibilidade da Sudene acatar o pleito da empresa após o término da carência do financiamento.
Obs5:	A SUDENE aprovou a alteração do quadro de usos e fontes, do cronograma físico-financeiro e de desembolso do projeto.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGDF/2020007**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2020**

Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MDR):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	**Gestor da subunidade:**	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):			
Projeto:	VILA ALAGOAS II EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.		
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto**	**Valor Total do Projeto**
	100	5	90	55.786.889,22	92.978.148,60

Previsão de Conclusão Física:	01/01/2022
Previsão de Conclusão ADM:	01/01/2022
Data Atualização:	30/09/2021
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	13.457.859,82
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	42.329.029,40
Saldo a liberar	R$	13.457.859,82
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	42.329.029,40

N.E.	**Atividades/ Etapas**	**Responsável**	**Previsto**			**Realizado**				**Status**	**Observação/Problemas**	**Providências**
			Início	**Fim**	**Valor**	**Início**	**Fim**	**Valor**	**Físico %**			
1	Consulta prévia	Anita Riquelme	29/11/19	29/12/19	-	29/11/19	26/12/19	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	22/05/20	19/10/20	-	22/05/20	15/10/20	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	15/10/20	14/11/20	-	15/10/20	11/12/20	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**29/11/19**	**14/11/20**	**0,00**	**29/11/19**	**11/12/20**	**0,00**	**100,00%**	**Concluído**		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	17/11/20	16/01/21		17/11/20	07/12/20		100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	19/03/21	18/04/21	15.891.285,35	19/03/21	05/04/21	15.891.285,35	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/05/21	31/05/21	23.937.650,00	02/07/21	19/07/21	26.437.744,05	100,00%	Concluído		
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/10/21	31/10/21	15.957.953,87			,	0,00%	A Iniciar		
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**17/11/20**	**31/10/21**	**55.786.889,22**	**00/01/00**	**19/07/21**	**15.891.285,35**	**75,00%**	**Em Andamento**		
	Competência da SUDENE /Banco								**88%**	**Em Andamento**		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	**A Iniciar**		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	**A Iniciar**		
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00%**	**A Iniciar**		

Resultado Geral do Projeto	**Valor Previsto:**	**R$**	**55.786.889,22**	**Valor realizado:**	**R$**	**15.891.285,35**	**67%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	A Sudene aprovou a reestruturação societária da empresa.
Obs3:	A SUDENE aprovou uma alteração nas condições do financiamento do FDNE (carência e prazo). Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.
Obs4:	Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.
Obs5:	A CEF manifestou-se favoravelmente quanto ao pleito da empresa (reestrututação dos investimentos e adequação da carência). A COFD sugeriu consulta à PRD acerca da possibilidade da Sudene acatar o pleito da empresa após o término da carência do financiamento.
Obs5:	A SUDENE aprovou a alteração do quadro de usos e fontes, do cronograma físico-financeiro e de desembolso do projeto.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGDF/2021001 (EX PO 50)**
Objetivo estratégico:	**1.3. Ampliar a captação de investimento, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes**	**Ano:**	**2021**
Programa do PPA:	-	**Eixo temático (MDR):**	
Ação do PPA:	**-**	**Objetivo estratégico (MDR):**	
Objetivo da ação:	-		
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento
Diretor:	Sérgio Wanderley Silva	**Gestor da subunidade:**	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):	Aprimorar o acompanhamento do trabalho realizado pelo BNB na aplicação dos recursos do FNE.		
Projeto:	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE.		
Objetivo do projeto:	Acompanhar a execução da programação da aplicação de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) no exercício de 2021. **Relatórios dos períodos jan-mar/2021; jan-jun/2021; jan-set/2021 e jan-dez/2021.**		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	2	-	-	-	-

Previsão de Conclusão:	15/02/2022
Data Atualização:	30/09/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Cláudia Maria da Silva e Artur Freitas Modesto Sedycias

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	**Envio dos dados das contratações no exercício até março/2021**	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/04/2021	25/04/2021	-	01/04/2021	26/04/2021	-	100%	**Concluído**	Os dados foram enviados com informações incompletas	
2	**Análise dos dados e elaboração do Relatório**	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a marco de 2021.	CONF/CGDF/DFIN	26/04/2021	06/05/2021	-	26/04/2021	07/06/2021	-	100%	**Concluído**	Tendo em vista o atraso por parte do BNB para enviar os dados refentes às contratações, o relatório de análise teve seu prazo estendido, bem como a aprovação pela DC	
3	**Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada**	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	07/05/2021	-	-	02/07/2021	15/07/2021	-	100%	**Concluído**		
4	**Envio dos dados das contratações no exercício até junho/2021**	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/06/2021	25/06/2021	-	01/06/2021	29/07/2021	-	100%	**Concluído**	Tendo em vista o atraso por parte do BNB para enviar os dados refentes às contratações, o relatório de análise teve seu prazo estendido, bem como a aprovação pela DC	
5	**Análise dos dados e elaboração do Relatório**	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a junho de 2021.	CONF/CGDF/DFIN	26/06/2021	06/07/2021	-	29/07/2021	27/08/2021	-	100%	**Concluído**		
6	**Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada**	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	07/07/2021	-	-	31/08/2021	02/09/2021	-	100%	**Concluído**		
7	**Envio dos dados das contratações no exercício até setembro/2021**	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/10/2021	25/10/2021	-	-	-	-	0%	**A Iniciar**		

8	**Análise dos dados e elaboração do Relatório**	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a setembro de 2021.	CONF/CGDF/DFIN	26/10/2021	05/11/2021	-	-	-	-	0%	**A Iniciar**		
9	**Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada**	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	06/11/2021	-	-	-	-	-	0%	**A Iniciar**		
10	**Envio dos dados das contratações no exercício até dezembro/2021**	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	01/01/2021	25/01/2021	-	-	-	-	0%	**A Iniciar**		
11	**Análise dos dados e elaboração do Relatório**	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a dezembro de 2021.	CONF/CGDF/DFIN	26/01/2021	05/02/2021	-	-	-	-	0%	**A Iniciar**		
12	**Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada**	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	06/02/2021	-	-	-	-	-	0%	**A Iniciar**		
				Valor Previsto:		R$ -	**Valor realizado:**		R$ -	50%	**Em Andamento**	Status do Projeto	

Parceiros institucionais:
BNB: Superintendência de Controle Financeiro / Ambiente de Controle Financeiro de Operações de Crédito (Maria Claudia: claudiaboop@bnb.gov.br; Silfarney: silfarney@bnb.gov.br) - Responsável pelo envio das informações
BNB: Superintendência de Políticas de Desenvolvimento / Ambiente de Políticas de Desenvolvimento (Valdir Machado: valdirm@bnb.gov.br)
Observações:
Processo nº -

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGDF/2021002**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2021**

Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MDR):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	**Gestor da subunidade:**	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):			
Projeto:	EOLICA CANUDOS II SPE S A		
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	100	5	90	183.361.938,16	305.603.230,26

Previsão de Conclusão Física:	01/04/2022
Previsão de Conclusão ADM:	01/04/2022
Data Atualização:	30/09/2021
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	183.361.938,16
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	35.444.673,28
Saldo a liberar	R$	147.917.264,88
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	35.444.673,28

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Consulta prévia	Anita Riquelme	24/08/20	23/09/20	-	24/08/20	23/09/20	-	100,00%	Concluído		
2	Análise de Projeto	BB	03/02/21	03/07/21	-	03/02/21	08/02/21	-	100,00%	Concluído		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/02/21	10/03/21	-	08/02/21	03/03/21	-	100,00%	Concluído	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**24/08/20**	**10/03/21**	**0,00**	**24/08/20**	**03/03/21**	**0,00**	**100,00%**	**Concluído**		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	04/03/21	03/05/21		04/03/21	31/05/21		100,00%	Concluído		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/04/21	01/05/21	36.829.244,50	16/07/21	03/08/21	35.444.673,28	100,00%	Concluído		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/07/21	31/07/21	128.804.144,44				0,00%	Atrasado	A empresa ainda não solicitou a liberção do recurso.	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/01/22	31/01/22	17.728.549,22				0,00%	A Iniciar		
	Competência da SUDENE /Banco		**04/03/21**	**31/01/22**	**183.361.938,16**	**04/03/21**	**03/08/21**	**35.444.673,28**	**50%**	**Em Andamento**		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	**A Iniciar**		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	**A Iniciar**		
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00%**	**A Iniciar**		

Resultado Geral do Projeto	**Valor Previsto:**	**R$**	**183.361.938,16**	**Valor realizado:**	**R$**	**35.444.673,28**	**56%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	A Sudene aprovou a reestruturação societária da empresa.
Obs3:	A SUDENE aprovou uma alteração nas condições do financiamento do FDNE (carência e prazo). Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.
Obs4:	Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.
Obs5:	A CEF manifestou-se favoravelmente quanto ao pleito da empresa (reestrututação dos investimentos e adequação da carência). A COFD sugeriu consulta à PRD acerca da possibilidade da Sudene acatar o pleito da empresa após o término da carência do financiamento.
Obs5:	A SUDENE aprovou a alteração do quadro de usos e fontes, do cronograma físico-financeiro e de desembolso do projeto.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGDF/2021003**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2021**

Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MDR):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	**Gestor da subunidade:**	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):			
Projeto:	EOLICA CANUDOS III SPE S A		
Objetivo do projeto:	implantação de parque eólico		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto**	**Valor Total do Projeto**
	100	5	90	183.361.938,16	305.603.230,26

Previsão de Conclusão Física:	01/04/2022
Previsão de Conclusão ADM:	01/04/2022
Data Atualização:	30/09/2021
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	183.361.938,16
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	28.947.510,76
Saldo a liberar	R$	154.414.427,40
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

N.E.	**Atividades/ Etapas**	**Responsável**	**Previsto**			**Realizado**				**Status**	**Observação/Problemas**	**Providências**
			Início	**Fim**	**Valor**	**Início**	**Fim**	**Valor**	**Físico %**			
1	Consulta prévia	Gabriela Lins	24/08/20	23/09/20	-	24/08/20	23/09/20	-	100,00%	**Concluído**		
2	Análise de Projeto	BB	04/02/21	04/07/21	-	04/02/21	08/02/21	-	100,00%	**Concluído**		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	08/02/21	10/03/21	-	08/02/21	25/02/21	-	100,00%	**Concluído**	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**24/08/20**	**10/03/21**	**0,00**	**24/08/20**	**25/02/21**	**0,00**	**100,00%**	**Concluído**		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	04/03/21	03/05/21		04/03/21	31/05/21		100,00%	**Concluído**		
5	Liberação 1	SUDENE/BB	01/04/21	01/05/21	36.829.244,50	16/07/21	03/08/21	28.947.510,76	100,00%	**Concluído**		
6	Liberação 2	SUDENE/BB	01/07/21	31/07/21	128.804.144,44				0,00%	**Atrasado**	A empresa ainda não solicitou a liberção do recurso.	
7	Liberação 3	SUDENE/BB	01/01/22	31/01/22	17.728.549,22				0,00%	**A Iniciar**		
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**04/03/21**	**31/01/22**	**183.361.938,16**	**04/03/21**	**03/08/21**	**28.947.510,76**	**50,00%**	**Em Andamento**		
	Competência da SUDENE /Banco								**75%**	**Em Andamento**		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	**A Iniciar**		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	**A Iniciar**		
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00%**	**A Iniciar**		

Resultado Geral do Projeto	**Valor Previsto:**	**R$**	**183.361.938,16**	**Valor realizado:**	**R$**	**28.947.510,76**	**56%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1:	O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.
Obs2:	A Sudene aprovou a reestruturação societária da empresa.
Obs3:	A SUDENE aprovou uma alteração nas condições do financiamento do FDNE (carência e prazo). Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.
Obs4:	Encontra-se em análise na CEF um pleito da empresa de readequar os investimentos fixos do projeto.
Obs5:	A CEF manifestou-se favoravelmente quanto ao pleito da empresa (reestrututação dos investimentos e adequação da carência). A COFD sugeriu consulta à PRD acerca da possibilidade da Sudene acatar o pleito da empresa após o término da carência do financiamento.
Obs5:	A SUDENE aprovou a alteração do quadro de usos e fontes, do cronograma físico-financeiro e de desembolso do projeto.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**PO CGDF/2021004**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Ano:**	**2021**

Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	Superar as Desigualdades Regionais e Erradicar a Miséria
Ação do PPA:	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	**Objetivo estrátegico (MDR):**	Fortalecer cadeias e Arranjos Produtivos Locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismo econômico e social
Objetivo da ação:			
Diretoria responsável:	Diretoria de Gestão de Fundos e Incentivos e de Atração de Incentivos	**Subunidade responsável:**	DFIN/CGDF
Diretor:	Sergio Wanderley Silva	**Gestor da subunidade:**	Breno Arruda Soares de Oliveira
Problema (causa):			
Projeto:	BORBOREMA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.		
Objetivo do projeto:	Implantação de linha de transmissão		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto**	**Valor Total do Projeto**
	100	5	90	60.000.000,00	317.976.844,97

Previsão de Conclusão Física:	21/03/2023
Previsão de Conclusão ADM:	21/03/2023
Data Atualização:	30/09/2021
Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Thiago Teles da Silva

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	60.000.000,00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	60.000.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

N.E.	**Atividades/ Etapas**	**Responsável**	**Previsto**			**Realizado**				**Status**	**Observação/Problemas**	**Providências**
			Início	**Fim**	**Valor**	**Início**	**Fim**	**Valor**	**Físico %**			
1	Consulta prévia	Anita de Cassia	25/11/20	25/12/20	-	25/11/20	23/12/21	-	100,00%	**Concluído**		
2	Análise de Projeto	BB	17/05/21	14/10/21	-	17/05/21	05/08/21	-	100,00%	**Concluído**		
3	Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada	SUDENE	14/10/21	13/11/21	-	05/08/21	02/09/21	-	100,00%	**Concluído**	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
	Atividades da Unidade (SUDENE)		**25/11/20**	**13/11/21**	**0,00**	**25/11/20**	**02/09/21**	**0,00**	**100,00%**	**Concluído**		
4	Contratação do banco operador	SUDENE/BB	02/09/21	01/11/21		02/09/21	01/11/21		50,00%	**Em Andamento**	A minuta de contrato foi enviado ao banco para validação e assinatura	
5	Liberação 1	SUDENE/BB	15/11/21	15/12/21	60.000.000,00				100,00%	**A Iniciar**		
	Liberações e Atribuições (SUDENE/Banco)		**02/09/21**	**15/12/21**	**60.000.000,00**	**02/09/21**	**01/11/21**	**0,00**	**75,00%**	**Em Andamento**		
	Competência da SUDENE /Banco								**88%**	**Em Andamento**		

15	Fiscalizações	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	**A Iniciar**		
16	Emissão de Certificado de Empreend. Implantado	BB	Não informado	Não informado		-	-	-	0,00%	**A Iniciar**		
	Encerramento (Banco)		**Não informado**	**Não informado**	**0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**0,00%**	**A Iniciar**		

Resultado Geral do Projeto	**Valor Previsto:**	**R$**	**60.000.000,00**	**Valor realizado:**	**R$**	**-**	**64%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:

Observações:

Obs1: O valor total do Projeto inclui os recursos do FDNE e das demais Fontes.

Fonte: CGDF (Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE**	**Número do Projeto:**	**PO COCIC/2021001 (EX POs 51 e 52)**
Sub-Obj. estratégico:	**3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências**	**Ano:**	**2021**
Programa:	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	**Eixo temático (MDR):**	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	**Objetivo estratégico (MDR):**	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	**Subunidade responsável:**	COCIC - Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres
Diretor:	Aluízio Pinto de Oliveira	**Gestor da subunidade:**	William Augusto de Souza
Problema (causa):	Localização inadequada das etapas de finalização de convênios nos planos operativos das unidades finalísticas.		
Projeto:	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.		
Objetivo do projeto:	Corrigir competências institucionais e acompanhar a finalização de convênios celebrados pela SUDENE.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	**ñ se aplica**
Data Atualização:	**31/03/2021**

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	William Augusto de Souza

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Processo nº 59335.000113/2018-11 - Uruçuca - BA (SIAFI nº 865731), Emissão de Nota Técnica 153/2021 (Doc SEI nº 0261604)	Fernanda Ferrario de Carvalho (COCIC - Núcleo de Análise)	06/05/2021	21/05/2021	ñ se aplica	06/05/2021	05/08/2021	ñ se aplica	100%	Concluído		
2	Processo nº 59335.000111/2018-14 - Pé de Serra - BA (SIAFI nº 865850), Emissão de Nota Técnica 154/2021 (Doc SEI nº 0261642)	Fernanda Ferrario de Carvalho (COCIC - Núcleo de Análise)	09/06/2021	24/06/2021	ñ se aplica	09/06/2021	05/08/2021	ñ se aplica	75%	Atrasado		
3	Processo nº 59336.001813/2021-19 - CIDAGRO/PB (SIAFI nº 868122), Emissão de Nota Técnica 149/2021 (Doc SEI nº 0260009)	Heber Leandro Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	22/07/2021	06/08/2021	ñ se aplica	22/07/2021	22/07/2021	ñ se aplica	100%	Concluído		
4	Processo nº 59335.000252/2018-37 - Negra do Norte - RN (SIAFI nº 875557), Emissão de Nota Técnica 162/2021 (Doc SEI nº 263096)	Clovis Emidio Martins da Silva (COCIC - Núcleo de Análise)	03/08/2021	18/08/2021	ñ se aplica	03/08/2021	04/08/2021	ñ se aplica	100%	Concluído		
5	Processo nº 59335.000107/2018-56 - Mata de São João - BA (SIAFI nº 865929), Emissão de Nota Técnica 189/2021 (Doc SEI nº 0269832)	Clovis Emídio (COCIC - Núcleo de Análise)	27/08/2021	11/09/2021	ñ se aplica	27/08/2021	23/09/2021	ñ se aplica	100%	Concluído		
6	Processo nº 59335.000218/2018-62 - Município de Marcelino Vieira-RN (SIAFI nº 875547), Emissão de NOTA TÉCNICA Nº46/2021 (Doc SEI nº 0232535) que foi conclúida com a Nota Técnica 161/2021(Doc SEI nº 0262586)	Fernanda Ferrário(COCIC - Núcleo de Análise) que foi substituida pelo Clovis Emídio (COCIC - Núcleo de Análise)	15/03/2021	30/03/2021	ñ se aplica	26/03/2021	03/08/2021	ñ se aplica	100%	Concluído		
7	Processo nº 59335.000127/2018-27 - Município de Carnaubais - RN (SIAFI nº 865918), Emissão de NOTA TÉCNICA Nº 158/2021 (Doc SEI nº 262309).	Clovis Emídio (COCIC - Núcleo de Análise)	07/06/2021	22/06/2021	ñ se aplica	04/08/2021	04/08/2021	ñ se aplica	100%	Concluído		
8	Processo nº 59335.000133/2018-84 - Município de Casa Nova - BA (SIAFI nº 868126), Emissão de NOTA TÉCNICA Nº 180/2021 (Doc SEI nº 266130).	Fernanda Ferrario de Carvalho (COCIC - Núcleo de Análise)	10/08/2021	25/08/2021	ñ se aplica	10/08/2021	21/10/2021	ñ se aplica	100%	Concluído		
9	Processo nº 59336.000568/2019-08 - Município de Mulungu do Morro - BA (SIAFI nº 883046), Emissão de NOTA TÉCNICA Nº 177/2021 (Doc SEI nº 265718).	Clovis Emídio (COCIC - Núcleo de Análise)	08/07/2021	23/07/2021	ñ se aplica	10/08/2021	19/08/2021	ñ se aplica	100%	Concluído		
10	Processo nº 59336.000573/2019-11 - Mata de São João - BA (SIAFI nº 883043), Emissão de Nota Técnica 183/2021 (Doc SEI nº 0266601)	Clovis Emídio (COCIC - Núcleo de Análise)	11/08/2021	26/08/2021	ñ se aplica	03/09/2021	03/09/2021	ñ se aplica	100%	Concluído		
11	Processo nº 59336.003247/2019-57 - Cupira - PE (SIAFI nº 897120), Emissão de Nota Técnica 178/2021 (Doc SEI nº 265352)	Clovis Emídio (COCIC - Núcleo de Análise)	13/08/2021	28/08/2021	ñ se aplica	17/08/2021	17/08/2021	ñ se aplica	100%	Concluído		
12	Processo nº 59336.001925/2018-66 - Gentio do Ouro-BA (SIAFI nº 880965), Emissão de Nota Técnica 193/2021 (Doc SEI nº 270639)	Fernanda Ferrario de Carvalho (COCIC - Núcleo de Análise)	24/05/2021	08/06/2021	ñ se aplica	24/05/2021	29/10/2021	ñ se aplica	100%	Concluído		
13	Processo nº 59336.000570/2019-79 - Mata de São João - BA (SIAFI nº 883044), Emissão de Nota Técnica 215/2021 (Doc SEI nº 277130)	Clovis Emídio (COCIC - Núcleo de Análise)	17/09/2021	02/10/2021	ñ se aplica	28/09/2021	28/09/2021	ñ se aplica	100%	Concluído		
14	Processo nº 59336.001363/2019-31 - COOP. DE CONSULTORIA E SERV. TÉCNICOS/PE (SIAFI nº 383906), Emissão de Nota Técnica 195/2021 (Doc SEI nº 271533)	Glaucio Pereira Maciel (COCIC - Núcleo de Análise)	16/06/2021	01/07/2021	ñ se aplica	03/09/2021	03/09/2021	ñ se aplica	100%	Concluído		

15	Processo nº 59336.000578/2021-50 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A (SIAFI nº 031/87—DPS/AAB/PLI), Emissão de Nota Técnica 206/2021 (Doc SEI nº 0273058)	Heber Leandro Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	10/09/2021	25/09/2021	ñ se aplica	10/09/2021	10/09/2021	ñ se aplica	100%	**Concluído**		
16	Processo nº 59336.000578/2021-50 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A (SIAFI nº 031/87—DPS/AAB/PLI), Emissão de Nota Técnica 206/2021 (Doc SEI nº 0273058)	Heber Leandro Nunes (COCIC - Núcleo de Análise)	10/09/2021	25/09/2021	ñ se aplica	10/09/2021	10/09/2021	ñ se aplica	100%	**Concluído**		
17	Processo nº 59335.000109/2018-45 - Ouro Branco-RB (SIAFI nº 865930), Emissão de Nota Técnica 70/2021 (Doc SEI nº 0237276)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	08/03/2021	23/03/2021	ñ se aplica	08/03/2021	04/11/2021	ñ se aplica	100%	**Concluído**		
18	Processo nº 59335.000144/2018-64 - Jacaraci/BA (SIAFI nº 875543), Emissão de Nota Técnica 71/2021 (Doc SEI nº 0237277)	Fernanda Ferrário (COCIC - Núcleo de Análise)	10/03/2021	25/03/2021	ñ se aplica	10/03/2021		ñ se aplica	75%	**Atrasado**		
19	Processo nº 59335.000068/2017-14 - Município de Bom Jesus - RN (SIAFI nº 850667), Emissão de NOTA TÉCNICA Nº 301/2020 (Doc SEI nº 199741)	Fernanda Ferrario de Carvalho (COCIC - Núcleo de Análise)	03/08/2020	18/08/2020	ñ se aplica	20/11/2020		ñ se aplica	75%	**Atrasado**	Processo atrasado, mas está em andamento.	
				Valor Previsto:	ñ se aplica	**Valor realizado:**		ñ se aplica	97%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
Coordenações-Gerais de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças, Auditoria Geral e Procuradoria Geral.
Observações:
1º ciclo 2021 - Jan/2020 a Março/2021
Os POs 51 (2019) e 52 (2020) foram consolidados nessa planilha.

Fonte: COCIC (Coordenação de Convênios e Instrumentos Congêneres)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE**	**Número do Projeto:**	**PO 2021001 (ex PO 2020001)**
Sub-Obj. estratégico:	**3.1.2. Modernizar a gestão**	**Ano:**	**2021**

Programa:	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	**Eixo temático (MDR):**	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000 - Administração de Unidade	**Objetivo estratégico (MDR):**	Assegurar participação, transparência e melhoria contínua dos meios e processos de gestão
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios adminitrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	**Subunidade responsável:**	CPTCE - Comissão Permanente de Tomadas de Contas Especial
Diretor:	Aluízio Pinto de Oliveira	**Gestor da subunidade:**	Heber Leandro Nunes
Problema (causa):	Localização inadequada das etapas de finalização de convênios nos planos operativos das unidades finalísticas.		
Projeto:	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.		
Objetivo do projeto:	Corrigir competências institucionais e acompanhar a finalização de convênios celebrados pela SUDENE.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	**ñ se aplica**
Data Atualização:	**30/09/2021**

Responsáv(el)(eis) técnico(s) pelo Projeto	Heber Leandro Nunes

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Cred.)	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

N.E.	Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
			Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	Processo TCE nº 59335.000035/2011-70, Ref. Conv. DDS-107/00 SIAFI nº 406572 Gov. Estado de Sergipe (Processo Convênio nº 59313.000107/00-85) - Relatório de TCE nº 001/2021	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	09/04/2020	31/12/2020	N/A	09/04/2020	12/03/2021	N/A	100%	Concluído	TCE encaminhada em 2019 à CGU e devolvida pela CGU em abril/2020, para reanálise. Renálise da TCE concluída em 12/03/2021	
2	Processo TCE nº 59335.000102/2011-57, Ref. Conv. CPE-084/00 SIAFI nº 406591 IPSA - Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas (Processo Convênio nº 559313.000084/2000-17) - Relatório de TCE nº 002/2021	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	09/04/2020	30/06/2021	N/A	09/04/2020	14/04/2021	N/A	100%	Concluído		
3	Processo TCE nº 59335.000032/2010-56, Ref. Conv. DPS n.º 038/97, SIAFI nº 338592, Morro Cabeça no Tempo-PI (Processo Convênio nº 03057.000045/97-87) - Relatório de TCE nº 003/2021	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	31/03/2021	29/06/2021	N/A	31/03/2021	14/04/2021	N/A	100%	Concluído		
4	Processo TCE n.º 59335.000720/2010-16, Ref. Conv. SIAFI n.º 406373, IPSA/PE (Processo n.º 59313.000114/00-87) - Relatório de TCE nº 004/2021	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	09/04/2020	31/12/2020	N/A	09/04/2020	29/04/2021	N/A	100%	Concluído		
5	Processo TCE n.º 59335.000394/2009-11, Ref. Conv. SIAFI n.º 368482, Chã de Alegria-PE (Processo n.º 03057.000016/1998-60) - Relatório de TCE nº 005/2021	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	19/04/2021	16/10/2021	N/A	19/04/2021	03/05/2021	N/A	100%	Concluído		
6	Processo TCE n.º 59335.000036/2008-10, Ref. Conv. SIAFI n.º 384007, Chã de Alegria-PE (Processo n.º 03045.000085/1999-48) - Relatório de TCE nº 006/2021	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	29/04/2021	26/10/2021	N/A	29/04/2021	14/05/2021	N/A	100%	Concluído		
7	Processo TCE n.º 59335.000550/2009-36, Ref. Conv. SIAFI n.º 407080, Escada-PE (Processo n.º 59313.000103/2000-05) - Relatório de TCE nº 007/2021	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	13/02/2021	12/08/2021	N/A	13/02/2021	10/06/201	N/A	100%	Concluído		
8	Processo TCE n.º 59335.000060/2010-73, Ref. Conv. SIAFI n.º 328386, Flexeiras-AL (Processo n.º 03057.000004/1997-08) - Relatório de TCE nº 008/2021	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	17/05/2021	13/11/2021	N/A	17/05/2021	25/06/2021	N/A	100%	Concluído		
9	Processo de TCE nº 59335.000184/2010-59, ref. Conv. SIAFI nº 348984 (proc. Nº 03055.000025/98-34), Governo do Estado de Alagoas. - Relatório de TCE nº 009/2021	Rivaldo Souza/Eliane Acioly (CPTCE)	03/04/2019	30/09/2019	N/A	03/04/2019	01/07/2021	N/A	100%	Concluído		

10	Processo TCE n.º 59335.000356/2009-08 Ref. Conv. SIAFI n.º 406593 (Processo n.º 59313.000095/2000-99) - AEDA - Autarquia Educacional do Araripe - Relatório de TCE nº 010/2021	gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	08/07/2021	04/01/2022	N/A	08/07/2021	31/08/2021	N/A	100%	**Concluído**	
11	Processo TCE n.º 59335.000365/2011-66 Ref. Conv. SIAFI n.º 580885 (Processo n.º 59333.000146/2006-30) - Cooperativa dos Artesãos em Couro de Ribeira de Cabaceiras LTDA - ARTEZA - Relatório de TCE nº 011/2021	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	02/08/2021	29/01/2022	N/A	02/08/2021	31/08/2021	N/A	100%	**Concluído**	
12	Processo de TCE nº 59335.000005/2012-45, Ref. Conv. SIAFI nº 406129 (Processo n.º 59313.000006/2000-12), Centro Nordestino de Medicina Popular-CNMP - Relatório de TCE nº 012/2021	Rivaldo Souza/Eliane Acioly (CPTCE)	22/04/2021	19/10/2021	N/A	22/04/2021	21/09/2021	N/A	100%	**Concluído**	
13	Processo de TCE nº 59335.000544/2009-89 , Ref. Conv. SIAFI nº 371426 (Processo n.º 03057.00002/1999-36), Fundação Quinteto Violado - Relatório de TCE nº 013/2021	Gilvannewton Souza, Jacilda Ferraz (CPTCE)	20/08/2021	16/02/2022	N/A	20/08/2021	27/09/2021	N/A	100%	**Concluído**	
14	Processo de TCE nº 59335.000049/2010-11, ref. Conv SIAFI nº 400444 (Processo nº 59313.000005/00-60) - Associação dos Engenheiros de Pesca de Pernambuco - AEP/PE - - Elaboração de Relatório de TCE	Rivaldo Souza/Eliane Acioly (CPTCE)	18/08/2021	14/02/2022	N/A	18/08/2021		N/A	25%	**Em Andamento**	
			Valor Previsto:		ñ se aplica	**Valor realizado:**		ñ se aplica	N/A	**Em Andamento**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:	Coordenações-Gerais de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação, Coordenação de Orçamento, Contabilidade e Finanças, Auditoria Geral e Procuradoria Geral.
Observações:	
P.O. - 3º ciclo/2021	

Fonte: CPTCE (Comissão Permanete de Tomadas de Contas Especial)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE**	**Número do Projeto:**	**PO CGGP/2018001 (ex PO 54)**
Objetivo estrátegico:	**3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências**	**Ano:**	**2018**
Programa do PPA:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	**Eixo temático (MDR):**	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação do PPA:	2000-Administração da Unidade	**Objetivo estrátegico**	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implemenatação e gestão de seus programas finalísticos		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	**Subunidade responsável**	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
Diretor:	**Aluízio Pinto de Oliveira**	**Gestor da subunidade:**	Carla dos Santos Macedo Paes
Problema (causa):	Necessidade de dimensionar a força de trabalho da Sudene		
Projeto:	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho		
Objetivo do projeto:	Realizar estudos para elaboração de Projeto com a finalidade de dimensionar a força de trabalho da Sudene		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto
	250	3.3.90.00			R$ 25.000,00

Previsão de Conclusão:	31/12/2021
Data Atualização:	30/09/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R$ 9.414,51
A realizar no exercício	R$ -00
Orçamento Aprov.no exercício (LOA+Créd.)	R$ -00
Valor Empenhado no Exercício	R$ -00
Valor liberado no Exercício	R$ -00
Saldo a liberar	R$ -00
Saldo a Empenhar no exercício	R$ -00
Total Liberado até o exercício	R$ 9.414,51

N.E	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	**Capacitação sobre Força de Trabalho**	Capacitar a unidade da CGGP sobre o tema (Carla - Márcia - Marlene)	CGGP	01/03/2018	31/12/2018	R$ 10.000,00	01/03/2018	17/08/2018	R$ 9.414,51	100%	**Concluído**		
2	**Elaboração do Projeto para Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho**	Elaboração do projeto para definição, objetivos, etapas e implementação do dimensionamento da Força de Trabalho visando a contratação de facilitador	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	30/07/2018	28/02/2019	R$ -00	30/07/2018	17/05/2019	R$ -00	100%	**Concluído**	Enviado Ofício nº 147/2018/SUDENE, datado de 17 de maio de 2018 ao MP pedindo acesso à metodologia do dimensionamento da força de trabalho no SPF, com a resposta por meio do Ofício nº 85618/2018-MP, de 26 de setembro de 2018. Participação em evento no MP sobre Movimentação e dimensionamento da força de trabalho em 29/11/2018. Datas repactuadas devido a agenda do facilitador para iniciar o projeto em 2018.	
3	**Dimensionamento Quantitativo da Força de Trabalho**	Levantamento dos quantitativos para elaboração de relatórios quatitativos e estudos de dimensionamento. Atualização do Lotacionograma das	CGGP, Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas e Facilitadores	01/03/2019	31/08/2019	R$ 15.000,00	19/07/2018	31/08/2019	R$ -00	100%	**Concluído**	Etapa concluída, sem a realização de oficinas internas. Não estando previstos outros gastos com este PO.	
4	**Dimensionamento Qualitativo da Força de Trabalho**	Levantamento dos qualitativos para elaboração de relatórios qualitativos e estudos de dimensionamento. Atualização do Lotacionograma das Unidades	CGGP	01/03/2019	31/08/2021	R$ -00	05/04/2020	31/08/2021		100%	**Concluído**	Realização de reuniões técnicas da CGGP no período para definição de dados e deliberação do estudo técnico.	

5	**Apresentação do Resultado**	Apresentação do Resultado do Documento Técnico do Dimensionamento da Força de Trabalho à Diretoria Colegiada para aprovação	CGGP	01/09/2021	31/10/2021		01/09/2021			80%	**Em Andamento**	O percentual atingido de 80% no Plano Operativo de Dimensionamento da Força de Trabalho na etapa 5 (Apresentação do Resultado do Documento Técnico do Dimensionamento da Força de Trabalho à Diretoria Colegiada para aprovação), tendo em vista que a consolidação das respostas/informações das unidades administrativas, colacionadas no processo SEI Nº 59336.000882/2021-05, está em elaboração o documento técnico que exige que desprende grande esforço e tempo da equipe envolvida, não sendo ainda finalizado para apresentação.	Enviado OFÍCIO Nº 1812/2021/CGGP/DAD/SUDENE, DE 03 de setembro de 2021 aos Gestores da Unidade da Sudene, com a finalidade de atualização do Lotacionograma para compor o Planejamento das Ações do Dimensionamento da Força de Trabalho da Sudene, com a juntada das respostas no processo SEI Nº 59336.000882/2021-05
6	**Definição de ações e Implantação do Plano de Ação do Planejamento da Força de Trabalho**	Plano de ação do Planejamento da Força de Trabalho com definição e implantação das principais ações para fortalecimento e melhor adequação da força de trabalho	CGGP e Unidades Administrativas	01/11/2021	31/12/2021					0%	**A Iniciar**	Data repactuada	
				Valor Previsto:		R$ 25.000,00	**Valor realizado:**		R$ 9.414,51	80%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:	
Observações:	

Fonte: CGGP (Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

ɔ

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégic	**3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE**	**Número do Projeto:**	**PO CGGP/2020001 (ex PO 55)**
Objetivo estrátegi	**3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências**	**Ano:**	**2020**
Sub-objetivo:	**3.1.3 – Valorizar e qualificar os servidores.**		

Programa:	2111-Programa de Gestão e Manutenção do MI	**Eixo temático (MDR):**	Implementar Gestão Eficiente, Eficaz e Efetiva
Ação:	2000-Administração da Unidade	**Objetivo estrátegico (MDR):**	Promover a valorização e qualificação permanente dos servidores
Objetivo da ação:	Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a implemenatação e gestão de seus programas finalísticos		
Diretoria responsável:	Diretoria de Administração	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas
Diretor :	**Aluízio Pinto de Oliveira**	**Gestor da subunidade:**	Carla dos Santos Macedo Paes
Problema (causa):	Necessidade de avaliar o desenvolvimento das competências organizacionais e individuais		
Projeto:	Indicadores de Gestão de Pessoas		
Objetivo do projeto:	Realizar estudos, elaborar instrumentos de avaliação e implantar a avaliação de competências		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor Total do Projeto**
	250	3.3.90.00		R$ 50.000,00

Previsão de Conclusão:	31/12/2021
Data Atualização:	30/09/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Carla Paes, Márcia Santos de Melo, Marlene Franklin e Marina Braga

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R$ 10.800,00
A realizar no exercício	-
Orçamento Aprovado (LOA + Crédito)	R$ -00
Valor Empenhado no Exercício	
Valor liberado no Exercício	
Saldo a liberar	R$ -00
Saldo a Empenhar no exercício	
Total Liberado até o exercício	R$ 10.800,00

N.E.	Nome da Etapa	escrição das Atividades/ Etap	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	**Estudos sobre Indicadores de Desempenho para Gestão de Pessoas**	Estudos sobre o tema indicadores de Desempenho para Gestão de Pessoas - pesquisas de modelos, pesquisa na literatura	CGGP	01/09/20	30/09/20		01/09/20	30/09/20		100%	Concluído	Estudos para compreensão do tema - prévia a capacitação formal	
2	**Capacitação da Equipe e Elaboração de Plano de Ação**	Participação em evento de capacitação e Elaboração de Projeto/Plano de Ação para execução do projeto	CGGP	01/09/20	29/10/20	R$ 50.000,00	01/09/20	29/10/20	R$ 10.800,00	100%	Concluído	Foi gasto com capacitação no exercício de 2020, o valor de R$10.800,00, não estando previstos outros gastos com este PO.	
3	**Análise das Atividades, Processos, Projetos e Programas da CGGP**	Estudo e análise das Atividades, Processos, Projetos e Programas da CGGP, assim como normativos referenciais para auxiliar na definição de processos críticos de monitoramento - conforme	CGGP (Gestores e Tecnicos)	01/02/21	31/03/21	R$ -00	01/02/21	31/03/21	-	100%	Concluído		
4	**Seleção dos processos críticos para monitoramento - CGGP**	Definir Atividades, Processos, Projetos e Programas da CGGP/DIDAS/DICAD para monitoramento	CGGP (Gestores)	01/04/21	30/04/21	R$ -00	12/04/21	30/04/21		100%	Concluído		
5	**Definir Ordem de estudos das subunidades da CGGP**	Definir ordem de trabalho para definição de indicadores (CGGP, DICAD, DIDAS)	CGGP (Gestores)	01/05/21	31/05/21	R$ -00	26/04/21	31/05/21		100%	Concluído		
6	**Estudo do processos críticos para monitoramento - Subunidade 1**	Análise do processo/atividade/projeto/programa para levantar informações crítica na elaboração de indicadores.	CGGP	01/05/21	31/05/21	R$ -00	01/05/21	31/05/21		100%	Concluído		**Definição de indicadores DIDAS Capacitação**

7	**Definição de Indicadores e Metas - Subunidade 1**	Elaboração da Ficha Tecnica dos indicadores (Nome, objetivo, definição, fonte de dados, fórmula de cálculo, periodicidade). Definição de critérios de avaliação - Metas	CGGP	01/05/21	31/05/21	R$ -00	01/05/21	31/05/21		100%	Concluído		Definição de indicadores DIDAS Capacitação
8	**Definição de Responsáveis pelo levantamento das informações - Subunidade 1**	Definição de Responsáveis pelo levantamento das informações e treinamento dos mesmos	CGGP	01/05/21	31/05/21	R$ -00	01/05/21	31/05/21		100%	Concluído		
9	**Levantamento das informações para Etapa piloto - Subunidade 1**	Coletar as informações necessárias para medição.	CGGP e responsáveis definidos na subunidade	01/07/21	31/07/21	R$ -00	01/07/21	31/07/21		100%	Concluído	Ajustes dos indicadores à luz dos trabalhos do Grupo responsável pelo Realinhamento do Planejamento Estratégico Institucional	
10	**Realização da avaliação com indicadores - Subunidade 1**	Rodar a avaliação da atividade/projeto/programa/processo para um período de monitoramento	CGGP	01/07/21	31/07/21	R$ -00	01/07/21	31/07/21		100%	Concluído	Ajustes dos indicadores à luz dos trabalhos do Grupo responsável pelo Realinhamento do Planejamento Estratégico Institucional	
11	**Apresentação dos resultados - Subunidade 1**	Apresentação dos resultadados p CGGP e subunidade para verificar adequação às necessidades	CGGP	01/08/21	31/08/21	R$ -00	01/08/21	31/08/21		100%	Concluído	Ajustes dos indicadores à luz dos trabalhos do Grupo responsável pelo Realinhamento do Planejamento Estratégico Institucional	
12	**Ajustes e validação - Subunidade 1**	Apresentação final da formatação dos indicadores e resultados do período piloto.	CGGP	01/08/21	31/08/21	R$ -00	01/08/21	31/08/21		100%	Concluído	Ajustes dos indicadores à luz dos trabalhos do Grupo responsável pelo Realinhamento do Planejamento Estratégico Institucional	Acompanhamento no Processo 59336.00288/2021-17
13	**Estudo do processos críticos para monitoramento - Subunidade 2**	Análise do processo/atividade/projeto/programa para levantar informações crítica na elaboração de indicadores.	CGGP	01/07/21	30/07/21	R$ -00	01/07/21	30/07/21		100%	Concluído	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
14	**Definição de Indicadores e Metas - Subunidade 2**	Elaboração da Ficha Tecnica dos indicadores (Nome, objetivo, definição, fonte de dados, fórmula de cálculo, periodicidade). Definição de critérios de avaliação - Metas	CGGP	02/08/21	13/08/21	R$ -00	02/08/21	13/08/21		100%	Concluído	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
15	**Definição de Responsáveis pelo levantamento das informações - Subunidade 2**	Definição de Responsáveis pelo levantamento das informações e treinamento dos mesmos	CGGP	16/08/21	17/08/21	R$ -00	16/08/21	17/08/21		100%	Concluído	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
16	**Levantamento das informações para Etapa piloto - Subunidade 2**	Coletar as informações necessárias para medição.	CGGP e responsáveis definidos na subunidade	18/08/21	10/09/21	R$ -00	18/08/21	10/09/21		100%	Concluído	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
17	**Realização da avaliação com indicadores - Subunidade 2**	Rodar a avaliação da atividade/projeto/programa/processo para um período de monitoramento	CGGP	13/09/21	30/09/21	R$ -00	13/09/21	30/09/21		100%	Concluído	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	Acompanhamento no Processo 59336.002888/2021-17
18	**Apresentação dos resultados - Subunidade 2**	Apresentação dos resultadados p CGGP e subunidade para verificar adequação às necessidades	CGGP	01/10/21	01/10/21	R$ -00				0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
19	**Ajustes e validação - Subunidade 2**	Apresentação final da formatação dos indicadores e resultados do período piloto.	CGGP	04/10/21	15/10/21	R$ -00				0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
20	**Estudo do processos críticos para monitoramento - Subunidade 3**	Análise do processo/atividade/projeto/programa para levantar informações crítica na elaboração de indicadores.	CGGP	18/10/21	29/10/21	R$ -00				0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
21	**Definição de Indicadores e Metas - Subunidade 3**	Elaboração da Ficha Tecnica dos indicadores (Nome, objetivo, definição, fonte de dados, fórmula de cálculo, periodicidade). Definição de critérios de avaliação - Metas	CGGP	01/11/21	12/11/21	R$ -00				0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
22	**Definição de Responsáveis pelo levantamento das informações - Subunidade 3**	Definição de Responsáveis pelo levantamento das informações e treinamento dos mesmos	CGGP	16/11/21	17/11/21	R$ -00				0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	

23	**Levantamento das informações para Etapa piloto - Subunidade 3**	Coletar as informações necessárias para medição.	CGGP e responsáveis definidos na subunidade	22/11/21	03/12/21	R$ -00				0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
24	**Realização da avaliação com indicadores - Subunidade 3**	Rodar a avaliação da atividade/projeto/programa/processo para um período de monitoramento	CGGP	06/12/21	17/12/21	R$ -00				0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
25	**Apresentação dos resultados - Subunidade 3**	Apresentação dos resultadados p CGGP e subunidade para verificar adequação às necessidades	CGGP	20/12/21	20/12/21	R$ -00				0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
26	**Ajustes e validação - Subunidade 3**	Apresentação final da formatação dos indicadores e resultados do período piloto.	CGGP	20/12/21	30/12/21	R$ -00				0%	A Iniciar	Datas repactuadas e adequação considerando as novas diretrizes do Decreto nº 9.991/2019 e o estado de pandemia do COVID-19.	
				Valor Previsto:		R$ 50.000,00	**Valor realizado:**		R$ 10.800,00	65%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
Observações:
Projeto com início em 2020 e previsão de conclusão em 2021.

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas CGGP

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

a

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ORÇAMENTO 2021 - POSIÇÃO ATÉ 30/09/2021

ESPECIFICAÇÃO	LOA 2021 (a)	%	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/CANCELAMENTOS/BLOQUEIOS (b)	ORÇAMENTO ATUALIZADO c = (a + b)	VALOR EMPENHADO/ DESCENTRALIZADO (d)	%	VALOR PAGO/REPASSADO (e)	SALDO ORÇAMENTÁRIO f = (c - d)
					10.678.442,36		**0,00**	
1) AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO - RP 2	**8.362.378,00**	**35,93**	**3.324.919,00**	**11.687.297,00**	**10.535.327,39**	**65,92**	**3.982.113,89**	**1.151.969,61**
Administração (Custeio Administrativo) - 2000/0001- PO 0000	7.808.433,00	33,55	3.324.919,00	11.133.352,00	9.992.642,39	62,43	3.864.094,41	1.140.709,61
Capacitação de Servidores - 2000/0001 - PO0001	400.000,00	1,72	0,00	400.000,00	388.740,00	2,43	2.030,00	11.260,00
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - 216H/0020	153.945,00	0,66	0,00	153.945,00	153.945,00	0,96	115.989,48	0,00
2) AÇÕES FINALÍSTICAS SUDENE - RP 2	**1.431.146,00**	**6,15**	**2.265.746,00**	**3.696.892,00**	**143.114,97**	**0,00**	**0,0**	**3.553.777,03**
Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - 8340/0001	***399.817,00***	***1,72***	***282.457,00***	**682.274,00**	***143.114,97***	**0,00**	***143.114,97***	***539.159,03***
Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - Despesas Diversas - 8340/0020 - PO 0000	206.874,00		0,00	206.874,00	0,00		0,00	206.874,00
Apoio a Estudos de Tecnologia e Inovação - 8340/0001 - PO 0001	192.943,00		282.457,00	475.400,00	143.114,97		143.114,97	332.285,03
Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial - 20WQ.0001	***825.484,00***	***3,55***	***1.015.876,00***	***1.841.360,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**1.841.360,00**
Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial - 20WQ/0001 - PO 0004	215.638,00		113.336,00	328.974,00	0,00		0,00	328.974,00
Fortalecimento das Políticas Desenvolvimento Regional - 20WQ/0001 - PO 0005	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Serviços Especializados de Informação - 20WQ/0001 - PO 0006	1,00		0,00	1,00	0,00		0,00	1,00
Estudos Estratégicos - 20WQ/0001 - PO 0007	215.637,00		104.221,00	319.858,00	0,00		0,00	319.858,00
Monitoramento e Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Regional - 20WQ/0001 - PO 0008	394.208,00		798.319,00	1.192.527,00	0,00		0,00	1.192.527,00
Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S/0001	***33.746,00***	***0,14***	***158.592,00***	***192.338,00***	***0,00***	**0,00**	***0,00***	***192.338,00***
Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S/0001 - PO 0000	33.746,00		158.592,00	192.338,00	0,00		0,00	192.338,00
Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade - 4640/0001	***67.490,00***	***0,29***	***317.185,00***	***384.675,00***	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**384.675,00**
Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade - 4640/0001 - PO 0000	67.490,00		317.185,00	384.675,00	0,00		0,00	384.675,00
Fortalecimento das Administrações Locais - Região Nordeste - 8917/0001	***104.609,00***	***0,45***	***491.636,00***	***596.245,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***596.245,00***
Fortalecimento das Administrações Locais - Despesas Diversas - 8917/0001 - PO 0000	101.235,00		475.777,00	577.012,00	0,00		0,00	577.012,00
Acompanhamento e Fiscalização "+ Gestão Municipal" - 8917/0001 - PO 0002	3.374,00		15.859,00	19.233,00	0,00		0,00	19.233,00
3) EMENDAS PARLAMENTARES - RP 6 E RP 7	**13.480.138,00**	**57,92**	**0,00**	**13.480.138,00**	**5.302.527,50**	**0,00**	**0,00**	**8.177.610,50**
Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S	***200.000,00***	***0,86***	***0,00***	***200.000,00***	***0,00***	**0,00**	***0,00***	***200.000,00***
Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S/0031 - (PTRES 202407) - No Estado de Minas Gerais (RP 6)	200.000,00		0,00	200.000,00	0,00		0,00	200.000,00
Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - 7K66	**13.280.138,00**	***57,06***	***0,00***	***13.280.138,00***	***5.302.527,50***	**0,00**	***0,00***	***7.977.610,50***
Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - 7K66 - (PTRES 202408) - No Estado do Ceará (RP 6)	5.000.000,00		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		0,00	0,00
Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - 7K66 - (PTRES 202409) - No Estado de Pernambuco (RP 6)	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	302.527,50		0,00	697.472,50
Ação 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - 7K66 - (PTRES 202411) - Aquisição de Máquina (RP 7)	7.280.138,00		0,00	7.280.138,00	0,00		0,00	7.280.138,00
TOTAL	**23.273.662,00**	**100,00**	**5.590.665,00**	**28.864.327,00**	**15.980.969,86**	**100,00**	**3.982.113,89**	**12.883.357,14**

PO = Plano Orçamentário

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
1	CGDS/2014001 (ex PO 3)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinicultura Leitiera no Semiárido Paraibano	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R$ 343.585,70	R$ 343.585,70	100%	CGDS
2	CGDS/2020005 (ex PO 6)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de Capacitação para Consolidaçãode de Novas Tecnologias de Computação (Nuvem)	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R$ 425.000,00	R$ 319.360,49	-	CGDS
3	CGDS/2020006 (ex PO 7)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas pernambucanas atraves da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R$ 340.000,00	R$ 241.376,80	-	CGDS
4	CGDS/2020007 (ex PO 7)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Montagem de Plataforma Digital, constituída de 1 (um) Centro de Processamento de Dados Avançados (Datacenter) e 2 (dois) laboratórios móveis para desenvolvimento de soluções em computação em nuvem.	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R$ 649.777,57	R$ 0,00	-	CGDS
5	CGDS/2020008	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de unidades piloto de aproveitamento bioenergético e fotovoltaico para apoio ao desenvolvimento de empreendimentos agroindustrial de médio e pequeno porte	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R$ 550.000,00	R$ 550.000,00	100%	CGDS
6	CGDS/2020009	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de sistemas de tratamento e reuso de águas cinzas domiciliares em atividades produtivas no semiárido piauiense.	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R$ 476.011,69	R$ 0,00	0%	CGDS
7	CGDS/2020010	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Formação em Saúde Digital para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE)	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R$ 969.572,00	R$ 969.572,00	100%	CGDS
8	CGDS/2020011	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas do Nordeste atraves da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R$ 1.264.680,00	R$ 0,00	0%	CGDS
9	CGDS/2020012	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da rede de inovação de polos da Rota do Cordeiro no Nordeste brasileiro por meio da inovação tecnológica	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R$ 426.466,90	R$ 426.466,90	100%	CGDS
10	CGDS/2020013	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de Desenvolvimento e aceleração de empreendimentos rurais no Semiárido Brasileiro Pós Pandemia de Covid-19.	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação e 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 465.839,00	R$ 465.839,00	100%	CGDS
11	CGEP/2019005 (ex PO 18)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Metodologia de acompanhamento do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Paralisado	R$ 1.481.361,00	R$ 120.403,17	8%	CGEP
12	CGEP/2020003 (ex PO 20)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em melhoramento genético e controle de pragas e doenças direcionados para fortalecimento da cultura da palma no Semiárido.	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R$ 479.849,09	R$ 211.365,09	-	CGEP
13	CGEP/2020004 (ex PO 21)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Diagnóstico Produtivo, Análises Zootécnicas, Aspectos Gerenciais e Propostas de Soluções para a Bovinocultura de Leite da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, Brasil	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R$ 298.932,28	R$ 218.511,98	-	CGEP

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
14	CGEP/2020006 (ex PO 23)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	INOVA + NE: Edital de subvenção econômica para inovação com o recurso correspondentes a 1,5% calculado sobre o produto do retorno das operações de financiamentos	Ação Interna	Ação Interna	Cancelado	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGEP
15	CGEP/2020007 (ex PO 24)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pesquisa de opinião sobre os efeitos decorrentes da Pandemia Covid-19 na área de atuação da Sudene - Processo nº 59336.000790/2020-36	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R$ 349.500,00	R$ 349.500,00	-	CGEP
16	CGCP/2020001 (ex PO 31)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Revisão do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R$ 1.644.040,39	R$ 905.055,23	55%	CGCP
17	CGCP/2020002 (ex PO 32)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Acordo de Cooperação Técnica com instituições financeiras.	Ação não orçamentária	Ação não orçamentária	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGCP
18	CGCP/2020003 (ex PO 33)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Articulação do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Concluído	R$ 889.987,96	R$ 889.987,96	100%	CGCP
19	CGCP/2021001	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Projeto Cidades Inteligentes 4.0 - Campina Grande - Convênio com ABDI	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	8340-Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Em Andamento	R$ 1.998.021,94	R$ 0,00	0%	CGCP
20	CGDF/2008001 (ex PO 34)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R$ 3.876.491.700,00	R$ 3.065.105.668,00	79%	CGDF
21	CGDF/2008002 (ex PO 35)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R$ 61.728.156,00	R$ 61.728.156,00	100%	CGDF
22	CGDF/2011001 (ex PO 36)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R$ 59.700.000,00	R$ 59.700.000,00	100%	CGDF
23	CGDF/2011002 (ex PO 37)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R$ 54.900.000,00	R$ 54.900.000,00	100%	CGDF
24	CGDF/2011003 (ex PO 38)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R$ 50.000.000,00	R$ 50.000.000,00	100%	CGDF
25	CGDF/2012002 (ex PO 40)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R$ 19.539.983,88	R$ 19.539.983,88	100%	CGDF
26	CGDF/2012003 (ex PO 41)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R$ 31.256.000,00	R$ 31.256.000,00	100%	CGDF
27	CGDF/2012004 (ex PO 42)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R$ 50.000.000,00	R$ 50.000.000,00	100%	CGDF

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
28	CGDF/2014001 (ex PO 43)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A.)	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 415.582.562,52	R$ 398.008.422,34	96%	CGDF
29	CGDF/2015001 (ex PO 44)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R$ 39.800.940,00	R$ 39.800.940,00	100%	CGDF
30	CGDF/2016001 (ex PO 45)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Brametal S.A	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R$ 4.095.556,81	R$ 4.095.556,81	100%	CGDF
31	CGDF/2019001 (ex PO 48)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Vila Piauí 1 Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	85.228.754,84	85.228.132,65	100%	CGDF
32	CGDF/2019002 (ex PO 49)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Vila Piauí 2 Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	85.228.754,84	83.252.534,84	98%	CGDF
33	CGDF/2020002	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Ventos de São Fernando IV Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 228.672.439,20	R$ 228.672.439,20	100%	CGDF
34	CGDF/2020003	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Central Eólica Boqueirão I S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 113.680.904,39	R$ 0,00	0%	CGDF
35	CGDF/2020004	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Central Eólica Boqueirão II S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 102.312.813,95	R$ 0,00	0%	CGDF
36	CGDF/2020005	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Vila Espírito Santo I Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 103.459.637,40	R$ 89.903.691,48	87%	CGDF
37	CGDF/2020006	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Vila Espírito Santo II Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 90.858.400,56	R$ 66.829.110,95	74%	CGDF
38	CGDF/2020007	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Vila Alagoas II Empreendimentos e Participações S.A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 55.786.889,22	R$ 15.891.285,35	28%	CGDF
39	CGDF/2021002	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Eólica Canudos II SPE S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 183.361.938,16	R$ 35.444.673,28	-	CGDF
40	CGDF/2021003	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Eólica Canudos III SPE S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 183.361.938,16	R$ 28.947.510,76	-	CGDF

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
41	CGDF/2021004	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	BORBOREMA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 60.000.000,00	R$ 0,00	-	CGDF
		Total do Objetivo 1.1						**5.968.099.995,45**	**4.474.315.129,86**	**75%**	
42	CGEP/2020001 (ex PO 17)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Estudo de georeferenciamento das empresas incentivadas na área de atuação da Sudene (Redução de 75%).	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGEP
43	CGEP/2020008 (ex PO 28)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE.	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGEP
44	CGDF/2021001	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a acaptação de investimento, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE 2021	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGDF
		Total do Objetivo 1.3						**0,00**	**0,00**	**-**	
45	CGEP/2019004 (ex PO 16)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Rede de Poços e Barragens	Ação Interna	Ação Interna	Cancelado	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGEP
46	CGEP/2020009 (ex PO 29)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Efeitos do Programa Cisternas 1ª água sobre indicadores de mercado de trabalho e saúde dos beneficiados.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R$ 384.000,00	R$ 384.000,00	100%	CGEP
47	CGEP/2020010 (ex PO 30)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Avaliação de Políticas Públicas: impacto da cota-parte municipal do ICMS na educação; educação infantil: oferta, demanda e medidas de qualidade; e, Nordeste	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R$ 480.600,00	R$ 480.600,00	100%	CGEP
48	CGEP/2021001 (ex PO 2019003)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Redelimitação do Semiárido	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGEP
		Total do Objetivo 1.4						**R$ 864.600,00**	**R$ 864.600,00**	**0%**	
49	CGEP/2019001 (ex PO 13)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5 Fortalecer as administrações públicas	Avaliação Qualidade dos Gastos Municipais (gestão fiscal)	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGEP
		Total do Objetivo 1.5						**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0%**	
		TOTAL DA DIRETRIZ 1						**5.968.964.595,45**	**4.475.179.729,86**	**75%**	
50	CGEP/2020002 (ex PO 19)	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.1 - Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis	IDEB como instrumento direcionador regional das Políticas Públicas da Educação	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGEP
		Total do Objetivo 2.1						**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**0%**	
51	CGEP/2019002 (ex PO 14)	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o Semiárido	Desenvolvimento de Máquina Colheitadeira de Palma	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGEP
52	CGCP/2021002	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Promover a sustentabilidade Ambiental	Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos dos 31 municípios do semiárido mineiro do CODANORTE	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ -Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	Em Andamento	R$ 725.810,00	R$ 0,00	0%	CGCP
53	CGCP/2021004	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Promover a sustentabilidade Ambiental	Plano de Desenvolvimento Sustentável de Guarabira-PB	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ -Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	Em Andamento	R$ 481.189,57	R$ 0,00	0%	CGCP
54	CGCP/2021005	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Promover a sustentabilidade Ambiental	Estudo de Vocações e Potencialidades para o estado da Paraíba	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ -Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	Em Andamento	R$ 750.000,00	R$ 0,00	0%	CGCP

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO DIRETRIZES E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
55	CGCP/2021006	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Promover a sustentabilidade Ambiental	Elaboração de um Estudo de Complexidade Econômica, um Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio São Francisco e área de influência do Projeto de Integração do São Francisco (PISF) e elaboração de um Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio Parnaíba	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ -Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	Em Andamento	R$ 893.809,13	R$ 201.107,06	23%	CGCP
Total do Objetivo 2.2								**R$ 2.850.808,70**	**R$ 201.107,06**	**0%**	
56	CGDS/2012001	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Paralisado	R$ 530.482,50	R$ 530.482,50	100%	CGDS
57	CGDS/2015001 (ex PO 4)	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Atrasado	R$ 459.000,00	R$ 459.000,00	100%	CGDS
		Total do Objetivo 2.3						**989.482,50**	**989.482,50**	**100%**	
		TOTAL DA DIRETRIZ 2						**3.840.291,20**	**1.190.589,56**	**31%**	
58	COCIC/2021001 (ex PO 51 e 52)	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.2019	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	-	COCIC
59	CPTCE/2021001	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CPTCE
60	CGGP/2018001 (ex PO 54)	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R$ 25.000,00	R$ 9.414,51	38%	CGGP
61	CGGP/2020001 (ex PO 55)	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Indicadores de Gestão de Pessoas	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R$ 50.000,00	R$ 10.800,00	22%	CGGP
		Total do Objetivo 3.1						**75.000,00**	**20.214,51**	**27%**	
		TOTAL DA DIRETRIZ 3						**75.000,00**	**20.214,51**	**27%**	
		TOTAL GERAL						**5.972.879.886,65**	**4.476.390.533,93**	**74,9%**	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

Referência dos dados: 3º Ciclo 2021

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição: Setembro/2021

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, PROGRAMAÇÃO DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
1	CGDF/2008001 (ex PO 34)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2217 - Desenvolvimento Regional, Terriroríal e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R$ 3.876.491.700,00	R$ 3.065.105.668,00	79%	CGDF
2	CGDF/2008002 (ex PO 35)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2217 - Desenvolvimento Regional, Terriroríal e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R$ 61.728.156,00	R$ 61.728.156,00	100%	CGDF
3	CGDF/2011001 (ex PO 36)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Terriroríal e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R$ 59.700.000,00	R$ 59.700.000,00	100%	CGDF
4	CGDF/2011002 (ex PO 37)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Terriroríal e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R$ 54.900.000,00	R$ 54.900.000,00	100%	CGDF
5	CGDF/2011003 (ex PO 38)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Terriroríal e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R$ 50.000.000,00	R$ 50.000.000,00	100%	CGDF
6	CGDF/2012002 (ex PO 40)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Terriroríal e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R$ 19.539.983,88	R$ 19.539.983,88	100%	CGDF
7	CGDF/2012003 (ex PO 41)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Terriroríal e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R$ 31.256.000,00	R$ 31.256.000,00	100%	CGDF
8	CGDF/2012004 (ex PO 42)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Terriroríal e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R$ 50.000.000,00	R$ 50.000.000,00	100%	CGDF
9	CGDF/2014001 (ex PO 43)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A.)	2217 - Desenvolvimento Regional, Terriroríal e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 415.582.562,52	R$ 398.008.422,34	96%	CGDF
10	CGDF/2015001 (ex PO 44)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2217 - Desenvolvimento Regional, Terriroríal e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R$ 39.800.940,00	R$ 39.800.940,00	100%	CGDF
11	CGDF/2016001 (ex PO 45)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Brametal S.A	2217 - Desenvolvimento Regional, Terriroríal e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R$ 4.095.556,81	R$ 4.095.556,81	100%	CGDF
12	CGDF/2019001 (ex PO 48)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Vila Piauí 1 Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Terriroríal e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	85.228.754,84	85.228.132,65	100%	CGDF
13	CGDF/2019002 (ex PO 49)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Vila Piauí 2 Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Terriroríal e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	85.228.754,84	83.252.534,84	98%	CGDF

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, PROGRAMAÇÃO DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
14	CGDF/2020002	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Ventos de São Fernando IV Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 228.672.439,20	R$ 228.672.439,20	100%	CGDF
15	CGDF/2020003	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Central Eólica Boqueirão I S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 113.680.904,39	R$ 0,00	0%	CGDF
16	CGDF/2020004	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Central Eólica Boqueirão II S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 102.312.813,95	R$ 0,00	0%	CGDF
17	CGDF/2020005	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Vila Espírito Santo I Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 103.459.637,40	R$ 89.903.691,48	87%	CGDF
18	CGDF/2020006	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Vila Espírito Santo II Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 90.858.400,56	R$ 66.829.110,95	74%	CGDF
19	CGDF/2020007	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Vila Alagoas II Empreendimentos e Participações S.A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 55.786.889,22	R$ 15.891.285,35	28%	CGDF
20	CGDF/2021002	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Eólica Canudos II SPE S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 183.361.938,16	R$ 35.444.673,28	-	CGDF
21	CGDF/2021003	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Eólica Canudos III SPE S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 183.361.938,16	R$ 28.947.510,76	-	CGDF
22	CGDF/2021004	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	BORBOREMA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 60.000.000,00	R$ 0,00	-	CGDF
		P 2217 - Ação 0355						**5.955.047.369,93**	**4.468.304.105,54**	**75%**	
23	CGDS/2014001 (ex PO 3)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinicultura Leitiera no Semiárido Paraibano	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R$ 343.585,70	R$ 343.585,70	100%	CGDS
		P 2217 - Ação 20N7						**343.585,70**	**343.585,70**	**100%**	
24	CGDS/2012001	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Paralisado	R$ 530.482,50	R$ 530.482,50	100%	CGDS
25	CGDS/2015001 (ex PO 4)	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Atrasado	R$ 459.000,00	R$ 459.000,00	100%	CGDS
		P 2217 - Ação 8689						**989.482,50**	**989.482,50**	**100%**	

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, PROGRAMAÇÃO DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
26	CGDS/2020010	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Formação em Saúde Digital para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE)	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R$ 969.572,00	R$ 969.572,00	100%	CGDS
		P 2217 - Ação 8917						**969.572,00**	**969.572,00**	**100%**	
27	CGEP/2019005 (ex PO 18)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Metodologia de acompanhamento do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Paralisado	R$ 1.481.361,00	R$ 120.403,17	8%	CGEP
28	CGEP/2020009 (ex PO 29)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Efeitos do Programa Cisternas 1ª água sobre indicadores de mercado de trabalho e saúde dos beneficiados.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R$ 384.000,00	R$ 384.000,00	100%	CGEP
29	CGEP/2020010 (ex PO 30)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Avaliação de Políticas Públicas: impacto da cota-parte municipal do ICMS na educação; educação infantil: oferta, demanda e medidas de qualidade; e, Nordeste Pacífico.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R$ 480.600,00	R$ 480.600,00	100%	CGEP
30	CGCP/2020001 (ex PO 31)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Revisão do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R$ 1.644.040,39	R$ 905.055,23	55%	CGCP
31	CGCP/2020003 (ex PO 33)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Articulação do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Concluído	R$ 889.987,96	R$ 889.987,96	100%	CGCP
32	CGCP/2021002	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Promover a sustentabilidade Ambiental	Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos dos 31 municípios do semiárido mineiro do CODANORTE	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ -Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	Em Andamento	R$ 725.810,00	R$ 0,00	0%	CGCP
33	CGCP/2021004	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Promover a sustentabilidade Ambiental	Plano de Desenvolvimento Sustentável de Guarabira-PB	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ -Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	Em Andamento	R$ 481.189,57	R$ 0,00	0%	CGCP
34	CGCP/2021005	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Promover a sustentabilidade Ambiental	Estudo de Vocações e Potencialidades para o estado da Paraíba	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ -Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	Em Andamento	R$ 750.000,00	R$ 0,00	0%	CGCP
35	CGCP/2021006	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Promover a sustentabilidade Ambiental	Elaboração de um Estudo de Complexidade Econômica, um Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio São Francisco e área	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ -Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	Em Andamento	R$ 893.809,13	R$ 201.107,06	23%	CGCP
		P 2217 - Ação 20WQ						**7.730.798,05**	**2.981.153,42**	**39%**	
36	CGDS/2020005 (ex PO 6)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de Capacitação para Consolidaçãode de Novas Tecnologias de Computação (Nuvem)	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R$ 425.000,00	R$ 319.360,49	-	CGDS
37	CGDS/2020006 (ex PO 7)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas pernambucanas atraves da capacitação de gestores de produção e alunos de	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R$ 340.000,00	R$ 241.376,80	-	CGDS
		P 2217 - Ação 4640						**765.000,00**	**560.737,29**	**73%**	

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, PROGRAMAÇÃO DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
38	CGDS/2020008	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de unidades piloto de aproveitamento bioenergético e fotovoltaico para apoio ao desenvolvimento de empreendimentos agroindustrial de médio e pequeno porte	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R$ 550.000,00	R$ 550.000,00	100%	CGDS
39	CGDS/2020009	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de sistemas de tratamento e reuso de águas cinzas domiciliares em atividades produtivas no semiárido piauiense.	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R$ 476.011,69	R$ 0,00	0%	CGDS
40	CGDS/2020013	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de Desenvolvimento e aceleração de empreendimentos rurais no Semiárido Brasileiro Pós Pandemia de Covid-19.	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação e 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 465.839,00	R$ 465.839,00	100%	CGDS
41	CGEP/2020003 (ex PO 20)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em melhoramento genético e controle de pragas e doenças direcionados para fortalecimento da cultura da palma no Semiárido.	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R$ 479.849,09	R$ 211.365,09	-	CGEP
42	CGEP/2020004 (ex PO 21)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Diagnóstico Produtivo, Análises Zootécnicas, Aspectos Gerenciais e Propostas de Soluções para a Bovinocultura de Leite da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, Brasil	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R$ 298.932,28	R$ 218.511,98	-	CGEP
43	CGCP/2021001	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Projeto Cidades Inteligentes 4.0 - Campina Grande - Convênio com ABDI	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	8340-Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Em Andamento	R$ 1.998.021,94	R$ 0,00	0%	CGCP
				P 2217 - Ação 8340				**4.268.654,00**	**1.445.716,07**	**34%**	
44	CGDS/2020007 (ex PO 8)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Montagem de Plataforma Digital, constituída de 1 (um) Centro de Processamento de Dados Avançados (Datacenter) e 2 (dois) laboratórios móveis para desenvolvimento de soluções em computação em nuvem.	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R$ 649.777,57	R$ 0,00	-	CGDS
45	CGDS/2020011	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas do Nordeste atraves da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R$ 1.264.680,00	R$ 0,00	0%	CGDS
46	CGDS/2020012	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da rede de inovação de polos da Rota do Cordeiro no Nordeste brasileiro por meio da inovação tecnológica	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R$ 426.466,90	R$ 426.466,90	100%	CGDS
				P 2217 - Ação 214S				**2.340.924,47**	**426.466,90**	**18%**	
				Total do Programa 2217				**5.972.455.386,65**	**4.476.020.819,42**	**75%**	
47	COCIC/2021001 (ex PO 51 e 52)	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.2019	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	-	COCIC
48	CPTCE/2021001	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CPTCE

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, PROGRAMAÇÃO DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
49	CGGP/2018001 (ex PO 54)	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R$ 25.000,00	R$ 9.414,51	38%	CGGP
50	CGGP/2020001 (ex PO 55)	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Indicadores de Gestão de Pessoas	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R$ 50.000,00	R$ 10.800,00	22%	CGGP
P 2111 - Ação 2000								**75.000,00**	**20.214,51**	**27%**	
Total do Programa 2111								**75.000,00**	**20.214,51**	**27%**	
51	CGEP/2019001 (ex PO 13)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5 Fortalecer as administrações públicas	Avaliação Qualidade dos Gastos Municipais (gestão fiscal)	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGEP
52	CGEP/2019002 (ex PO 14)	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o Semiárido	Desenvolvimento de Máquina Colheitadeira de Palma	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGEP
53	CGEP/2019004 (ex PO 16)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Rede de Poços e Barragens	Ação Interna	Ação Interna	Cancelado	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGEP
54	CGEP/2020001 (ex PO 17)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras	Estudo de georeferenciamento das empresas incentivadas na área de atuação da Sudene (Redução de 75%).	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGEP
55	CGEP/2020002 (ex PO 19)	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.1 - Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis	IDEB como instrumento direcionador regional das Políticas Públicas da Educação	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGEP
56	CGEP/2020006 (ex PO 23)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	INOVA + NE: Edital de subvenção econômica para inovação com o recurso correspondentes a 1,5% calculado sobre o produto do retorno	Ação Interna	Ação Interna	Cancelado	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGEP
57	CGEP/2020007 (ex PO 24)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pesquisa de opinião sobre os efeitos decorrentes da Pandemia Covid-19 na área de atuação da Sudene - Processo nº 59336.000790/2020-36	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R$ 349.500,00	R$ 349.500,00	-	CGEP
58	CGEP/2020008 (ex PO 28)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE.	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGEP
59	CGEP/2021001 (ex PO 2019003)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Redelimitação do Semiárido	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGEP
60	CGCP/2020002 (ex PO 32)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Acordo de Cooperação Técnica com instituições financeiras.	Ação não orçamentária	Ação não orçamentária	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGCP
61	CGDF/2021001	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a acaptação de investimento, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE 2021	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGDF
		Total das Ações Internas/ Não se aplicam						**349.500,00**	**349.500,00**	**0%**	
		TOTAL GERAL						**5.972.879.886,65**	**4.476.390.533,93**	**74,9%**	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e Coordenação-Geral de Gestão Institucional
Referência dos dados: 3º Ciclo 2021
Posição: Setembro/2021

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, PROGRAMAÇÃO DO PPA

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
1	CGDS/2012001 (ex PO)	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Paralisado	R$ 530.482,50	R$ 530.482,50	100%	CGDS
2	CGDS/2014001 (ex PO 3)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinicultura Leitiera no Semiárido Paraibano	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	20N7 - Provimento de Infraestrutura produtiva para arranjos produtivos locais - Plano Brasil Sem Miséria	Em Andamento	R$ 343.585,70	R$ 343.585,70	100%	CGDS
3	CGDS/2015001 (ex PO 4)	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.3. Promover a sustentabilidade ambiental	Atualização e complementação do diagnóstico do Macrozoneamento Ecológico-Econômico da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	Atrasado	R$ 459.000,00	R$ 459.000,00	100%	CGDS
4	CGDS/2020005 (ex PO 6)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de Capacitação para Consolidaçãode de Novas Tecnologias de Computação (Nuvem)	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R$ 425.000,00	R$ 319.360,49	-	CGDS
5	CGDS/2020006 (ex PO 7)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas pernambucanas atraves da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade	Em Andamento	R$ 340.000,00	R$ 241.376,80	-	CGDS
6	CGDS/2020007 (ex PO 8)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Montagem de Plataforma Digital, constituída de 1 (um) Centro de Processamento de Dados Avançados (Datacenter) e 2 (dois) laboratórios móveis para desenvolvimento de soluções em computação em nuvem.	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R$ 649.777,57	R$ 0,00	-	CGDS
7	CGDS/2020008	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de unidades piloto de aproveitamento bioenergético e fotovoltaico para apoio ao desenvolvimento de empreendimentos agroindustrial de médio e pequeno porte	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R$ 550.000,00	R$ 550.000,00	100%	CGDS
8	CGDS/2020009	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de sistemas de tratamento e reuso de águas cinzas domiciliares em atividades produtivas no semiárido piauiense.	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R$ 476.011,69	R$ 0,00	0%	CGDS
9	CGDS/2020010	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Formação em Saúde Digital para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE)	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Em Andamento	R$ 969.572,00	R$ 969.572,00	100%	CGDS
10	CGDS/2020006 (ex PO 7)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas do Nordeste atraves da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R$ 1.264.680,00	R$ 0,00	0%	CGDS
11	CGDS/2020012	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Fortalecimento da rede de inovação de polos da Rota do Cordeiro no Nordeste brasileiro por meio da inovação tecnológica	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional	Em Andamento	R$ 426.466,90	R$ 426.466,90	100%	CGDS
12	CGDS/2020013	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Programa de Desenvolvimento e aceleração de empreendimentos rurais no Semiárido Brasileiro Pós Pandemia de Covid-19.	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação e 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 465.839,00	R$ 465.839,00	100%	CGDS
TOTAL CGDS/DPLAN								**6.900.415,36**	**4.305.683,39**	**62%**	
13	COCIC/2021001 (ex PO 51 e 52)	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.2019	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	-	COCIC
TOTAL COCIC/DPLAN								**0,00**	**0,00**	**-**	

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
14	CGEP/2019001 (ex PO 13)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5 Fortalecer as administrações públicas	Avaliação Qualidade dos Gastos Municipais (gestão fiscal)	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGEP
15	CGEP/2019002 (ex PO 14)	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Viabilizar soluções inovadoras e sustentáveis para o Semiárido	Desenvolvimento de Máquina Colheitadeira de Palma	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGEP
16	CGEP/2019004 (ex PO 16)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Rede de Poços e Barragens	Ação Interna	Ação Interna	Cancelado	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGEP
17	CGEP/2019005 (ex PO 18)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos	Metodologia de acompanhamento do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Paralisado	R$ 1.481.361,00	R$ 120.403,17	8%	CGEP
18	CGEP/2020001 (ex PO 17)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Estudo de georeferenciamento das empresas incentivadas na área de atuação da Sudene (Redução de 75%).	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGEP
19	CGEP/2020002 (ex PO 19)	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.1 - Estimular a melhoria da qualidade da educação formal em todos os níveis	IDEB como instrumento direcionador regional das Políticas Públicas da Educação	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGEP
20	CGEP/2020003 (ex PO 20)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em melhoramento genético e controle de pragas e doenças direcionados para fortalecimento da cultura da palma no Semiárido.	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R$ 479.849,09	R$ 211.365,09	-	CGEP
21	CGEP/2020004 (ex PO 21)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Diagnóstico Produtivo, Análises Zootécnicas, Aspectos Gerenciais e Propostas de Soluções para a Bovinocultura de Leite da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, Brasil	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	Ação 8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R$ 298.932,28	R$ 218.511,98	-	CGEP
22	CGEP/2020006 (ex PO 23)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	INOVA + NE: Edital de subvenção econômica para inovação com o recurso correspondentes a 1,5% calculado sobre o produto do retorno das operações de financiamentos concedidos pelo FNDE	Ação Interna	Ação Interna	Cancelado	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGEP
23	CGEP/2020007 (ex PO 24)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pesquisa de opinião sobre os efeitos decorrentes da Pandemia Covid-19 na área de atuação da Sudene - Processo nº 59336.000790/2020-36	Ação Interna	Ação Interna	Concluído	R$ 349.500,00	R$ 349.500,00	-	CGEP
24	CGEP/2020010 (ex PO 30)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a captação de investimentos, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos, incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE.	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGEP
25	CGEP/2020009 (ex PO 29)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Efeitos do Programa Cisternas 1ª água sobre indicadores de mercado de trabalho e saúde dos beneficiados.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R$ 384.000,00	R$ 384.000,00	100%	CGEP
26	CGEP/2020010 (ex PO 30)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Avaliação de Políticas Públicas: impacto da cota-parte municipal do ICMS na educação; educação infantil: oferta, demanda e medidas de qualidade; e, Nordeste Pacífico.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R$ 480.600,00	R$ 480.600,00	100%	CGEP
27	CGEP/2021001 (ex PO 2019003)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.4. Inserir a abordagem regional nas políticas nacionais, particularmente em relação ao semiárido	Redelimitação do Semiárido	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGEP
TOTAL CGEP/DPLAN								**3.474.242,37**	**1.764.380,24**	**51%**	

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
28	CGCP/2020001 (ex PO 31)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Revisão do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Em Andamento	R$ 1.644.040,39	R$ 905.055,23	55%	CGCP
29	CGCP/2020002 (ex PO 32)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Acordo de Cooperação Técnica com instituições financeiras.	Ação não orçamentária	Ação não orçamentária	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGCP
30	CGCP/2020003 (ex PO 33)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Articulação do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Concluído	R$ 889.987,96	R$ 889.987,96	100%	CGCP
31	CGCP/2021001	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Projeto Cidades Inteligentes 4.0 - Campina Grande - Convênio com ABDI	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	8340-Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Em Andamento	R$ 1.998.021,94	R$ 0,00	0%	CGCP
32	CGCP/2021002	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Promover a sustentabilidade Ambiental	Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos dos 31 municípios do semiárido mineiro do CODANORTE	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ -Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	Em Andamento	R$ 725.810,00	R$ 0,00	0%	CGCP
33	CGCP/2021004	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Promover a sustentabilidade Ambiental	Plano de Desenvolvimento Sustentável de Guarabira-PB	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ -Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	Em Andamento	R$ 481.189,57	R$ 0,00	0%	CGCP
34	CGCP/2021005	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Promover a sustentabilidade Ambiental	Estudo de Vocações e Potencialidades para o estado da Paraíba	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ -Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	Em Andamento	R$ 750.000,00	R$ 0,00	0%	CGCP
35	CGCP/2021006	2. Universalizar o acesso a ativos estratégicos	2.2. Promover a sustentabilidade Ambiental	Elaboração de um Estudo de Complexidade Econômica, um Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio São Francisco e área de influência do Projeto de Integração do São Francisco (PISF) e elaboração de um Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio Parnaíba	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ -Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial e Irrigação	Em Andamento	R$ 893.809,13	R$ 201.107,06	23%	CGCP
TOTAL CGCP/DPLAN								**7.382.858,99**	**1.996.150,25**	**27%**	
TOTAL DPLAN								**17.757.516,72**	**8.066.213,88**	**45%**	
36	CGDF/2008001 (ex PO 34)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Transnordestina Logística S/A - TLSA	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Paralisado	R$ 3.876.491.700,00	R$ 3.065.105.668,00	79%	CGDF
37	CGDF/2008002 (ex PO 35)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R$ 61.728.156,00	R$ 61.728.156,00	100%	CGDF
38	CGDF/2011001 (ex PO 36)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R$ 59.700.000,00	R$ 59.700.000,00	100%	CGDF
39	CGDF/2011002 (ex PO 37)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R$ 54.900.000,00	R$ 54.900.000,00	100%	CGDF
40	CGDF/2011003 (ex PO 38)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Atrasado	R$ 50.000.000,00	R$ 50.000.000,00	100%	CGDF

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
41	CGDF/2012002 (ex PO 40)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Natulab Laboratório S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R$ 19.539.983,88	R$ 19.539.983,88	100%	CGDF
42	CGDF/2012003 (ex PO 41)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Deten Química S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R$ 31.256.000,00	R$ 31.256.000,00	100%	CGDF
43	CGDF/2012004 (ex PO 42)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Braskem S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R$ 50.000.000,00	R$ 50.000.000,00	100%	CGDF
44	CGDF/2014001 (ex PO 43)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A.)	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 415.582.562,52	R$ 398.008.422,34	96%	CGDF
45	CGDF/2015001 (ex PO 44)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Tiberina Automotive PE - Componentes Metálicos para Indústria Automotiva Ltda.	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R$ 39.800.940,00	R$ 39.800.940,00	100%	CGDF
46	CGDF/2016001 (ex PO 45)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Brametal S.A	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	R$ 4.095.556,81	R$ 4.095.556,81	100%	CGDF
47	CGDF/2019001 (ex PO 48)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Vila Piauí 1 Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	85.228.754,84	85.228.132,65	100%	CGDF
48	CGDF/2019002 (ex PO 49)	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Vila Piauí 2 Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Concluído	85.228.754,84	83.252.534,84	98%	CGDF
49	CGDF/2020002	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Ventos de São Fernando IV Energia S/A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 228.672.439,20	R$ 228.672.439,20	100%	CGDF
50	CGDF/2020003	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Central Eólica Boqueirão I S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 113.680.904,39	R$ 0,00	0%	CGDF
51	CGDF/2020004	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Central Eólica Boqueirão II S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 102.312.813,95	R$ 0,00	0%	CGDF
52	CGDF/2020005	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Vila Espírito Santo I Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 103.459.637,40	R$ 89.903.691,48	87%	CGDF

RELAÇÃO DE PROJETOS DO 3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021, SEGUNDO UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SUDENE

Nº de Ordem	Nº PO	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
53	CGDF/2020006	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Vila Espírito Santo II Empreendimentos e Participações S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 90.858.400,56	R$ 66.829.110,95	74%	CGDF
54	CGDF/2020007	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Vila Alagoas II Empreendimentos e Participações S.A	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 55.786.889,22	R$ 15.891.285,35	28%	CGDF
55	CGDF/2021001	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.3 Ampliar a acaptação de investimento, maximizando a aplicação dos recursos dos fundos e incentivos fiscais e a alavancagem de outras fontes	Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE 2021	Ação Interna	Ação Interna	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGDF
56	CGDF/2021002	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Eólica Canudos II SPE S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 183.361.938,16	R$ 35.444.673,28	-	CGDF
57	CGDF/2021003	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	Eólica Canudos III SPE S.A.	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 183.361.938,16	R$ 28.947.510,76	-	CGDF
58	CGDF/2021004	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1 Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores.	BORBOREMA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	Em Andamento	R$ 60.000.000,00	R$ 0,00	-	CGDF
TOTAL CGDF/DFIN								**5.955.047.369,93**	**4.468.304.105,54**	**75%**	
TOTAL DFIN								**5.955.047.369,93**	**4.468.304.105,54**	**75%**	
59	CPTCE/2021001	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CPTCE
TOTAL CPTCE/DAD								**0,00**	**0,00**	**0%**	
60	CGGP/2018001 (ex PO 54)	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R$ 25.000,00	R$ 9.414,51	38%	CGGP
61	CGGP/2020001 (ex PO 55)	3. Promover a excelência técnica e a qualidade da gestão na SUDENE	3.1 Modernizar a gestão e promover a valorização dos servidores e a capacitação por competências	Indicadores de Gestão de Pessoas	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	Em Andamento	R$ 50.000,00	R$ 10.800,00	22%	CGGP
TOTAL CGGP/DAD								**75.000,00**	**20.214,51**	**27%**	
TOTAL DAD								**75.000,00**	**20.214,51**	**27%**	
TOTAL GERAL								**5.972.879.886,65**	**4.476.390.533,93**	**74,9%**	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional.

Referência dos dados: 3º Ciclo 2021

Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, caso do FDNE, correspondem a mais de um exercício.

Posição:Setembro/2021

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento

3º ciclo 2021

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**CGEP/2018001 (Ex PO 4)**
Objetivo estrátegico:	**1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva**	**Ano:**	**2018**

Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	Superar as desigualdades regionais e erradicar a miséria
Ação:	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	**Objetivo estrátegico (MDR):**	Fortalecer cadeias e APL, articulando-os a investimentos estruturadores nas regiões de menor dinamismo econômico e social.
Finalidade da ação:	Provimento de infraestruturas para o desenvolvimento das atividades produtivas em suas múltiplas escalas, por meio da resolução de gargalos nos processos produtivos em todas as instâncias, podendo sê-las produtivas, de beneficiamento ou ainda de inserção mercadológica, perfazendo assim, o apoio a toda cadeia de valor e promovendo sua dinamização, inclusive com implantação de estruturas físicas para produção, beneficiamento, comercialização e de apoio logístico além de aquisição de equipamentos materiais e insumos, bem como a promoção de capacitações, intercâmbio de produtores, eventos técnicos e de comercialização, e fomento ao associativismo e cooperativismos como opção de organização social e produtiva. Atua-se principalmente, nas Rotas de Integração Nacional que são redes de Arranjos Produtivos Locais - APLs e apresentam simultaneamente uma dimensão territorial e setorial em sua concepção: o recorte territorial define o espaço comum a ser trabalhado e o modelo de governança adotado, enquanto o recorte setorial sinaliza o conteúdo das ações a serem definidas e trabalhadas de modo integrado e cooperativo.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Marcos Falcão Gonçalves
Problema (causa):	Na Bahia, a agricultura de base familiar representa 87% dos estabelecimentos agropecuários e concentra 81% do pessoal ocupado neste setor no estado. No semiárido baiano, notadamente no Território de identidade Portal do Sertão (constituído por 17 municípios), o referido setor caracteriza-se pelos baixos níveis tecnológico, de qualificação, de organização e de inserção no mercado. Ademais, é notória a falta de comprovação de que seus produtos atendem aos padrões sanitários e de qualidade.		
Projeto:	**Fortalecer as agroindústrias familiares nos muncípios do Consórcio Portal do Sertão, através da monitorização dos seus produtos alimentícios.**		
Objetivo do projeto:	Realizar análises microbiológicas de alimentos da agroindústria familiar para verificar o atendimento aos padrões da legislação, bem como dar assistência aos produtores rurais para conseguirem obter a qualificação dos seus produtos, por meio de ações integradas de assistência técnica e capacitação.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no	Valor Total do Projeto
	280	GND 3 e 4	90	199.399,80	199.899,80
Processo SEI	59335.000222/2018-21				

Previsão de Conclusão:	31/12/2022	**Proposta SICONV 052519/2018**	**Nível Siconv IV**
Data Atualização:	30/09/2021	**Pré Convênio nº 875549/2018**	

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto		
	Concedente	Marcus Paz; Marcelo Saiki
	Convenente	Elisa Teshima

Ata 304ª Diretoria Colegiada 2018

Cronograma de Desembolso (R$ 1,00)			
MÊS	**CONCEDENTE**	**CONVENENTE**	**TOTAL**
ABR/2019	**106.536,26**	500,00	107.036,26
Diárias	**1.062,00**		**1.062,00**
FEV/2020	**90.385,54**		90.385,54
Diárias	**1.416,00**		**1.416,00**
TOTAL	**199.399,80**	**500,00**	**199.899,80**

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	199.399,80
Orçamento (LOA+Crédito) no ex	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								**20,0%**	**Concluído**		
1	**Seleção de proposta**	Seleção de proposta para a Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	CGEP/SUDENE	13/06/2018	29/06/2018		13/06/2018	06/07/2018		100,0%	**Concluído**		
1.1	**Disponibilização do Programa no SICONV**	Lançamento do Programa Fortalecimento da Agroindústria e atividades complementares - Código SICONV Nº 5320320180019	CGEP/SUDENE	08/06/2018	15/06/2018		08/06/2018	15/06/2018		100,0%	**Concluído**		
1.2	**Análise de propostas**	Análise de propostas, com possíveis indicações de ajustes.	CGEP/SUDENE	18/06/2018	22/06/2018		18/06/2018	06/07/2018		100,0%	**Concluído**	Apenas uma proposta foi encaminhada à Sudene	
1.2.1	**Aprovação dos Ajustes/Complementação**	Análise dos ajustes/complementação	CGEP/SUDENE	26/06/2018	28/06/2018		25/06/2018	06/07/2018		100,0%	**Concluído**		
1.3	**Seleção da proposta**	Seleção da proposta mais adequada ao programa	CGEP/SUDENE	28/06/2018	29/06/2018		28/06/2018	06/07/2018		100,0%	**Concluído**		

1.4	**Aprovação da Diretoria Colegiada**	Aprovação da Diretoria Colegiada	CGEP/SUDENE	02/07/2018	02/07/2018		11/07/2018	11/07/2018		100,0%	**Concluído**	Proposta aprovada na 309ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da SUDENE, realizada em 11/07/2018. (Etapa antecipada por se tratar de aprovação da	
2	**Análise do Plano de trabalho**	Análise do projeto para verificação de sua aderência à legislação vigente, com possibilidade de solicitação de ajustes.	CGEP/SUDENE	02/07/2018	04/07/2018		06/07/2018	07/12/2018		100,0%	**Concluído**	Parecer técnico nº 8 (sei 0031601) e Parecer Técnico nº 80 (sei 0037665)	
2.1	**Análise do Termo de Referência**	Análise técnica referente à: documento apresentado que envolve aquisição de bens ou prestação de serviços, que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado da região onde será executado o objeto, a definição dos métodos e o prazo de execução do objeto	CGEP/SUDENE	02/07/2018	19/12/2018		02/07/2018	20/12/2018		100,0%	**Concluído**	Parecer Técnico nº 53/2018 (sei 0033947) e Parecer Técnico 108 (sei 0044316)	
3	**Envio à CCONT para formalização do convênio**	Procedimentos iniciais para a formalização do convênio	CGEP/SUDENE	06/08/2018	06/08/2018		11/12/2018	11/12/2018		100,0%	**Concluído**	Encaminhado à COCIC em 11/12/2018. O processo andará em paralelo com as duas coordenações -	
4	**Envio para apreciação da Procuradoria**	Apreciação da Procuradoria	PF /COCIC	19/12/2018	26/12/2018		26/12/2018	26/12/2018		100,0%	**Concluído**		
5	**Esclarecimentos sobre relatório Jurídico**		CGEP /COCIC	26/12/2018	26/12/2018		27/12/2018	27/12/2018		100,0%	**Concluído**	Parecer Técnico nº 135 (0047530)	
6	**Formalização do convênio**	Assinatura dos responsáveis legais	CGEP/SUDENE	31/12/2018	31/12/2018		28/12/2018	31/12/2018		100,0%	**Concluído**	CONVÊNIO SEI nº 0049175	
7	**Envio para procedimentos para a publicação do convênio.**	Publicação do convênio no DOU	CGEP/SUDENE	31/12/2018	31/12/2018		11/01/2019	11/01/2019		100,0%	**Concluído**	Publicação no DOU 11/01/2019	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								**2,0%**	**Atrasado**		
8	**Licitação**		UEFS	01/01/2019	01/04/2019		19/09/2019			50,0%	**Atrasado**	A Universidade iniciou vários processos para dispensa de licitação de todos os itens. Uma vez que estes processos foram sendo incluídos no Siconv de **setembro de 2019 até o mês de abril de 2020** e a liberação dos recursos é prevista pra ser efetuada em parcela única, a análise realizada a partir de maio rejeitou todos os processos por entender que o critério da contemporaneidade restou prejudicado. A UEFS reiniciou os procedimentos para tais procesos, não os concluindo até 30 de setembro de 2020. Em 29/10/2020, convenente solicitou prorrogação do prazo de vigência do convênio para até 31/12/2022,a qual foi analisada e tecnicamente aceita, uma vez que não havia motivos técnicos para negar o pedido. O Termo Aditivo foi assinado em 23/12/2020. A nova vigência é 31/12/2022	Acompanhamentos realizados (23/01/2019, 18/03/2019, 05/04/2019; 22/05/2019, 06/06/2019)
9	**Aceite do processo licitatório**		CGEP E COCIC	01/04/2019	16/04/2019					0,0%	**Atrasado**	Equipe técnica da CGEP aguarda término dos novos processos licitatórios para finalizar as análises e	

10	**Procedimentos para a liberação da 1ª parcela.**	Liberação da primeira parcela (está em análise a possibilidade de parcela única ou duas parcelas)	CGEP/SUDENE	16/04/2019	21/04/2019	R$ 106.536,26				0,0%	**Atrasado**	A liberação depende da finalização e aceite do processo licitatório. Foram realizadas consultas à PF/Sudene e à COCIC/CGEP a respeito da possibilidade de interrupção do Convênio pela não execução financeira. Em termos legais, não há razão para extinção do convênio. No entanto, a COCF alertou que os recursos, inscritos em Restos a Pagar não liquidados de 2018, serão cancelados caso não sejam liberados até dezembro de 2021.	
11	**Meta 1 _ Realizar análises microbiológicas de 100 produtos alimentícios da agroindústria familiar**		UEFS	01/04/2019	30/01/2020					0,0%	**Atrasado**	As datas das metas estão estimadas, poderá sofrer alteração a partir da data de formalização.	
12	**Etapa 1.1 _Aquisição de equipamentos e serviços de manutenção corretiva dos equipamentos.**		UEFS	26/04/2019	26/04/2019					0,0%	**Atrasado**		
13	**Etapa 1.2_ Aquisição dos meios de cultura e Realização das análises microbiológicas de acordo com a categoria de alimentos para os microorganismos especificados na legislação.**		UEFS	24/08/2019	30/01/2020					0,0%	**Atrasado**		
14	**Meta 2_ Realizar análises físico-químicas de 50 produtos alimentícios da agroindústria familiar**		UEFS	26/04/2019	30/01/2020					0,0%	**Atrasado**		
15	**Etapa 2.1. Aquisição de equipamentos e serviços de manutenção corretiva dos equipamento**		UEFS	26/04/2019	26/04/2019					0,0%	**Atrasado**		
16	**Etapa 2.2.Aquisição dos reagentes e realização das análises físico químicas necessária para verificar adequação aos PIQ (Padrão de Identidade e Qualidade) e obtenção da composição centesimal dos produtos e adequação/elaboração do valor nutricional do rótulo.**		UEFS	24/08/2019	30/01/2020					0,0%	**Atrasado**		
17	**1ª Prestação de contas parcial**	Análise e emissão de Parecer Técnico sobre relatório de execução parcial	CGEP/SUDENE	14/02/2020	29/02/2020					0,0%	**Atrasado**		
18	**Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório**	1ª Visita técnica de acompanhamento	CGEP/SUDENE	a combinar	a combinar	R$ 1.062,00				0,0%	**A Iniciar**	As datas da visita técnica serão acordadas entre as partes. O valor correspondente à essa meta é referente às diárias necessárias para a equipe técnica : 2 servidores x 3	
19	**Procedimentos para liberação da 2ª parcela**	Liberação da segunda parcela	CGEP/SUDENE	29/02/2020	15/03/2020	R$ 90.385,54				0,0%	**Atrasado**		

20	**Meta 3_ Realizar 15 cursos de capacitação em Boas Práticas de Manipulação.**		UEFS	15/03/2020	30/10/2020					0,0%	**Atrasado**	
21	**Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório**	2ª Visita técnica de acompanhamento	CGEP/SUDENE	a combinar	a combinar	R$ 1.416,00				0,0%	**A Iniciar**	As datas da visita técnica serão acordadas entre as partes a partir da assinatura do termo de convênio. O valor correspondente à essa meta é referente às diárias necessárias para a equipe
22	**2ª Prestação de contas parcial**	Análise e emissão de Parecer Técnico sobre relatório de execução parcial	CGEP/SUDENE	30/10/2020	30/11/2020					0,0%	**Atrasado**	
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								**0,0%**	**A Iniciar**	
23	**Prestação de Contas Final**		UEFS	30/11/2020	29/01/2021					0,0%	**Atrasado**	
24	**Análise da prestação de contas, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.**	Procedimento de análise dos elementos que comprovam, sob os aspectos técnicos, a execução integral do objeto e o alcance dos resultados previstos nos instrumentos	CGEP/SUDENE	29/01/2021	29/01/2022				--	0,0%	**A Iniciar**	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.
				Valor Previsto:		R$ 199.399,80	**Valor realizado:**		R$ 0,00	**22%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:

Universidade Estadual de Feira de Santana-BA (UEFS)

Observações:

Em 23/12/2020 foi assinado o primeiro Termo Aditivo prorrogando o prazo do convênio para 31/12/2022 (Doc SEI 0211007-pasta VII)

Em 31/12/2020 foi providenciado o desbloqueio de RAP conforme Nota de Lançamento 2020NL000089. (Doc SEI 0210816 - pasta VII)

Processo SEI nº 59335.000222/2018-21

Nota: Este convênio vem apresentando problema há algum tempo. Com o aviso da CGAF (e-mail de jul/21) sobre a possibilidade de cancelamento dos recursos em RAP não liquidados até dez/21 realizamos reunião interna dia 10/08, envolçvendo a COCF/CGAF, a COCIC/CGDS e a equipe da COTI para acharmos uma solução haja vista que o problema advinda da própria UEFS/BA em razão da dificuldade para cumprir o plano de trabalho que foi elaborado para a realização em lote, de uma séria de licitações. Outra reunião com a COCIC/CGDS se mostrou necessáriaaté como preparatória para reunião que queriamos fazer com a UEFS/BA. Em 01/09/2021 foi realizada essa reunião com a presença de representantes da UEFS, da CGAF/DAD/Sdene e nossa equipe para se discutir o destino deste convênio tendo em vista que caso os recursos não fossem utilizados até dez/2021 eles seriam cancelados (Restos a Pagar a Liquidar, de 2018). Até o momento a UEFS/BA não realizou processo de licitação completo para cumprir o que está no Plano de Trabalho. De acordo com a CGAF/DAD "a liquidação se refere a aquisição de bem, execução da obra e/ou realização do serviço respectivo. Os valores não liquidados e/ou liberados serão cancelados ao final do exercício (parágrafo 7º do artigo 67, Decreto Nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986)). Na reunião de 01/09/21 a UEFS/BA reconheceu a dificuldade de cumprir a agenda de licitações em razão das muitas demandas, porém levou o assunto para estudar e definir uma forma de viabilização ou o seu cancelamento.

Contatos: Profª Elisa Teshima (75)99134-8133 / Alan PPGPOS 75 3161-8256

Fonte: CGEP (Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

- 3º ciclo 2021

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**CGDS/2018001 (ex PO 6.1)**
		Ano:	**2018**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Processo (s) SEI:**	**59336.001679/2021-48**

Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	-
Ação do PPA:	**8340 - Rede Regional de Inovação**	**Objetivo estrátegico (MDR):**	-
Objetivo da ação:	Viabilizar condições para implantar estruturas produtivas baseadas na inovação, informação e conhecimento, propiciando melhoria nos processos produtivos, aumentos da competitividade, incorporação de tecnologias e inovação social e incremento tecnológico e inovativo para melhorias dos		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Baixa disponibilidade de informações atualizadas sobre os diversos segmentos envolvidos nos processos produtivos da Palma (cacto).		
Projeto:	**Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: Produtor.**		
Objetivo do projeto:	Disponibilizar as informações atualizadas sobre técnicas de produção, manejo e ultilização da palma (cacto) voltadas para produtores desta cultura.		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)**	**Valor Total do Projeto (R$ 1,00)**
	-	-	-	R$ -	R$ -

Ata 304ª Diretoria Colegiada 2018

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R$ -
A realizar no exercício	R$ -
Orçamento Aprov.no exercício (	R$ -
Valor Empenhado no Exercício	R$ -
Valor liberado no Exercício	R$ -
Saldo a liberar	R$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R$ -
Total Liberado até o exercício	R$ -

Previsão de Conclusão:	30/12/2021
Data Atualização:	**30/09/2021**

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia Assunção e Mauro Póvoas Souto- CODEM/CGDS

N.E.	**Nome da Etapa**	**Descrição das Atividades/ Etapas**	**Responsável**	**Previsto**			**Realizado**				**Status**	**Observação/Problemas**	**Providências**
				Início	**Fim**	**Valor**	**Início**	**Fim**	**Valor**	**Físico %**			
1	**Planejamento da Atualização da literatura sobre a cultura da palma.**	Mediante identificação, articulação e negociação da Rede Palma, que trabalharão a produção de publicações atualizadas sobre palma.	CGDS/DPLAN	04/09/2017	16/03/2018		04/09/2017	16/03/2018		**20%**	**Concluído**	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.	
1.1	**Reuniões Externas**	-		04/09/2017	16/03/2018	--	04/09/2017	16/03/2018	--	**100%**	**Concluído**	Nos encontros realizados com os parceiros, em particular, na I Reunião Técnica de Articulação da Rede Palma, foi levantada a necessidade de haver uma maior quantidade	
1.2	**Reuniões Internas (CGDS)**	-		04/09/2017	16/03/2018	--	04/09/2017	16/03/2018	--	**100%**	**Concluído**	Realização de reuniões da equipe técnica da CGDS/DPLAN para identificação de possíveis parceiros e publicações relativas à cultura da palma a	
2	**Articulações com Parceiros.**	-	CGDS/DPLAN							**40%**	**Concluído**	O percentual total de execução desta Meta é de 40%.	
2.1	Articulação com a Emparn	Contato por telefone.	--	17/03/2018	17/04/2018	--	17/03/2018	17/04/2018	--	100%	**Concluído**	Foi identificada a possibilidade de se ter duas publicações com a Emparn, uma relacionada aos registros do último Congresso Brasileiro de Palma, e uma outra seria a	

2.2	Articulação com o IPA.	Contato por telefone/ e-mail	--	20/08/2018	20/09/2018	--	20/08/2018	20/09/2018	--	100%	**Concluído**	Foi realizado contato com o IPA e agendada uma reunião presencial com as equipes técnicas da Sudene e IPA.	
2.2.1	Reunião Técnica com o IPA	Reunião na sede do IPA em Recife	--	12/09/2018	12/09/2018	--	12/09/2018	12/09/2018	--	100%	**Concluído**	O IPA expôs a possibilidade de fazer uma publicação inédita e, no momento, também foi montada a estrutura desta publicação, ficando como	
3	**Consulta e manifestação do parceiro quanto a possíveis publicações**	-	CGDS/DPLAN							**20%**	**Concluído**	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.	
3.1	Parceria com a Emparn		--	03/09/2018	31/10/2018	--	--	--	--	-	**Cancelado**	A articulação não prosperou no sentido da elaboração do documento/ publicação em conjunto.	
3.2	Parceria com o IPA.		--	03/09/2018	31/11/2019	--	10/09/2018	31/11/2019	--	100%	**Concluído**	Foi retomada a articulação com o IPA com o agendamento de reunião com a presença de gestores, pesquisadores e técnicos. Dela decorreram outros encontros até a apresentação de conteudo. Assim, com a elaboração do conteúdo técnico pelos autores/pesquisadores do IPA e da UFRPE, com as	
3.3	Sudene			01/10/2019	10/11/2019		01/10/2019	10/11/2019		100%	**Concluído**	Edição de 1.000 cartilhas, distribuição a agricultores e técnicos. Foi realizado o lançamento do Livreto	
4	**Relatório Técnico**		--	03/09/2018	29/05/2020	--	03/09/2018		--	**20%**	**Concluído**	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.	
4.1	Elaboração de Relatório Técnico descritivo da execução.			03/09/2018	29/05/2020	--	03/09/2018	22/10/2021	--	100%	**Concluído**	Relatório Técnico descritivo concluído, inserido no Processo SEI 59336.001679/2021-48, que trata do PO 6.1/2018 - CGDS Prioritários, do qual constam: cópia deste PO, o Relatório e cópia do produto, publicação (Livreto) "A palma forrageira no Nordeste do Brasil".	
				Valor Previsto:	R$ -		**Valor realizado:**		R$ -	**100%**	**Concluído**		

Parceiros institucionais:
(Emparn) IPA-PE (UFRPE).
Observações:

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado

	Paralisado

3º ciclo 2021

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**CGDS/2018002 (ex PO 6.2)**
		Ano:	**2018**
Objetivo estratégico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Processo (s) SEI:**	

Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	
Ação do PPA:	**8340 - Rede Regional de Inovação**	**Objetivo estratégico (MDR):**	
Objetivo da ação:	Viabilizar condições para implantar estruturas produtivas baseadas na inovação, informação e conhecimento, propiciando melhoria nos processos produtivos, aumentos da competitividade, incorporação de tecnologias e inovação social e incremento tecnológico e inovativo para melhorias dos		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Baixa disponibilidade de informações atualizadas sobre os diversos segmentos envolvidos nos processos produtivos da Palma (cacto).		
Projeto:	**Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: pesquisadores/academia.**		
Objetivo do projeto:	Disponibilizar as informações atualizadas sobre técnicas de produção, manejo e ultilização da palma (cacto) voltadas para pesquisadores/ academia.		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)**	**Valor Total do Projeto (R$ 1,00)**
	--	--	--	--	--

Previsão de Conclusão:	30/03/2018
Data Atualização:	**30/09/2021**

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Vera Lúcia, Mauro Souto, Victor Uchôa Silva (CODEM/CGDS)

Ata 304ª Diretoria Colegiada 2018

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento Aprov.no exercício (	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

N.E.	**Nome da Etapa**	**Descrição das Atividades/ Etapas**	**Responsável**	**Previsto**			**Realizado**				**Status**	**Observação/Problemas**	**Providências**
				Início	**Fim**	**Valor**	**Início**	**Fim**	**Valor**	**Físico %**			
1	**Planejamento da Atualização da literatura sobre a cultura da palma.**	Mediante identificação, articulação e negociação da Rede Palma, que trabalharão a produção de publicações atualizadas sobre palma.	CGDS/DPLAN	04/09/2017	16/03/2018		04/09/2017	16/03/2018		**20%**	**Concluído**	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.	
1.1	**Reuniões Externas**	-		04/09/2017	16/03/2018	--	04/09/2017	16/03/2018	--	**100%**	**Concluído**	Nos encontros realizados com os parceiros, em particular, na I Reunião Técnica de Articulação da Rede Palma, foi levantada a necessidade de haver uma maior quantidade	
1.2	**Reuniões Internas (CGDS)**	-		04/09/2017	16/03/2018	--	04/09/2017	16/03/2018	--	**100%**	**Concluído**	Realização de reuniões da equipe técnica da CGDS/DPLAN para identificação de possíveis parceiros e publicações relativas à cultura da palma a	
2	**Articulações com Parceiros.**	-	CGDS/DPLAN							**40%**	**Concluído**	O percentual total de execução desta Meta é de 40%.	
2.1	Articulacão com a Embrapa.	Contato por telefone.	--	19/03/2018	17/07/2018	--	19/03/2018	17/07/2018	--	100%	**Concluído**	Não foi possível firmar parceria com a Embrapa, devido aos entraves burocráticos seguidos por essa	

2.4	Articulação com a FAO.	--	--	20/08/2018	28/09/2018	--	28/0/2018	03/09/2018	--	100%	**Concluído**	Foi identificada a publicação "*Ecología del cultivo, manejo y usos do nopal*", produzida pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Esta publicação já existe nos idiomas inglês, francês e espanhol. Neste sentido, a articulação que a Sudene realizou junto à FAO foi no sentido de traduzir esta publicação para a língua portuguesa para que este seja mais um suporte à implementação da Rede Palma.	
2.4.1	Contatos iniciais/ articulação	Contatos telefônicos	--	28/08/2018	28/09/2018	--	28/08/2018	28/09/2018	--	100%	**Concluído**	Nesta ocasião foi realizado o agendamento de uma reunião técnica presencial, em Brasília/DF, bem como, para os desdobramentos adivindos desta reunião, como, por exemplo, a consulta à sede da FAO, em Roma, Itália, para autorização da tradução da publicação citada acima.	
2.4.2	Reunião Técnica	Reunião no escritório da FAO de Brasilia/DF	--	03/09/2018	03/09/2018	--	03/09/2018	03/09/2018	--	100%	**Concluído**	Reunião realizada com o Sr. Gustavo Chianca, assistente do representante da FAO no Brasil. Nesta ocasião, foram tratados os diversos aspectos envolvidos da parceria Sudene FAO: indicação da publicação da FAO que trata da cultura da palma; verificação da possibilidade de disponibilização da publicação.	
3	**Consulta e manifestação do parceiro quanto a possíveis publicações**	-	CGDS/DPLAN							**2%**	**Paralisado**	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.	Em função da prioridade apresentada pela elaboração do PRDNE, que demandou a cessão de técnicos desta CGDS/DPLAN para a Força Tarefa, foi necessário priorizar outras atividades já em andamento, como convênios e emendas, em detrimento de outras. Posteriormente, a priorização, conforme orientação superior, recaiu sobre a elaboração de cartilha para os produtores. No momento, **é necessário levar à apreciação da atual gestão se oportuno retomar as articulações com a FAO para verificar o interesse recíproco em realizar esta ação**. Aguardando definição da gestão quanto ao encaminhamento a ser dado a este projeto.
3.1	Parceria com Embrapa		--	--	--	--	--	--	--	--	**Cancelado**	Uma vez que a articulação com a Embrapa não prosperou, este item foi cancelado.	
3.4	Parceria com a FAO.		--	03/09/2018	31/10/2018	--	20/09/2018	--	--	10%	**Paralisado**	Na ocasião foram realizados alguns procedimentos burocráticos com a elaboração de uma minuta de Ofício a ser encaminhada a FAO.	
4	**Relatório Técnico**		CGDS/DPLAN	03/09/2018	30/03/2018	--	03/09/2018		--	**4%**	**Paralisado**	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.	
4.1	Elaboração de Relatório Técnico descritivo da execução.		--	01/08/2018	30/03/2018	--	03/09/2018	--	--	20%	**Paralisado**	Relatório Técnico descritivo teve sua elaboração iniciada, porém paralizada.	
				Valor Previsto:		R$ -	**Valor realizado:**		R$ -	**66%**	**Paralisado**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Embrapa; FAO.

Observações:

Tradução - Publicação FAO - Ecología del cultivo, manejo y usos do nopal.

Informação adicionada em outubro/2021 - Ação s ser tomada: abertura de processo no SEI para apreciação do Diretor de Planejamento sobre possíveis encaminhamentos, a fim de retomar o projeto.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

3º ciclo 2021

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**CGDS/2018003 (ex PO 6.4)**
		Ano:	**2018**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Processo (s) SEI:**	**59335.000292/2018-89**

Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	
Ação:	DESENVOLVIMENTO DA REDE REGIONAL DE INOVAÇÃO (8340) - REDE PALMA	**Objetivo estrátegico (MDR):**	
Finalidade da ação:	Difusão da inovação, por meio da incorporação de novos usos e produtos, propiciando inserção no mercado. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a propiciar condições para que se possa implantar na macrorregião uma estrutura produtiva baseada na inovação, informação e conhecimento.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulçao de Políticas	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Vulnerabilidade dos rebanhos com relação à segurança alimentar provocada pela variabilidade climática provocando reduções das precipitações pluviométricas nos últimos ansos, resultando em secas severas na região, tendo como consequência a perda de safras consecutivas e grande redução no quantitativo do rebanho bovino do Norte de Minas Gerais.		
Projeto:	**Sistema de produção de Palma forrageira e Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma) no semiárido mineiro.**		
Objetivo do projeto:	Desenvolver e apresentar soluções tecnológicas para o cultivo da Palma Forrageira no Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha; e estabelecer uma Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma), visando difundir a tecnologia da cultura da Palma Forrageira no semiárido mineiro contribuindo para o desenvolvimento sustentável da pecuária na região.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	280	GND 3	30	R$ 255.000,00	R$ 256.000,00

Cronograma de Desembolso			
MÊS	**CONCEDENTE**	**CONVENENTE**	**TOTAL**
mar/19	R$ 255.000,00	R$ 1.000,00	R$ 256.000,00
	R$ 255.000,00	**R$ 1.000,00**	**R$ 256.000,00**

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício RAP	R$	255.000,00
Orçamento (LOA+Crédito) no ex	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

Previsão de Conclusão:	24/12/2021	**CONVÊNIO Nº 878402/2018**
Data Atualização:	**30/09/2021**	**Vigência: 27/12/2018 a 25/12/2021**

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Mauro Póvoas e Vera Lúcia Assunção; EPAMIG/MG - Eliana Pires/ Laura de Sá

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇAO (Peso 20%)								**20,0%**	**Concluído**		
1	**Cadastramento e divulgação**	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	10/04/2018	15/05/2019	-	10/04/2018	15/05/2019	-	100%	**Concluído**		
2	**Recebimento de proposta**	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	16/05/2018	07/06/2018	-	16/05/2018	07/06/2018	-	100%	**Concluído**		
3	**Análise da proposta**	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	16/06/2018	16/06/2018	-	16/06/2018	16/06/2018	-	100%	**Concluído**		
4	**Complementação da proposta**	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	17/06/2018	12/12/2018	-	17/06/2018	12/12/2018	-	100%	**Concluído**		
5	**Emissão de parecer técnico final**	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	13/12/2018	13/12/2018	-	13/12/2018	13/12/2018	-	100%	**Concluído**		
6	**Aprovaçao do parecer técnico**	Aprovaçao do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	14/12/2018	26/12/2018	-	14/12/2018	26/12/2018	-	100%	**Concluído**		
7	**Formalização do Convênio**	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	27/12/2018	11/01/2019	-	27/12/2018	11/01/2019	-	100%	**Concluído**		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								**0,3%**	**Atrasado**		
	Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	EPAMIG/MG	31/12/2018	24/12/2021	--	17/12/2019	--	--	10%	**Em Andamento**	A Epamig está reformulando o processo de licitação para atender a legislação.	Reunião de acompanhamento, em 18/03/2021, entre coordenação e equipes técnicas, para verificar andamento da reformulação do processo licitatório (processos em elaboração).

8	**Liberação 1ª parcela (única)**	Liberação de recursos	CGDS/SUDENE	01/03/2019	31/03/2019	**R$ 255.000,00**	--	--	--	0%	**Atrasado**	A liberação da 1ª parcela ou parcela única dos recursos está condionada a realização do processo licitatório pela convenente e ao aceite do concedente (PI 424/2016). Só uma parte dos processos de execução foram concluídos e registrados. Esses, analisados demandaram medidas de ajuste da EPAMIG. A pandemia do Covid-19 e seus impactos sobre os preços dos insumos do projeto tem trazido grande dificuldade para a execução.	Reunião para entendimento, em 02/06/2021, sobre processos de licitação (EPI's, Ferramentas e Fertilizantes), considerando análise e orientações (Parecer 08/2020 - PF/SUDENE), quanto a liberação proporcional aos itens licitados/contratados. Informando também a necessidade de apresentar justificativas e submeter novos TR's, considerando ajustes/alterações da quantidade. A Epamig não apresentou o novo TR e justificativa, nem avançou nos processos de execução (licitações).
9	**Manejo da Fertilidade do solo com cobertura vegetal, adubação orgânica e química**	Manejo da Fertilidade do solo com cobertura vegetal, adubação orgânica e química, na produção de palma forrageira (Meta 1).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R$ 49.510,00	--	--	--	0%	**A Iniciar**		
9.1	**Instalação dos experimentos**	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 01)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R$ 18.250,00	--	--	--	0%	**Atrasado**		
9.2	**Condução dos Experimentos e Coleta de Dados**	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 01)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R$ 31.260,00	--	--	--	0%	**A Iniciar**		
10	**Multiplicação In Vitro de Palma Forrageira**	Multiplicação In Vitro de Palma Forrageira (Meta 2)	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R$ 48.890,00	--	--	--	0%	**A Iniciar**		

10.1	**Instalação dos experimentos**	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 02)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R$ 24.890,00	--	--	--	0%	**Atrasado**		
10.2	**Condução dos Experimentos e Coleta de Dados**	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 02)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R$ 24.000,00	--	--	--	0%	**A Iniciar**		
11	**Flutuação populacional e avaliação de métodos alternativos de controle de insetos**	Flutuação populacional e avaliação de métodos alternativos de controle de insetos que ocorrem na cultura da palma forrageira no semiário mineiro (Meta 3).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R$ 24.350,00	--	--	--	0%	**A Iniciar**		
11.1	**Instalação dos experimentos**	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 03)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R$ 18.350,00	--	--	--	0%	**Atrasado**		
11.2	**Condução dos Experimentos e Coleta de Dados**	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 03)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R$ 6.000,00	--	--	--	0%	**A Iniciar**		
12	**Manejo de doenças na cultura da palma em sistema orgânico para produção de frutos e forragem.**	Manejo de doenças na cultura da palma em sistema orgânico para produção de frutos e forragem (Meta 4).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R$ 40.600,00	--	--	--	0%	**A Iniciar**		
12.1	**Instalação e Condução dos Experimentos e Coleta de Dados**	Instalação e Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 01 - Meta 04).	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R$ 40.600,00	--	--	--	0%	**Atrasado**		
13	**Desenvolvimento da palma forrageira sob diferentes níveis de déficit hídrico**	Desenvolvimento da palma forrageira sob diferentes níveis de déficit hídrico (Meta 5).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R$ 29.900,00	--	--	--	0%	**A Iniciar**		
13.1	**Instalação dos experimentos**	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 05)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R$ 29.000,00	--	--	--	0%	**Atrasado**		
13.2	**Condução dos Experimentos e Coleta de Dados**	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 05)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R$ 900,00	--	--	--	0%	**A Iniciar**		
14	**Rede Mineira de seleção, multiplicação e distribuição de palma forrageira (REDEPALMA)**	Rede Mineira de seleção, multiplicação e distribuição de palma forrageira - REDEPALMA (Meta 6).	EPAMIG/MG	01/01/2019	25/12/2021	R$ 62.750,00	--	--	--	0%	**A Iniciar**		
14.1	**Instalação dos experimentos**	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 06)	EPAMIG/MG	01/01/2019	31/07/2019	R$ 34.050,00	--	--	--	0%	**Atrasado**		
14.2	**Condução dos Experimentos e Coleta de Dados**	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 06)	EPAMIG/MG	01/08/2019	25/12/2021	R$ 28.700,00	--	--	--	0%	**A Iniciar**		
15	**Visita Técnica de Acompanhamento**	Realização de visita técnica para acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	**A Iniciar**		
16	**Visita Técnica de Acompanhamento**	Realização de visita técnica para acompanhamento para elaboração do Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	**A Iniciar**		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								**0,0%**	**A iniciar**		
17	**Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.**	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	02/24/2022	24/04/2022	-			-	0%	**A Iniciar**		
					Valor Previsto:	R$ 255.000,00	**Valor realizado:**		R$ 0,00	**20%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

EPAMIG/MG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais.

Observações:

Considerando a não conclusão/avanço dos processos de licitação, condição para aceite e liberação dos recursos da 1ª parcela ou parcela única, e tendo em vista o disposto no Decreto .... que regulamenta os RAP, entende-se que a tendência é de cancelamento do empenho inscrito em RAP 2018 e a extinção do Convênio.

Informação adicionada em outubro/2021: projeto possivelmente será cancelado por falta de execução físico - financeira.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

3º ciclo 2021

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**CGDS/2018004 (ex PO 9.1)**
		Ano:	**2018**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Processo (s) SEI:**	

Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		
Ação:	**8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica**	**Objetivo estrátegico (MDR):**	I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismos econômico e social
Finalidade da ação:	Promoção de Infraestrutura Economica.		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Escassez Hídrica no Semiárido Nordestino: vulnerabilidade das famílias no semiárido nos aspectos produtivos, alimentar e nutricional, hídrico e ambiental		
Projeto:	BIOÁGUA FAMILIAR - convênio n.º 878341/2018		
Objetivo do projeto:	Implantar Sistemas Bioágua Familiar (SBF) de reúso da água cinza, para produção de alimentos e redução da contaminação ambiental (saneamento simplificado) nos quintais das famílias agricultoras em Caraúbas/RN.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	-	-	-	R$ 547.369,48	567.369,48

Previsão de Conclusão:	31/12/2023
Data Atualização:	30/09/2021

Ata 304, da Diretoria Colegiada 2018

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	547.369,48
Orçamento (LOA+Crédito) no ex	R$	-
Valor Empenhado no Exercício (	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	547.369,48
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto		
	Concedente:	Mauro Póvoas e Juliana Borges - CODEM/CGDS, Coordenação: Victor Uchôa
	Convenente:	Diego Linhares Silva - Prefeitura de Caraúbas/RN

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1		**CONTRATAÇÃO (Peso 20%)**								**15%**	**Em Andamento**		
1.1	**Assinatura do convênio**	Convênio firmado em 31/12/2018 com vigência até 20/09/2020.	Caraúbas/ Gabinete/ CGDS	15/10/2018	21/12/2018		08/10/2018	31/12/2018		100,0%	**Concluído**	As etapas de planejamento estão descritas no PO 07 Reúso de Águas - 1º ciclo prioritários 2019.	
1.2	**Liberação de Cláusula Suspensiva**	Convênio firmado com pendência no CAUC	Caraúbas/ CGDS	31/12/2018	31/03/2019		01/01/2019	Não informado		100,0%	**Concluído**		
1.3	**Processo licitatório**	Procedimentos administrativos referentes à licitação	Caraúbas	31/03/2019	01/07/2019		31/03/2019	21/08/2020		100,0%	**Concluído**	O processo licitatório foi concluído em 21/08/20. O atraso da licitação ocorreu pela necessidade de solicitar suspensão do edital para realizar ajustes e consulta à Procuradoria Federal junto à Sudene sobre a possibilidade de contratação de entidades da sociedade civil. A Procuradoria Sudene pronunciou-se de forma favorável por meio de parecer n. 205/2019/PF-	

1.4	**Análise e aceite da licitação**	Etapa prevista nos art. 41 e 42 da Portaria n.º 424/2016	Codem/ CGDS	01/07/2019	19/07/2019		31/08/2020	19/10/2020		100,0%	**Concluído**	19/10/2020, a Sudene realiza o aceite da licitação na Plataforma + Brasil.	
1.5	**Ajuste dos cronogramas físico e de desembolso**	Ajuste das etapas de execução do projeto	Caraúbas/ Codem	01/10/2020	30/11/2020		29/10/2020	03/02/2021		100,0%	**Concluído**	Realizada reunião de acompanhamento técnico por meio de videoconferência em 29/10/20. Convenente solicita em 6/11/2020 prorrogação da vigência do convênio. 2º Termo Aditivo assinado em 18/12/2020 e define que a visita técnica deverá ser realizada para liberação de 2ª parcela. Todas as datas do cronograma físico foram ajustadas para nova vigência do convênio: 31/12/2022. O cronograma de desembolso foi alterado de 3 para 2 parcelas, sendo a primeira alterada de R$ 99.673,80 para R$ 102.806,80	

1.6	**Ingresso de contrapartida**	Liberação dos recursos do convenente	Caraúbas	01/01/2021	30/09/2021	R$ 20.000,00	27/01/2021			33,0%	**Em Andamento**	1ª parcela no valor de R$ 1.387,00 paga pelo convenente em 27/01/2021. 2ª e 3ª parcelas previstas para fevereiro e setembro de 2021.	
1.8	**Liberação da 1ª parcela**	Verificação das exigências para solicitar liberação da 1ª parcela	CGDS/ COCF	01/02/2021	28/02/2021	R$ 102.896,80	01/02/2021			0,0%	**Paralisado**	Em 3/2/2021, a CODEM solicita liberação da primeira parcela tendo como base o Parecer nº 6/2021 - SEI/SUDENE que aprova os ajustes do plano de trabalho e afirma não haver impedimento técnico para o repasse.	Em 22/3/2021, por meio do Ofício nº 519/2021/COCIC, a Sudene oficializou o município a respeito do impedimento para recebimento da 1ª parcela do convênio por ter recursos transferidos do governo federal sem utilização há 180 dias (Art. 41º, da Portaria nº 424/ 2016). Em 19/10/21, o convenente continua impedido de receber recursos por registro no CAUC. Essa situação coloca em risco a continuidade do convênio por perda do empenho de recursos que são restos a pagar de 2018.
2		**Execução (Peso 60%)**								**0%**	**Paralisado**		
2.1	**Mobilização de 6 comunidades rurais**	Mobilização de 120 famílias de 6 comunidades rurais no município de Caraúbas.	Caraúbas	01/02/2021	28/02/2021					0,0%	**Paralisado**	Aguardando liberação da 1ª parcela.	
2.2	**Seleção de famílias a serem beneficiadas com o SBF**	Seleção de 42 famílias a serem beneficiadas com o SBF.	Caraúbas	01/02/2021	31/03/2021					0,0%	**Paralisado**	Aguardando liberação da 1ª parcela.	
2.3	**Capacitações**	Realização de 18 capacitações, sendo 3 em cada uma das 6 comunidades.	Caraúbas	01/04/2021	30/11/2021					0,0%	**A Iniciar**		
2.4	**Visita técnica**	Visita técnica para liberação de parcela	Codem	A definir	A definir					0,0%	**A Iniciar**	O Termo Aditivo do convênio alterou a previsão de visita técnica como condição para liberação da 2ª parcela, antes do início da instalação dos sistemas de reúso.	
2.5	**1ª Prestação de contas parciais**	Análise dos relatórios de execução da 1ª parcela	Caraúbas/ CGDS	01/10/2019	31/10/2019					0,0%	**Atrasado**	Em 22/3/2021, por meio do Ofício nº 519/2021/COCIC/CGDS/DPLAN/SUDENE, a Sudene oficializou o município a respeito do impedimento para recebimento da 1ª parcela do convênio por ter recursos transferidos do governo federal sem utilização há 180 dias sem movimentação (Art. 41º, § 15º da Portaria Interministerial	O impedimento para receber a 1ª parecela perciste, pois a prefeitura de Caraúbas apresenta pendência no CAUC.
2.6	**Liberação da 2ª parcela**	Verificação do cumprimento das exigências para liberação da 1ª parcela	CGDS/ COCF	01/09/2021	30/09/2021	444.472,52				0,0%	**Atrasado**		
2.7	**Implantação dos Sistemas Bioágua Familiar**	Implantação de 42 SBF em 6 comunidades.	Caraúbas	01/09/2021	31/07/2022					0,0%	**A Iniciar**		
2.8	**Articulação com controle social e avaliação do projeto**	Realização de 6 reuniões do comitê de controle social e avaliação do projeto, sendo uma reunião em cada uma das 6 comunidades.	Caraúbas	01/08/2022	31/08/2022					0,0%	**A Iniciar**		
2.9	**2ª Visita técnica**	Acompanhamento técnico da execução do projeto.	Codem	A definir	A definir					0,0%	**A Iniciar**		
2.10	**2ª Prestação de contas parciais**	Análise dos relatórios de execução da 2ª parcela	Caraúbas/ CGDS	01/09/2022	31/12/2022					0,0%	**A Iniciar**		
3		**Encerramento (peso 20%)**								**0%**	**A Iniciar**		
3.2	**Prestação de contas final**	Envio da prestação de contas pelo convenente	Caraúbas	01/01/2023	28/02/2023					0,0%	**A Iniciar**		

3.3	**Elaboração de Relatório Final**	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CODEM	01/01/2023	30/06/2023					0,0%	**A Iniciar**		
3.4	**Análise da prestação de contas financeiras**	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CGDS	01/07/2023	31/12/2023					0,0%	**A Iniciar**		
				Valor Previsto:		R$ 567.369,32	**Valor realizado:**		R$ 0,00	15%	**Paralisado**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

Prefeituras de Caraúbas

Observações:

Processo nº 59335.000298/2018-56 - Prefeitura de Caraúbas - convênio n.º 878341/2018 publicado no DOU em 16/01/19. Vigência de 31/12/2018 até 19/09/2020. Convênio sofreu aditivo de Ofício, conforme Decreto n.º 10.315/2020, em decorrência da pandemia e o término da nova vigência é 31/12/2020. 2º Termo de convênio prorroga para

Atas 303, 304 e 325 Diretoria Colegiada 2018 aprovando o projeto.

Informação adicionada em outubro/2021 - Sobre a situação "Paralisado" : Projeto que possui recursos em restos a pagar 2018 que precisa ser liquidado neste ano, sob pena de cancelamento.

Fonte: Coordenação de Desenvolvimento Territorial, Infraestrutura e Meio Ambiente - CODEM/CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

3º ciclo 2021

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**CGDS/2018005 (ex PO 9.2)**
		Ano:	**2018**
Objetivo estratégico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Processo (s) SEI:**	**59335.000278/2018-85**

Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		
Ação:	**8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica**	**Objetivo estratégico (MDR):**	I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismos econômico e social
Finalidade da ação:	Promoção de Infraestrutura Economica.		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Escassez Hídrica no Semiárido Nordestino: vulnerabilidade das famílias no semiárido nos aspectos produtivos, alimentar e nutricional, hídrico e ambiental		
Projeto:	FORTALECIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES INTEGRADOS AO REÚSO DE ÁGUAS CINZA DOMICILIARES EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NO TERRITÓRIO DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO		
Objetivo do projeto:	Implementação de modelos de sistemas de produção familiar integrado ao Bioágua, visando à sustentabilidade ambiental, segurança alimentar e nutricional de comunidades tradicionais no território do Sertão do São Francisco.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	-	-	-	R$ 339.517,00	R$ 339.517,00

Ata 304, da Diretoria Colegiada 2018

Previsão de Conclusão:	30/06/2022
Data Atualização:	30/09/2021

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto		
	CGDS/SUDENE:	Mauro Póvoas e Juliana Borges (CODEM/CGDS); Coordenação CODEM: Victor Uchôa
	EMBRAPA SEMIÁRIDO:	Roseli Freire de Melo, Anderson Ramos de Oliveira

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	302.767,00
A realizar no exercício	R$	23.700,00
Orçamento (LOA+Crédito) no e	R$	36.750,00
Valor Empenhado no Exercício	R$	36.750,00
Valor liberado no Exercício	R$	36.750,00
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	339.517,00

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1		**PLANEJAMENTO (Peso 20%)**								**20%**	**Concluído**		
1.1	**Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira**	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	27/05/2018	17/06/2018		27/05/2018	17/06/2018		100,0%	**Concluído**	Todas as etapas anteriores estão detalhadas no PO 7-CGDS-REUSO Águas (CGDS 1º ciclo 2019 - Prioritários)	
1.2	**Analise jurídica**	Análise e parecer juridico	PROCURADORIA	15/10/2018	31/10/2018		15/10/2018	31/10/2018		100,0%	**Concluído**		
1.3	**Elaboração da minuta do TED**	Elaboração do minuta do TED	CCONT	01/11/2018	15/11/2018		09/11/2018	04/12/2018		100,0%	**Concluído**	A minuta do TED precisou ser alterada devido a uma modificação na programação orçamentária da Sudene na disponibilização de recursos	Foi elaborada nova minuta de TED com alterações em alguns valores previstos no Plano de Trabalho
1.4	**Assinatura do TED**	Assinatura do TED	GABINETE / Embrapa	15/11/2018	31/12/2018		06/12/2018	06/12/2018		100,0%	**Concluído**		
1.5	**Publicação do TED**	Publicação do TED no DOU	GABINETE	15/11/2018	31/12/2018		07/12/2018	26/02/2019		100,0%	**Concluído**	O extrato do TED foi publicado originalmente em 07/12/2018, mas, em razão de ter sido publicado o TED com uma numeração equivocada, foi publicado	Termo de Apostilamento ao TED N.º 006/2018 - SUDENE/EMBRAPA-CPATSA e publicação de Extrato
2		**EXECUÇÃO (Peso 60%)**								**36%**	**Em Andamento**		
2.1	**Liberação da primeira parcela de recursos**	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	07/12/2018	31/12/2018	**R$ 90.000,00**	07/12/2018	13/02/2019	**R$ 90.000,00**	100,0%	**Concluído**		

2.2	**Meta 1: Mobilização e realização do diagnóstico participativo/cadastramento das famílias que serão beneficiadas**	Realização de oficinas de sensibilização; Aplicação de questionários aos beneficiários; Cadastramento das famílias beneficiárias nas comunidades.	Embrapa	01/11/2018	31/12/2018	R$ 8.800,00	19/02/2019	18/04/2019		100,0%	**Concluído**	Houve atraso na liberação da primeira parcela de recursos, o que gerou atraso na execução. Mesmo assim, a Embrapa realizou as ações com recursos de contrapartida	
2.3	**Meta 2: Caracterização Ambiental e análise da estrutura da paisagem nas duas comunidades**	Caracterização das comunidades quanto aos ao tipo de solos, vegetação e relevo; Tabulação e confecção de mapas; Prepara material para publicação.	Embrapa	01/01/2019	30/06/2021	R$ 20.275,00	13/02/2019		R$ 1.200,00	70,0%	**Em Andamento**	Etapa referente à preparação do material para publicação ainda será realizada.	
2.4	**Meta 3: Avaliação de pelo menos 8 sistemas de bioágua familiar com o uso de energia solar visando à sustentabilidade do sistema**	Instalação do kit de energia solar integrado ao sistema bioágua familiar.	Embrapa	01/03/2019	30/06/2021	R$ 19.410,00	13/02/2019		R$ 19.410,00	20,0%	**Em Andamento**		

2.5	**Meta 4: Definição de modelos (composição e dimensionamento) de sistemas de cultivo a partir da disponibilidade hídrica em cada propriedade**	Avaliação da quantidade de água disponível (fluxo de água) do sistema bioágua familiar para definição de modelos de sistema produtivo irrigação quanto a dimensionamento e composição (espécies de plantas).	Embrapa	01/01/2019	30/06/2021	R$ 4.973,00	01/09/2020			50,0%	**Em Andamento**	A instalação dos sistemas de irrigação foi iniciada, conforme mensagens, vídeo e fotos encaminhados em 29/9/20. Foi concluída na comunidade de Uauá - BA, segundo mensagem	
2.6	**Meta 5: Instalação de 22 sistemas bioágua familiar em área de produtor com reservatório e sistema de irrigação**	Realização de 02 oficinas de capacitação de construção da tecnologia; Instalação dos 20 sistemas bioágua familiar; Definição de pelo menos 4 modelos de sistema de produção; Realização de, no mínimo, 04 oficinas sobre gestão de águas, educação ambiental e cultivo produtivo; Seleção e implantação de 14 culturas (hortaliças, frutíferas e forrageiras) de forma participativa	Embrapa	01/02/2019	30/06/2021	R$ 188.081,86	13/02/2019		R$ 62.190,00	60,0%	**Em Andamento**	Em visita técnica de acompanhamento realizada em 18/11/19 à comunidade indígena Aticum, foi possível observar parte da meta concluída (incluindo compra de materiais). A instalação dos sistemas bioágua estavam previstos para serem concluídos no final de março, contudo, foram interrompidos por conta da pandemia. Contudo, nessa comunidade foram finalizados, incluindo o sistema de irrigação. Em 16/12/2020, conforme mensagem enviada pela Embrapa, foi iniciada a etapa	
2.7	**Meta 6: Implantação de 01 (um) sistema bioágua como unidade demonstrativa em área experimental na Embrapa Semiárido**	Instalação de 01 sistema bioágua familiar como unidade demonstrativa; Realização de no mínimo 08 dias de campo sobre o uso e manejo do bioágua familiar; Realização de no mínimo 06 cursos sobre instalação, manejo e segurança alimentar e nutricional, sustentabilidade ambiental no Semiárido	Embrapa	01/03/2019	30/06/2021	R$ 19.000,00	01/10/2019		R$ 7.200,00	50,0%	**Em Andamento**	Unidade demonstrativa apresentada no Semiárido Show no período de 19 a 22/11/19. As outras atividades da meta, como os cursos, ainda serão realizadas.	
2.8	**Meta 7: Avaliação de pelo menos 20 amostras de qualidade da água, solo e planta nos 23 sistemas bioágua familiar**	Avaliação da qualidade da água para análise física, química e microbiológica durante a execução do projeto; Monitoramento das características físicas, químicas e microbiológica do solo durante a execução do projeto; Avaliação da qualidade microbiológicas dos alimentos produzidos nos sistemas bioágua familiar	Embrapa	01/05/2019	30/06/2021	R$ 33.139,14				0,0%	**Atrasado**	Em decorrência da paralisação do projeto motivada pelo contexto de pandemia, o cronograma de execução deverá ser atualizado para nova vigência do projeto (31/12/2021).	
2.9	**Meta 8: Avaliação da integração de pelo menos 08 sistemas de bioágua (em área de agricultores familiares) com a criação de galinhas adaptadas localmente**	Seleção das 08 famílias aptas a integrar o **sistema bioágua com a criação de galinhas já** existente em sua propriedade	**Embrapa**	**01/01/2019**	**30/06/2021**	**R$ 1.196,00**				**0,0%**	**Atrasado**	Em decorrência da paralisação do projeto motivada pelo contexto de pandemia, o cronograma de execução deverá ser atualizado para nova vigência	
2.10	**Meta 9: Avaliação do Projeto**	Avaliação da contribuição do sistema bioágua na produtividade das culturas e eficiência hídrica; Avaliação da contribuição do sistema bioágua integrado na segurança alimentar e nutricional da família; Avaliação da contribuição do sistema bioágua integrado na sustentabilidade ambiental, por meio de indicadores da qualidade do solo e da água; Avaliação socioeconômica ex-ante e ex-post do impacto da tecnologia de reuso de água por meio do sistema familiar integrado a culturas alimentares para as famílias beneficiadas na renda das famílias; Publicações; Relatórios anuais	Embrapa	01/04/2019	30/06/2021	R$ 31.592,00				0,0%	**Atrasado**	Em decorrência da paralisação do projeto motivada pelo contexto de pandemia, o cronograma de execução deverá ser atualizado para nova vigência do projeto (31/12/2021).	
2.11	**1ª Prestação de contas parcial**	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	Embrapa/CGDS	01/01/2019	28/02/2019		02/05/2019	06/06/2019		100,0%	**Concluído**		

2.12	**Liberação da segunda parcela de recursos**	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/05/2019	30/06/2019	**R$ 212.767,00**	05/06/2019	21/06/2019	**R$ 212.767,00**	100,0%	**Concluído**	Liberação da 2ª parcela realizada em 21/06/19.	Em 26/12/19, foi devolvido o valor de R$ 47.674,65 que não foi possível executar em 2019 referente ao 2º repasse do TED.
2.13	**2ª Prestação de contas parcial**	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	Embrapa/CGDS	01/10/2019	30/11/2019		15/12/2019	19/05/2020		100,0%	**Concluído**	O relatório de execução da 2ª parcela foi finalizado pela Embrapa em 9/3/20 e aprovado em 19/5/20, a partir do parecer técnico n.º 129/2020, de 28/4/20. Em 16/6/2021, a Embrapa encaminhou relatório de	Em 12/12/19, Embrapa solicitou ajuste de PT, conforme Carta nº 146/2019-CPATSA/CHGE, que foi tecnicamente aprovada por meio do Parecer Técnico n.º 391/2019 - SEI/SUDENE em 19/12/19.
2.14	**Liberação da terceira parcela de recursos**	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	01/03/2020	01/04/2020	**R$ 23.700,00**	14/03/2020	09/09/2020	**R$ 36.750,00**	100,0%	**Concluído**	A 3ª parcela foi paga em 9/9/20, após consulta à COCF e Procuradoria sobre mudança de ação orçamentária e complementação de recursos.	Em 14/3/2020, a Embrapa solicitou complementação de recursos da 3ª parcela no valor de R$ 13.050,00, que foi aprovada em 21/5/20, a partir do parecer técnico n.º 132/2020, de 6/5/20.
2.15	**3ª Prestação de contas parcial**	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 3ª parcela	Embrapa/CGDS	30/06/2021	30/06/2022					0,0%	**A Iniciar**		
3		**PRESTAÇÃO DE CONTAS (peso 10%)**								**0,0%**	**A Iniciar**		
3.1	**Prestação de contas final**	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	Embrapa	30/06/2021	30/06/2022					0,0%	**A Iniciar**		
3.2	**Elaboração de Relatório Final**	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	30/06/2021	30/06/2022					0,0%	**A Iniciar**		
3.3	**Análise da prestação de contas financeiras**	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	30/06/2021	30/06/2022					0,0%	**A Iniciar**		
				Valor Previsto:		R$ 326.467,00	**Valor realizado:**		R$ 339.517,00	56%	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
Embrapa Semiárido
Observações:
Processo SEI n.º 59335.000278/2018-85 - TED Embrapa Semiárido
O projeto foi apresentado no 1º Webinar de Reúso de Água da Sudene promovido pela Codem/CGDS em 9/6/2020. O projeto foi prorrogado para 30/06/2021, conforme 2º Termo Aditivo assinado em 21/08/2020. O 3º Termo Aditivo ao TED Nº 006 /2018 – SUDENE/Embrapa Semiárido, foi firmado em 30/06/2021, prorrogando a sua vigência até 31/12/2021. Há necessidade de ajustar o seu Plano de Trabalho a nova data de vigência.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

3º ciclo 2021

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**CGDS/2019001 (ex PO 6.5)**
		Ano:	**2019**
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Processo (s) SEI:**	**59336.003213/2019-62**

Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	
Ação:	Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação (8340)	**Objetivo estrátegico (MDR):**	
Finalidade da ação:	Difusão da inovação, por meio da incorporação de novos usos e produtos, propiciando inserção no mercado. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a propiciar condições para que se possa implantar na macrorregião uma estrutura produtiva baseada na inovação, informação e conhecimento.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulçao de Políticas	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Vulnerabilidade dos rebanhos com relação à segurança alimentar provocada pela variabilidade climática provocando reduções das precipitações pluviométricas nos últimos ansos, resultando em secas severas na região, tendo como consequência a perda de safras consecutivas e grande redução no quantitativo do rebanho bovino do Norte de Minas Gerais.		
Projeto:	**Implantação de dois campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmim para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.**		
Objetivo do projeto:	Ampliar a oferta de mudas de palma resistentes à cochonilha do carmim, contribuindo sobremaneira para a sustentabilidade da atividade pecuária, sobretudo na agricultura familiar no semiárido.distribuição a agricultores do semiárido mineiro por meio do programa Rede Palma.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	280	GND 3	30	R$ 206.730,00	R$ 207.730,00

Cronograma de Desembolso			
MÊS	**CONCEDENTE**	**CONVENENTE**	**TOTAL**
mar/19	R$ 206.730,00	R$ 1.000,00	R$ 207.730,00
	R$ 206.730,00	**R$ 1.000,00**	**R$ 207.730,00**

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício RAP	R$	206.730,00
Orçamento (LOA+Crédito) no e	R$	-
Valor Empenhado no Exercício	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

Previsão de Conclusão:	31/12/2022	**CONVÊNIO Nº 892981/2019**
Data Atualização:	**30/09/2021**	**Vigência: 31/12/2019 a 31/12/2022**

Res. DC nº 281/2017

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	SUDENE - Mauro Póvoas e Vera Lúcia Assunção; EPAMIG/MG - Eliana Pires/ Laura de Sá

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								**20,0%**	**Concluído**		
1	**Cadastramento e divulgação**	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	06/12/2019	11/12/2019	-	06/12/2019	11/12/2019	-	100%	**Concluído**		
2	**Recebimento de proposta**	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	06/12/2019	11/12/2019	-	06/12/2019	11/12/2019	-	100%	**Concluído**		
3	**Análise da proposta**	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	13/12/2019	31/12/2019	-	13/12/2019	31/12/2019	-	100%	**Concluído**		
4	**Complementação da proposta**	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	13/12/2019	31/12/2019	-	13/12/2019	31/12/2019	-	100%	**Concluído**		
5	**Emissão de parecer técnico final**	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	13/12/2019	31/12/2019	-	30/12/2019	30/12/2019	-	100%	**Concluído**		
6	**Aprovaçao do parecer técnico**	Aprovaçao do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	13/12/2019	31/12/2019	-	31/12/2019	31/12/2019	-	100%	**Concluído**		
7	**Formalização do Convênio**	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	13/12/2019	31/12/2019	-	31/12/2019	31/12/2019	-	100%	**Concluído**		
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								**0,8%**	**Atrasado**		
	Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	EPAMIG/MG	01/02/2020	31/01/2022	--	04/04/2021	--	--	10%	**Atrasado**	A Convenente atendeu a todas as condições da Cláusula Suspensiva e iniciou os procedimentos licitatórios. Até 30/06/2021 foram apresentados / registrados 3 processos de execução (aquisição de: EPI's, Ferramentas e Fertilizantes), uma pequena parte do todo.	Reunião de acompanhamento, em 18/03/2021, entre coordenação e equipes técnicas, para verificar andamento. Processos em elaboração (2018, 2019, 2020).

8	**Liberação 1ª parcela**	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	02/01/2020	31/05/2020	R$ 163.000,00	--	--	--	0%	**Atrasado**	A liberação dos recursos da 1ª parcela está condicionada a realização do processo licitátorio pela convenente e o aceite pela concedente. Até 30/06/2021,só uma parte dos processos de execução foram registrados (aquisição de: EPI's, Ferramentas,Fertilizantes) . Esses, analisados demandaram medidas da EPAMIG. A pandemia do Covid-19 e seus impactos sobre os preços dos insumos do projeto tem trazido grande dificuldade para a execução	Reunião para entendimento, em 02/06/2021, sobre processos de licitação (EPI's, Ferramentas e Fertilizantes), considerando análise e orientações (Parecer 08/2020 - PF/SUDENE), quanto a liberação proporcional aos itens licitados/contratados. Informando também a necessidade de apresentar justificativas e submeter novos TR's, considerando ajustes/alterações propostas. A Epamig não apresentou o novo TR e a justificativa. Até a data de atualização, não foram identificados avanços nos processos de licitação
9	**Liberação 2ª parcela**	Liberação 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	01/12/2020	31/12/2020	R$ 43.730,00	--	--	--	0%	**Atrasado**		
10	**Implantação dos campos de multiplicação**	Implantação dos campos de multiplicação (Meta 1).	EPAMIG/MG	02/01/2020	31/12/2022	R$ 102.180,63	--	--	--	0%	**A Iniciar**		
11	**Manutenção dos campos de produção (Meta 2).**	Manutenção dos campos de produção (Meta 2).	EPAMIG/MG	02/01/2020	31/12/2022	R$ 56.453,84	--	--	--	0%	**A Iniciar**		
12	**Distribuição de mudas aos agricultores.**	Distribuição de mudas aos agricultores (Meta 3).	EPAMIG/MG	02/01/2020	31/12/2022	R$ 33.160,29	--	--	--	0%	**A Iniciar**		
13	**Eventos de Transferência e Difusão de**	Eventos de Transferência e Difusão de	EPAMIG/MG	02/01/2020	31/12/2022	R$ 15.940,51	--	--	--	0%	**A Iniciar**		
14	**Visita Técnica de Acompanhamento**	Realização de visita técnica para acompanhamento para elaboração do Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	**A Iniciar**		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								**0,0%**	**A iniciar**		
15	**Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.**	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	02/03/2023	01/05/2023	-			-	0%	**A iniciar**		
					Valor Previsto:	R$ 206.730,00		**Valor realizado:**	R$ 0,00	**21%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

EPAMIG/MG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais.

Observações:

Informação adiconada em outubro/2021 - Status em atraso: Restos a pagar de 2019 com possibilidade de ampliar o período de liquidação até 2022. O motivo do atraso não depende da Sudene, Processos licitatórios apresentados à Sudene com valores muito abaixo do valor total do projeto.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

3º ciclo 2021

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**CGDS/2020001 (ex PO 6.6)**
		Ano:	**2020**
Objetivo estratégico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Processo (s) SEI:**	

Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	**Objetivo estratégico (MDR):**	
Finalidade da ação:	Difusão da inovação, por meio da incorporação de novos usos e produtos, propiciando inserção no mercado. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a propiciar condições para que se possa implantar na macrorregião uma estrutura produtiva baseada na inovação, informação e conhecimento.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulçao de Políticas	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Dois problemas principais dificultam a execução de políticas de convivência com o Semiárido para a pecuária no RN, a pequena área existente com cultivos de palma forrageira e a expansão da praga da cochonilha-do-carmim.		
Projeto:	**Estruturação, manutenção e ampliação de unidades multiplicadoras de raquetes-semente de palma forrageira com variedades tolerantes a cochonilha-do-carmim no RN.**		
Objetivo do projeto:	Expandir a área cultivada com palma e combater a praga da cochonilha-do-carmim, pela disponibilização de materiais tolerantes e divulgação de práticas de manejo fitossanitário no RN.		

	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
Dados Orçamentários	250532030	3; 4	30	R$ 199.412,43	R$ 199.612,04

Previsão de Conclusão:	31/12/2024	**CONVÊNIO Nº 903995/2020**
Data Atualização:	30/9/2021	**Vigência até: 31/12/2023**

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CODEM/SUDENE - Mauro Póvoas, Mauro Bezerra e Amauri Nascimento; Coordenação: Victor Uchôa; SAPE/RN

Cronograma de Desembolso (R$1,00)			
MÊS	**CONCEDENTE**	**CONVENENTE**	**TOTAL**
fev/21	100.000,00	199,61	100.199,61
set/21	99.412,43	0,00	99.412,43
total	199.412,43	199,61	199.612,04

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R$ -
A realizar no exercício RAP	R$ 199.412,43
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$ -
Valor Empenhado no Exercício	R$ -
Valor liberado no Exercício	R$ -
Saldo a liberar	R$ 199.412,43
Saldo a Empenhar no exercício	R$ -
Total Liberado até o exercício	R$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								**20,00%**	**Concluído**		
1	**Proposição de apoio de projetos**	Elaboração de nota técnica e aprovação pela Diretoria Colegiada	CODEM/CGDS/SUDENE	6/4/2020	25/5/2020	-	06/04/2020	25/05/2020	-	100%	**Concluído**	Elaboração de nota técnica N.º 77/2020 em 06/04/2020 e aprovação na 358ª reunião da Diretoria Colegiada em 25/05.	
2	**Cadastramento do Programa e recebimento de proposta**	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	05/06/2020	05/07/2020	-	05/06/2020	05/07/2020	-	100%	**Concluído**	Programa n.º 5320320200008 na Plataforma +Brasil	
3	**Análise da proposta**	Análise e aprovação da proposta	CODEM/SUDENE	06/07/2020	30/11/2020	-	06/07/2020	03/11/2020	-	100%	**Concluído**	Parecer técnico n.º 210/2020 sugerindo aprovação da proposta elaborado em 3/9/2020.	
4	**Análise do plano de trabalho**	Análise do plano de trabalho, realização de ajustes e aprovação para celebração	CODEM/SUDENE	06/07/2020	31/12/2020		10/09/2020	23/12/2020		100%	**Concluído**	Parecer técnico n.º 274/2020 sugerindo aprovação do plano de trabalho elaborado em 3/11/2020	
5	**Formalização do Convênio**	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGDS/COCIC/SUDENE	06/07/2020	31/12/2020	-	6/7/2020	31/12/2020	-	100%	**Concluído**	Convênio celebrado em 31/12/2020. e extrato publicado em 4/1/2021.	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								**0,00%**	**A Iniciar**		
6	**Realização de proc. Licitatório**	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	SAPE/RN	01/01/2021	31/01/2021		--	--	--	0%	**Atrasado**	Processo licitatório ainda não foi apresentado à Sudene para análise.	
7	**Contrapartida**	Liberação da contrapartida	SAPE/RN	01/02/2021	28/02/2021	R$ 199,61	--	--	--	0%	**Atrasado**	Depósito do valor da contrapartida deve ocorrer por ocasião da liberação da primeira parcela.	
8	**Liberação 1ª parcela**	Liberação 1ª parcela de recursos	CGDS/SUDENE	01/02/2021	28/02/2021	R$ 100.000,00	--	--	--	0%	**Atrasado**	Liberação da primeira parcela depende da análise e aprovação pela Sudene do processo licitatório, que ainda não foi apresentado.	Aguardando a licitação referente a parcela.
9	**Meta 1 - Capacitação de extensionistas/ técnicos/estudantes e produtores.**	1.1) Realização de dois cursos de manejo da palma forrageira voltados aos extensionistas, técnicos e estudantes das unidades parceiras (2 cursos x 16 horas x 30 participantes);	SAPE/RN	31/12/2020	31/12/2023	R$ 9.441,80	--	--	--	0%	**A Iniciar**		
		1.2) Realização de dois dias de campo voltados aos produtores selecionados pelas entidades parceiras. (1 dia de campo x 100 participantes).	SAPE/RN	31/12/2020	31/12/2023	R$ 8.202,00	--	--	--	0%	**A Iniciar**		

10	**Visita Técnica de Acompanhamento**	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	**A Iniciar**		
11	**Relatório de Execução referente à 1ª parcela**	Apresentação pelo convenente dos relatórios de execução via Plataforma +Brasil, análise técnica pela Codem e análise financeira pela COCIC.	SAPE/RN - CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	**A Iniciar**		
12	**Liberação 2ª parcela**	É condição para liberação da 2ª parcela o mínimo de 70% de execução da 1ª parcela liberada.	CGDS/SUDENE	01/09/2021	30/09/2021	R$ 99.412,43					**Atrasado**		
13	**mil de raquetes-semente de variedades de palma forrageira**	irrigação, controle de ervas daninhas e distribuição de raquetes-sementes - Manutenção de 16 ha de	SAPE/RN	31/12/2020	31/12/2023	R$ 150.827,07	--	--	--	0%	**A Iniciar**		
14	**tolerantes à cochonilha do carmim por ano, com**	2.2) Implantação de 2 ha irrigados de variedades tolerantes a cochonilha do carmim - ampliação	SAPE/RN	31/12/2020	31/12/2023	R$ 31.141,17					**A Iniciar**		
15	**Visita Técnica de Acompanhamento**	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	**A Iniciar**		
16	**Relatório de Execução referente à 2ª parcela**	Apresentação pelo convenente dos relatórios de execução via Plataforma +Brasil, análise técnica pela Codem e análise financeira pela COCIC.	SAPE/RN - CODEM/SUDENE	31/12/2023	30/06/2024	--	--	--	--	0%	**A Iniciar**		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								**0,00%**	**A iniciar**		
17	**Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.**	Análise das Prestação de Contas, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório de Avaliação.	CODEM/SUDENE	01/01/2024	31/12/2024	-			-	0%	**A iniciar**		
					Valor Previsto:	R$ 199.612,04		**Valor realizado:**	R$ 0,00	**20%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
SAPE/RN; EMPARN, EMATER-RN, SENAR-RN, SEBRAE-RN e SEAPAC
Observações:

Fonte: CODEM (Coordenação de Desenvolvimento Territorial, Infraestrutura e Meio Ambiente)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

3º ciclo 2021

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**CGDS/2020002 (ex PO 6.7)**
		Ano:	**2020**
Objetivo estratégico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	**Processo (s) SEI:**	**59336.001426/2020-93**

Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	
Ação:	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	**Objetivo estrátegico (MDR):**	
Finalidade da ação:	Difusão da inovação, por meio da incorporação de novos usos e produtos, propiciando inserção no mercado. Visa articular empreendedores e agentes do sistema de apoio à inovação de forma a propiciar condições para que se possa implantar na macrorregião uma estrutura produtiva baseada na inovação, informação e conhecimento.		
Diretoria responsável:	DPLAN - Diretoria de Planejamento e Articulçao de Políticas	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável - CGDS
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Vulnerabilidade dos rebanhos com relação à segurança alimentar provocada pela variabilidade climática provocando reduções das precipitações pluviométricas nos últimos ansos, resultando em secas severas na região, tendo como consequência a perda de safras consecutivas e grande redução no quantitativo do rebanho bovino do Norte de Minas Gerais.		
Projeto:	**Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmim para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.**		
Objetivo do projeto:	Implantação de produção de mudas no Campo Experimental de Jaíba, EPAMIG NORTE, para distribuição a 160 agricultores do Território da Cidadania da Serra Geral.		

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)**	**Valor Total do Projeto (R$ 1,00)**
	144000000 / 0250532030	4	30	R$ 200.000,00	R$ 201.000,00

Cronograma de Desembolso			
MÊS	**CONCEDENTE**	**CONVENENTE**	**TOTAL**
mar/21	R$ 200.000,00	R$ 1.000,00	R$ 201.000,00

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R$ -
A realizar no exercício RAP	R$ 200.000,00
Orçamento (LOA+Crédito) no exercício	R$ -
Valor Empenhado no Exercício	R$ -
Valor liberado no Exercício	R$ -
Saldo a liberar	R$ 200.000,00
Saldo a Empenhar no exercício	R$ -
Total Liberado até o exercício	R$ -

Previsão de Conclusão:	31/12/2024	**CONVÊNIO Nº 903996/2020**
Data Atualização:	**30/9/2021**	**Vigência até: 31/12/2023**

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	CODEM/SUDENE - Mauro Póvoas e Vera Lúcia Assunção; Coordenação: Victor Uchôa; EPAMIG/MG

N.E.	**Nome da Etapa**	**Descrição das Atividades/ Etapas**	**Responsável**	**Previsto**			**Realizado**				**Status**	**Observação/Problemas**	**Providências**
				Início	**Fim**	**Valor**	**Início**	**Fim**	**Valor**	**Físico %**			
		INICIAÇÃO (Peso 20%)								**20,00%**	**Concluído**		
1	**Proposição de apoio de projetos**	Elaboração de nota técnica e aprovação pela Diretoria Colegiada	CODEM/CGDS/SUDENE			-	04/02/2020	25/05/2020	-	100%	**Concluído**	Elaboração de nota técnica N.º 77/2020 em 06/04/2020 e aprovação na 358ª reunião da Diretoria Colegiada em 25/05.	
2	**Cadastramento do Programa e recebimento de proposta**	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE			-	05/06/2020	05/07/2020	-	100%	**Concluído**	Programa n.º 5320320200008 na Plataforma +Brasil	
3	**Análise da proposta**	Análise e aprovação da proposta	CODEM/SUDENE			-	06/07/2020	09/09/2020	-	100%	**Concluído**	Parecer técnico n.º 210/2020 sugerindo aprovação da proposta elaborado em 3/9/2020.	
	Análise do plano de trabalho	Análise do plano de trabalho, realização de ajustes e aprovação para celebração	CODEM/SUDENE				10/09/2020	11/12/2020		100%	**Concluído**	Parecer técnico n.º 276/2020 sugerindo aprovação do plano de trabalho elaborado em 5/11/2020	
7	**Formalização do Convênio**	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGDS/COCIC/SUDENE			-	11/12/0200	05/01/2021	-	100%	**Concluído**	Convênio celebrado em 31/12/2020. e extrato publicado em 5/1/2021.	
		EXECUÇÃO (Peso 60%)								**1,00%**	**Em Andamento**		
	Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	EPAMIG/MG	01/02/2020	31/01/2022	--	04/04/2021	--	--	10%	**Em Andamento**	Processo licitatório em elaboração.	Reunião de acompanhamento, em 18/03/2021, entre coordenação e equipes técnicas, para verificar andamento. Processos em elaboração (2018, 2019, 2020).
8	**Contrapartida**	Liberação da contrapartida	EPAMIG/MG	02/01/2020	31/05/2020	R$ 1.000,00	--	--	--	0%	**Atrasado**		

9	**Liberação 1ª parcela**	Liberação 1ª parcela de recursos	CGDS/SUDENE	01/12/2020	31/12/2020	R$ 200.000,00	--	--	--	0%	**Atrasado**	A liberação da 1ª parcela ou parcela única dos recursos está condionada a realização do processo licitatório pela convenente e ao aceite do concedente (PI 424/2016). Só uma parte dos processos de execução foram concluídos e registrados (aquisição de EPI's e Fertilizantes). Esses, analisados suscitaram orientações e medidas de ajuste da EPAMIG	Reunião para entendimento, em 02/06/2021, sobre processos de licitação (EPI's e Fertilizantes), considerando análise e orientações (Parecer 08/2020 - PF/SUDENE), quanto a liberação proporcional aos itens licitados/contratados. Informando também a necessidade de apresentar justificativas e submeter novos TR's, considerando ajustes/alterações. A Epamig não apresentou o novo TR e a justificativa. Ate a datae atualizaçãonão foram idenficados avanços.
10	**Meta 1 - Implantação dos campos de multiplicação**	1.1) Preparação do Campo Experimental Jaíba - CEJA; 1.2) aquiisição de mudas;	EPAMIG/MG	31/12/2023	31/07/2023	R$ 102.957,48	--	--	--	0%	**A Iniciar**		

11	**Meta 2 -Manutenção dos campos de produção**	2.1) Tratos culturais; 2.2) manejo de irrigação.	EPAMIG/MG	31/12/2023	31/07/2023	R$ 39.119,12	--	--	--	0%	**A Iniciar**		
12	**Meta 3 - Distribuição de mudas aos agricultores.**	3.1) reuniões preparatórias; 3.2) seleção dos beneficiários; 3.3) visitas técnicas às	EPAMIG/MG	31/12/2023	31/07/2023	R$ 30.918,50	--	--	--	0%	**A Iniciar**		
13	**Meta 4 - Eventos de Transferência e Difusão deTecnologia.**	4.1 - Capacitação de Técnicos; 4.2 - Dias de campo; 4.3 - Jornada da Inovação.	EPAMIG/MG	31/12/2023	31/07/2023	R$ 28.004,90	--	--	--	0%	**A Iniciar**		
14	**Visita Técnica de Acompanhamento**	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A definir	A definir	--	--	--	--	0%	**A Iniciar**		
		ENCERRAMENTO (Peso 20%)								**0,00%**	**A iniciar**		
15	**Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.**	Análise das Prestação de Contas, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório de Avaliação.	CODEM/SUDENE	31/12/2023	30/06/2024	-			-	0%	**A iniciar**		
					Valor Previsto:	R$ 201.000,00		**Valor realizado:**	R$ 0,00	**21%**	**Em Andamento**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:
EPAMIG/MG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais.
Observações:

Fonte: CODEM (Coordenação de Desenvolvimento Territorial, Infraestrutura e Meio Ambiente)

Legenda	
	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado
	Paralisado

3º ciclo 2021

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**CGDS/2020003 (ex PO 8)**
Objetivo estratégico:	**1.5. Fortalecer as administrações públicas**	**Ano:**	**2020**
		Processo (s) SEI:	**59336.000750/2020-94**

Programa do PPA:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MI):**	
Ação do PPA:	**8917 - Fortalecimento das Administrações Locais**	**Objetivo estratégico (MI):**	
Objetivo da ação:	Contribuir para a melhoria da capacidade de gestão do poder público local, mediante assistência técnica para o aperfeiçoamento dos recursos humanos, financeiros e organizacionais das prefeituras, em municípios selecionados.		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	CGDS/DPLAN
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Beatriz Araripe Lyra
Problema (causa):	Estruturação de um programa para atender a fragilidade das capacidades tecnico-gerenciais da gestão municipal na área de atuação da Sudene.		
Projeto:	Elaboração de Proposta de Reformulação do "+ Gestão Municipal".		
Objetivo do projeto:	Elaborar proposta de reformulação do +Gestão Municipal a partir da PNDR (Programa de Fortalecimento das Capacidades Governativas), do PRDNE e da realidade, com vistas ao fortalecimento das administrações locais.		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto	Valor Total do Projeto

Previsão de Conclusão:	**30/09/2021**
Data Atualização:	**30/09/2021**

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	José Amauri, Vera Lúcia Assunção, Juliana Boges. Coord. CODEM/CGDS: Victor Uchôa Silva.

Valores Orçamentários/ Financeiros (R$ 1,00)	
Pago até o ano anterior	R$ -
A realizar no exercício	R$ -
Orçamento Aprov.no exercício (L	R$ -
Valor Empenhado no Exercício	R$ -
Valor liberado no Exercício	R$ -
Saldo a liberar	R$ -
Saldo a Empenhar no exercício	R$ -
Total Liberado até o exercício	R$ -

N.E.	Nome da Etapa	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Providências
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
		PLANEJAMENTO (Peso 20%)						**24/09/21**		**20%**	**Concluído**		
1	Planejamento Interno - CODEM	Realização de reuniões internas de planejamento, para detalhamento do projeto. Produto: Elaboração do TAP	Equipe Codem	01/11/2019	24/04/2020		01/11/2019	24/04/2020		100%	**Concluído**		
2	Identificação de parcerias	Levantamento dos potenciais parceiros com vistas ao apoio na prestação de serviços especializados, de consultoria e assessoramento, para reformulação/elaboração do Programa de Melhoria da Gestão Municipal "+ Gestão Municipal" e promoção do desenvolvimento regional, territorial e local sustentável	Equipe Codem		24/04/2020		01/11/2019	24/04/2020		100%	**Concluído**		
		EXECUÇÃO (Peso 70%)								**70%**	**Concluído**		**Execução da Meta 8, alterada/ajustada, mediante apreciação e aprovação do Voto DC 120/2021, conforme ata da 394ª Reunião da Diretoria Colegiada da SUDENE, de 02 de setembro de 2021.**
3	Planejamento metodológico proposta ajustada: "elaboração de uma proposta de ações para melhoria da gestão municipal"	Detalhamento da proposta: elaboração do escopo do projeto, conteudo, metodologia	Equipe Codem	02/08/2021	20/08/2021		02/08/2021	12/09/2021		100%	**Concluído**	Reuniões internas da equipe técnica para discussão da meta em 02/08/21, 11/08/21 e 13/08/21.	Proposta metodológica reformulada no curso do processo de planejamento
4	Articulação interna e sensibilização	Contato com potenciais parceiros (CGEP, CGCP, CGGI), para apresentar a proposta de trabalho e solicitação das participações (conteúdo, palestrante)	CG - CGDS	17/08/2021	01/09/2021		24/08/2021	02/09/2021		100%	**Concluído**	Contato, telefonico, da CG-CGDS com CG's das CGCP, CGEP, CGGI para tratar do assunto e de suas participações.	
5	Organização e preparação do evento - Oficina Interna	Elaboração e envio de convite com programação da Oficina; Confirmação dos participantes (CGEP, CGCP, CGGI)	Equipe Codem	17/08/2021	01/09/2021		24/08/2021	09/09/2021		100%	**Concluído**		

6	Realização do evento	Oficina Interna I e II	CGDS, CGEP, CGGP	02/09/2021	16/09/2021		14/09/2021	17/09/2021		100%	**Concluído**		
7	Síntese dos dados/informações (resultados) envolvidos na proposta de ações para melhoria da gestão municipal	Consolidação dos insumos da Oficina I e II, reunião do material produzido, descrição/indicação dos resultados (focos de ação priorizados), da proposta	Equipe Codem	02/09/2021	30/09/2021		14/09/2021	24/09/2021		100%	**Concluído**		Por conta de demandas diversas, a execução desta Meta seria concluída no ciclo 2020-2021. A proposta foi adaptada às necessidades da mais recente IN SGP-ENAP/SEDGG/ME N°21, de 1/02/2021, que estabelece orientações aos órgãos do SIPEC, quanto aos prazos, condições, critérios e procedimentos para implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas - PNDP, de que trata o Decreto 9.991, de 28 de agosto de 2019 e aguarda retorno da CGGP/DAD. ***O retorno desfavorável a contratação da capacitação específica pleiteada, entendida como necessária a execução da meta institucional de (re)formulação do Programa +Gestão Municipal, somado ao reduzido período de tempo restante, requereu discussões e busca de alternativas de possíveis encaminhamentos. Reuniões realizadas: CODEM (18/05/21, 28/06/21), CODEM e CGGP (24/05/21). Para tratar do assunto, a equipe técnica sugere agendar reunião ampliada para tratar do assunto com a participação da CGGI, da CGGP, além da CODEM/CGDS.
	ENCERRAMENTO (Peso 10%)									**10%**	**Concluído**		
8	Relatório Final	Relatório descritivo dos passos percorridos e da proposta de melhoria da gestão municipal, para 2022, considerando a destinação dos recursos da ação orçamentária 8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Equipe Codem/CGDS	02/09/2021	30/09/2021		14/09/2021	30/09/2021		100%	**Concluído**		
				Valor Previsto:		R$ -	**Valor realizado:**		R$ -	100,0%	**Concluído**	**Status do Projeto**	

Parceiros institucionais:

UFPE. De acordo com a proposta original da Meta 8, foi prevista uma capacitação da equipe técnica, em formulação de políticas públicas e programas, para habilitar na (re)formulação do Programa +Gestão Municipal, a ser realizada pela docente Brunna Carvalho (via GECC), inviabilizada pela alteração ocorrida na legislação/normatização das contratações diretas.

Observações:

Tratava-se, originalmente, da revisão e elaboração de uma proposta de (re)formulação da iniciativa denominada + Gestão Municipal, iniciada em 2018, com uma ação mais estruturada, buscando-se, desta feita, uma conformação de Programa, voltado para melhoria das capacidades das administrações municipais, por meio do suporte teórico, da leitura da realidade e do aprofundame

Processo: 59336.000750/2020-94 e correlatos: Processos 59336.000751/2020-39 e 59336.002029/2021-10.

Legenda
A Iniciar
Concluído
Em Andamento
Atrasado
Cancelado
Paralisado

3º ciclo 2021

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	**Número do Projeto:**	**CGDS/2020004 (ex PO 9.3)**
		Ano:	**2020**
Objetivo estratégico:	**1.1. Fortalecer as Administrações Públicas**	**Processo (s) SEI:**	**59336.000835/2021-53**

Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**	I. Superar desigualdades regionais e Erradicar a Miséria
Ação:	**8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação**	**Objetivo estratégico (MDR):**	I.II Fortalecer cadeias e Arranjos produtivos locais, articulando-os a investimentos estruturadores, nas regiões de menor dinamismos econômico e social
Finalidade da ação:	Difusão do conhecimento, por meio da colaboração insterinstitucional, propiciando divulgação de ações da Sudene. Visa articular diferentes atores baseando-se na informação, inovação e conhecimento com o foco de fortalecer as administrações públicas municipais		
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**	Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (CGDS/DPLAN)
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**	Beatriz Araripe Bezerra de Menezes Lyra
Problema (causa):	Necessidade de uma maior divulgação e debates sobre temáticas voltadas ao desenvolvimento regional, sobretudo, fazendo a conexão com o PRDNE.		
Projeto:	Webinars sobre "Inovação para o Desenvolvimento do Nordeste", com foco em Saúde Digital, Caprinovinocultura, TIC e Convivência com o Semiárido		
Objetivo do projeto:	Realização de eventos de difusão do conhecimento e articulação de parceiros, tendo como tema central "Inovação para o Desenvolvimento do Nordeste" e com subtemas alguns daqueles da atuação, demonstrando os projetos/ações realizadas, quais sejam: saúde digital, caprinovinocultura, Rota da TIC, convivência com o semiárido (Meta Institucional - 2020/2021- n.º 7: Realização de eventos de difusão do conhecimento e articulação de parceiros).		

Dados Orçamentários	Fonte	Grupo de Despesa	Modalidade	Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)	Valor Total do Projeto (R$ 1,00)
	-	-	-		

Ata 304, da Diretoria Colegiada 2018

Valores Orçamentários/ Financeiros		
Pago até o ano anterior	R$	-
A realizar no exercício	R$	-
Orçamento (LOA+Crédito) no ex	R$	-
Valor Empenhado no Exercício (	R$	-
Valor liberado no Exercício	R$	-
Saldo a liberar	R$	-
Saldo a Empenhar no exercício	R$	-
Total Liberado até o exercício	R$	-

Previsão de Conclusão:	**30/09/21**
Data Atualização:	**30/09/21**

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto		
	CODEM/CGDS/SUDENE:	Juliana Borges, José Farias, Mauro Povoas, Amauri Nascimento, Vera Lúcia Assunção, Mauro Bezerra - CODEM/CGDS
	Coordenação	Victor Uchôa

		Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Previsto			Realizado				Status	Observação/Problemas	Ações Corretivas
				Início	Fim	Valor	Início	Fim	Valor	Físico %			
1	**PLANEJAMENTO (Peso 20%)**									**20%**	**Concluído**		
1.1	**Planejamento do Projeto - Meta Institucional 7, ciclo 2020/2021**	Realização de reuniões internas para definição do escopo do projeto, objetivos, medotologia, definição dos eventos, focos, datas, públicos, parceiros, elaboração de cronograma, elaboração do TAP, entre outras atividades.	CODEM/CGDS	14/01/2021	14/05/2021	--	12/04/2021	10/06/2021	--	100%	**Concluído**		
1.2	**Definição de modus operandi e Plataforma para realização dos eventos** *On line*	Definição junto com Ascom e CGTI de ferramenta para realização dos eventos *on line* que permita participação do público e gravação das falas.	CODEM/CGDS/ ASCOM / CGTI	22/02/2021	26/02/2021	--	02/06/2021	16/06/2021	--	100%	**Concluído**		
1.3	**Articulação com parceiros para construção da programação, conteúdos e agenda conjunta.**	Realização de reuniões com parceiros por meio virtual, contatos por mensagens eletrônicas e telefone.	CODEM/CGDS	22/04/2021	14/05/2021	--	15/04/2021	16/09/2021	--	100%	**Concluído**		
1.4	**Plano de Divulgação do Projeto: incluindo os quatro eventos.**	Solicitar a Ascom um plano de divulgação e comunicação do Projeto, com produtos definidos para cada um dos eventos.	CODEM/CGDS/ ASCOM	22/04/2021	14/05/2021	--	02/06/2021	23/09/2021	--	100%	**Concluído**		
2	**Realização dos eventos (PESO 60%)**									**60%**	**Concluído**		
2.1	**Evento** ***On Line*** **1**	Descrição do evento, objetivo e proposta constará em documento específico.	CODEM/CGDS	15/04/2021	08/06/2021	--	15/04/2021	16/06/2021	--	100%	**Concluído**	"Inovação para o Desenvolvimento do Nordeste: Saúde Digital"	
2.2	Fechamento de programação, data ou outra atividade prévia.	Será realizada pela CODEM/CGDS, em conjunto com parceiros.	CODEM/CGDS	15/04/2021	17/05/2021	--	15/04/2021	15/06/2021	--	100%	**Concluído**	Reuniões SUDENE/Nutes-UFPE; Contato/entendimentoscom convidados; Reunião prévia ao	
2.3	Convite para parceiros institucionais.	Serão elaborados os convites para os parceiros específicos desse evento.	CODEM/CGDS	15/04/2021	24/05/2021	--	02/06/2021	09/06/2021	--	100%	**Concluído**	Prof.ª Dra. Magdala Novaes - Nutes/UFPE; Dr. Lincoln de Assis Moura Jr.- diretor associado da Saúde da Accenture Brasil e membro da Sociedade Brasileira de	
2.4	Divulgação dos eventos via redes sociais.	A divulgação levará em conta a especificidade do público desse evento.	CODEM/CGDS/ ASCOM	15/04/2021	03/06/2021	--	09/06/2021	16/06/2021	--	100%	**Concluído**	Divulgação nas redes sociais e grupos; e-mail convite considerando publico-alvo	
2.5	Preparação de materiais para apresentação.	Apresentações serão elaboradas pela Codem/Sudene e também pelos parceiros que irão realizar apresentações.	CODEM/CGDS	15/04/2021	03/06/2021	--	09/06/2021	16/06/2021	--	100%	**Concluído**	Elaboração SUDENE: roteiro, contextualização do evento, apresentação dos convidados,	

2.6	Realização do 1º evento *on line*.	O evento será gravado para fins de disponibilização no you tube da SUDENE	CODEM/CGDS/ ASCOM	**18/05/2021**	**08/06/2021**	--	16/06/2021	16/06/2021	--	100%	**Concluído**	1º evento realizado em 16/06/2021, das 10:00 às 11:30h Vídeo do 1º Webinar	
2.7	**Evento *On Line* 2**	Descrição do evento, objetivo e proposta constará em documento específico.	CODEM/CGDS	09/06/2021	22/07/2021	--	17/06/2021	28/07/2021	--	100%	**Concluído**	"Inovação para o Desenvolvimento do Nordeste: Caprinovinocultura."	

2.8	Fechamento de programação, data ou outra atividade prévia.	Será realizada pela CODEM/CGDS, em conjunto com parceiros.	CODEM/CGDS	09/06/2021	23/07/2021	--	17/06/2021	27/07/2021	--	100%	**Concluído**	Realização de atividades de planejamento e execução de atividades, articulação de parceiros, para a concretização do evento. Foi necessário adia
2.9	Convite para parceiros institucionais.	Serão elaborados os convites para os parceiros específicos desse evento.	CODEM/CGDS	09/06/2021	25/07/2021	--	14/07/2021	21/07/2021	--	100%	**Concluído**	Francisco Soares - MDR; Joaquim Dantas - Produtor Rural e Administrador da Fazenda Carnaúba; Marcos Bomfim - Embrapa Caprinos e Ovinos; Francis Neri - Presidente da ASCOBETANIA-
2.10	Divulgação dos eventos via redes sociais	A divulgação levará em conta a especificidade do público desse evento.	CODEM/CGDS/ ASCOM	06/07/2021	07/27/2021	--	21/07/2021	28/07/2021	--	100%	**Concluído**	Divulgação nas redes sociais, e-mail, sitio da Sudene.
2.11	Preparação de materiais para apresentação	Apresentações serão elaboradas pela Codem/Sudene e também pelos parceiros que irão realizar apresentações.	CODEM/CGDS	06/07/2021	27/07/2021	--	21/07/2021	28/07/2021	--	100%	**Concluído**	Elaboração SUDENE: roteiro, contextualização do evento,
2.12	Realização do 2º evento *on line*	O evento será gravado para fins de publicação.	CODEM/CGDS/ ASCOM	**12/07/2021**	**28/07/2021**	--	28/07/2021	28/07/2021	--	100%	**Concluído**	2º evento realizado em28/07/2021, das 10:00 às
2.13	**Evento *On Line* 3**	Descrição do evento, objetivo e proposta constará em documento específico.	CODEM/CGDS	16/07/2021	24/08/2021	--	29/07/2021	20/08/2021	--	100%	**Concluído**	"Inovação para o Desenvolvimento do Nordeste:
2.14	Fechamento de programação, data ou outra atividade prévia.	Será realizada pela CODEM/CGDS, em conjunto com parceiros.	CODEM/CGDS	16/07/2021	02/02/2021	--	29/07/2021	19/08/2021	--	100%	**Concluído**	Realização de atividades de planejamento e execução de atividades, articulação de
2.15	Convite para parceiros institucionais.	Serão elaborados os convites para os parceiros específicos desse evento.	CODEM/CGDS	16/07/2021	02/02/2021	--	06/08/2021	13/08/2021	--	100%	**Concluído**	Francilene Garcia, Doutora em Engenharia Elétrica, professora e pesquisadora da UFCG/CEEI/UASC; André Rafael, economista e gestor público federal (EPPGG),
2.16	Divulgação dos eventos via redes sociais	A divulgação levará em conta a especificidade do público desse evento.	CODEM/CGDS/ ASCOM	13/08/2021	17/08/2021	--	13/08/2021	20/08/2021	--	100%	**Concluído**	Divulgação nas redes sociais, e-mail, sitio da Sudene.
2.17	Preparação de materiais para apresentação	Apresentações serão elaboradas pela Codem/Sudene e também pelos parceiros que irão realizar apresentações.	CODEM/CGDS	13/08/2021	17/08/2021	--	13/08/2021	20/08/2021	--	100%	**Concluído**	Elaboração SUDENE: roteiro, contextualização do evento,
2.18	Realização do 3º evento *on line*	O evento será gravado para fins de publicação.	CODEM/CGDS/ ASCOM	**23/08/2021**	**24/08/2021**	--	20/08/2021	20/08/2021	--	100%	**Concluído**	O terceiro Webinar com o tema "Inovação para o Desenvolvimento do Nordeste: TIC" aconteceu no dia 20 de agosto de 2021, das 10:00 às 11:30 horas. com transmissão
2.19	**Evento *On Line* 4**	Descrição do evento, objetivo e proposta constará em documento específico.	CODEM/CGDS	26/08/2021	16/09/2021	--	23/08/2021	23/09/2021	--	100%	**Concluído**	"Inovação para o Desenvolvimento do Nordeste:
2.20	Fechamento de programação, data ou outra atividade prévia.	Será realizada pela CODEM/CGDS, em conjunto com parceiros.	CODEM/CGDS	26/08/2021	02/09/2021	--	23/08/2021	22/09/2021	--	100%	**Concluído**	Realização de atividades de planejamento e execução de atividades, articulação de parceiros, para a concretização
2.21	Convite para parceiros institucionais.	Serão elaborados os convites para os parceiros específicos desse evento.	CODEM/CGDS	26/08/2021	02/09/2021	--	09/09/2021	16/09/2021	--	100%	**Concluído**	Diana Signor Deon (Pesquisadora Embrapa Semiárido) e Mônica Tejo Cavalcanti, Diretora do Instituto
2.22	Divulgação dos eventos via redes sociais	A divulgação levará em conta a especificidade do público desse evento.	CODEM/CGDS/ ASCOM	06/09/2021	09/09/2021	--	16/09/2021	23/09/2021	--	100%	**Concluído**	Divulgação nas redes sociais, e-mail, sitio da Sudene.
2.23	Preparação de materiais para apresentação	Apresentações serão elaboradas pela Codem/Sudene e também pelos parceiros que irão realizar apresentações.	CODEM/CGDS	06/09/2021	09/09/2021	--	16/09/2021	23/09/2021	--	100%	**Concluído**	Elaboração SUDENE: roteiro, contextualização do evento,
2.24	Realização do 4º evento *on line*	O evento será gravado para fins de publicação.	CODEM/CGDS/ ASCOM	**01/09/2021**	**16/09/2021**	--	23/09/2021	23/09/2021	--	100%	**Concluído**	O 4º Webinar com o tema " Inovação para o desenvolvimento do Nordeste: convivência com o semiárido" aconteceu no dia 23 de setembro de 2021, no período
3	**Relatório Técnico e Publicação (Peso 20%)**									20%	**Concluído**	
3.1	Elaboração de Relatório Técnico descritivo da execução dos 4 eventos.	A meta institucional do ciclo 2019/2020 será concluída com um relatório que contemple os quatro eventos e uma avaliação do projeto.	CODEM/CGDS	20/09/2021	30/09/2021	--	16/06/2021*	30/09/2021	--	100%	**Concluído**	O relatório descritivo contextualiza o projeto, descreve as etapas, contém os links de acesso aos webinars, bem como todas as informações dos eventos. A data de inicio informada,16/06/2021, corresponde a data do Evento
				Valor Previsto:		R$ 0,00	**Valor realizado:**		R$ 0,00	100%	**Concluído**	**Status do Projeto**

Parceiros institucionais:

NUTES/UFPE; Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR); Embrapa Caprinos e Ovinos; Universidade de Pernambuco (UPE); Embrapa Semiárido; Instituto Nacional do Semiárido; entre outros.

Observações:

O processo n.º 59336.000835/2021-53 reflete a execução da meta 7 do período 202/2021, incluindo os relatórios parciais e final, com os links de acesso aos webinars.

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

	A Iniciar
	Concluído
	Em Andamento
	Atrasado
	Cancelado

3º ciclo 2021

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
PLANO DE AÇÃO 2021

Diretriz estratégica:	**1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste**	
Objetivo estrátegico:	**1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores**	
Programa:	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	**Eixo temático (MDR):**
Ação:	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	**Objetivo estrátegico (MDR):**
Finalidade da ação:	**Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana e Entorno.**	
Diretoria responsável:	DPLAN	**Subunidade responsável:**
Diretor:	Raimundo Gomes de Matos	**Gestor da subunidade:**
Problema (causa):	Os municípios necessitam de instrumento de planejamento voltado para o desenvolvimento sustentável de curto, médio e longo prazos por enfrentarem problemas e desafios nas questões de mobilidade e desigualdade econômico e social e de infraestrutura.	
Projeto:	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana	
Objetivo do projeto:	Promover a convergência e integração de iniciativas, recursos de instituições públicas e privadas nas oportunidades em segmentos com maior potencial para geração de benefícios econômico, social e ambiental, beneficiando as populações locais dos Municípios de Feira de Santana e entorno.	

Dados Orçamentários	**Fonte**	**Grupo de Despesa**	**Modalidade**	**Valor SUDENE no Projeto (R$ 1,00)**	**Valor Total do Projeto (R$ 1,00)**
	280	Custeio	20WQ	R$ 709.382,21	R$ 709.382,21

Cronograma de Desembolso (1)	
SUDENE	Feira de Santana
R$ 709.382,21	**R$ 0,00**

Previsão de Conclusão:	31/08/2019
Data Atualização:	31/06/2021

Res. DC nº 281/2017 E Ata 304ª Reunião da Diretoria Colegiada

Responsável(eis) técnico(s) pelo Projeto	Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP

s	**Nome da Etapa**	**Descrição das Atividades/ Etapas**	**Responsável**	**Previsto**			**Realizado**		
				Início	**Fim**	**Valor**	**Início**	**Fim**	**Valor**
1	**Protocolo de Intenções**	Comunicação Oficial da Prefeitura de Fiera de Santana - BA (PFS) solicitando parceria visando implementar o plano de desenvolvimento naquela Região. (2)	SUDENE/GAB	25/01/2017	20/02/2017		25/01/2017	14/02/2017	

2	**Elaboração de Nota Técnica**	Elaboração de Nota Técnica SUDENE/DPLAN/CGEP N 001/2017 referente ao protocolo de inteções para elaboarção do plano de desenvolviemnto de Feira de Santana - BA e Municiíos do Entorno", que são Conceição Jacuípe, Anguera, São Gonçalo dos Campos, Amélia Rodrigues, Conceição da Feira, Tanquinho, Antônio Cardoso, Cardeal, Coração de Maria, Ipecaetá, Riachão do Jacuípe, Santa Bárbara, Santanópolis e Serra Preta). (3)	SUDENE DPLAN/CGCP	02/02/2017	09/02/2018		02/02/2017	09/02/2017	
3	**Elaboração de Plano de Trabalho específico.**	Elaboração de Plano de Trabalho específico (Equipe CGCP) sobre o plano de desenvolviemnto de Feira de Santana - BA, contendo questões de economia, educação, estrutra urbana, infraestrutura e outros temas de relevância, alem de diretrizes, prioridades, metodologias, prazos,articulações, recursos, metas, desenho do monitoramento, produtos e mudanças esperadas para a execução do Plano.	SUDENE DPLAN/CGCP	18/09/2017	20/10/2017		18/09/2017	20/10/2017	
4	**Assinatura de Parceiros Signatários** (4)	Ata de assinatura de Parceiros Signatários do documento Projeto - BRA/17/019 - "Desenvolvimento regional no Nordeste" - Local Cidade de Feira de Santana - BA.	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada	02/10/2017	20/10/2017		20/11/2017	20/11/2017	
5	**Pré Diagnóstico Básico Municipal**	Solicitação de Trabalho à SUDENE/DPLAN/CGEP: Elaboração de documento pela Coordenação Geral de Cooperação e Articulação de Políticas - CGCP contendo os principais indicadores do espaço e com uma análise das principais tendências.	SUDENE CGEP e CGCP (em parceria)	02/10/2017	20/10/2017		25/09/2017	13/11/2017	
6	**Elaboração e aprovação do Termo de referência.**	Elaboração e aprovação do Termo de referência de Contratação dos Serviços de Consultoria. Elaboração de documento contendo um detalhamento e especificações dos principais produtos esperados e sua orçamentação. em Parceira com o PNUD e Comitê local para subsidio à contratação de PJ	SUDENE/CGCP e PNUD	02/10/2017	20/10/2017		20/11/2017	15/12/2017	

7	**Realização do processo licitatório**	Objetivo contratação de empresa com ênfase em mobilização de comunidades, definição de objetivos, metas e realiação de oficinas e formatação de um documento base para discussão.	SUDENE e PNUD	29/01/2018	02/03/2018		02/03/2018	15/06/2018	
8	**Contração de serviços especializados para elaboração do Plano**	Objeto contratação de serviço de apoio às atividade do plano.	SUDENE e PNUD	05/03/2018	30/06/2018		01/04/2018	20/08/2018	
9	**Apresentação do projeto técnico da Consutoria e ajuste do cronograma**	Elaboração de documento contendo detalhamento e especificação dos principais produtos esperados e sua orçamentação.	SUDENE, PNUD e Consultoria Contratada	02/07/2018	27/07/2018		01/04/2018	20/08/2018	
10	**Acompanhamento da Liberação dos Pagamentos por produto apresentado**	Autorização da SUDENE para Liberação da primeira parcela, referente ao **Produto 1: Plano de Trabalho**	SUDENE/DPLAN/ CGCP	01/08/2018	22/08/2018	R$ 70.938,22	05/09/2018	30/11/2018	#REF!
11	**Realização da primeira etapa do PDE de Feira de Santana (5)**	**Produto 2: Diagnóstico, inventário de estudos e pesquisas e** análise da Política Nacional de Desenvolvimento regional focando suas interligações com o Território de Feira de Santana - BA. Autorização da SUDENE para Liberação da 2ª parcela	SUDENE/DPLAN/ CGCP, PNUD e Consultoria Ernst Young	01/10/2018	10/03/2019	R$ 141.876,44	01/10/2018	09/05/2019	#REF!
12	**Realização da segunda etapa do PDE de Feira de Santana**	**Produto 3: Oficinas Setoriais e regionais. E**m conjunto com atores sociais. Autorização da SUDENE para Liberação da 3ª parcela	SUDENE/DPLAN/ CGCP, PNUD e Consultoria Ernst Young	01/11/2018	01/03/2019	R$ 141.876,44	01/11/2018	25/02/2019	#REF!

13	**Realização da terceira etapa do PDES de Feira de Santana**	**Produto 4: Agendas estratégicas por setor, construídas.** Autorização da SUDENE para Liberação da 4ª parcela	SUDENE/DPLAN/ CGCP, PNUD e Consultoria a ser contratada	02/03/2019	28/06/2019	R$ 212.814,66	01/05/2019		
14	**Realização da quarta etapa**	Produto 5: PDES Feira de Santana em primeira	SUDENE/DPLAN/	28/06/2019	05/07/2019	R$ 70.938,22	25/06/2019		
15	**Realização da quinta etapa (final) do PDES de Feira de Santana**	Produto 6: PDES Feira de Santana em versão final	SUDENE/DPLAN/ CGCP, PNUD e Consultoria a ser contratada	06/07/2019	02/08/2019	R$ 70.938,22			
16	**Parecer final de aprovação do Plano**	Parecer final de acompanhamento envolvendo todas as etapas do processo.	SUDENE/DPLAN/ CGCP, PNUD e Consultoria a ser	03/08/2019	15/08/2019				
17	**Aprovação do Plano Lançamento do PDE de Feira de Santana.**	Deliberação pela Diretoria Colegiada	SUDENE/DPLAN/ CGCP, PNUD e Consultoria a ser contratada	20/08/2019	31/08/2019				
				Valor Previsto:		R$ 709.382,21	**Valor realizado:**		#REF!

Parceiros institucionais:

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolviemento; Prefeitura de Feira de Santana (BA) e outros órgãos federais e estaduias afeitos ao tema.

Observações: Nova licitação de contratação de empresa de consultoria será realizada pelo PNUD. Minuta de Termo de Referência foi elaborado pela CGCP para apreciação do Diretor da DPLAN e posterior validação junto ao

(1) Processo Nota de Empenho Credor PNUD 25/08/2017, n 2017ne000365 (pg 61; Processo CGCP 59335000235/2017-19 - Plano de Desenvolvimento Econômico de Feira de Santana - BA)

(2) Conforme Ata da 256 reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da SUDENE.

(3) Ata da Assinatura de Parceiros Signatários (págs 63 e 64) apenso ao processo. Acordo de Coopreação SUDENE/PNUD aprovado e assinado em 20/11/2017.

(4) Atraso no ajuste do Produto II para aprovação suscitou dois aditamentos do contrato pelo PNUD com vigência final para 31 de agosto de 2019.

Emendas 3º ciclo 2021

Dados do Projeto					SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orçamentários				Status			
Ano		Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin.	Iniciação	Liberação 1ª	Liberação 2ª	Liberação 3ª
2016	COCIC/2016001	1	Pavimentação e Drenagem Superficial pelo método convencional de diversas ruas no Município de Passa e Fica/RN - 2	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 250.000,00	R$ 274.321,90	R$ 250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	~~Não se Aplica~~
2016	COCIC/2016002	2	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 250.000,00	R$ 262.868,86	R$ 250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	~~Não se Aplica~~
2016	COCIC/2016003	3	Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 500.000,00	R$ 514.509,40	R$ 500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2016	COCIC/2016004	4	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 1.000.000,00	R$ 1.020.000,00	R$ 813.633,43	81%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar
2016	COCIC/2016005	5	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 1.172.497,00	R$ 1.234.957,85	R$ 926.955,29	79%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2016	COCIC/2016006	6	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 600.000,00	R$ 611.924,74	R$ 559.952,79	93%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2016	COCIC/2016008	7	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 500.000,00	R$ 503.901,97	R$ 250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	~~Não se Aplica~~
2016	COCIC/2016009	8	Pavimentação de diversas ruas no município de Upanema/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 500.000,00	R$ 526.970,57	R$ 500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	~~Não se Aplica~~
2017	COCIC/2017001	9	Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 1	BA	1	1.1	2029	214S	R$ 500.000,00	R$ 501.000,00	R$ 400.000,00	80%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar
2017	COCIC/2017002	10	Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 2	BA	1	1.1	2029	214S	R$ 1.000.000,00	R$ 1.001.500,00	R$ 500.000,00	50%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar
2017	COCIC/2017003	11	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	BA	1	1.1	2029	214S	R$ 500.000,00	R$ 500.800,00	R$ 500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2017	COCIC/2017004	12	Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	BA	1	1.1	2029	214S	R$ 385.000,00	R$ 436.300,00	R$ 186.190,69	48%	Concluído	Concluído	A Iniciar	~~Não se Aplica~~
2017	COCIC/2017005	13	Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	BA	1	1.1	2029	214S	R$ 500.000,00	R$ 500.800,00	R$ 500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2017	COCIC/2017006	14	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas povoado de Brejão no município de Jaborandi.	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 400.000,00	R$ 400.500,00	R$ 400.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2017	COCIC/2017007	15	Pavimentação de vias no Município de Campo Alegre de Lourdes	BA	1	1.1	2029	214S	R$ 400.000,00	R$ 400.500,00	R$ 400.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2017	COCIC/2017008	16	Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de Wanderley	BA	1	1.1	2029	214S	R$ 1.000.000,00	R$ 1.274.003,42	R$ 1.000.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2017	COCIC/2017009	17	Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA.	BA	1	1.1	2029	214S	R$ 1.989.238,23	R$ 1.991.738,23	R$ 1.989.238,23	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2017	COCIC/2017010	18	Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	BA	1	1.1	2029	214S	R$ 1.500.000,00	R$ 1.548.118,86	R$ 1.500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2017	COCIC/2017011	19	Pavimentação de vias do Município de Campo Alegre de Lourdes - 2	BA	1	1.1	2029	214S	R$ 500.000,00	R$ 501.000,00	R$ 500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído

Emendas 3º ciclo 2021

Dados do Projeto					SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orçamentários				Status			
Ano		Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin.	Iniciação	Liberação 1ª	Liberação 2ª	Liberação 3ª
2017	COCIC/2017012	20	Pavimentação nas ruas da sede do município de Matina.	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 500.000,00	R$ 520.000,00	R$ 400.000,00	80%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar
2017	COCIC/2017013	21	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 700.855,00	R$ 705.855,00	R$ 490.598,50	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar
2017	COCIC/2017014	22	Pavimentação de ruas - Município de São Miguel	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 250.000,00	R$ 250.500,00	R$ 250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	~~Não se Aplica~~
2017	COCIC/2017015	23	Pavimentação de ruas no município de Passa e Fica - RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 350.000,00	R$ 357.500,00	R$ 350.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2017	COCIC/2017017	24	Pavimentação em paralelepípedo nos povoados de Brejão e Planalto do município de Jaborandi-Bahia.	BA	1	1.1	2029	214S	R$ 880.000,00	R$ 890.000,00	R$ 880.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2017	COCIC/2017018	25	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 250.000,00	R$ 274.181,45	R$ 44.381,79	18%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar
2017	COCIC/2017019	26	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 250.000,00	R$ 274.341,55	R$ 50.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar
2017	COCIC/2017020	27	Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 264.608,17	R$ 266.608,17	R$ 52.921,63	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	~~Não se Aplica~~
2017	COCIC/2017021	28	Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe	BA	1	1.1	2029	214S	R$ 390.020,00	R$ 433.930,65	R$ 314.012,00	81%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar
2017	COCIC/2017022	29	Reforma e Ampliação de Feira Livre - Município de Bom Jesus da Serra	BA	1	1.1	2029	214S	R$ 350.000,00	R$ 357.000,00	R$ 350.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2017	COCIC/2017024	30	Pavimentação de estradas vicinais - Município de Coronel João Pessoa	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 250.493,20	R$ 260.930,41	R$ 210.000,00	84%	Concluído	Concluído	Concluído	~~Não se Aplica~~
2017	COCIC/2017025	31	CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS ACESSOS A PRAIA DE REDONDA MUNICIPIO DE ICAPUI	CE	1	1.1	2029	7k66	R$ 1.000.000,00	R$ 1.025.963,58	R$ 700.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2018	COCIC/2018001	32	Pavimentação - Municipio de Uruçuca	BA	1	1.1	2029	7k66	R$ 1.000.000,00	R$ 1.002.500,00	R$ 1.000.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2018	COCIC/2018002	33	Pavimentação com paralelepípedo e guias de sarjeta na zona urbana do município de pé de serra, Bahia.	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 250.000,00	R$ 252.500,00	R$ 200.000,00	80%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar
2018	COCIC/2018003	34	Pavimentação em paralelepípedo de vias de povoado localizado na zona rural do município de Paulo Afonso	BA	1	1.1	2029	214S	R$ 586.135,00	R$ 633.025,80	R$ 586.135,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2018	COCIC/2018004	35	Pavimentação com paralelepípedos em ruas de povoados e comunidades no município de Lucrécia- RN.	RN	1	1.1	2029	214S	R$ 250.000,00	R$ 251.000,00	R$ 175.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar
2018	COCIC/2018005	36	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	RN	1	1.1	2029	214S	R$ 250.000,00	R$ 251.628,29	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
2018	COCIC/2018006	37	Pavimentação de vias públicas no município de Filadélfia	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 1.000.000,00	R$ 1.025.000,00	R$ 600.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2018	COCIC/2018007	38	Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 1.500.000,00	R$ 1.673.298,27	R$ 1.500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2018	COCIC/2018008	39	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 250.000,00	R$ 252.500,00	R$ -	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar

Emendas 3º ciclo 2021

Dados do Projeto					SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orçamentários				Status			
Ano		Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin.	Iniciação	Liberação 1ª	Liberação 2ª	Liberação 3ª
			de Xique-Xique/BA													
2018	COCIC/2018009	40	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 1.755.787,09	R$ 1.773.344,96	R$ 841.262,37	48%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar
2018	COCIC/2018010	41	Aquisição de Trator Agricola e Implementos. - Cairu/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 150.000,00	R$ 167.500,00	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	~~Não se Aplica~~	~~Não se Aplica~~
2018	COCIC/2018011	42	Recuperação e encascalhamento de estrada vicinal na zona rural do município de Tanhaçu - BA, para apoio a atividade produtiva.	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 400.000,00	R$ 416.000,00	R$ 400.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2018	COCIC/2018012	43	Objeto: pavimentação asfáltica de ruas na sede do município de Simões Filho-BA.	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 300.000,00	R$ 451.239,86	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
2018	COCIC/2018013	44	Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 250.000,00	R$ 251.000,00	R$ 250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2018	COCIC/2018014	45	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 700.000,00	R$ 703.500,00	R$ 490.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar
2018	COCIC/2018015	46	Pavimentação de Ruas e Vias no município de Sátiro Dias-BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 1.000.000,00	R$ 1.001.100,00	R$ 250.000,00	75%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar
2018	COCIC/2018016	47	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de São Tomé/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 250.000,00	R$ 258.607,22	R$ 250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2018	COCIC/2018017	48	Aquisição de um trator agrícola, de pneus, 4x4, para o município de São Pedro/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 100.000,00	R$ 104.000,00	R$ 100.000,00	100%	Concluído	Concluído	~~Não se Aplica~~	~~Não se Aplica~~
2018	COCIC/2018018	49	Pavimentação em paralelepípedo de ruas na zona urbana do município de São Fernando/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 250.000,00	R$ 250.743,89	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
2018	COCIC/2018019	50	Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 500.000,00	R$ 501.000,00	R$ 500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2018	COCIC/2018020	51	Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 250.000,00	R$ 255.000,00	R$ -	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar
2018	COCIC/2018021	52	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	RN	1	1.1	2029	214S	R$ 250.000,00	R$ 259.298,48	R$ 50.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar
2018	COCIC/2018022	53	Drenagem e pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do município de Santa Cruz/RN	RN	1	1.1	2029	214S	R$ 250.000,00	R$ 258.523,52	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
2018	COCIC/2018023	54	Aquisição de Retroescavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia. Salvador/BA	BA	1	1.1	2029	214S	R$ 802.936,73	R$ 811.047,20	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	~~Não se Aplica~~	~~Não se Aplica~~
2018	COCIC/2018024	55	Pavimentação de ruas do município de Rafael Jambeiro/BA	BA	1	1.1	2029	214S	R$ 300.000,00	R$ 303.000,00	R$ 210.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2018	COCIC/2018025	56	Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	RN	1	1.1	2029	214S	R$ 150.000,00	R$ 151.000,00	R$ 150.000,00	100%	Concluído	Concluído	~~Não se Aplica~~	~~Não se Aplica~~
2018	COCIC/2018026	57	Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 250.000,00	R$ 253.000,00	R$ 175.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar
2018	COCIC/2018027	58	Pavimentação de vias públicas no município de Pindobaçu.	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 500.000,00	R$ 512.500,00	R$ 350.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar
			Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de													

Emendas 3º ciclo 2021

Dados do Projeto					SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orçamentários				Status			
Ano		Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin.	Iniciação	Liberação		
														1ª	2ª	3ª
2018	COCIC/2018028	59	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 250.000,00	R$ 251.031,31	R$ 115.000,00	46%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar
2018	COCIC/2018029	60	Pavimentação em paralelepipedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 500.000,00	R$ 505.000,00	R$ 500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2018	COCIC/2018030	61	Pavimentação em Paralelepípedos em Ruas da Sede do Município de Monte Santo/BA.	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 500.000,00	R$ 505.000,00	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
2018	COCIC/2018031	62	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de vias no Distrito de Maracajaú em Maxaranguape/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 250.000,00	R$ 253.240,98	R$ 50.000,00	73%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar
2018	COCIC/2018032	63	Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal de Mata de São	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 3.000.000,00	R$ 3.425.196,50	R$ 3.000.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2018	COCIC/2018033	64	Pavimentação em Paralelepípedo de ruas na Comunidade Pé de Serra e Construção de Passagem Molhada na Zona Rural do Município de Marcelino Vieira/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 380.000,00	R$ 381.000,00	R$ 380.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2018	COCIC/2018034	65	Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 600.000,00	R$ 602.000,00	R$ 420.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2018	COCIC/2018035	66	Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lagedo Grande no município de Jundiá/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 260.000,00	R$ 267.527,38	R$ 159.708,52	61%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2018	COCIC/2018036	67	Recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município de Jacaraci/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 1.000.000,00	R$ 1.005.000,00	R$ 1.000.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2018	COCIC/2018037	68	Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 2.000.000,00	R$ 2.004.800,00	R$ 2.000.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2018	COCIC/2018038	69	Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajuípe.	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 100.000,00	R$ 101.000,00	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	~~Não se Aplica~~	~~Não se Aplica~~
2018	COCIC/2018039	70	Pavimentação e drenagem superficial de via na Sede do Município de Itajá/RN.	RN	1	1.1	2029	214S	R$ 250.000,00	R$ 256.187,08	R$ 250.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2018	COCIC/2018040	71	Pavimentação em paralelepípedo na sede e distrito de Bento Simões – área urbana – município de Irará/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 500.000,00	R$ 505.000,00	R$ 350.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar
2018	COCIC/2018041	72	Pavimentação em paralelo das diversas ruas do município de Irará/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 500.000,00	R$ 505.000,00	R$ 350.000,00	70%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar
2018	COCIC/2018042	73	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibirataia - BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 1.438.556,24	R$ 1.440.476,88	R$ 1.187.711,25	83%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2018	COCIC/2018043	74	Pavimentação com paralelepípedo em ruas das comunidades de: São Bento, Brejo, Riacho do Cedro e Ibitunane, município de Gentio do Ouro/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 500.000,00	R$ 501.000,00	R$ 100.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar
2018	COCIC/2018044	75	Construção de sistema de abastecimento de água no município de Feira da Mata	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 1.050.000,00	R$ 1.060.500,00	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
2018	COCIC/2018045	76	Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 500.000,00	R$ 500.980,22	R$ 500.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2018	COCIC/2018046	77	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 250.000,00	R$ 252.636,67	R$ -	0%	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar
2018	COCIC/2018047	78	Pavimentação em paralelepípedo de ruas no Município de Cordeiros-BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 300.000,00	R$ 300.400,00	R$ 180.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído

Emendas 3º ciclo 2021

Dados do Projeto					SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orçamentários				Status			
Ano		Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin.	Iniciação	Liberação 1ª	Liberação 2ª	Liberação 3ª
2018	COCIC/2018048	79	Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 1.000.000,00	R$ 1.005.000,00	R$ 500.000,00	50%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar
2018	COCIC/2018049	80	Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubais/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 300.000,00	R$ 301.000,00	R$ 150.000,00	50%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar
2018	COCIC/2018050	81	Aquisição de caminhão trucado com tração 6x2 - equipado com tanque reservatório (pipa) para o município de Caraúbas/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 250.000,00	R$ 332.853,00	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	~~Não se Aplica~~	~~Não se Aplica~~
2018	COCIC/2018051	82	Aquisição de Trator Agricola e Implementos- Texeira de Freitas	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 150.000,00	R$ 156.000,00	R$ 150.000,00	100%	Concluído	Concluído	~~Não se Aplica~~	~~Não se Aplica~~
2018	COCIC/2018052	83	Construção de um polo comercial de artesanato no município de Cachoeirinha - PE	PE	1	1.1	2029	8902	R$ 800.000,00	R$ 832.000,00	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
2018	COCIC/2018053	84	Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barrocão – LOTE 02,zona rural do município de Barreiras. BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 1.000.000,00	R$ 1.100.000,00	R$ 600.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2018	COCIC/2018054	85	Aquisição de Patrulha Mecanizada e de Terraplanagem para o município de Barreiras, estado da Bahia	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 3.000.000,00	R$ 3.065.661,71	R$ 2.810.590,05	94%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2018	COCIC/2018055	86	Pavimentação em Paralelipípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 500.000,00	R$ 501.000,00	R$ 400.000,00	80%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar
2018	COCIC/2018056	87	Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	PB	1	1.1	2029	7K66	R$ 350.000,00	R$ 350.500,00	R$ -	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar
2018	COCIC/2018057	88	Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 500.000,00	R$ 500.500,50	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
2018	COCIC/2018058	89	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 250.000,00	R$ 255.000,00	R$ -	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar
2019	COCIC/2019001	90	Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 250.000,00	R$ 255.996,10	R$ -	65%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar
2019	COCIC/2019002	91	Construção de Mercado Público do município de Sitio Novo/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 300.000,00	R$ 312.836,25	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
2019	COCIC/2019003	92	Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana de GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 250.000,00	R$ 254.836,76	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
2019	COCIC/2019004	93	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de FELIPE GUERRA	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 250.000,00	R$ 257.704,50	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
2019	COCIC/2019005	94	Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 250.000,00	R$ 260.000,00	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
2019	COCIC/2019006	95	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de PARELHAS	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 850.000,00	R$ 855.000,00	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
2019	COCIC/2019007	96	Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Publicas com Construção e Meio Fio no Município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 320.000,00	R$ 393.325,11	R$ 320.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2019	COCIC/2019008	97	Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripar de diversas ruas no bairro Guajiru, município de São Gonçalo do Amarante –	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 291.831,01	R$ 292.431,01	R$ 180.000,00	62%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar

Emendas 3º ciclo 2021

Dados do Projeto					SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orçamentários				Status			
Ano		Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin.	Iniciação	Liberação 1ª	Liberação 2ª	Liberação 3ª
			RN													
2019	COCIC/2019009	98	Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Paratí no município de Assú/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 900.000,00	R$ 1.064.313,40	R$ 900.000,00	100%	Concluído	Concluído	~~Não se Aplica~~	~~Não se Aplica~~
2019	COCIC/2019010	99	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 300.000,00	R$ 301.000,00	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
2019	COCIC/2019011	100	Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R$ 1.700.000,00	R$ 1.707.445,09	R$ 340.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar
2019	COCIC/2019012	101	Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R$ 500.000,00	R$ 607.328,74	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
2019	COCIC/2019013	102	Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 300.000,00	R$ 301.000,00	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
2019	COCIC/2019014	103	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 250.000,00	R$ 254.863,57	R$ 50.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar
2019	COCIC/2019015	104	Pavimentação em paralelepípedo em via pública no povoado de João Vaz, município de Rio de Contas/BA.	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 260.000,00	R$ 265.000,00	R$ 220.086,98	85%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar
2019	COCIC/2019016	105	Aquisição de Implementos agrícolas para desenvolvimento de atividades no Município de Riacho de Santana/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 100.000,00	R$ 101.000,00	R$ 100.000,00	100%	Concluído	Concluído	~~Não se Aplica~~	~~Não se Aplica~~
2019	COCIC/2019017	106	Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapiá no município de Riacho das Almas	PE	1	1.1	2029	7K66	R$ 700.000,00	R$ 703.867,45	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
2019	COCIC/2019018	107	Drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Parelhas.	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 300.000,00	R$ 305.115,05	R$ 60.000,00	20%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
2019	COCIC/2019019	108	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA E UMA RASPADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 300.000,00	R$ 306.000,00	R$ 300.000,00	100%	Concluído	Concluído	~~Não se Aplica~~	~~Não se Aplica~~
2019	COCIC/2019020	109	Pavimentação em CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 2.410.387,00	R$ 3.237.722,30	R$ 2.086.232,20	87%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar
2019	COCIC/2019021	110	Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 2.000.000,00	R$ 2.237.065,05	R$ 1.447.000,00	72%	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar
2019	COCIC/2019022	111	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 250.000,00	R$ 250.999,99	R$ -	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar
2019	COCIC/2019023	112	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	PE	1	1.1	2029	7K66	R$ 1.700.000,00	R$ 1.723.118,36	R$ 340.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar
2019	COCIC/2019024	113	Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 250.000,00	R$ 251.756,73	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
2019	COCIC/2019025	114	Pavimentação em paralelepípedo granítico de ruas no Município de Itapissuma/PE, na área Urbana do Município Itapissuma/PE	PE	1	1.1	2029	7K66	R$ 779.525,47	R$ 810.705,19	R$ 681.404,45	87%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2019	COCIC/2019026	115	Pavimentação em paralelepípedos em vias na area urbana do Município de Itambé/PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R$ 1.000.000,00	R$ 1.015.646,71	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
2019	COCIC/2019027	116	Construção do Mercado Público Municipal - Ipanguaçu/RN.	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 250.000,00	R$ 259.999,21	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
			AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINA AO MUNICÍPIO													

Emendas 3º ciclo 2021

Dados do Projeto					SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orçamentários				Status			
Ano		Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin.	Iniciação	Liberação 1ª	Liberação 2ª	Liberação 3ª
2019	COCIC/2019028	117	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINADA AO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA.	PE	1	1.1	2029	7K66	R$ 1.000.000,00	R$ 1.027.825,85	R$ 820.183,29	82%	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica
2019	COCIC/2019029	118	Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R$ 2.000.000,00	R$ 2.216.519,98	R$ 2.000.000,00	100%	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído
2019	COCIC/2019030	119	Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R$ 1.000.000,00	R$ 1.005.000,00	R$ 400.001,00	40%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar
2019	COCIC/2019031	120	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAÉM/BA	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 300.000,00	R$ 310.000,00	R$ 60.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar
2019	COCIC/2019032	121	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE/PE	PE	1	1.1	2029	7K66	R$ 600.000,00	R$ 602.867,51	R$ 240.000,00	40%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar
2019	COCIC/2019033	122	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R$ 700.000,00	R$ 770.735,13	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
2019	COCIC/2019034	123	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	RN	1	1.1	2029	7K66	R$ 300.000,00	R$ 310.000,00	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
2019	COCIC/2019035	124	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	PE	1	1.1	2029	7K66	R$ 1.000.000,00	R$ 1.010.000,00	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
2019	COCIC/2019036	125	Obra de Pavimentação Asfáltica em (CBUQ),na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-Ba..	BA	1	1.1	2029	7K66	R$ 350.000,00	R$ 378.000,00	R$ 70.000,00	20%	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar
2019	COCIC/2019037	126	Pavimentação em Paralelepípedos, na zona urbana, no município de Jurema PE.	PE	1	1.1	2029	7K66	R$ 800.000,00	R$ 801.000,00	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar
2020	COCIC/2020001	127	Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Uruçuca/Ba	BA	1	1.1	2217	7K66	R$ 500.000,00	R$ 500.500,50	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica
2020	COCIC/2020002	128	CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN	RN	1	1.1	2217	7K66	R$ 250.000,00	R$ 259.039,60	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica
2020	COCIC/2020003	129	Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	RN	1	1.1	2217	7K66	R$ 150.000,00	R$ 152.000,00	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica
2020	COCIC/2020004	130	Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita)	RN	1	1.1	2217	7K66	R$ 450.227,00	R$ 460.000,00	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica
2020	COCIC/2020005	131	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Afonso Bezerra – RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R$ 150.000,00	R$ 154.000,00	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica
2020	COCIC/2020006	132	Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha, Distrito do Guaibim no Município de Valença - BA.	BA	1	1.1	2217	7K66	R$ 1.000.000,00	R$ 1.010.000,00	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica
2020	COCIC/2020007	133	Pavimentação em Paralelepípedo de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Agua Nova/RN.	BA	1	1.1	2217	7K66	R$ 250.000,00	R$ 251.669,05	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica
2020	COCIC/2020008	134	Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R$ 250.000,00	R$ 266.402,82	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica
2020	COCIC/2020009	135	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó – RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R$ 150.000,00	R$ 203.666,66	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica
2020	COCIC/2020010	136	Ampliação e adequação da passagem molhada entre os bairros Paraíba e Soledade no Município de Caicó/RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R$ 250.000,00	R$ 252.000,00	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica

Emendas 3º ciclo 2021

Dados do Projeto					SUDENE		PPA		Dados Financeiros/Orçamentários				Status			
Ano		Nº	Nome	UF	Diretriz	Objetivo	Programa	Ação	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin.	Iniciação	Liberação 1ª	Liberação 2ª	Liberação 3ª
2020	COCIC/2020011	137	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA - RN.	RN	1	1.1	2217	7K66	R$ 300.000,00	R$ 350.167,88	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica
2020	COCIC/2020012	133	Adequação de Estradas Vicinais no **Município de Valença - BA. -** CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	BA	1	1.1	2217	7K66	R$ 1.000.000,00	R$ 1.005.000,00	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica
2021		134	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO (PIÇARRAMENTO), LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE.	CE	1	1.1	2217	7K66	R$ 500.000,00	R$ 501.040,45	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica
2021		135	Pavimentação em pedra tosca com iluminação na zona rural do Município de Piquet Carneiro – Ce.	CE	1	1.1	2217	7K66	R$ 500.000,00	R$ 502.941,95	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica
2021		136	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE	CE	1	1.1	2217	7K66	R$ 500.000,00	R$ 557.053,54	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica
2021		137	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE IBARETAMA-CE.	CE	1	1.1	2217	7K66	R$ 500.000,00	R$ 545.825,61	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica
2021		138	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL NA LOCALIDADE DE FLORESTA E MURIÇOCA DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS - CE	CE	1	1.1	2217	7K66	R$ 500.000,00	R$ 534.343,80	R$ -	0%	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica
								TOTAL	R$ 87.051.430,47	R$ 91.368.416,61	R$ 49.863.199,46					

Fonte: CGDS (Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável)

ANEXO VII - Planos Operativos prioritários, tabulados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da Sudene.

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
1	CGDS/2018 001 (ex PO 6.1)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: Produtor.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Concluído	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGDS
2	CGDS/2018 002 (ex PO 6.2)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: pesquisadores/academia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Paralisado	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGDS
3	CGDS/2018 003 (ex PO 6.4)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Sistema de produção de Palma forrageira e Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma) no semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R$ 255.000,00	R$ 0,00	0%	CGDS
4	CGDS/2018 004 (ex PO 9.1)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BIOÁGUA FAMILIAR - convênio n.º 878341/2018	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Paralisado	R$ 547.369,48	R$ 0,00	0%	CGDS
5	CGDS/2018 005 (ex PO 9.2)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	FORTALECIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES INTEGRADOS AO REÚSO DE ÁGUAS CINZA DOMICILIARES EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NO TERRITÓRIO DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R$ 339.517,00	R$ 339.517,00	100%	CGDS
6	CGDS/2019 001 (ex PO 6.5)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmim para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R$ 206.730,00	R$ 0,00	0%	CGDS
7	CGDS/2020 001 (ex PO 6.6)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estruturação, manutenção e ampliação de unidades multiplicadoras de raquetes-semente de palma forrageira com variedades tolerantes a cochonilha-do-carmim no RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R$ 199.412,43	R$ 0,00	0%	CGDS
8	CGDS/2020 002 (ex PO 6.7)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmim para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R$ 200.000,00	R$ 0,00	0%	CGDS
9	CGDS/2020 004 (ex PO 9.3)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Realização de eventos que demonstrem as ações realizadas, trazendo aproximação institucional e difusão de conhecimento tomando como viés o Programa +GM (temas saúde digital, economia circular, reuso de águas, rede palma, TEC, energias renováveis e sistemas produtivos, etc.)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Concluído	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGDS
10	CGCP/2017 001 (ex PO 2)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Paralisado	R$ 709.382,21	R$ 354.691,11	50%	CGCP
11	COCIC/201 6001 (ex PO 3)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial pelo método convencional de diversas ruas no Município de Passa e Fica/RN - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00	100%	COCIC

ANEXO VII - Planos Operativos prioritários, tabulados segundo Diretrizes e Objetivos Estratégicos da Sudene.

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
12	COCIC/2016002 (ex PO 4)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00	100%	COCIC
13	COCIC/2016003 (ex PO 5)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	100%	COCIC
14	COCIC/2016004 (ex PO 7)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.020.000,00	R$ 813.633,43	80%	COCIC
15	COCIC/2016005 (ex PO 8)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.172.497,00	R$ 926.955,29	79%	COCIC
16	COCIC/2016006 (ex PO 9)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 600.000,00	R$ 559.952,79	93%	COCIC
17	COCIC/2016008 (ex PO 11)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 250.000,00	50%	COCIC
18	COCIC/2016009 (ex PO 12)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Upanema/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	100%	COCIC
19	COCIC/2017001 (ex PO 13)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 1	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 400.000,00	80%	COCIC
20	COCIC/2017002 (ex PO 14)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 500.000,00	50%	COCIC
21	COCIC/2017003 (ex PO 15)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atrasado	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	100%	COCIC
22	COCIC/2017004 (ex PO 16)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 385.000,00	R$ 186.190,69	48%	COCIC
23	COCIC/2017005 (ex PO 17)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atrasado	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	100%	COCIC
24	COCIC/2017006 (ex PO 18)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas povoado de Brejão no município de Jaborandi.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00	100%	COCIC
25	COCIC/2017007 (ex PO 19)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias no Município de Campo Alegre de Lourdes	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Concluído	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00	100%	COCIC

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
26	COCIC/2017008 (ex PO 20)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de Wanderley - Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	100%	COCIC
27	COCIC/2017009 (ex PO 21)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 1.989.238,23	R$ 1.989.238,23	100%	COCIC
28	COCIC/2017010 (ex PO 22)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00	100%	COCIC
29	COCIC/2017011 (ex PO 23)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias do Município de Campo Alegre de Lourdes - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	100%	COCIC
30	COCIC/2017012 (ex PO 26)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, com guias de meio fio pre-moldado e passeios com piso de concreto,nas ruas da sede do município de Matina.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 400.000,00	80%	COCIC
31	COCIC/2017013 (ex PO 29)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 700.855,00	R$ 490.598,50	70%	COCIC
32	COCIC/2017014 (ex PO 30)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de São Miguel	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00	100%	COCIC
33	COCIC/2017015 (ex PO 32)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas no município de Passa e Fica - RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R$ 350.000,00	R$ 350.000,00	100%	COCIC
34	COCIC/2017017 (ex PO 34)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo nos povoados de Brejão e Planalto do município de Jaborandi-Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Concluído	R$ 880.000,00	R$ 880.000,00	100%	COCIC
35	COCIC/2017018 (ex PO 36)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 44.381,79	18%	COCIC
36	COCIC/2017019 (ex PO 37)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 50.000,00	20%	COCIC
37	COCIC/2017020 (ex PO 38)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 264.608,17	R$ 52.921,63	20%	COCIC
38	COCIC/2017021 (ex PO 40)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 390.020,00	R$ 314.012,00	81%	COCIC
39	COCIC/2017022 (ex PO 41)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e Ampliação de Feira Livre - Município de Bom Jesus da Serra	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atrasado	R$ 350.000,00	R$ 350.000,00	100%	COCIC
40	COCIC/2017024 (ex PO 43)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estradas vicinais - Município de Coronel João Pessoa	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.493,20	R$ 210.000,00	84%	COCIC

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
41	COCIC/2017025 (ex PO 44)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS ACESSOS A PRAIA DE REDONDA MUNICIPIO DE ICAPUI	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 700.000,00	70%	COCIC
42	COCIC/2018001 (ex PO 45)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação - Município de Uruçuca	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	100%	COCIC
43	COCIC/2018002 (ex PO 46)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO E GUIAS DE SARJETA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, BAHIA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 200.000,00	80%	COCIC
44	COCIC/2018003 (ex PO 47)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS DE POVOADO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 586.135,00	R$ 586.135,00	100%	COCIC
45	COCIC/2018004 (ex PO 48)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 175.000,00	70%	COCIC
46	COCIC/2018005 (ex PO 49)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
47	COCIC/2018006 (ex PO 50)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 600.000,00	60%	COCIC
48	COCIC/2018007 (ex PO 51)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00	100%	COCIC
49	COCIC/2018008 (ex PO 52)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
50	COCIC/2018009 (ex PO 53)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.755.787,09	R$ 841.262,37	48%	COCIC
51	COCIC/2018010 (ex PO 54)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos. - Cairu/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 150.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
52	COCIC/2018011 (ex PO 55)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	RECUPERAÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TANHAÇU - BA, PARA APOIO A ATIVIDADE PRODUTIVA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00	100%	COCIC
53	COCIC/2018012 (ex PO 56)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 300.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
54	COCIC/2018013 (ex PO 57)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00	100%	COCIC

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
55	COCIC/2018014 (ex PO 58)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 700.000,00	R$ 490.000,00	70%	COCIC
56	COCIC/2018015 (ex PO 59)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas e Vias no município de Sátiro Dias-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 250.000,00	25%	COCIC
57	COCIC/2018016 (ex PO 60)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de São Tomé/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00	100%	COCIC
58	COCIC/2018017 (ex PO 61)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator agrícola, de pneus, 4x4, para o município de São Pedro/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	100%	COCIC
59	COCIC/2018018 (ex PO 62)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
60	COCIC/2018019 (ex PO 63)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	100%	COCIC
61	COCIC/2018020 (ex PO 64)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
62	COCIC/2018021 (ex PO 65)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 50.000,00	20%	COCIC
63	COCIC/2018022 (ex PO 66)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
64	COCIC/2018023 (ex PO 67)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Retroescavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 802.936,73	R$ 0,00	0%	COCIC
65	COCIC/2018024 (ex PO 68)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 300.000,00	R$ 210.000,00	70%	COCIC
66	COCIC/2018025 (ex PO 69)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	100%	COCIC
67	COCIC/2018026 (ex PO 70)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 175.000,00	70%	COCIC
68	COCIC/2018027 (ex PO 71)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 350.000,00	70%	COCIC
69	COCIC/2018028 (ex PO 72)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e rtrenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 115.000,00	46%	COCIC

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
70	COCIC/2018029 (ex PO 73)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	100%	COCIC
71	COCIC/2018030 (ex PO 74)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos em Ruas da Sede do Município de Monte Santo/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Paralisado	R$ 500.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
72	COCIC/2018031 (ex PO 75)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de vias no Distrito de Maracajaú em Maxaranguape/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 50.000,00	20%	COCIC
73	COCIC/2018032 (ex PO 76)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00	100%	COCIC
74	COCIC/2018033 (ex PO 77)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de ruas na Comunidade Pé de Serra e Construção de Passagem Molhada na Zona Rural do Município de Marcelino Vieira/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 380.000,00	R$ 380.000,00	100%	COCIC
75	COCIC/2018034 (ex PO 78)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/Ba	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 600.000,00	R$ 420.000,00	70%	COCIC
76	COCIC/2018035 (ex PO 79)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lagedo Grande no município de Jundiá/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 260.000,00	R$ 159.708,52	61%	COCIC
77	COCIC/2018036 (ex PO 80)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	100%	COCIC
78	COCIC/2018037 (ex PO 81)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00	100%	COCIC
79	COCIC/2018038 (ex PO 82)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajuípe.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 100.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
80	COCIC/2018039 (ex PO 83)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de via na Sede do Município de Itajá/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00	100%	COCIC
81	COCIC/2018040 (ex PO 84)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE E DISTRITO DE BENTO SIMÕES – ÁREA URBANA – MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 350.000,00	70%	COCIC
82	COCIC/2018041 (ex PO 85)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 350.000,00	70%	COCIC

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
83	COCIC/2018042 (ex PO 86)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibirataia - BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.438.556,24	R$ 1.187.711,25	83%	COCIC
84	COCIC/2018043 (ex PO 87)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DAS COMUNIDADES DE: SÃO BENTO, BREJO, RIACHO DO CEDRO E IBITUNANE, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 100.000,00	20%	COCIC
85	COCIC/2018044 (ex PO 88)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.050.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
86	COCIC/2018045 (ex PO 89)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	100%	COCIC
87	COCIC/2018046 (ex PO 90)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
88	COCIC/2018047 (ex PO 91)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de ruas no Município de Cordeiros-BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 300.000,00	R$ 180.000,00	60%	COCIC
89	COCIC/2018048 (ex PO 92)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 500.000,00	50%	COCIC
90	COCIC/2018049 (ex PO 93)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubais/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 300.000,00	R$ 150.000,00	50%	COCIC
91	COCIC/2018050 (ex PO 94)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO COM TRAÇÃO 6X2 - EQUIPADO COM TANQUE RESERVATÓRIO (PIPA) PARA O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
92	COCIC/2018051 (ex PO 95)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos-Texeira de Freitas	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	100%	COCIC
93	COCIC/2018052 (ex PO 96)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE UM POLO COMERCIAL DE ARTESANATO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA - PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R$ 800.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
94	COCIC/2018053 (ex PO 97)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barrocão – LOTE 02,zona rural do município de Barreiras. BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 600.000,00	60%	COCIC
95	COCIC/2018054 (ex PO 98)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Patrulha Mecanizada e de Terraplanagem para o município de Barreiras, estado da Bahia	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 3.000.000,00	R$ 2.810.590,05	94%	COCIC
96	COCIC/2018055 (ex PO 99)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelipípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 400.000,00	80%	COCIC

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
97	COCIC/2018056 (ex PO 100)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 350.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
98	COCIC/2018057 (ex PO 101)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
99	COCIC/2018058 (ex PO 102)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-Ba.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
100	COCIC/2019001 (ex PO 103)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
101	COCIC/2019002 (ex PO 104)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Mercado Público do município de Sítio Novo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 300.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
102	COCIC/2019003 (ex PO 105)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
103	COCIC/2019004 (ex PO 106)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
104	COCIC/2019005 (ex PO 107)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
105	COCIC/2019006 (ex PO 108)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de PARELHAS	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 850.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
106	COCIC/2019007 (ex PO 109)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Publicas com Construção e Meio Fio no Município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 320.000,00	R$ 320.000,00	100%	COCIC
107	COCIC/2019008 (ex PO 110)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripar de diversas ruas no bairro Guajiru, município de São Gonçalo do Amarante – RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 291.831,01	R$ 180.000,00	62%	COCIC
108	COCIC/2019009 (ex PO 111)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Paraíi no município de Assú/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 900.000,00	R$ 900.000,00	100%	COCIC
109	COCIC/2019010 (ex PO 112)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e rrenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 300.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
110	COCIC/2019011 (ex PO 113)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.700.000,00	R$ 340.000,00	20%	COCIC

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
111	COCIC/2019012 (ex PO 114)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
112	COCIC/2019013 (ex PO 115)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 300.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
113	COCIC/2019014 (ex PO 116)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 50.000,00	20%	COCIC
114	COCIC/2019015 (ex PO 117)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo em via pública no povoado de João Vaz, município de Rio de Contas/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 260.000,00	R$ 220.086,98	85%	COCIC
115	COCIC/2019016 (ex PO 118)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Implementos agrícolas para desenvolvimento de atividades no Município de Riacho de Santana/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	100%	COCIC
116	COCIC/2019017 (ex PO 119)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapiá no município de Riacho das Almas	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 700.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
117	COCIC/2019018 (ex PO 120)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Parelhas.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 300.000,00	R$ 60.000,00	20%	COCIC
118	COCIC/2019019 (ex PO 121)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA E UMA RASPADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	100%	COCIC
119	COCIC/2019020 (ex PO 122)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 2.410.387,00	R$ 2.086.232,20	87%	COCIC
120	COCIC/2019021 (ex PO 123)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 2.000.000,00	R$ 1.447.000,00	72%	COCIC
121	COCIC/2019022 (ex PO 124)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
122	COCIC/2019023 (ex PO 125)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.700.000,00	R$ 340.000,00	20%	COCIC
123	COCIC/2019024 (ex PO 126)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
124	COCIC/2019025 (ex PO 127)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo granítico de ruas no Município de Itapissuma/PE, na área Urbana do Município Itapissuma/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 779.525,47	R$ 681.404,45	87%	COCIC
125	COCIC/2019026 (ex PO 128)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias na area urbana do Município de Itambé/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
126	COCIC/2019027 (ex PO 129)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção do Mercado Público Municipal - Ipanguaçu/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
127	COCIC/2019028 (ex PO 130)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINA AO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 820.183,29	82%	COCIC
128	COCIC/2019029 (ex PO 131)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00	100%	COCIC
129	COCIC/2019030 (ex PO 132)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 400.001,00	40%	COCIC
130	COCIC/2019031 (ex PO 133)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAÉM/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 300.000,00	R$ 60.000,00	20%	COCIC
131	COCIC/2019032 (ex PO 134)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 600.000,00	R$ 240.000,00	40%	COCIC
132	COCIC/2019033 (ex PO 135)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 700.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
133	COCIC/2019034 (ex PO 136)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 300.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
134	COCIC/2019035 (ex PO 137)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
135	COCIC/2019036 (ex PO 138)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Obra de Pavimentação Asfáltica em (CBUQ),na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 350.000,00	R$ 70.000,00	20%	COCIC
136	COCIC/2019037 (ex PO 139)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos, na zona urbana, no município de Jurema PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 800.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
137	COCIC/2020001 (ex PO 140)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Uruçuca/Ba	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
138	COCIC/2020002 (ex PO 141)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
139	COCIC/2020003 (ex PO 142)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 150.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
140	COCIC/2020004 (ex PO 143)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 450.227,00	R$ 0,00	0%	COCIC

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
141	COCIC/2020005 (ex PO 144)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Afonso Bezerra – RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 150.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
142	COCIC/2020006 (ex PO 145)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha, Distrito do Guaibim no Município de Valença - BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
143	COCIC/2020007 (ex PO 146)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Agua Nova/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
144	COCIC/2020008 (ex PO 147)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
145	COCIC/2020009 (ex PO 148)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó – RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 150.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
146	COCIC/2020010 (ex PO 149)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação e adequação da passagem molhada entre os bairros Paraíba e Soledade no Município de Caicó/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
147	COCIC/2020011 (ex PO 150)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA - RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 300.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
148	COCIC/2020012 (ex PO 151)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA. - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
			Total do Objetivo 1.1						**86.845.508,26**	**50.557.407,57**	**58%**	
149	CGEP/2018001 (Ex PO 4)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva	Fortalecer as agroindústrias familiares nos municípios do Consórcio Portal do Sertão, através da monitorização dos seus produtos alimentícios.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 199.399,80	R$ 0,00	0%	CGEP
			Total do Objetivo 1.2						**199.399,80**	**0,00**	**0%**	
150	CGDS/2020003 (ex PO 8)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Elaboração de Proposta de Reformulação do "+ Gestão Municipal"	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Concluído	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGDS
			Total do Objetivo 1.5						R$ 0,00	R$ 0,00		
			TOTAL DA DIRETRIZ 1						**87.044.908,06**	**50.557.407,57**	**58%**	
			TOTAL GERAL						**87.044.908,06**	**50.557.407,57**	**58,1%**	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional.
Referência dos dados: 3º Ciclo 2021
Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, correspondem a mais de um exercício.
Posição: Setembro/2021

ANEXO VIII - Planos Operativos prioritários, tabulados segundo a Programação do PPA.

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
1	CGCP/2017001 (ex PO 2)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento - Feira de Santana	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Plano Orçamentário 0004 - Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial	Paralisado	R$ 709.382,21	R$ 354.691,11	50%	CGCP
				Total da Ação 20WQ					**709.382,21**	**354.691,11**	**0%**	
2	COCIC/2016001 (ex PO 3)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial pelo método convencional de diversas ruas no Município de Passa e Fica/RN - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00	100%	COCIC
3	COCIC/2016002 (ex PO 4)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00	100%	COCIC
4	COCIC/2016003 (ex PO 5)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	100%	COCIC
5	COCIC/2016004 (ex PO 7)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.020.000,00	R$ 813.633,43	80%	COCIC
6	COCIC/2016005 (ex PO 8)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.172.497,00	R$ 926.955,29	79%	COCIC
7	COCIC/2016006 (ex PO 9)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 600.000,00	R$ 559.952,79	93%	COCIC
8	COCIC/2016008 (ex PO 11)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 250.000,00	50%	COCIC
9	COCIC/2016009 (ex PO 12)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Upanema/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	100%	COCIC
10	COCIC/2017006 (ex PO 18)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas povoado de Brejão no município de Jaborandi.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00	100%	COCIC
11	COCIC/2017012 (ex PO 26)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, com guias de meio fio pre-moldado e passeios com piso de concreto,nas ruas da sede do município de Matina.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 400.000,00	80%	COCIC
12	COCIC/2017013 (ex PO 29)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 700.855,00	R$ 490.598,50	70%	COCIC

ANEXO VIII - Planos Operativos prioritários, tabulados segundo a Programação do PPA.

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
13	COCIC/2017014 (ex PO 30)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de São Miguel	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00	100%	COCIC
14	COCIC/2017015 (ex PO 32)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas no município de Passa e Fica - RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R$ 350.000,00	R$ 350.000,00	100%	COCIC
15	COCIC/2017018 (ex PO 36)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 44.381,79	18%	COCIC
16	COCIC/2017019 (ex PO 37)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 50.000,00	20%	COCIC
17	COCIC/2017020 (ex PO 38)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 264.608,17	R$ 52.921,63	20%	COCIC
18	COCIC/2017024 (ex PO 43)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estradas vicinais - Município de Coronel João Pessoa	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.493,20	R$ 210.000,00	84%	COCIC
19	COCIC/2017025 (ex PO 44)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS ACESSOS A PRAIA DE REDONDA MUNICIPIO DE ICAPUI	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 700.000,00	70%	COCIC
20	COCIC/2018001 (ex PO 45)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação - Município de Uruçuca	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	100%	COCIC
21	COCIC/2018002 (ex PO 46)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO E GUIAS DE SARJETA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, BAHIA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 200.000,00	80%	COCIC
22	COCIC/2018006 (ex PO 50)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 600.000,00	60%	COCIC
23	COCIC/2018007 (ex PO 51)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00	100%	COCIC
24	COCIC/2018008 (ex PO 52)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC

ANEXO VIII - Planos Operativos prioritários, tabulados segundo a Programação do PPA.

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
25	COCIC/2018009 (ex PO 53)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.755.787,09	R$ 841.262,37	48%	COCIC
26	COCIC/2018010 (ex PO 54)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos. - Cairu/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 150.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
27	COCIC/2018011 (ex PO 55)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	RECUPERAÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TANHAÇU - BA, PARA APOIO A ATIVIDADE PRODUTIVA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00	100%	COCIC
28	COCIC/2018012 (ex PO 56)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 300.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
29	COCIC/2018013 (ex PO 57)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00	100%	COCIC
30	COCIC/2018014 (ex PO 58)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 700.000,00	R$ 490.000,00	70%	COCIC
31	COCIC/2018015 (ex PO 59)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas e Vias no município de Sátiro Dias-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 250.000,00	25%	COCIC
32	COCIC/2018016 (ex PO 60)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de São Tomé/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00	100%	COCIC
33	COCIC/2018017 (ex PO 61)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator agrícola, de pneus, 4x4, para o município de São Pedro/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	100%	COCIC
34	COCIC/2018018 (ex PO 62)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
35	COCIC/2018019 (ex PO 63)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	100%	COCIC
36	COCIC/2018020 (ex PO 64)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC

ANEXO VIII - Planos Operativos prioritários, tabulados segundo a Programação do PPA.

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
37	COCIC/2018026 (ex PO 70)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 175.000,00	70%	COCIC
38	COCIC/2018027 (ex PO 71)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE PINDOBAÇU	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 350.000,00	70%	COCIC
39	COCIC/2018028 (ex PO 72)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 115.000,00	46%	COCIC
40	COCIC/2018029 (ex PO 73)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepipedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	100%	COCIC
41	COCIC/2018030 (ex PO 74)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos em Ruas da Sede do Município de Monte Santo/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Paralisado	R$ 500.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
42	COCIC/2018031 (ex PO 75)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de vias no Distrito de Maracajaú em Maxaranguape/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 50.000,00	20%	COCIC
43	COCIC/2018032 (ex PO 76)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 3.000.000,00	R$ 3.000.000,00	100%	COCIC
44	COCIC/2018033 (ex PO 77)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de ruas na Comunidade Pé de Serra e Construção de Passagem Molhada na Zona Rural do Município de Marcelino Vieira/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 380.000,00	R$ 380.000,00	100%	COCIC
45	COCIC/2018034 (ex PO 78)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/Ba	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 600.000,00	R$ 420.000,00	70%	COCIC
46	COCIC/2018035 (ex PO 79)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lagedo Grande no município de Jundiá/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 260.000,00	R$ 159.708,52	61%	COCIC
47	COCIC/2018036 (ex PO 80)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	100%	COCIC
48	COCIC/2018037 (ex PO 81)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00	100%	COCIC

ANEXO VIII - Planos Operativos prioritários, tabulados segundo a Programação do PPA.

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
49	COCIC/2018038 (ex PO 82)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajuípe.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 100.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
50	COCIC/2018040 (ex PO 84)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE E DISTRITO DE BENTO SIMÕES – ÁREA URBANA – MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 350.000,00	70%	COCIC
51	COCIC/2018041 (ex PO 85)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 350.000,00	70%	COCIC
52	COCIC/2018042 (ex PO 86)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibirataia - BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.438.556,24	R$ 1.187.711,25	83%	COCIC
53	COCIC/2018043 (ex PO 87)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DAS COMUNIDADES DE: SÃO BENTO, BREJO, RIACHO DO CEDRO E BITUNANE, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 100.000,00	20%	COCIC
54	COCIC/2018044 (ex PO 88)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.050.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
55	COCIC/2018045 (ex PO 89)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	100%	COCIC
56	COCIC/2018046 (ex PO 90)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
57	COCIC/2018047 (ex PO 91)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de ruas no Município de Cordeiros-BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 300.000,00	R$ 180.000,00	60%	COCIC
58	COCIC/2018048 (ex PO 92)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 500.000,00	50%	COCIC
59	COCIC/2018049 (ex PO 93)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubais/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 300.000,00	R$ 150.000,00	50%	COCIC
60	COCIC/2018050 (ex PO 94)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO COM TRAÇÃO 6X2 - EQUIPADO COM TANQUE RESERVATÓRIO (PIPA) PARA O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC

ANEXO VIII - Planos Operativos prioritários, tabulados segundo a Programação do PPA.

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
61	COCIC/2018051 (ex PO 95)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos-Texeira de Freitas	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	100%	COCIC
62	COCIC/2018053 (ex PO 97)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barrocão – LOTE 02,zona rural do município de Barreiras. BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 600.000,00	60%	COCIC
63	COCIC/2018054 (ex PO 98)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Patrulha Mecanizada e de Terraplanagem para o município de Barreiras, estado da Bahia	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 3.000.000,00	R$ 2.810.590,05	94%	COCIC
64	COCIC/2018055 (ex PO 99)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 400.000,00	80%	COCIC
65	COCIC/2018056 (ex PO 100)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 350.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
66	COCIC/2018057 (ex PO 101)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Rispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
67	COCIC/2018058 (ex PO 102)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataíba, no município de Água Fria-Ba.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
68	COCIC/2019001 (ex PO 103)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
69	COCIC/2019002 (ex PO 104)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Mercado Público do município de Sitio Novo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 300.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
70	COCIC/2019003 (ex PO 105)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
71	COCIC/2019004 (ex PO 106)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
72	COCIC/2019005 (ex PO 107)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC

ANEXO VIII - Planos Operativos prioritários, tabulados segundo a Programação do PPA.

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
73	COCIC/2019006 (ex PO 108)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de PARELHAS	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 850.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
74	COCIC/2019007 (ex PO 109)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Publicas com Construção e Meio Fio no Município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 320.000,00	R$ 320.000,00	100%	COCIC
75	COCIC/2019008 (ex PO 110)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripar de diversas ruas no bairro Guajiru, município de São Gonçalo do Amarante – RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 291.831,01	R$ 180.000,00	62%	COCIC
76	COCIC/2019009 (ex PO 111)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Paratí no município de Assú/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 900.000,00	R$ 900.000,00	100%	COCIC
77	COCIC/2019010 (ex PO 112)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 300.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
78	COCIC/2019011 (ex PO 113)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.700.000,00	R$ 340.000,00	20%	COCIC
79	COCIC/2019012 (ex PO 114)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
80	COCIC/2019013 (ex PO 115)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 300.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
81	COCIC/2019014 (ex PO 116)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 50.000,00	20%	COCIC
82	COCIC/2019015 (ex PO 117)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo em via pública no povoado de João Vaz, município de Rio de Contas/BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 260.000,00	R$ 220.086,98	85%	COCIC
83	COCIC/2019016 (ex PO 118)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Implementos agrícolas para desenvolvimento de atividades no Município de Riacho de Santana/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	100%	COCIC
84	COCIC/2019017 (ex PO 119)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapiá no município de Riacho das Almas	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 700.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC

ANEXO VIII - Planos Operativos prioritários, tabulados segundo a Programação do PPA.

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
85	COCIC/2019018 (ex PO 120)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Parelhas.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 300.000,00	R$ 60.000,00	20%	CODC
86	COCIC/2019019 (ex PO 121)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA E UMA RASPADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 300.000,00	R$ 300.000,00	100%	CODC
87	COCIC/2019020 (ex PO 122)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 2.410.387,00	R$ 2.086.232,20	87%	CODC
88	COCIC/2019021 (ex PO 123)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 2.000.000,00	R$ 1.447.000,00	72%	CODC
89	COCIC/2019022 (ex PO 124)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA-RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	CODC
90	COCIC/2019023 (ex PO 125)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.700.000,00	R$ 340.000,00	20%	CODC
91	COCIC/2019024 (ex PO 126)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	CODC
92	COCIC/2019025 (ex PO 127)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo granítico de ruas no Município de Itapissuma/PE, na área Urbana do Município Itapissuma/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 779.525,47	R$ 681.404,45	87%	CODC
93	COCIC/2019026 (ex PO 128)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em vias na area urbana do Município de Itambé/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	0%	CODC
94	COCIC/2019027 (ex PO 129)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção do Mercado Público Municipal - Ipanguaçu/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	CODC
95	COCIC/2019028 (ex PO 130)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINA AO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 820.183,29	82%	CODC
96	COCIC/2019029 (ex PO 131)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00	100%	CODC

ANEXO VIII - Planos Operativos prioritários, tabulados segundo a Programação do PPA.

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
97	COCIC/2019030 (ex PO 132)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 400.001,00	40%	COCIC
98	COCIC/2019031 (ex PO 133)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAÉM/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 300.000,00	R$ 60.000,00	20%	COCIC
99	COCIC/2019032 (ex PO 134)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 600.000,00	R$ 240.000,00	40%	COCIC
100	COCIC/2019033 (ex PO 135)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 700.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
101	COCIC/2019034 (ex PO 136)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 300.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
102	COCIC/2019035 (ex PO 137)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
103	COCIC/2019036 (ex PO 138)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Obra de Pavimentação Asfáltica em (CBUQ),na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 350.000,00	R$ 70.000,00	20%	COCIC
104	COCIC/2019037 (ex PO 139)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedos, na zona urbana, no município de Jurema PE.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 800.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
105	COCIC/20 20001 (ex PO 140)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Uruçuca/Ba	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
106	COCIC/20 20002 (ex PO 141)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
107	COCIC/20 20003 (ex PO 142)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 150.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
108	COCIC/20 20004 (ex PO 143)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 450.227,00	R$ 0,00	0%	COCIC

ANEXO VIII - Planos Operativos prioritários, tabulados segundo a Programação do PPA.

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
109	COCIC/2020005 (ex PO 144)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Afonso Bezerra – RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 150.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
110	COCIC/2020006 (ex PO 145)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha, Distrito do Guaibim no Município de Valença - BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
111	COCIC/2020007 (ex PO 146)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Água Nova/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
112	COCIC/2020008 (ex PO 147)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
113	COCIC/2020009 (ex PO 148)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó – RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 150.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
114	COCIC/2020010 (ex PO 149)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação e adequação da passagem molhada entre os bairros Paraíba e Soledade no Município de Caicó/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
115	COCIC/2020011 (ex PO 150)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA - RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 300.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
116	COCIC/2020012 (ex PO 151)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA. - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
			Total da Ação 7k66						**70.604.767,18**	**39.422.623,54**	**56%**	
117	CGEP/2018001 (Ex PO 4)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.2. Fortalecer a infraestrutura regional, inclusive aquela voltada para a inclusão na cadeia produtiva	Fortalecer as agroindústrias familiares nos municípios do Consórcio Portal do Sertão, através da monitorização dos seus produtos alimentícios.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 199.399,80	R$ 0,00	0%	CGEP
118	COCIC/2017001 (ex PO 13)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 1	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 400.000,00	80%	COCIC
119	COCIC/2017002 (ex PO 14)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 500.000,00	50%	COCIC
120	COCIC/2017003 (ex PO 15)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atrasado	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	100%	COCIC

ANEXO VIII - Planos Operativos prioritários, tabulados segundo a Programação do PPA.

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
121	COCIC/2017004 (ex PO 16)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 385.000,00	R$ 186.190,69	48%	CODC
122	COCIC/2017005 (ex PO 17)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atrasado	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	100%	CODC
123	COCIC/2017007 (ex PO 19)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias no Município de Campo Alegre de Lourdes	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Concluído	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00	100%	CODC
124	COCIC/2017008 (ex PO 20)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de Wanderley - Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	100%	CODC
125	COCIC/2017009 (ex PO 21)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 1.989.238,23	R$ 1.989.238,23	100%	CODC
126	COCIC/2017010 (ex PO 22)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00	100%	CODC
127	COCIC/2017011 (ex PO 23)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias do Município de Campo Alegre de Lourdes - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	100%	CODC
128	COCIC/2017017 (ex PO 34)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo nos povoados de Brejão e Planalto do município de Jaborandi-Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Concluído	R$ 880.000,00	R$ 880.000,00	100%	CODC
129	COCIC/2017021 (ex PO 40)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 390.020,00	R$ 314.012,00	81%	CODC
130	COCIC/2017022 (ex PO 41)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e Ampliação de Feira Livre - Município de Bom Jesus da Serra	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atrasado	R$ 350.000,00	R$ 350.000,00	100%	CODC
131	COCIC/2018003 (ex PO 47)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS DE POVOADO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 586.135,00	R$ 586.135,00	66%	CODC
132	COCIC/2018004 (ex PO 48)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA-RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 175.000,00	70%	CODC

ANEXO VIII - Planos Operativos prioritários, tabulados segundo a Programação do PPA.

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
133	COCIC/2018005 (ex PO 49)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
134	COCIC/2018021 (ex PO 65)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 50.000,00	20%	COCIC
135	COCIC/2018022 (ex PO 66)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
136	COCIC/2018023 (ex PO 67)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Retroescavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 802.936,73	R$ 0,00	0%	COCIC
137	COCIC/2018024 (ex PO 68)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 300.000,00	R$ 210.000,00	70%	COCIC
138	COCIC/2018025 (ex PO 69)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	100%	COCIC
139	COCIC/2018039 (ex PO 83)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de via na Sede do Município de Itajá/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00	100%	COCIC
			Total da Ação 214S						**13.182.729,76**	**10.440.575,92**	**79%**	
140	CGDS/2018001 (ex PO 6.1)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: Produtor.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Concluído	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGDS
141	CGDS/2018002 (ex PO 6.2)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: pesquisadores/academia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Paralisado	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGDS
142	CGDS/2018003 (ex PO 6.4)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Sistema de produção de Palma forrageira e Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma) no semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R$ 255.000,00	R$ 0,00	-	CGDS
143	CGDS/2019001 (ex PO 6.5)	2019	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmim para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R$ 206.730,00	R$ 0,00	-	CGDS
144	CGDS/2020001 (ex PO 6.6)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Estruturação, manutenção e ampliação de unidades multiplicadoras de raquetes-semente de palma forrageira com variedades tolerantes a cochonilha-do-carmim no RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R$ 199.412,43	R$ 0,00		CGDS

ANEXO VIII - Planos Operativos prioritários, tabulados segundo a Programação do PPA.

SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
145	CGDS/2020002 (ex PO 6.7)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmim para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Em Andamento	R$ 200.000,00	R$ 0,00		CGDS
146	CGDS/2020004 (ex PO 9.3)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Realização de eventos que demonstrem as ações realizadas, trazendo aproximação institucional e difusão de conhecimento tomando como viés o Programa +GM (temas: saúde digital, economia circular, reuso de águas, rede palma, TEC, energias renováveis e sistemas produtivos, etc.)	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	Concluído	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGDS
			Total da Ação 8340						**861.142,43**	**0,00**	**0%**	
147	CGDS/2018004 (ex PO 9.1)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	BIOÁGUA FAMILIAR - convênio nº 878341/2018	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Paralisado	R$ 547.369,48	R$ 0,00	-	CGDS
148	CGDS/2018005 (ex PO 9.2)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	FORTALECIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES INTEGRADOS AO REUSO DE ÁGUAS CINZA DOMICILIARES EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NO TERRITÓRIO DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R$ 339.517,00	R$ 339.517,00	104%	CGDS
149	COCIC/2018052 (ex PO 96)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CONSTRUÇÃO DE UM POLO COMERCIAL DE ARTESANATO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA - PE	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	Em Andamento	R$ 800.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
			Total da Ação 8902						**1.686.886,48**	**339.517,00**	20%	
150	CGDS/2020003 (ex PO 8)	2020	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.5. Fortalecer as administrações públicas	Elaboração de Proposta de Reformulação do "+ Gestão Municipal"	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	Concluído	R$ 0,00	R$ 0,00	-	CGDS
			Total da Ação 8917						**0,00**	**0,00**		
			TOTAL DO PROGRAMA 2217						**87.044.908,06**	**50.557.407,57**	**58%**	
			TOTAL GERAL						**87.044.908,06**	**50.557.407,57**	**58,1%**	

Fontes: Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas, Diretoria de Gestão de Fundos, Incentivos e Atração de Investimentos, Diretoria de Administração e Coordenação-Geral de Gestão Institucional
Referência dos dados: 3º Ciclo 2021
Nota: Tanto os valores previstos nos projetos, como os liberados, correspondem a mais de um exercício.
Posição: Setembro/2021

ANEXO IX - Planos Operativos prioritários, tabulados segundo Unidades Administrativa da Sudene.
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
1	COCIC/ 201600 1 (ex PO 3)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e Drenagem Superficial pelo método convencional de diversas ruas no Município de Passa e Fica/RN - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00	100%	COCIC
2	COCIC/ 201600 2 (ex PO 4)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00	100%	COCIC
3	COCIC/ 201600 3 (ex PO 5)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	100%	COCIC
4	COCIC/ 201600 4 (ex PO 7)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.020.000,00	R$ 813.633,43	80%	COCIC
5	COCIC/ 201600 5 (ex PO 8)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.172.497,00	R$ 926.955,29	79%	COCIC
6	COCIC/ 201600 6 (ex PO 9)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 600.000,00	R$ 559.952,79	93%	COCIC
7	COCIC/ 201600 8 (ex PO 11)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 250.000,00	50%	COCIC
8	COCIC/ 201600 9 (ex PO 12)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de diversas ruas no município de Upanema/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Atrasado	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	100%	COCIC
9	COCIC/ 201700 1 (ex PO 13)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 1	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 400.000,00	80%	COCIC
10	COCIC/ 201700 2 (ex PO 14)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 500.000,00	50%	COCIC
11	COCIC/ 201700 3 (ex PO 15)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atrasado	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	100%	COCIC
12	COCIC/ 201700 4 (ex PO 16)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 385.000,00	R$ 186.190,69	48%	COCIC

ANEXO IX - Planos Operativos prioritários, tabulados segundo Unidades Administrativa da Sudene.
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
13	COCIC/ 2017005 (ex PO 17)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atrasado	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	100%	COCIC
14	COCIC/ 2017006 (ex PO 18)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo de diversas ruas povoado de Brejão no município de Jaborandi.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00	100%	COCIC
15	COCIC/ 2017007 (ex PO 19)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias no Município de Campo Alegre de Lourdes	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Concluído	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00	100%	COCIC
16	COCIC/ 2017008 (ex PO 20)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de Wanderley - Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	100%	COCIC
17	COCIC/ 2017009 (ex PO 21)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 1.989.238,23	R$ 1.989.238,23	100%	COCIC
18	COCIC/ 2017010 (ex PO 22)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00	100%	COCIC
19	COCIC/ 2017011 (ex PO 23)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de vias do Município de Campo Alegre de Lourdes - 2	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	100%	COCIC
20	COCIC/ 2017012 (ex PO 26)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, com guias de meio fio pre-moldado e passeios com piso de concreto,nas ruas da sede do município de Matina.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 500.000,00	R$ 400.000,00	80%	COCIC
21	COCIC/ 2017013 (ex PO 29)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 700.855,00	R$ 490.598,50	70%	COCIC
22	COCIC/ 2017014 (ex PO 30)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas Município de São Miguel	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00	100%	COCIC
23	COCIC/ 2017015 (ex PO 32)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas no município de Passa e Fica - RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Concluído	R$ 350.000,00	R$ 350.000,00	100%	COCIC

ANEXO IX - Planos Operativos prioritários, tabulados segundo Unidades Administrativa da Sudene.
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
24	COCIC/201701 7 (ex PO 34)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em paralelepípedo nos povoados de Brejão e Planalto do município de Jaborandi-Bahia.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Concluído	R$ 880.000,00	R$ 880.000,00	100%	COCIC
25	COCIC/201701 8 (ex PO 36)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 44.381,79	18%	COCIC
26	COCIC/201701 9 (ex PO 37)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 50.000,00	20%	COCIC
27	COCIC/201702 0 (ex PO 38)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de ruas Município de Extremoz	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 264.608,17	R$ 52.921,63	20%	COCIC
28	COCIC/201702 1 (ex PO 40)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 390.020,00	R$ 314.012,00	81%	COCIC
29	COCIC/201702 2 (ex PO 41)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Reforma e Ampliação de Feira Livre - Município de Bom Jesus da Serra	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Atrasado	R$ 350.000,00	R$ 350.000,00	100%	COCIC
30	COCIC/201702 4 (ex PO 43)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de estradas vicinais - Município de Coronel João Pessoa	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.493,20	R$ 210.000,00	84%	COCIC
31	COCIC/201702 5 (ex PO 44)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS ACESSOS A PRAIA DE REDONDA MUNICIPIO DE ICAPUI	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 700.000,00	70%	COCIC
32	COCIC/201800 1 (ex PO 45)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação - Município de Uruçuca	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	100%	COCIC
33	COCIC/201800 2 (ex PO 46)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO E GUIAS DE SARJETA NA ZONA URBANA NO MUNICIPIO DE PF DE SERRA, BAHIA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 200.000,00	80%	COCIC
34	COCIC/201800 3 (ex PO 47)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS DE POVOADO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 586.135,00	R$ 586.135,00	100%	COCIC
35	COCIC/201800 4 (ex PO 48)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 175.000,00	70%	COCIC

ANEXO IX - Planos Operativos prioritários, tabulados segundo Unidades Administrativa da Sudene.
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL
3º CICLO DE MONITORAMENTO DE 2021

Nº de Ordem	Nº PO	Ano de Priorização	Diretriz	Objetivo	Projeto	Programa PPA (Código)	Ação PPA (Código)	Status	Total SUDENE (a)	Total liberado (b)	(b/a) (%)	Unidade
36	COCIC/ 2018005 (ex PO 49)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
37	COCIC/ 2018006 (ex PO 50)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 600.000,00	60%	COCIC
38	COCIC/ 2018007 (ex PO 51)	2017	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00	100%	COCIC
39	COCIC/ 2018008 (ex PO 52)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
40	COCIC/ 2018009 (ex PO 53)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.755.787,09	R$ 841.262,37	48%	COCIC
41	COCIC/ 2018010 (ex PO 54)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Aquisição de Trator Agrícola e Implementos. - Cairu/BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 150.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
42	COCIC/ 2018011 (ex PO 55)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	RECUPERAÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IANHAÇU - BA, PARA APOIO A ATIVIDADE PRODUTIVA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00	100%	COCIC
43	COCIC/ 2018012 (ex PO 56)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 300.000,00	R$ 0,00	0%	COCIC
44	COCIC/ 2018013 (ex PO 57)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 250.000,00	R$ 250.000,00	100%	COCIC
45	COCIC/ 2018014 (ex PO 58)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 700.000,00	R$ 490.000,00	70%	COCIC
46	COCIC/ 2018015 (ex PO 59)	2018	1. Promover a competitividade sistêmica da base produtiva do Nordeste	1.1. Aumentar a Competitividade do setor produtivo, fortalecendo cadeias e arranjos produtivos, estimulando a inovação, articulando-os a investimentos estruturadores	Pavimentação de Ruas e Vias no município de Sátiro Dias-BA	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	Em Andamento	R$ 1.000.000,00	R$ 250.000,00	25%	COCIC
