RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA DA SUDENE

2º Ciclo de Monitoramento
e Avaliação 2022

SUPERINTENDÊNCIA DO
**DESENVOLVIMENTO
DO NORDESTE**

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO INSTITUCIONAL

Relatório de Acompanhamento da Execução Programática da Sudene
2º Ciclo de Monitoramento e Avaliação 2022

RECIFE/PE
2022

Sumário

1. Introdução.....5
2. Monitoramento dos projetos 6
2.1 Resumo dos Resultados 6
2.2 Projetos concluídos no ciclo.....11
2.3 Principais oportunidades e desafios 13
3. Monitoramento dos indicadores 14
3.1 Indicadores do Planejamento Estratégico Organizacional.....14
3.2 Indicadores da Metodologia de Monitoramento e Controle da Programação 15
3.3 Metas de Desempenho Institucional 16
4. Recomendações.....17
5. Conclusão.....17

Lista de Anexos

Anexo I - Projetos Tabulados

Anexo II – Projetos do Monitoramento

Anexo III - Execução Orçamentária e Financeira

Anexo IV - Indicadores do Planejamento Estratégico Institucional

Anexo V - Indicadores da Metodologia de Monitoramento e Controle da Programação

Anexo VI - Acompanhamento da série histórica dos Indicadores da Metodologia de Monitoramento e Controle da Programação

Anexo VII – Resultado parcial das metas de desempenho institucional

Lista de Figuras

Figura 1 - Projetos por Unidade Administrativa em 30/06/2022 6
Figura 2 - Projetos Prioritários em 30/06/2022 7
Figura 3 - Projetos por Objetivo Estratégico em 30/06/2022 8
Figura 4 - Projetos da Diretoria de Administração em 30/06/2022 9
Figura 5 - Projetos da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas em 30/06/2022 9
Figura 6 - Projetos da Diretoria de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos em 30/06/2022 10
Figura 7 - Projetos das Unidades Vinculadas à Superintendência em 30/06/2022 10
Figura 8 - Projetos concluídos no segundo trimestre de 2022 11
Figura 9 - Projetos em Atraso e Paralisados em 30/06/2022 13

1. Introdução

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), por meio da Coordenação-Geral de Gestão Institucional (CGGI), apresenta o monitoramento e a avaliação da sua estratégia organizacional para o segundo trimestre de 2022, com ênfase nos eventuais desvios observados em relação aos objetivos e projetos com metas e entregas previstas para o trimestre findo e principalmente no intuito de antecipar problemas e tomar as ações necessárias para o alcance das metas e entregas do trimestre seguinte.

Com o novo Planejamento Estratégico Institucional, aprovado na 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), realizada em 16 de dezembro de 2021, o monitoramento passa a abranger os projetos de todas as unidades da Sudene, bem como os indicadores aprovados no Planejamento Estratégico.

Neste segundo ciclo de 2022, foram monitorados 583 projetos, dos quais: 83 foram concluídos, 350 estão em andamento, 51 estão atrasados em sua execução, 1 está paralisado, 86 encontram-se a iniciar e 12 foram cancelados. Além disso, foram monitorados os indicadores setoriais estabelecidos na Metodologia de Monitoramento e Controle da Programação e os indicadores estratégicos do Planejamento Estratégico da Sudene.

Compõem, ainda, este Relatório, os projetos em andamento, apresentados de forma sintética no Anexo I e de forma analítica no Anexo II, os resultados da Gestão Orçamentária e Financeira para o segundo trimestre, e os resultados parciais, até 30 de junho, das metas de desempenho institucional para o período de out/2021 a set/2022.

Com o objetivo de atender aos princípios da prestação de contas e da transparência, o referido documento será disponibilizado no *site* da Sudene, na página Site Sudene - Gestão Institucional, para acesso dos órgãos de controle e diversos atores que tenham interesse em conhecer e acompanhar as ações e entregas da Instituição em sua área de atuação. Entende-se que, dessa forma, a Sudene fortalece o controle social e o acesso à informação.

2. Monitoramento dos projetos

2.1 Resumo dos Resultados

Neste segundo ciclo de monitoramento utilizando o SIGSudene, se notou mais um avanço no número de projetos monitorados, saindo de 228 projetos registrados no 4º Ciclo de 2021 para 484 projetos no 1º ciclo de 2022, e 583 no 2º Ciclo conforme Figura 1.

No atual ciclo, a principal unidade responsável por esse aumento, foi a Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais (CGIF), com o cadastramento de 87 novos projetos.

Figura 1 - Projetos por Unidade Administrativa em 30/06/2022

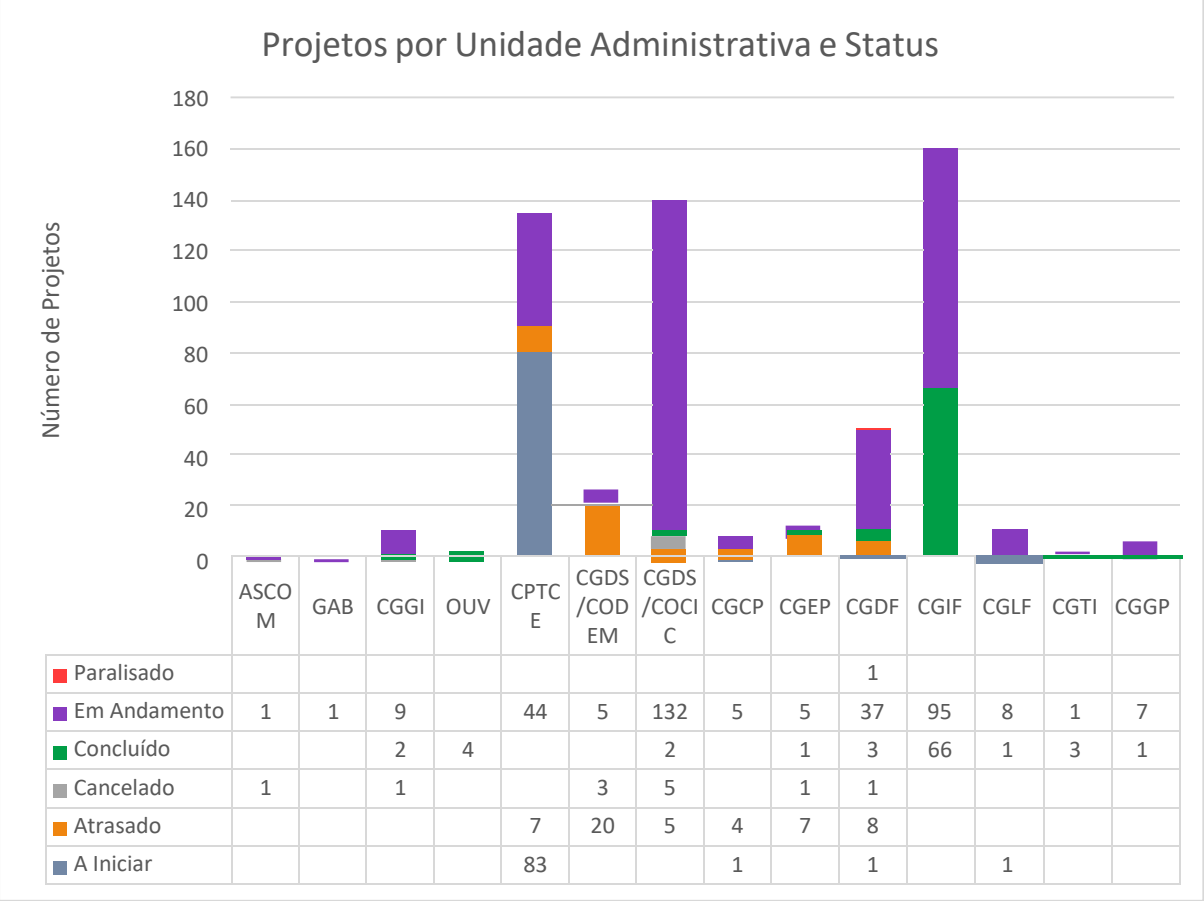

	ASCOM	GAB	CGGI	OUV	CPTCE	CGDS/CODEM	CGDS/COCIC	CGCP	CGEP	CGDF	CGIF	CGLF	CGTI	CGGP
Paralisado										1				
Em Andamento	1	1	9		44	5	132	5	5	37	95	8	1	7
Concluído			2	4			2		1	3	66	1	3	1
Cancelado	1		1			3	5		1	1				
Atrasado					7	20	5	4	7	8				
A Iniciar					83			1		1		1		

Fonte: SIGSudene

A partir de um recorte específico dos projetos prioritários definidos pela Ata da 304ª Reunião da Diretoria Colegiada, realizada em 16 de maio de 2018, e Resolução DC/Sudene nº 281, de 13 de junho de 2017, posteriormente alterada pela Resolução DC/Sudene nº 601, de 25 de fevereiro de 2021, tem-se a representação dos projetos prioritários por Unidade e por status na Figura 2.

Figura 2 - Projetos Prioritários em 30/06/2022

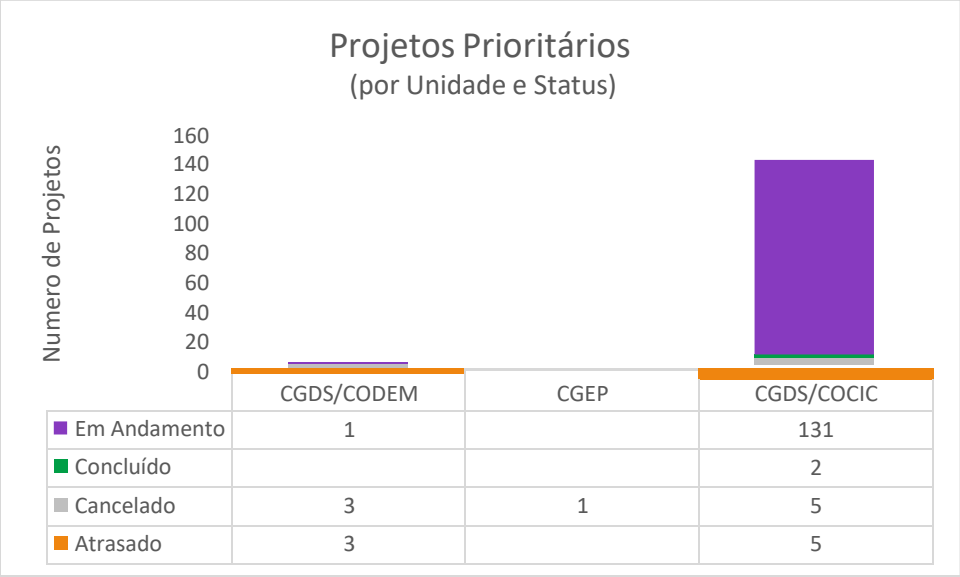

	CGDS/CODEM	CGEP	CGDS/COCIC
Em Andamento	1		131
Concluído			2
Cancelado	3	1	5
Atrasado	3		5

Fonte: SIGSudene

Na Figura 3 estão representados os projetos da Sudene e a sua relação com os objetivos estratégicos aprovados no Planejamento Estratégico Institucional. No segundo ciclo de monitoramento foi realizado esforço das unidades para que todos os objetivos estratégicos tivessem projetos cadastrados, conforme determinação do CGRC na sua 3ª Reunião Ordinária, pois dois objetivos estratégicos encontravam-se sem projetos vinculados.

Cabe destacar que aproximadamente 65% dos projetos têm vinculação direta com os objetivos da perspectiva “Resultados para a sociedade”, que são os objetivos de maior entrega ao cidadão.

Figura 3 - Projetos por Objetivo Estratégico em 30/06/2022

Fonte: SIGSudene

Abaixo seguem os projetos por membro da Diretoria Colegiada da Sudene, Diretoria de Administração (DAD), Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas (DPLAN), Diretoria de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimento (DFIN) e Superintendência (SUP). Neste sentido cabe esclarecer uma alteração com relação ao último relatório de Monitoramento, que é a vinculação da Comissão Permanente de Tomadas de Contas Especiais ao Superintendente e não mais à Diretoria de Administração.

Figura 4 - Projetos da Diretoria de Administração em 30/06/2022

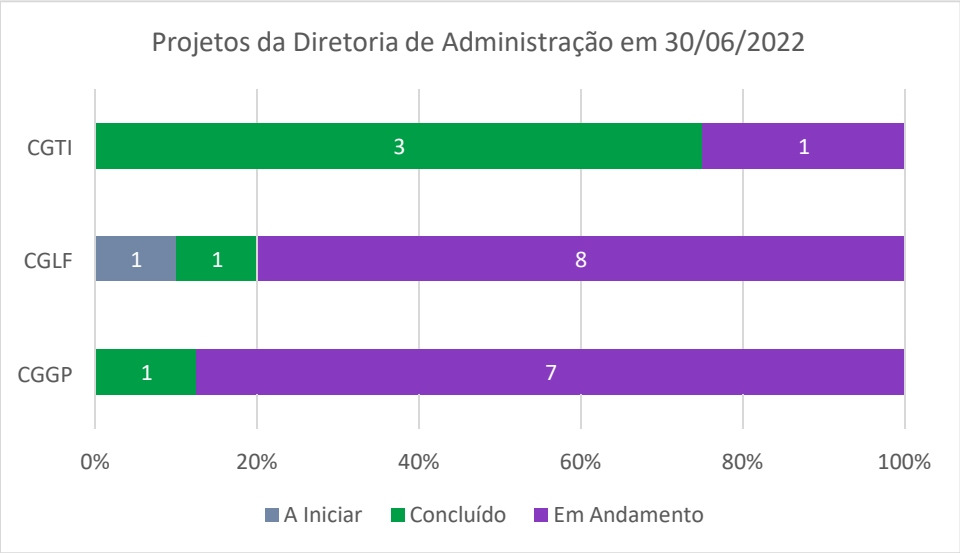

Fonte: SIGSudene

Figura 5 - Projetos da Diretoria de Planejamento e Articulação de Políticas em 30/06/2022

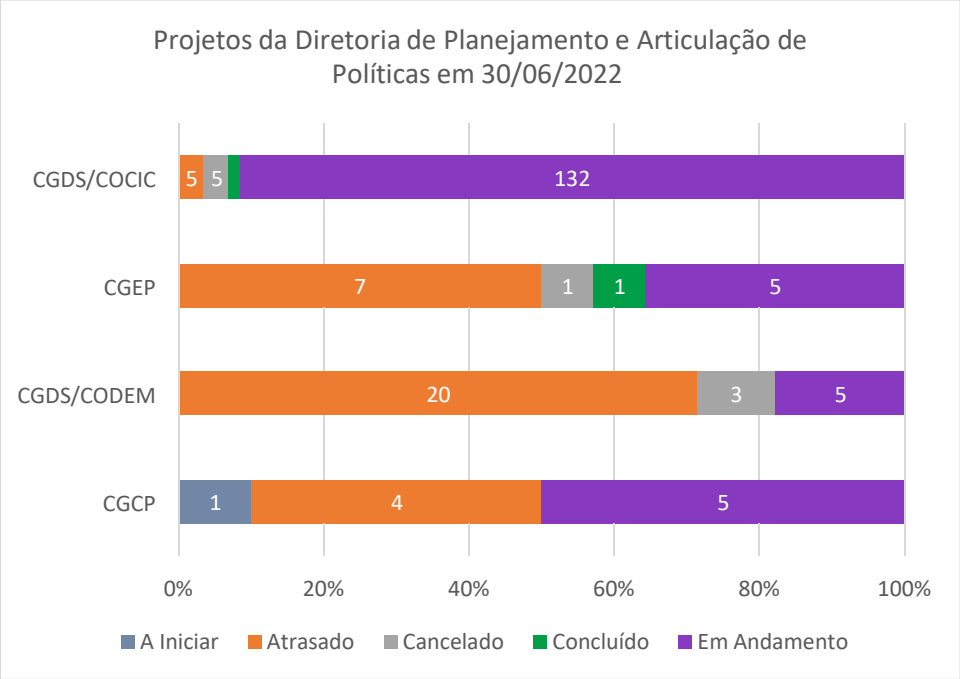

Fonte: SIGSudene

Figura 6 - Projetos da Diretoria de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos em 30/06/2022

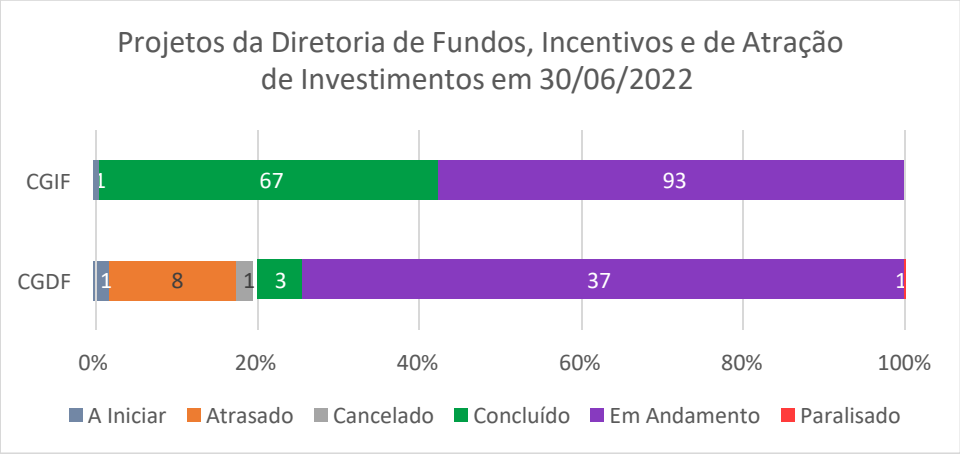

Fonte: SIGSudene

Figura 7 - Projetos das Unidades Vinculadas à Superintendência em 30/06/2022

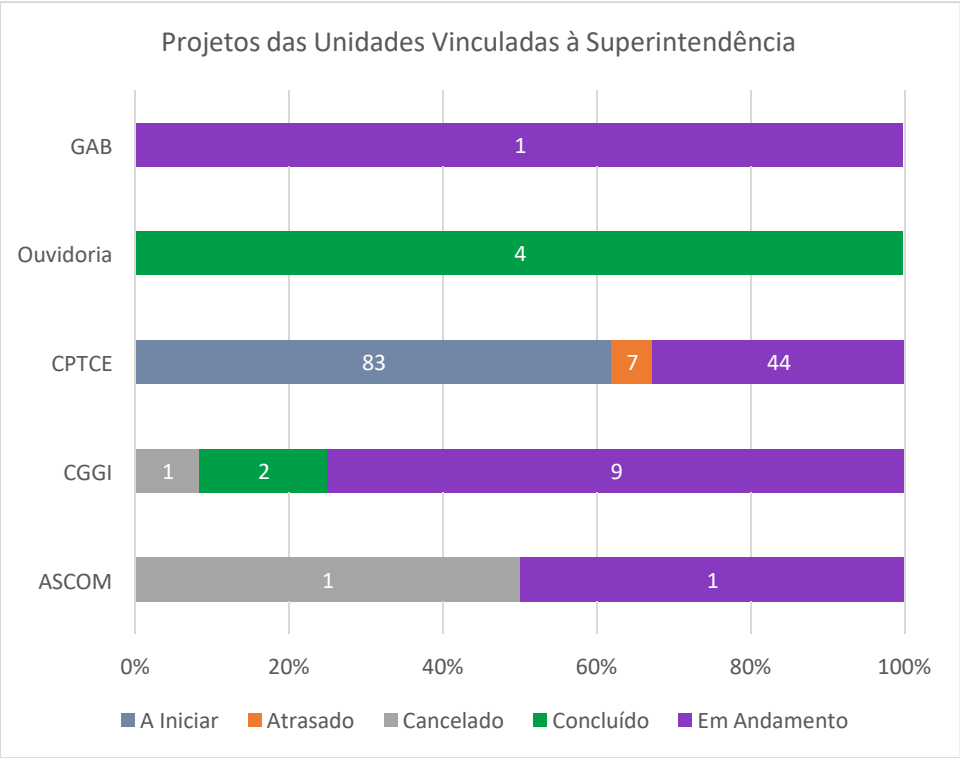

Fonte: SIGSudene

2.2 Projetos concluídos no ciclo

Ao total, foram 83 projetos concluídos neste ciclo, com ampla participação da CGIF, com a conclusão de 66 pleitos de incentivos fiscais desde o início do monitoramento no SIGSudene. Os pleitos de incentivos fiscais concluídos nesse ciclo de avaliação totalizam mais de R$ 3,9 bilhões em investimentos realizados pelas empresas solicitantes.

Os demais projetos concluídos estão detalhados na Figura 8 abaixo.

Figura 8 - Projetos concluídos no segundo trimestre de 2022

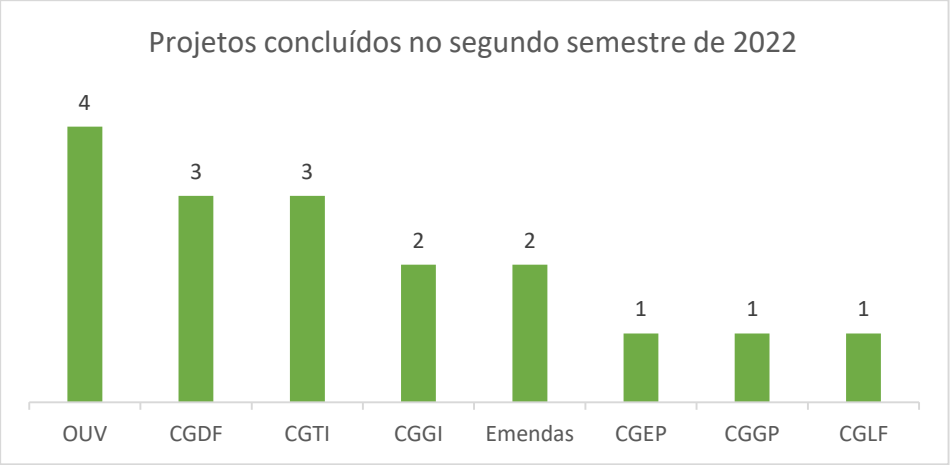

Fonte: SIGSudene

Detalhando os demais projetos concluídos por unidade, temos o seguinte:

OUV:

- **Projeto OUV202001**, referente à prestação de contas da Ouvidoria do FNE do exercício de 2021, cujo produto foi o Relatório da Ouvidoria do FNE 2021;
- **Projeto OUV202002**, referente à prestação de contas da Ouvidoria da Sudene do exercício de 2021, cujo produto foi o Relatório da Ouvidoria da Sudene 2021;
- **Projeto OUV202003**, referente à satisfação dos usuários da Sudene, cujo produto final foi o Relatório de Pesquisa de Satisfação Externa 2021; e
- **Projeto OUV202004**, referente à satisfação dos servidores da Sudene, cujo produto final foi o Relatório de Pesquisa de Satisfação Interna 2022.

CGDF:

- **Projeto CGDF2008002**, referente ao projeto de financiamento da Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II) para geração de energia termoelétrica;
- **Projeto CGDF2021001**, referente ao acompanhamento da execução da programação da aplicação de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) no exercício de 2021, cujo produto final foi o Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE 2021; e

- **Projeto CGDF2022005**, referente à normatização de contrapartidas sociais aos beneficiários do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) e Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

CGTI:

- **Projeto CGTI2022002**, referente ao planejamento e o monitoramento integrado, em sistema georreferenciado, dos dados de FDNE, FNE, Incentivos Fiscais, projetos e convênios, visando a otimização da tomada de decisão, realizado por meio do SIGMapas;
- **Projeto CGTI2022003**, referente à concentração da visualização de compromissos e eventos institucionais de forma dinâmica, colaborativa e aprimorada, realizado por meio da Agenda Compartilhada; e
- **Projeto CGTI2022004**, referente à infraestrutura para realização de reuniões e eventos virtuais, remotos, por videoconferência, com os recursos de gravação e transmissão online, realizado por meio da contratação do Zoom.

CGGI:

- **Projeto CGGI2022002**, referente ao acompanhamento do Plano de Dados Abertos do triênio de 2020 e 2022; e
- **Projeto CGGI2022013**, referente à fase qualitativa da proposta de lei orçamentária anual.

Emendas:

- **Projeto COCIC2018004**, referente à Emenda Parlamentar para pavimentação de ruas no município de Lucrécia - RN; e
- **Projeto COCIC2019028**, referente à Emenda Parlamentar para aquisição de patrulha mecanizada destinada ao município de Custódia - PE.

CGEP:

- **Projeto CGEP2020002**, referente à elaboração de índice que norteie a regionalização de Políticas Públicas de Educação.

CGGP:

- **Projeto CGGP2018001**, O projeto foi concluído com a apresentação e aprovação de relatório do dimensionamento da força de trabalho da Sudene, estudo do período 2018-2021 focado no Quadro de Pessoal permanente, e apresentou propostas de ações para reforçar quantitativa e qualitativamente seu quadro de pessoal (movimentação, concurso, entre outras) e foi subsídio para elaboração de proposta de concurso público encaminhada ao Ministério do Desenvolvimento Regional (Maio/2022) para recomposição do quadro da autarquia.

CGLF:

- **Projeto CGLF2022008**, referente reforma de andares da sede da Sudene para adequação do novo leiaute da Sudene, visando à otimização da ocupação predial e redução de despesas prediais.

2.3 Principais oportunidades e desafios

Neste ciclo de monitoramento, referente ao segundo trimestre de 2022, observa-se uma diminuição do número de projetos paralisados, passando de 10 para 1, uma estabilidade nos projetos atrasados, que mudaram de 50 para 51, e um total de 12 projetos cancelados. A Figura 9 representa os projetos em atraso e paralisados por unidade da Sudene.

Figura 9 - Projetos em Atraso e Paralisados em 30/06/2022

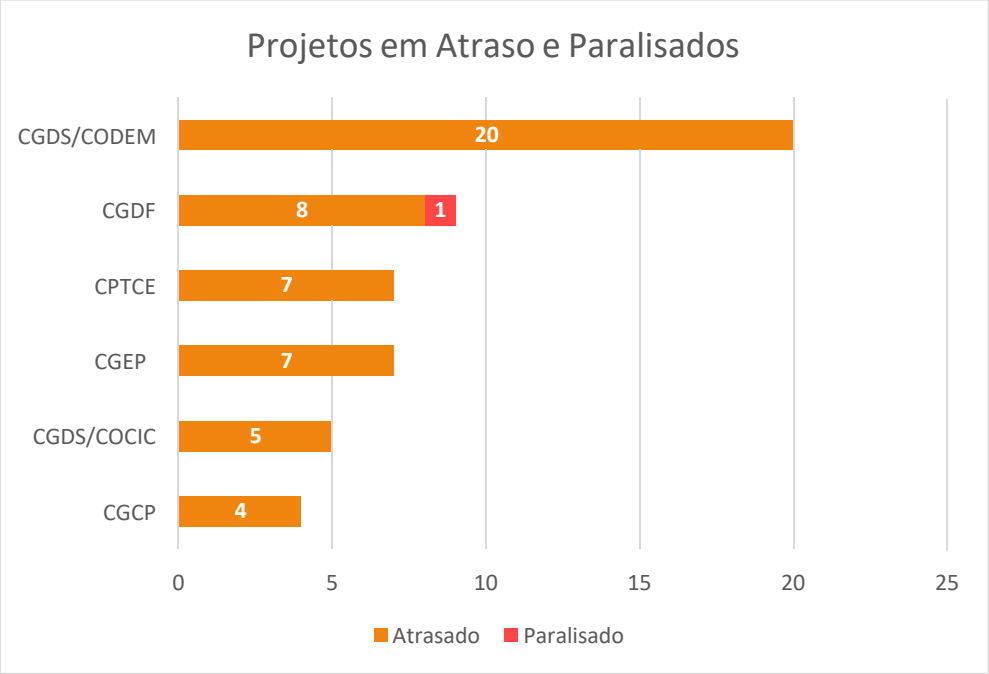

Fonte: SIGSudene

No ciclo anterior, 10 projetos encontravam-se paralisados e, após medidas administrativas e gerenciais, atualmente apenas 1 projeto encontra-se nesta situação, que é o Projeto CGDF 2008001, referente à Transnordestina Logística S/A – TLSA, que se encontra paralisado desde 2017, por orientação do Tribunal de Contas da União, que suspendeu, por meio do Acórdão nº 67/2017, as liberações de recursos para este empreendimento.

Nota-se, ainda, que houve uma estabilidade no número de atrasados (50 para 51), com predominância dos projetos sob responsabilidade da Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável de Meio Ambiente (CGDS), com cerca da metade dos projetos atrasados (25), devendo envidar esforços para a sua normalização.

Outra situação que merece registro são os projetos de Tomadas de Contas Especiais, que possuem 51 processos com data de conclusão na Sudene em 02/09/2022, por força do Acórdão nº 1556/2018 TCU-Plenário e outros 83 processos que já tiveram suas instaurações aprovadas, porém ainda não foram iniciados. Isso representa um grande desafio para o próximo ciclo. Já fora identificada fragilidade referente a este tema no ciclo anterior e medidas gerenciais foram tomadas para solucionar o problema, dentre elas:

- Alocação de mais 6 (seis) servidores na Comissão Permanente de Tomadas de Contas Especiais;
- Análise e mapeamento do processo de Tomada de Contas Especiais, identificando gargalos e melhorando o fluxo do processo na Sudene; e
- Acompanhamento das TCEs no SIGSudene de forma estruturada, por meio do qual identificou-se que os 51 processos de TCE alvo do Acórdão nº 1556/2018 TCU-Plenário encontravam-se na situação de dispensa de instauração.

Com a identificação de que os 51 processos de TCE alvo do Acórdão nº 1556/2018 TCU-Plenário encontravam-se na situação de dispensa de instauração de TCE, foi realizado esforço no sentido de notificar os responsáveis para posterior encaminhamento do processo para cobrança judicial e cadastro no Sistema e-TCE para fins de controle do TCU, devendo estas duas últimas etapas serem realizadas até 02/09/2022, ou seja, dentro do próximo ciclo de monitoramento.

3. Monitoramento dos indicadores

3.1 Indicadores do Planejamento Estratégico Organizacional

Como já introduzido no início deste Relatório, o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) foi aprovado na 2ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), em 16 de dezembro de 2021, e, visando realizar o monitoramento do plano estratégico institucional de forma sistemática e contínua, os resultados da apuração trimestral dos indicadores estratégicos do plano são apresentados de forma pormenorizada no Anexo IV deste Relatório.

Nos indicadores vinculados ao PEI, foi observado, já no primeiro trimestre de 2022, alguns índices que atingiram ou ultrapassaram a meta estabelecida para o corrente ano, como: os indicadores relacionados aos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) relativos ao objetivo estratégico nº 1, bem como nos indicadores de Percentual de Contratação dos instrumentos conforme áreas prioritárias definidas pelo Conselho Deliberativo da Sudene (CONDEL) e de Número de parcerias estratégicas com órgãos/entidades, vinculados ao objetivo estratégico nº 2, que tinham como meta para o ano de 2022, respectivamente, atingir 75% de contratações, tendo alcançado 100%, e realizar 57 parcerias, o que foi alcançado já no primeiro trimestre com a realização de 60 parcerias.

É importante ressaltar a evolução neste segundo trimestre, especialmente, o aumento no número de parcerias estratégicas com órgãos/entidades de 60 para 136 neste trimestre, o incremento em 51 no número de municípios-polo beneficiários dos projetos estratégicos alinhados com as diretrizes, programas e projetos do PRDNE, ao aumento do número de servidores municipais e estaduais capacitados em cursos voltados para melhoria da gestão pública, passando de 256 no primeiro trimestre para 762 no segundo trimestre., e à realização de 10 estudos e pesquisas realizados no período.

De modo inverso, alguns indicadores não demonstraram a evolução esperada, permanecendo alguns indicadores com resultado nulo nesse segundo ciclo, o que demandará um maior esforço e atenção pelos setores da Autarquia e monitoramento pelo CGRC. Os indicadores que se encontram nessa situação são:

- Percentual de desembolso do 1,5% FDNE em relação ao valor planejado para o exercício, sob responsabilidade da CGEP, com projetos em andamento;
- Número de Planos de desenvolvimento territorial elaborados ou revisados, sob responsabilidade da CGEP, com projetos em andamento;
- Percentual das metas do PRDNE[1] monitoradas, sob responsabilidade da CGEP;
- Número de consultas públicas realizadas com atores regionais para atualização do PRDNE, sob responsabilidade da CGCP, com solicitação de alteração do indicador para melhor representar as ações realizadas pela Sudene para atualização do PRDNE;
- Número de projetos executados com recursos da Sudene para melhoria da gestão pública dos entes subnacionais, sob responsabilidade da CGDS, com projetos em andamento;
- Percentual de realização das reuniões do Condel programadas, sob responsabilidade da CGGI, com tratativas sendo realizadas junto ao MDR para cumprimento do calendário proposto;
- Percentual de participação dos membros nas reuniões do Condel, sob responsabilidade da CGGI, com tratativas sendo realizadas junto ao MDR para cumprimento do calendário proposto e engajamento dos Conselheiros;
- Taxa de Processos Críticos Mapeados, sob responsabilidade da CGGI, com projetos em andamento;
- Índice Integrado de Governança e Gestão Pública, sob responsabilidade da CGGI, aguardando divulgação do IGG pelo TCU;
- Percentual de servidores capacitados, sob responsabilidade da CGGP, com ações para realizar a avaliação de lacunas de competência a iniciar;
- Taxa de execução do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho, sob responsabilidade da CGGP, com ações para elaborar o programa de qualidade de vida no trabalho iniciadas;
- Índice de qualidade de vida no trabalho, sob responsabilidade da CGGP, com ações para elaborar e executar a pesquisa de qualidade de vida no trabalho a iniciar;
- Índice de clima organizacional, sob responsabilidade da CGGP, com ações para elaborar e executar a pesquisa de clima organizacional a iniciar;
- Taxa de Execução de Recursos Adicionais, sob responsabilidade das CGCP, CGDS e CGEP, com projetos em andamento; e
- Taxa de Execução Orçamentária com Ações Estratégicas, sob responsabilidade das CGCP, CGDS e CGEP, com projetos em andamento.

3.2 Indicadores da Metodologia de Monitoramento e Controle da Programação

Apesar da aprovação do Planejamento Estratégico Institucional pelo Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), em 16 de dezembro de 2021, os indicadores monitorados até o momento

[1] Embora o Projeto de Lei nº 6163/2019, que tem por objetivo a instituição do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE) não tenha sido, ainda, aprovado pelo Congresso Nacional, suas diretrizes, prioridades e metas balizam a ação da Sudene, sendo necessário o monitoramento de suas metas que estejam vinculadas a ações executadas diretamente pela Sudene.

considerando a Metodologia de Monitoramento e Controle da Programação, aprovada na 121ª Reunião da Diretoria Colegiada, em 01 de novembro de 2012, continuam a ser monitorados. Os resultados desses indicadores e sua série histórica constam, respectivamente, nos Anexos V e VI deste Relatório.

Em relação ao mencionado rol de indicadores, observamos alguns pontos que merecem destaque. Nos indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), houve manutenção e discreta melhora nos resultados, sendo importante destacar os pontos que merecem atenção, mais precisamente no de Inconsistências das consultas prévias apresentadas ao FDNE (CCPA), com uma elevação no índice de consultas com inconsistências de 36% para 67%, no primeiro ciclo de 2022, com leve melhora (59%) no segundo, mas ainda acima do patamar médio. Observa-se também que os indicadores tanto de produtividade (PAPC) quanto de tempo médio entre o protocolo e aprovação da consulta prévia pela Diretoria colegiada (TMCP) tiveram uma piora em relação ao ciclo anterior, voltando aos patamares dos outros ciclos de 2021. Tal fato se deve, ao nosso ver, pelo elevado número de pleitos no último trimestre de 2021, retornando no primeiro semestre 2022 aos patamares normais. Ainda nos indicadores do FDNE, vale ressaltar a diminuição no seu índice de execução orçamentária.

De modo semelhante aos indicadores do FDNE, nos indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros também se observou uma diminuição nos índices de produtividade em relação ao ciclo de monitoramento anterior, e de forma análoga visualizamos o mesmo motivo para tal resultado, qual seja, o aumento exponencial de pleitos de incentivos fiscais no último trimestre de 2021, o que sobrecarregou as equipes dos setores responsáveis.

Nos indicadores de Gestão de Convênios houve uma grande evolução em relação ao primeiro trimestre, no qual boa parte encontrou-se com índice zerado em função de não se ter nenhum convênio analisado no período e neste ciclo houve a análise, aprovação e realização de vistorias de diversos convênios. De maneira semelhante, os indicadores de Gestão de Pessoas apresentaram avanço considerável neste ciclo, superando inclusive os segundos trimestres dos anos anteriores, demonstrando um engajamento maior dos servidores em eventos de capacitação. Já os indicadores de Gestão da Comunicação Social e Marketing Institucional apresentaram resultados dentro do esperado, com aumento discreto na maioria dos indicadores, com exceção do Tempo de Permanência no site e dos indicadores relacionados à utilização do Facebook, o que reflete a tendência global de aumento de engajamento no Instagram em detrimento das demais redes sociais.

3.3 Metas de Desempenho Institucional

Além dos indicadores acima tratados, deve ser alvo de monitoramento constante as metas de desempenho institucional para fins de pagamento de gratificações de desempenho aos servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal da Sudene.

Atualmente, estão sendo monitorados os resultados para as Metas de Desempenho Institucional Previstas pela Portaria Sudene nº 138, de 22 de dezembro de 2021, alterada pela Portaria Sudene nº 150, de 18 de abril de 2022, para o 13º ciclo de avaliação da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo (GDPGPE) e 10º ciclo de avaliação da Gratificação de Desempenho de Atividade de Cargos Específicos (GDACE), que se iniciaram em 1º de outubro de 2021 e se encerram em 30 de setembro de 2022.

Neste ciclo houve a repactuação da meta institucional nº 01, referente à revisão do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE, alterando a meta intermediária para o período de 2 (dois) para 1 (um) e, consequentemente a meta global de 6 (seis) para 5 (cinco) e a exclusão da meta institucional nº 02, referente à articulação do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste - PRDNE, uma vez que a ação foi concluída no ciclo de avaliação anterior.

O Anexo VII apresenta o resultado parcial das metas de desempenho institucional no período de outubro de 2021 a março de 2022.

O resultado geral neste ciclo 2º trimestre de 2022 teve uma robusta evolução em relação à pontuação atingida no último ciclo, passando de 30,4 para 67 pontos, dos 80 pontos possíveis de atingimento ao final de todo o período do ciclo avaliativo como mencionado acima.

4. Recomendações

Diante do exposto neste Relatório, recomenda-se que sejam adotadas todas as seguintes medidas, visando a melhoria da gestão e atingimento da estratégia da Sudene:

1. Considerando o enquadramento nas situações de dispensa de instauração dos 51 processos de TCE alvo do Acórdão nº 1556/2018 TCU-Plenário, com prazo para conclusão na Sudene para o dia 02/09/2022, são necessárias ações para conclusão dos processos dentro do prazo, da seguinte forma:
    - Realização de todas as notificações;
    - Encaminhamento para cobrança judicial; e
    - Cadastro dos processos de TCE no Sistema e-TCE até o dia 02/09/2022.
2. Considerando que de início, foram objetivo de tratamento os processos cujo status estava como paralisado, a Sudene deve envidar esforços nos projetos tidos como atrasados, em especial os projetos da CGDS, para que esses projetos não se tornem riscos ao alcance dos objetivos estratégicos da Autarquia.
3. Considerando os resultados parciais dos Indicadores do Planejamento Estratégico Organizacional que não alcançaram o desempenho esperado neste primeiro semestre, as unidades responsáveis pelos indicadores deverão elaborar plano de ação para alavancar tais resultados, a ser apresentado, juntamente com os resultados de sua aplicação, até o final do próximo ciclo.
4. Considerando que fora cumprido 75% do 13º Ciclo de avaliação GDPGPE e 10º Ciclo de avaliação GDACE (1º de outubro de 2021 a 30 de setembro de 2022), as metas que ainda estão com baixo percentual de execução deverão ser acompanhadas mensalmente ao longo do próximo trimestre, destacando as metas nº 6, 9 e 14 da Portaria nº 150, de 2022.

5. Conclusão

Visando à apresentação do monitoramento e da avaliação da sua estratégia organizacional para o primeiro trimestre de 2022, a Sudene enfatizou os eventuais desvios observados em relação aos objetivos e projetos com metas e entregas previstas para o trimestre findo e buscou antecipar problemas e tomar as ações necessárias para o alcance das metas e entregas do trimestre seguinte.

Cabe citar a mudança no paradigma de gestão de projetos na Sudene, com a implantação de um sistema de monitoramento de projetos, que entre outros benefícios, incorre num aumento da tempestividade no processamento das informações, facilitando e melhorando a tomada de decisões na Autarquia.

Neste segundo ciclo de 2022, foram monitorados 583 projetos, dos quais: 83 foram concluídos, 350 estão em andamento, 51 estão atrasados em sua execução, 1 está paralisado, 86 encontram-se a iniciar e 12 foram cancelados.

Além do monitoramento de projetos, foram apresentados os indicadores setoriais estabelecidos na Metodologia de Monitoramento e Controle da Programação já anteriormente monitorados, e os indicadores estratégicos do novo Planejamento Estratégico da Sudene.

Foram também apresentadas informações específicas sobre projetos concluídos no ciclo em questão, sendo destacadas nove convênios relativos a emendas parlamentares e três projetos desenvolvidos na Sudene. Dois destes que não eram alvo de acompanhamento nos ciclos prévios.

Compõem, ainda, este Relatório, os projetos em andamento, apresentados de forma sintética no Anexo I e de forma analítica no Anexo II; os resultados da Gestão Orçamentária e Financeira para o primeiro trimestre; e os resultados parciais das metas de desempenho institucional para o período de out/2021 a set/2022.

Além disso, foram realizadas recomendações a serem seguidas pelas unidades administrativas da Sudene, visando à melhoria da gestão e ao atingimento da estratégia organizacional.

Assim, sabendo da importância dos instrumentos de transparência e prestação de contas, a Sudene tem avançado no sentido de melhorar o acompanhamento dos seus projetos, tornando-o mais efetivo tanto internamente como para controle externo.

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
Conselho Deliberativo da Sudene - Condel	ASCOM 2022001	2022	Cancelado	Não	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	6. Consolidar o Condel da Sudene como órgão superior de articulação e decisões estratégicas	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	-	GAB	ASCOM	-	
Plano de Comunicação Sudene	ASCOM 2022002	2022	Em Andamento	Não	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	6. Consolidar o Condel da Sudene como órgão superior de articulação e decisões estratégicas	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	-	GAB	ASCOM	-	-
Acordo de Cooperação Técnica com instituições financeiras	CGCP2020002	2020	Em Andamento	Não	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	4. Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE	Ação não orçamentária	n/a	DPLAN	CGCP	-	-
Projeto Cidades Inteligentes 4.0 - Campina Grande - Convênio com ABDI	CGCP2021001	2021	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGCP	1.998.021,94	1.998.021,94
Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos dos 31 municípios do semiárido mineiro do CODANORTE	CGCP2021002	2021	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGCP	725.810,00	725.810,00
Plano de Desenvolvimento Sustentável de Guarabira-PB	CGCP2021003	2021	Atrasado	Não	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGCP	483.189,57	-
Estudo de Vocações e Potencialidades para o estado da Paraíba	CGCP2021004	2021	Atrasado	Não	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGCP	750.000,00	-
Elaboração de um Estudo de Complexidade Econômica, um Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio São Francisco e área de influência do Projeto de Integração do São Francisco (PISF) e elaboração de um Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio Parnaíba	CGCP2021005	2021	Atrasado	Não	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGCP	893.809,13	446.904,57

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
Propor as diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE).	CGCP2022001	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Ação não orçamentária	n/a	DPLAN	CGCP	-	-
Propor as diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do Fundo do Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).	CGCP2022002	2022	A Iniciar	Não	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Ação não orçamentária	n/a	DPLAN	CGCP	-	-
Rede de "Cidades Polo" na área de atuação da Sudene - OnuHabitat	CGCP2220003	2022	Atrasado	Não	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGCP	309.985,00	-
Transnordestina Logística S/A - TLSA	CGDF2008001	2008	Paralisado	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	3.876.491.700,00	3.065.105.668,00
Candeias Energia S/A (UTE's Global I e II)	CGDF2008002	2008	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	61.728.156,00	61.728.156,00
Embuaca Geração e Comercialização de Energia S/A	CGDF2011001	2011	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	59.700.000,00	59.700.000,00
Eólica Bela Vista Geração e Comercialização de Energia S/A	CGDF2011002	2011	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	54.900.000,00	54.900.000,00
Eólica Mar e Terra Geração e Comercialização de Energia S/A	CGDF2011003	2011	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	50.000.000,00	50.000.000,00
BRK Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (antiga Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A.)	CGDF2014001	2014	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	415.582.562,52	413.011.416,34
Ventos de São Fernando IV Energia S/A	CGDF2020002	2020	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	228.672.439,20	228.672.439,20
Central Eólica Boqueirão I S.A.	CGDF2020003	2020	Atrasado	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	113.680.904,39	41.435.881,68
Central Eólica Boqueirão II S.A.	CGDF2020004	2020	Atrasado	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	102.312.813,95	32.968.329,74
Vila Espírito Santo I Empreendimentos e Participações S.A.	CGDF2020005	2020	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	107.686.880,50	103.459.637,40
Vila Espírito Santo II Empreendimentos e Participações S.A.	CGDF2020006	2020	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	94.964.244,39	90.858.400,56
Vila Alagoas II Empreendimentos e Participações S.A	CGDF2020007	2020	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	58.577.007,99	55.786.889,22
Elaborar trimestralmente um Relatório de Acompanhamento da Aplicação dos Recursos do FNE 2021	CGDF2021001	2021	Concluído	Não	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	Ação Interna	n/a	DFIN	CGDF	-	-
Eólica Canudos II SPE S.A.	CGDF2021002	2021	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	183.361.938,16	88.049.841,59
Eólica Canudos III SPE S.A.	CGDF2021003	2021	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	183.361.938,16	144.820.026,76

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
BORBOREMA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A	CGDF2021004	2021	Atrasado	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	60.000.000,00	-
Central Eólica Catanduba I	CGDF2021005	2021	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	140.841.810,36	-
Central Eólica Catanduba II	CGDF2021006	2021	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	140.841.810,36	-
Parnaíba II Geração de Energia S.A	CGDF2021007	2021	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	274.179.982,11	-
Lightsource Milagres I Geração de Energia LTDA.	CGDF2021008	2021	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	77.808.580,65	-
Lightsource Milagres II Geração de Energia LTDA.	CGDF2021009	2021	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	77.808.580,65	-
Lightsource Milagres III Geração de Energia LTDA.	CGDF2021010	2021	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	77.808.580,65	-
Lightsource Milagres IV Geração de Energia LTDA.	CGDF2021011	2021	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	111.715.126,17	-
Lightsource Milagres V Geração de Energia LTDA.	CGDF2021012	2021	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	348.968.580,64	-
Assuruá 5 I Energia S.A.	CGDF2021013	2021	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	136.700.004,97	-
Assuruá 5 II Energia S.A.	CGDF2021014	2021	Atrasado	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	127.304.765,68	-
Assuruá 5 III Energia S.A.	CGDF2021015	2021	Atrasado	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	134.805.486,72	-
Ligas de Alumínio S/A LIASA	CGDF2022001	2022	Atrasado	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de projetos do setor produtivo no âmbito do FDNE	DFIN	CGDF	191.780.000,00	-
Programação FNE para o exercício de 2023	CGDF2022002	2022	A Iniciar	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	0902 Operações Especiais: Financiamentos com Retorno	0030 - Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste e 0031 - Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste	DFIN	CGDF	-	-
Relatório de Resultados e Impactos do FNE, para o exercício de 2021	CGDF2022003	2021	Atrasado	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	0902 Operações Especiais: Financiamentos com Retorno	0030 - Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste e 0031 - Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste	DFIN	CGDF	-	-
Taxa efetiva de juros dos Fundos de Desenvolvimento (TFD)	CGDF2022004	2022	Cancelado	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação		0030 - Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste e 0031 - Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste	DFIN	CGDF	-	-
Contrapartidas sociais aos beneficiários do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) e Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE)	CGDF2022005	2021	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	0030 - Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste e 0031 - Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste	0030 - Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste e 0031 - Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste	DFIN	CGDF	-	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
Programação FNE para o exercício de 2022	CGDF2022006	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	0030 - Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste e 0031 - Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste	0030 - Financiamento aos Setores Produtivos do Semiárido da Região Nordeste e 0031 - Financiamento aos Setores Produtivos da Região Nordeste	DFIN	CGDF	-	-
MEZ 2 Energia S.A.	CGDF2022007	2022	Atrasado	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	27.935.000,00	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ II S.A.	CGDF2022008	2021	Em Andamento	Não			2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	97.957.192,88	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ III S.A.	CGDF2022009	2021	Em Andamento	Não			2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	253.124.296,41	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ IV S.A.	CGDF2022010	2021	Em Andamento	Não			2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	238.153.076,86	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ VI S.A.	CGDF2022011	2021	Em Andamento	Não			2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	246.772.944,27	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ VII S.A.	CGDF2022012	2021	Em Andamento	Não			2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	253.094.130,78	-
PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ IX S.A.	CGDF2022013	2021	Em Andamento	Não			2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	288.909.515,09	-
LIGHTSOURCE BOM LUGAR IV GERACAO DE ENERGIA LTDA	CGDF2022014	2021	Em Andamento	Não			2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	148.611.928,00	-
LIGHTSOURCE BOM LUGAR V GERACAO DE ENERGIA LTDA	CGDF2022015	2021	Em Andamento	Não			2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	148.611.928,00	-
LIGHTSOURCE BOM LUGAR VI GERACAO DE ENERGIA LTDA	CGDF2022016	2021	Em Andamento	Não			2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	148.611.928,00	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
VENTOS DE SANTA JUSTINA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.	CGDF2022017	2021	Em Andamento	Não			2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	323.624.750,23	-
SOLAR SÃO CONRADO I S.A.	CGDF2022018	2021	Em Andamento	Não			2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	107.107.265,01	-
SOLAR SÃO CONRADO II S.A.	CGDF2022019	2021	Em Andamento	Não			2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	94.480.385,71	-
SOLAR SÃO CONRADO III S.A.	CGDF2022020	2021	Em Andamento	Não			2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	94.480.385,71	-
SOLAR SÃO CONRADO IV S.A.	CGDF2022021	2021	Em Andamento	Não			2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	107.107.265,01	-
SOLAR SÃO CONRADO V S.A.	CGDF2022022	2021	Em Andamento	Não			2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	107.107.265,01	-
VENTOS DE SÃO JOAQUIM ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.	CGDF2022023	2021	Em Andamento	Não			2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	323.591.933,45	-
SOL SERRA DO MEL V SPE S.A,	CGDF2022024	2021	Em Andamento	Não			2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	0355 - Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE	DFIN	CGDF	257.632.165,75	-
Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco.	CGDS2012001	2012	Atrasado	Não	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	DPLAN	CGDS	530.482,50	530.482,50
Qualificação do Arranjo Produtivo Local da Caprinicultura Leitiera no Semiárido Paraibano	CGDS2014001	2014	Atrasado	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	20NC - Operação e Manutenção de Unidades de Produção para Apoio aos Arranjos Produtivos Locais (APLs)	DPLAN	CGDS	343.585,70	343.585,70
Levantamento e identificação de parceiros e produções, sejam técnicas ou científicas, atualizadas sobre a cultura da palma (cacto) - Público: pesquisadores/academia.	CGDS2018002	2018	Cancelado	Sim	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	-	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
Sistema de produção de Palma forrageira e Rede Mineira de Seleção, Multiplicação e Distribuição de Palma Forrageira (RedePalma) no semiárido mineiro.	CGDS2018003	2018	Cancelado	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	255.000,00	-
BIOÁGUA FAMILIAR - convênio n.º 878341/2018	CGDS2018004	2018	Cancelado	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	DPLAN	CGDS	547.369,48	-
FORTALECIMENTO DE SISTEMAS PRODUTIVOS FAMILIARES INTEGRADOS AO REÚSO DE ÁGUAS CINZA DOMICILIARES EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NO TERRITÓRIO DO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO	CGDS2018005	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	DPLAN	CGDS	339.517,00	339.517,00
Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmim para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.	CGDS2019001	2019	Atrasado	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	206.730,00	-
Estruturação, manutenção e ampliação de unidades multiplicadoras de raquetes-semente de palma forrageira com variedades tolerantes a cochonilha-do-carmim no RN.	CGDS2020001	2020	Atrasado	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	199.412,43	-
Implantação de campos de multiplicação de palma forrageira resistente à cochonilha do carmim para distribuição aos agricultores do semiárido mineiro.	CGDS2020002	2020	Atrasado	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	255.000,00	-
Programa de Capacitação para Consolidação de Novas Tecnologias de Computação (Nuvem)	CGDS2020005	2020	Atrasado	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a competitividade	DPLAN	CGDS	425.000,00	319.360,49
Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas pernambucanas atraves da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	CGDS2020006	2020	Atrasado	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	4640 - Capacitação de Recursos Humanos para a competitividade	DPLAN	CGDS	340.000,00	241.376,80
Montagem de Plataforma Digital, constituída de 1 (um) Centro de Processamento de Dados Avançados (Datacenter) e 2 (dois) laboratórios móveis para desenvolvimento de soluções em computação em nuvem.	CGDS2020007	2020	Atrasado	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	649.777,57	-
Implantação de unidades piloto de aproveitamento bioenergético e fotovoltaico para apoio ao desenvolvimento de empreendimentos agroindustrial de médio e pequeno porte	CGDS2020008	2020	Atrasado	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	550.000,00	550.000,00

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
Implantação de sistemas de tratamento e reuso de águas cinzas domiciliares em atividades produtivas no semiárido piauiense.	CGDS2020009	2020	Atrasado	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	476.011,69	-
Formação em Saúde Digital para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Controle de Endemias (ACE)	CGDS2020010	2020	Em Andamento	Não	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	5. Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8917 - Fortalecimento das Administrações Locais	DPLAN	CGDS	969.572,00	969.572,00
Programa de desenvolvimento de capacidades da indústria 4.0 em empresas do Nordeste atraves da capacitação de gestores de produção e alunos de pós graduação	CGDS2020011	2020	Atrasado	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	1.264.680,00	-
Fortalecimento da rede de inovação de polos da Rota do Cordeiro no Nordeste brasileiro por meio da inovação tecnológica	CGDS2020012	2020	Atrasado	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	426.466,90	426.466,90
Programa de Desenvolvimento e aceleração de empreendimentos rurais no Semiárido Brasileiro Pós Pandemia de Covid-19.	CGDS2020013	2020	Atrasado	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação e 214S – Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	465.839,00	465.839,00
Webinars para difusão do conhecimento e articulação de parceiros.	CGDS2022001	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Ação não orçamentária	n/a	DPLAN	CGDS	-	-
Análise de propostas de instrumentos de transferências voluntárias provenientes de emendas parlamentares para investimentos na área de atuação da Sudene	CGDS2022002	2022	Atrasado	Não	Aprendizado e Crescimento	13. Otimizar a captação e a utilização de recursos orçamentários	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66	DPLAN	CGDS	-	-
PROJETO FORMAÇÃO EM ENERGIA FOTOVOLTAICA – GERAÇÃO DE RENDA E DESENVOLVIMENTO DO SETOR DE ENERGIAS RENOVÁVEIS NO CARIRI (TED nº 05/2021)	CGDS2022003	2021	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	230.000,00	230.000,00

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
Programa Qualificar - Um projeto de Aquicultura Social e Economicamente Sustentável no Município de Maranguape (TED nº 07/2021)	CGDS2022004	2021	Atrasado	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação e 214S – Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	860.000,00	-
MANDIOCULTURA NO MUNICÍPIO DE SALITRE-CE (TED Nº10/2021)	CGDS2022005	2021	Atrasado	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Programa 2217: Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGDS	210.000,00	210.000,00
TERMO DE FOMENTO COOPEMAPI - MG	CGDS2022006	2021	Atrasado	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Programa 2217: Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	191.000,00	-
Disseminaçã+B1:B31o e fortalecimento de competências na Tecnologia Habilitadora de Inteligência Artificial (IA) no Estado da Bahia através de ações da Rede de Referência de Inteligência Artificial do Estado da Bahia (ESPAÇO BAH.IA) - Convênio nº 907639/2020	CGDS2022007	2020	Atrasado	Não	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	4. Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE	PPA 2020-2023	214S	DPLAN	CGDS	615.600,00	-
Centro de Tecnologia, Pesquisa e Inovação de Pescado Sustentável para o Semiárido - Termo de Execução Descentralizada (TED) - 12/2020	CGDS2022009	2020	Atrasado	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGDS	831.600,00	831.600,00
NUTRIÇÃO DA PALMA FORRAGEIRA NO SEMIÁRIDO DO BRASIL	CGEP 2022002	2022	Atrasado	Não	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Programa 2217: Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 8340	DPLAN	CGEP	719.484,90	303.706, 70
Monitoramento dos Índices Socioeconômicos da Região	CGEP 2022003	2022	Em Andamento		Processos Internos	9. Monitorar Índices Socioeconômicos da Região	Todos os Programas/Objetivos do PPA		DPLAN	CGEP	-	-
Fortalecer as agroindústrias familiares nos muncípios do Consórcio Portal do Sertão, através da monitorização dos seus produtos alimentícios.	CGEP2018001	2018	Cancelado	Sim	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	CGEP	199.399,80	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
Desenvolvimento de Máquina Colheitadeira de Palma	CGEP2019002	2019	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Ação Interna		DPLAN	CGEP	-	-
IDEB como instrumento direcionador regional das Políticas Públicas da Educação	CGEP2020002	2020	Concluído	Não	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	4. Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE	Ação Interna	n/a	DPLAN	CGEP	-	-
Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em melhoramento genético e controle de pragas e doenças direcionados para fortalecimento da cultura da palma no Semiárido.	CGEP2020003	2020	Atrasado	Não	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGEP	479.849,09	350.707,09
Diagnóstico Produtivo, Análises Zootécnicas, Aspectos Gerenciais e Propostas de Soluções para a Bovinocultura de Leite da Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu, Brasil	CGEP2020004	2020	Atrasado	Não	Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	8340 - Desenvolvimento da rede Regional de Inovação	DPLAN	CGEP	298.932,28	218.511,98
Efeitos do Programa Cisternas 1ª água sobre indicadores de mercado de trabalho e saúde dos beneficiados.	CGEP2020009	2020	Em Andamento	Não	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGEP	384.000,00	384.000,00
Avaliação de Políticas Públicas: impacto da cota-parte municipal do ICMS na educação; educação infantil: oferta, demanda e medidas de qualidade; e, Nordeste Pacífico.	CGEP2020010	2020	Atrasado	Não	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGEP	480.600,00	480.600,00
Apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.	CGEP2021002	2021	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Ação não orçamentária	n/a	DPLAN	CGEP	-	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
Elaboração de estudo de competitividade dos prinicpais polos do setor Têxtil/Confecções da área de atuação da Sudene.	CGEP2021003	2021	Atrasado	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGEP	-	-
Elaboração de estudo de competitividade dos prinicpais polos dos setor de Calçados da área de atuação da Sudene.	CGEP2021004	2021	Atrasado	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional , Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGEP	-	-
Avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE	CGEP2022001	2022	Atrasado	Não	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	Programa 2217 – Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	20WQ - Gestão da Política de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial	DPLAN	CGEP	399.945,00	199.972,50
Implantação do Sistema de Gerenciamento de Projetos	CGGI2022001	2022	Em Andamento	Não	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		Superintendência	CGGI	25.773,00	-
Revisão e Consolidação dos Atos Inferiores a Decreto	CGGI2022003	2019	Em Andamento	Não	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		Superintendência	CGGI	-	-
PDA/Sudene 2020-2022	CGGI2022004	2019	Concluído	Não	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		Superintendência	CGGI	-	-
PDA/Sudene 2022-2024	CGGI2022005	2022	Cancelado	Não	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		Superintendência	CGGI	-	-
Revisão do Planejamento Estratégico da Sudene	CGGI2022006	2019	Em Andamento	Não	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		Superintendência	CGGI	-	-
Melhoria de processos críticos	CGGI2022007	2022	Em Andamento	Não	Processos Internos	7. Aprimorar a gestão de processos	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		Superintendência	CGGI	-	-
Monitoramento do Desempenho Institucional	CGGI2022008	2021	Em Andamento	Não	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		Superintendência	CGGI	-	-
Implantação do Programa de Gestão na Sudene	CGGI2022009	2020	Em Andamento	Não	Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		Superintendência	CGGI	-	-
Elaboração da Política de Gestão de Riscos da Sudene	CGGI2022010	2022	Em Andamento	Não	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		Superintendência	CGGI	-	-
Implantação do MEG-Tr	CGGI2022011	2022	Em Andamento	Não	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		Superintendência	CGGI	-	-
Implantação do TransformaGov	CGGI2022012	2022	Em Andamento	Não	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		Superintendência	CGGI	-	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
Elaboração do Proposta Orçamentária - fase qualitativa	CGGI2022013	2022	Concluído	Não	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		Superintendência	CGGI	-	-
Elaboração do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	CGGP 2022006	2022	Em Andamento	Não	Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		DAD	CGGP	-	-
Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho	CGGP2018001	2018	Concluído	Não	Aprendizado e Crescimento	10. Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	25.000,00	9.414,51
Desenvolvimento de Ações para a recomposição da Força de Trabalho	CGGP2021001	2021	Em Andamento	Não	Aprendizado e Crescimento	10. Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais	2111 - Programa de Gestão e Manutenção do MI	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	75.000,00	-
Plano de Desenvolvimento de Pessoas 2022	CGGP2022001	2022	Em Andamento	Não	Aprendizado e Crescimento	10. Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo Federal	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	200.000,00	-
Psicioterapia Ativa	CGGP2022002	2022	Em Andamento	Não	Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	21.600,00	-
Contratação de Maestro	CGGP2022003	2022	Em Andamento	Não	Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	14.500,00	-
Contratação de Médico Generalista	CGGP2022004	2022	Em Andamento	Não	Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	45.00,00	-
Balcão de Talentos	CGGP2022005	2022	Em Andamento	Não	Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGGP	-	-
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	CGIF2022001	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	6.250.000,00	-
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA.	CGIF2022002	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	194.349,00	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	CGIF2022003	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	49.358.242,00	-
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	CGIF2022004	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	106.964.068,76	-
OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CGIF2022005	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	41.955.529,12	-
SULOG - SUAPE LOGISTICA S/A	CGIF2022006	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	27.000.000,00	-
MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A	CGIF2022007	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	2.328.314,37	-
PERNAMBUCO QUIMICA S A	CGIF2022008	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	4.000.000,00	-
POLIMIX CONCRETO LTDA	CGIF2022009	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	4.169.646,61	-
LUZ BELA INDUSTRIA DE VELAS LTDA	CGIF2022010	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	84.726,00	-
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	CGIF2022011	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	3.299.665,67	-
MEGAFERRO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	CGIF2022012	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	1.437.000,00	-
INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO GUARANI LTDA	CGIF2022013	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	2.319.019,00	-
FERTILIZANTES TOCANTINS S.A	CGIF2022014	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	6.277.232,00	-
GRI TOWER BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S/A	CGIF2022015	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	32.936.452,58	-
MOINHO NORDESTE DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA	CGIF2022016	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	3.000.000,00	-
PRIME AGROINDUSTRIAL LTDA	CGIF2022017	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	200.000,00	-
LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.	CGIF2022018	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	15.886.301,76	-
NUTRANE NUTRICAO ANIMAL LTDA	CGIF2022019	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	350.000,00	-
SP ACOS BRASIL LTDA	CGIF2022020	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	810.411,10	-
GRI CORTE E BISELADO BRASIL S/A	CGIF2022021	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	8.197.053,90	-
SPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO E ASSESSORIA EM ERP LTDA.	CGIF2022023	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	225.219,28	-
JANAUBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S.A	CGIF2022024	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	978.196.950,14	-
INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES GOLFINHO LTDA	CGIF2022025	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	4.385.447,37	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A.	CGIF2022026	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	33.422.750,59	-
DASA- DESTILARIA DE ALCOOL SERRA DOS AIMORES S/A	CGIF2022027	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	6.785.675,62	-
MORQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CGIF2022028	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	428.671,93	-
OASIS ALIMENTOS LTDA	CGIF2022029	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	15.242.656,14	-
ARTHUR AZEVEDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	CGIF2022030	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	442.979,84	-
AGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	CGIF2022031	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	4.189.913,00	-
ASTRAL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES E MASSAS ESPECIAIS LTDA.	CGIF2022032	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	3.000.000,00	-
GAAS SERVICOS E SOLUCOES LTDA	CGIF2022033	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	1.500.000,00	-
KNAUF DO BRASIL LTDA	CGIF2022034	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	75.052.619,12	-
ECOFOR AMBIENTAL S/A	CGIF2022035	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	22.129.496,33	-
SAO FRANCISCO ENERGIA S.A.	CGIF2022036	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	-	-
REFINARIA DE MATARIPE S.A.	CGIF2022037	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	-	-
I.V.L. INDUSTRIAS VIEIRA LTDA	CGIF2022038	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	-	-
PLASTMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	CGIF2022039	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	128.168,96	-
BARBOSA, BARBOSA E CIA LTDA	CGIF2022040	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	458.748,77	-
PARK HOTEL E ADMINISTRACAO LTDA	CGIF2022041	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	-	-
DURLICOUROS IND E COM DE COUROS, EXP E IMPORTAC...	CGIF2022042	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	20.000.000,00	-
CMP DE FARIAS LTDA	CGIF2022043	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	272.558,83	-
BETANIA LACTEOS S.A.	CGIF2022044	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	-	-
TECON SALVADOR S/A	CGIF2022045	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	947.226.992,39	-
PROTEINORTE ALIMENTOS SA	CGIF2022046	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	21.264.823,20	-
RDX INDUSTRIA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	CGIF2022048	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	690.000,00	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
SAO FRANCISCO ENERGIA S.A.	CGIF2022049	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	-	-
SAO FRANCISCO ENERGIA S.A.	CGIF2022050	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	-	-
POLIMIX CONCRETO LTDA	CGIF2022051	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	208.651.895,79	-
ARA TEXTIL LTDA	CGIF2022052	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	347.200,00	-
CLARO S.A.	CGIF2022053	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	96.489.757,99	-
ESTEL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	CGIF2022054	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	1.485.287,31	-
JRS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS LTDA	CGIF2022055	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	3.257.003,78	-
LIFERAY LATIN AMERICA LTDA.	CGIF2022056	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	9.616.435,89	-
MESSER GASES LTDA.	CGIF2022057	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	5.634.850,44	-
MORQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CGIF2022058	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	428.671,93	-
ALTENBURG NORDESTE LTDA	CGIF2022059	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	-	-
ANTTUNINA POUSADA SPA LTDA	CGIF2022060	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	10.745.010,76	-
CLARO S.A.	CGIF2022061	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	18.758.104,08	-
CMPQ IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ...	CGIF2022062	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	5.184.568,00	-
EVC INDUSTRIAL LTDA	CGIF2022063	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	1.593.251,43	-
INTERCEMENT BRASIL S.A.	CGIF2022064	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	-	-
LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.	CGIF2022065	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	38.364.830,00	-
LATICINIOS VIDA COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	CGIF2022066	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	3.000.000,00	-
LINHAS DE TRANSMISSAO DE MONTES CLAROS S.A.	CGIF2022067	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	297.024.503,75	-
MINERACAO VALE VERDE DO BRASIL LTDA.	CGIF2022068	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	429.791.999,96	-
PONTES & LANDIM HOTELARIA E ALUGUEIS LTDA	CGIF2022069	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	7.229.503,96	-
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	CGIF2022070	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	932.481,00	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
TRANSMISSORA SERTANEJA DE ELETRICIDADE S.A.	CGIF2022071	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	219.294.920,41	-
IMPLASVERDE INDUSTRIA DE PLASTICOS BAIXAVERDE LTDA	CGIF2022072	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	6.950.000,00	-
FRIGORIFICO LESTE LTDA	CGIF2022073	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	18.748.800,96	-
LABOREMUS IND E COM DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	CGIF2022074	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	1.481.040,74	-
Consolidação PLOA 2023 - Quantitativo - Despesa	CGLF 2022010	2022	A Iniciar	Não	Aprendizado e Crescimento	14. Aprimorar a gestão orçamentária, de forma integrada ao planejamento estratégico	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGLF	-	-
Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2023 - Quantitativo - Receita	CGLF2022001	2022	Em Andamento	Não	Aprendizado e Crescimento	14. Aprimorar a gestão orçamentária, de forma integrada ao planejamento estratégico	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGLF	-	-
Acompanhamento das Receitas (FDNE e SUDENE)	CGLF2022002	2022	Em Andamento	Não	Aprendizado e Crescimento	14. Aprimorar a gestão orçamentária, de forma integrada ao planejamento estratégico	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGLF	-	-
Alterações Orçamentárias	CGLF2022003	2022	Em Andamento	Não	Aprendizado e Crescimento	14. Aprimorar a gestão orçamentária, de forma integrada ao planejamento estratégico	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGLF	-	-
Levantamentos e Solicitações Financeiras (Despesas Discricionárias)	CGLF2022004	2022	Em Andamento	Não	Aprendizado e Crescimento	14. Aprimorar a gestão orçamentária, de forma integrada ao planejamento estratégico	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGLF	-	-
Levantamentos e Solicitações Financeiras (Emendas Impositivas)	CGLF2022005	2022	Em Andamento	Não	Aprendizado e Crescimento	13. Otimizar a captação e a utilização de recursos orçamentários	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGLF	-	-
Restos a Pagar (RP)	CGLF2022006	2022	Em Andamento	Não	Aprendizado e Crescimento	14. Aprimorar a gestão orçamentária, de forma integrada ao planejamento estratégico	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGLF	-	-
Digitalização do Acervo da Sudene	CGLF2022007	2020	Em Andamento	Não	Aprendizado e Crescimento	12. Modernizar e integrar os sistemas de informação		2000 - Administração de Unidade	DAD	CGLF	-	-
Reforma Predial para adequação do novo leiaute da Sudene	CGLF2022008	2022	Concluído	Não				2000 - Administração de Unidade	DAD	CGLF	-	-
Plano de Contratação Anual 2023	CGLF2022009	2022	Em Andamento	Não	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais		2000 - Administração de Unidade	DAD	CGLF	-	-
SigMapas	CGTI2022002	2022	Concluído	Não	Aprendizado e Crescimento	12. Modernizar e integrar os sistemas de informação	Programa 0032 – Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGTI	49.073,84	49.073,84
Agenda Compartilhada	CGTI2022003	2022	Concluído	Não	Aprendizado e Crescimento	12. Modernizar e integrar os sistemas de informação	Programa 0032 – Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGTI	5.000,00	-
Aprimorar a realização de reuniões por videoconferência	CGTI2022004	2022	Concluído	Não	Aprendizado e Crescimento	12. Modernizar e integrar os sistemas de informação	Programa 0032 – Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	2000 - Administração de Unidade	DAD	CGTI	50.000,00	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	COCIC2016002	2016	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	250.000,00
Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN	COCIC2016003	2016	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	500.000,00
Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal/RN.	COCIC2016004	2016	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	813.633,43
Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	COCIC2016005	2016	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.172.497,00	926.955,29
Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	COCIC2016006	2016	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	600.000,00	559.952,79
Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	COCIC2016008	2016	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	500.000,00
Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 1	COCIC2017001	2017	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	500.000,00	400.000,00
Pavimentação de Vias no Município de Tremendal - 2	COCIC2017002	2017	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	500.000,00
Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	COCIC2017003	2017	Atrasado	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	500.000,00	500.000,00
Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	COCIC2017004	2017	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	385.000,00	384.999,99
Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	COCIC2017005	2017	Atrasado	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	500.000,00	500.000,00
Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de Wanderley - Bahia.	COCIC2017008	2017	Atrasado	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	1.000.000,00
Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA	COCIC2017009	2017	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	1.989.238,23	1.989.238,23
Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	COCIC2017010	2017	Atrasado	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	1.500.000,00	1.500.000,00
Pavimentação em paralelepípedos sobre berço de areia, com guias de meio fio pre-moldado e passeios com piso de concreto,nas ruas da sede do município de Matina.	COCIC2017012	2017	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	400.000,00
Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	COCIC2017013	2017	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	700.855,00	490.598,50
Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	COCIC2017018	2017	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	44.381,79
Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	COCIC2017019	2017	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	50.000,00
Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	COCIC2017020	2017	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	264.608,17	52.921,63
Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe	COCIC2017021	2017	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	390.020,00	390.020,00

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
Pavimentação de estradas vicinais - Município de Coronel João Pessoa	COCIC2017024	2017	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.493,20	210.000,00
CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS ACESSOS A PRAIA DE REDONDA MUNICIPIO DE ICAPUI	COCIC2017025	2017	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	700.000,00
Pavimentação - Município de Uruçuca	COCIC2018001	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	1.000.000,00
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO E GUIAS DE SARJETA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PÉ DE SERRA, BAHIA.	COCIC2018002	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	200.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS DE POVOADO LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO	COCIC2018003	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	586.135,00	586.135,00
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	COCIC2018004	2018	Concluído	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	250.000,00	175.000,00
Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	COCIC2018005	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	250.000,00	50.000,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA	COCIC2018006	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	1.000.000,00
Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	COCIC2018007	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.500.000,00	1.500.000,00
Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	COCIC2018008	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	50.000,00
Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	COCIC2018009	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.755.787,09	1.298.524,73
Aquisição de Trator Agricola e Implementos. - Cairu/BA	COCIC2018010	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	150.000,00	-
RECUPERAÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TANHAÇU - BA, PARA APOIO A ATIVIDADE PRODUTIVA.	COCIC2018011	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	400.000,00	400.000,00
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO-BA.	COCIC2018012	2018	Cancelado	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	300.000,00	-
Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	COCIC2018013	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	250.000,00
Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	COCIC2018014	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	700.000,00	490.000,00
Pavimentação de Ruas e Vias no município de Sátiro Dias-BA	COCIC2018015	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	995.818,64

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SÃO FERNANDO/RN.	COCIC2018018	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	49.629,00
Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	COCIC2018019	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	500.000,00
Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	COCIC2018020	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	213.520,47
Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	COCIC2018021	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	250.000,00	200.000,00
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EM PARALELEPÍPEDO PELO MÉTODO CONVENCIONAL, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ/RN	COCIC2018022	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	250.000,00	-
Aquisição de Retroescavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia.	COCIC2018023	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	802.936,73	-
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE RAFAEL JAMBEIRO/BA	COCIC2018024	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	300.000,00	300.000,00
Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	COCIC2018025	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	150.000,00	150.000,00
Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	COCIC2018026	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	175.000,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE PINDOBAÇU	COCIC2018027	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	500.000,00
Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	COCIC2018028	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	115.000,00
Pavimentação em paralelepipedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	COCIC2018029	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	500.000,00
Pavimentação em Paralelepípedos em Ruas da Sede do Município de Monte Santo/BA.	COCIC2018030	2018	Cancelado	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	-
Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de vias no Distrito de Maracajaú em Maxaranguape/RN.	COCIC2018031	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	183.485,84
Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal.	COCIC2018032	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	3.000.000,00	3.000.000,00
Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/Ba	COCIC2018034	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	600.000,00	600.000,00

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lagedo Grande no município de Jundiá/RN.	COCIC2018035	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	260.000,00	159.708,52
Recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município.	COCIC2018036	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	1.000.000,00
Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	COCIC2018037	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	2.000.000,00	2.000.000,00
Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajuípe.	COCIC2018038	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	100.000,00	-
Pavimentação e drenagem superficial de via na Sede do Município de Itajá/RN.	COCIC2018039	2018	Atrasado	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	DPLAN	COCIC	250.000,00	250.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE E DISTRITO DE BENTO SIMÕES – ÁREA URBANA – MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA	COCIC2018040	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	500.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELO DAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE IRARÁ/BA.	COCIC2018041	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	350.000,00
Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibirataia - BA	COCIC2018042	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.438.556,24	1.187.711,25
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DAS COMUNIDADES DE: SÃO BENTO, BREJO, RIACHO DO CEDRO E IBITUNANE, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO/BA.	COCIC2018043	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	500.000,00
CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA	COCIC2018044	2018	Cancelado	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.050.000,00	-
Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	COCIC2018045	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	500.000,00
Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	COCIC2018046	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	50.000,00
Pavimentação em paralelepípedo de ruas no Município de Cordeiros-BA.	COCIC2018047	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	300.000,00	300.000,00
Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	COCIC2018048	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	1.000.000,00
Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubais/RN	COCIC2018049	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	300.000,00	150.000,00
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO COM TRAÇÃO 6X2 - EQUIPADO COM TANQUE RESERVATÓRIO (PIPA) PARA O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/RN.	COCIC2018050	2018	Cancelado	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
CONSTRUÇÃO DE UM POLO COMERCIAL DE ARTESANATO NO MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA - PE	COCIC2018052	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	8902 - Promoção de Investimentos em Infraestrutura Econômica	DPLAN	COCIC	800.000,00	-
Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barrocão – LOTE 02,zona rural do município de Barreiras. BA	COCIC2018053	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	1.000.000,00
Pavimentação em Paralelipípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	COCIC2018055	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	400.000,00
Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	COCIC2018056	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	350.000,00	286.910,00
Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	COCIC2018057	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	100.000,00
Execução de Obras de Pavimentação em Paralelepípedo, em trecho da estrada de acesso ao Distrito de Pataiba, no município de Água Fria-Ba.	COCIC2018058	2018	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	-
Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	COCIC2019001	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	162.500,00
Construção de Mercado Público do município de Sitio Novo/RN	COCIC2019002	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	300.000,00	-
Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana.	COCIC2019003	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	-
Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas.	COCIC2019004	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	250.000,00
Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	COCIC2019005	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	-
Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de PARELHAS	COCIC2019006	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	850.000,00	-
Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Publicas com Construção e Meio Fio no Município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia	COCIC2019007	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	320.000,00	320.000,00
Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripar de diversas ruas no bairro Guajiru, município de São Gonçalo do Amarante – RN	COCIC2019008	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	291.831,01	291.831,00
Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Paratí no município de Assú/RN	COCIC2019009	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	900.000,00	900.000,00
Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	COCIC2019010	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	300.000,00	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	COCIC2019011	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.700.000,00	340.000,00
Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	COCIC2019012	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	-
Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	COCIC2019013	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	300.000,00	-
Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	COCIC2019014	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	50.000,00
Pavimentação em paralelepípedo em via pública no povoado de João Vaz, município de Rio de Contas/BA.	COCIC2019015	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	260.000,00	220.086,98
Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapiá no município de Riacho das Almas	COCIC2019017	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	700.000,00	280.000,00
Drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Parelhas.	COCIC2019018	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	300.000,00	60.000,00
AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA E UMA RASPADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN.	COCIC2019019	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	300.000,00	300.000,00
Pavimentação em CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	COCIC2019020	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	2.410.387,00	2.086.232,20
Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	COCIC2019021	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	2.000.000,00	2.000.000,00
PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	COCIC2019022	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	150.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	COCIC2019023	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.700.000,00	340.000,00
Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	COCIC2019024	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	172.191,48
Pavimentação em paralelepípedo granítico de ruas no Município de Itapissuma/PE, na área Urbana do Município Itapissuma/PE	COCIC2019025	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	779.525,47	779.525,47

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
Pavimentação em paralelepípedos em vias na area urbana do Município de Itambé/PE.	COCIC2019026	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	736.111,49
Construção do Mercado Público Municipal - Ipanguaçu/RN.	COCIC2019027	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	-
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINA AO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA.	COCIC2019028	2019	Concluído	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	1.000.000,00
Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	COCIC2019029	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	2.000.000,00	2.000.000,00
Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	COCIC2019030	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	700.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAÉM/BA	COCIC2019031	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	300.000,00	60.000,00
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE/PE	COCIC2019032	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	600.000,00	240.000,00
Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município de Arcoverde/PE.	COCIC2019033	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	700.000,00	-
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	COCIC2019034	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	300.000,00	-
Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	COCIC2019035	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	846.588,72
Obra de Pavimentação Asfáltica em (CBUQ),na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-BA	COCIC2019036	2019	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	350.000,00	70.000,00
Pavimentação em Paralelepípedos, na zona urbana, no município de Jurema PE.	COCIC2019037	2019	Cancelado	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	800.000,00	-
Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Uruçuca/Ba	COCIC2020001	2020	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	-
CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN	COCIC2020002	2020	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	194.555,54
Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	COCIC2020003	2020	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	150.000,00	-
Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita)	COCIC2020004	2020	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	450.227,00	-
Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Afonso Bezerra – RN.	COCIC2020005	2020	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	150.000,00	150.000,00

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha, Distrito do Guaibim no Município de Valença - BA.	COCIC2020006	2020	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	-
Pavimentação em Paralelepípedo de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Agua Nova/RN.	COCIC2020007	2020	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	250.000,00
Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	COCIC2020008	2020	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	-
Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó – RN.	COCIC2020009	2020	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	150.000,00	-
Ampliação e adequação da passagem molhada entre os bairros Paraíba e Soledade no Município de Caicó/RN.	COCIC2020010	2020	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	250.000,00	250.000,00
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA - RN.	COCIC2020011	2020	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	300.000,00	210.000,00
Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA. - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	COCIC2020012	2020	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	-
Monitoramento das últimas etapas (administrativas internas) de finalização de convênios.2019	COCIC2021001	2021	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	-	-
Pavimentação em pedra tosca com iluminação na zona rural do Município de Piquet Carneiro – Ce.	COCIC2021002	2021	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	-
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE	COCIC2021003	2021	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	-
CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE IBARETAMA-CE.	COCIC2021004	2021	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	-
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL NA LOCALIDADE DE FLORESTA E MURIÇOCA DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS - CE	COCIC2021005	2021	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	-
AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICIPIO DE SERRITA/PE.	COCIC2021006	2021	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	307.230,00	-
aquisição de uma retroescavadeira para a Associação Comunitária do Sitio VArzinha dos Grossos	COCIC2021007	2021	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	389.158,00	389.158,00
Pavimentação em pedra tosca no município de Paracuru-CE	COCIC2021008	2021	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	500.000,00	-
Aquisição de Equipamento Agrícola em Lago do Itaenga/PE	COCIC2021009	2021	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	184.338,00	184.338,00
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em Ipubi/PE	COCIC2021010	2021	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	2.984.100,00	2.984.100,00

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
Aquisição de maquina retroescavadeira para atender as necessidades da ZONA RURAL ATRAVES da ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES em Goiana/PE	COCIC2021011	2021	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	398.158,00	389.158,00
Pavimentação asfáltica em vias do município de Crateús-CE.	COCIC2021012	2021	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	-
aquisição de Trator agrícola e com implementos agrícolas para Associação das Famílias do Quilombo de Tanquinhos Maria de Nazaré da Silva em Águas Belas/PE	COCIC2021013	2021	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	368.676,00	368.676,00
Aquisição de máquina retroescavadeira para atender as necessidades da zona rural de Agrestina/PE.	COCIC2021014	2021	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	398.158,00	389.158,00
Recuperação de estradas vicinais, com execução de revestimento primário (empiçarramento), localizadas na Zona Rural do município de Abaiara/CE	COCIC2021015	2021	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	1.000.000,00	-
Aquisição de caminhão para suporte ao escoamento da produção local e a pequenas obras de auxílio à atividades rurais, no município de Santa Cruz da Baixa Verde-PE	COCIC2022001	2022	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	390.000,00	-
Aquisição de dois veículos automotores tipo pick-up em Paranatama/PE	COCIC2022002	2022	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	372.376,00	-
Pavimentação em paralelepípedos de ruas na zona urbana e rural do Municipio de João Alfredo/PE.	COCIC2022003	2022	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	606.234,77	-
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA PE	COCIC2022004	2022	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	545.825,61	-
Pavimentação em pedras de paralelepípedos nas ruas da zona urbana do município de Ferreiros/PE.	COCIC2022005	2022	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	449.276,71	-
Aquisição de EQUIPAMENTOS AGRICULAS para atender as necessidades da zona rural de Bonito/PE - ASSOC. DOS PEQ PRODUTORES RURAIS DO ST AGUA VERMELHA.	COCIC2022006	2022	Em Andamento	Sim	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Terrirorial e Urbano	7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	DPLAN	COCIC	368.676,00	368.676,00
Convênio 400444 | Processo nº 59335.000049/2010-11 | Associação dos Engenheiros de Pesca de Pernambuco - AEP/PE	CPTCE2022019	2021	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 317590 | Processo nº 59335.000187/2010-92 | Governo de Alagoas	CPTCE2022020	2021	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
Convênio 384829 | Processo nº 59335.000050/2010-38 | Prefeitura de Campina Grande/PB	CPTCE2022021	2022	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 407063 | Processo nº 59335.000062/2010-62 | Prefeitura de Buenos Aires/PE	CPTCE2022022	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 383780 | Processo nº 59335.000412/2009-57 | Prefeitura de Tianguá/CE	CPTCE2022023	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 368683 | Processo nº 59335.000419/2009-79 | Governo de Alagoas	CPTCE2022024	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 368442 | Processo nº 59335.000421/2009-48 | Prefeitura de Croatá/CE	CPTCE2022025	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 348990 | Processo nº 59335.000426/2009-71 | Governo de Alagoas	CPTCE2022026	-	Atrasado	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 384179 | Processo nº 59335.000710/2010-80 | Governo do Piauí	CPTCE2022027	-	Atrasado	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 407141 | Processo nº 59333.000071/2005-14 | CEFET RN	CPTCE2022028	-	Atrasado	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 337714 | Processo nº 59335.000040/2012-64 | CEFET MA	CPTCE2022029	-	Atrasado	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Processo nº 59335.000091/2011-05 | Associação Olindense Dom Vital de Ensino Superior - FOCCA	CPTCE2022030	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 338364 | Processo nº 59335.000153/2012-60 | Governo de Alagoas	CPTCE2022031	-	Atrasado	Não					Superintendência	CPTCE	-	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
Convênio 317573 | Processo nº 59335.000208/2011-50 | Governo do Ceará	CPTCE2022032	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 406121 | Processo nº 59335.000554/2009-14 | Prefeitura de Boca da Mata/AL	CPTCE2022033	-	Atrasado	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 005/2013 | Processo nº 59335.000379/2013-41 | Prefeitura de Areia/PB	CPTCE2022062	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 003/2013 | Processo nº 59335.000381/2013-11 | Prefeitura de Alcantil/PB	CPTCE2022063	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 139/2013 | Processo nº 59335.000385/2013-07 | Prefeitura de São José do Peixe/PI	CPTCE2022064	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 037/2013 | Processo nº 59335.000386/2013-43 | Prefeitura de Picuí/PI	CPTCE2022065	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 099/2013 | Processo nº 59335.000387/2013-98 | Prefeitura de Alagoinha do Piauí/PI	CPTCE2022066	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 148/2013 | Processo nº 59335.000389/2013-87 | Prefeitura de Vila Nova do Piauí/PI	CPTCE2022067	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 147/2013 | Processo nº 59335.000390/2013-10 | Prefeitura de Vera Mendes/PI	CPTCE2022068	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 146/2013 | Processo nº 59335.000391/2013-56 | Prefeitura de Várzea Grande/PI	CPTCE2022069	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 145/2013 | Processo nº 59335.000392/2013-09 | Prefeitura de Velança do Piauí/PI	CPTCE2022070	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
Termo de Compromisso 143/2013 | Processo nº 59335.000394/2013-90 | Prefeitura de Simplício Mender/PI	CPTCE2022071	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 142/2013 | Processo nº 59335.000395/2013-34 | Prefeitura de Simões/PI	CPTCE2022072	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 059/2013 | Processo nº 59335.000397/2013-23 | Prefeitura de Santa Maria do Cambucá/PE	CPTCE2022073	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 058/2013 | Processo nº 59335.000399/2013-12 | Prefeitura de Orobó/PE	CPTCE2022074	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 052/2013 | Processo nº 59335.000401/2013-53 | Prefeitura de Brejão/PE	CPTCE2022075	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 054/2013 | Processo nº 59335.000402/2013-06 | Prefeitura de Capoeiras/PE	CPTCE2022076	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 055/2013 | Processo nº 59335.000403/2013-42 | Prefeitura de Casinhas/PE	CPTCE2022077	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 056/2013 | Processo nº 59335.000404/2013-97 | Prefeitura de Frei Miguelinho/PE	CPTCE2022078	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 045/2013 | Processo nº 59335.000405/2013-31 | Prefeitura de Santa Terezinha/PB	CPTCE2022079	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 048/2013 | Processo nº 59335.000408/2013-75 | Prefeitura de São José do Sabugi/PB	CPTCE2022080	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 049/2013 | Processo nº 59335.000409/2013-10 | Prefeitura de São José dos Ramos/PB	CPTCE2022081	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
Termo de Compromisso 050/2013 | Processo nº 59335.000410/2013-44 | Prefeitura de Sapé/PB	CPTCE2022082	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 051/2013 | Processo nº 59335.000411/2013-99 | Prefeitura de Bom Jardim/PE	CPTCE2022083	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 134/2013 | Processo nº 59335.000412/2013-33 | Prefeitura de Santo Inácio do Piauí/PI	CPTCE2022084	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 135/2013 | Processo nº 59335.000413/2013-88 | Prefeitura de São Félix do Piauí/PI	CPTCE2022085	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 136/2013 | Processo nº 59335.000414/2013-22 | Prefeitura de São Francisco do Piauí/PI	CPTCE2022086	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 137/2013 | Processo nº 59335.000415/2013-77 | Prefeitura de São José da Canabrava/PI	CPTCE2022087	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 140/2013 | Processo nº 59335.000417/2013-66 | Prefeitura de Luís do Piauí/PI	CPTCE2022088	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 141/2013 | Processo nº 59335.000418/2013-19 | Prefeitura de São Miguel do Fidalgo/PI	CPTCE2022089	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 124/2013 | Processo nº 59335.000419/2013-55 | Prefeitura de Paquetá/PI	CPTCE2022090	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 125/2013 | Processo nº 59335.000420/2013-80 | Prefeitura de Patos do Piauí/PI	CPTCE2022091	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 126/2013 | Processo nº 59335.000421/2013-24 | Prefeitura de Pimenteiras/PI	CPTCE2022092	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
Termo de Compromisso 127/2013 | Processo nº 59335.000422/2013-79 | Prefeitura de Pio IX/PI	CPTCE2022093	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 042/2013 | Processo nº 59335.000425/2013-11 | Prefeitura de Princesa Isabel/PI	CPTCE2022094	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 043/2013 | Processo nº 59335.000426/2013-57 | Prefeitura de Queimadas/PB	CPTCE2022095	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 044/2013 | Processo nº 59335.000427/2013-00 | Prefeitura de Rio Tinto/PB	CPTCE2022096	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 035/2013 | Processo nº 59335.000429/2013-91 | Prefeitura de Pedra Larada/PB	CPTCE2022097	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 036/2013 | Processo nº 59335.000430/2013-15 | Prefeitura de Pedro Régis/PB	CPTCE2022098	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 038/2013 | Processo nº 59335.000431/2013-60 | Prefeitura de Pilar/PB	CPTCE2022099	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 128/2013 | Processo nº 59335.000432/2013-12 | Prefeitura de Prata do Piauí/PI	CPTCE2022100	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 039/2013 | Processo nº 59335.000433/2013-59 | Prefeitura de Pilões/PB	CPTCE2022101	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 030/2013 | Processo nº 59335.000434/2013-01 | Prefeitura de Matinhas/PB	CPTCE2022102	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 129/2013 | Processo nº 59335.000435/2013-48 | Prefeitura de Ribeira do Piauí	CPTCE2022103	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
Termo de Compromisso 031/2013 | Processo nº 59335.000436/2013-92 | Prefeitura de Mogueiro/PB	CPTCE2022104	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 032/2013 | Processo nº 59335.000437/2013-37 | Prefeitura de Monteiro/PB	CPTCE2022105	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 026/2013 | Processo nº 59335.000440/2013-51 | Prefeitura de Lagoa de Dentro/PB	CPTCE2022106	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 130/2013 | Processo nº 59335.000441/2013-03 | Prefeitura de Rio Grande do Piauí/PI	CPTCE2022107	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 131/2013 | Processo nº 59335.000443/2013-94 | Prefeitura de Santa Rosa do Piauí/PI	CPTCE2022108	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 029/2013 | Processo nº 59335.000445/2013-83 | Prefeitura de Mataraca/PB	CPTCE2022109	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 132/2013 | Processo nº 59335.000448/2013-17 | Prefeitura de Santana do Piauí/PI	CPTCE2022110	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 133/2013 | Processo nº 59335.000449/2013-61 | Prefeitura de Santo Antônio de Lisboa/PI	CPTCE2022111	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 122/2013 | Processo nº 59335.000450/2013-96 | Prefeitura de Novo Oriente do Piauí/PI	CPTCE2022112	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 123/2013 | Processo nº 59335.000451/2013-31 | Prefeitura de Padre Marcos/PI	CPTCE2022113	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 120/2013 | Processo nº 59335.000453/2013-20 | Prefeitura de Massapê do Piauí/PI	CPTCE2022114	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
Termo de Compromisso 019/2013 | Processo nº 59335.000454/2013-74 | Prefeitura de Itaporanga/PB	CPTCE2022115	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 121/2013 | Processo nº 59335.000455/2013-19 | Prefeitura de Monsenhor Hipólito/PI	CPTCE2022116	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 020/2013 | Processo nº 59335.000456/2013-63 | Prefeitura de Itapororoca/PB	CPTCE2022117	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 015/2013 | Processo nº 59335.000461/2013-76 | Prefeitura de Frei Martinho/PB	CPTCE2022118	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 113/2013 | Processo nº 59335.000462/2013-11 | Prefeitura de Francisco Macedo/PI	CPTCE2022119	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 114/2013 | Processo nº 59335.000463/2013-65 | Prefeitura de Francisco Santos/PI	CPTCE2022120	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 115/2013 | Processo nº 59335.000464/2013-18 | Prefeitura de Ipiranga do Piauí/PI	CPTCE2022121	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 009/2013 | Processo nº 59335.000465/2013-54 | Prefeitura de Borborema/PB	CPTCE2022122	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 010/2013 | Processo nº 59335.000466/2013-07 | Prefeitura de Cacimba de Dentro/PB	CPTCE2022123	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 116/2013 | Processo nº 59335.000467/2013-43 | Prefeitura de Isaias Coelho/PI	CPTCE2022124	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 011/2013 | Processo nº 59335.000468/2013-98 | Prefeitura de Cubati/PB	CPTCE2022125	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
Termo de Compromisso 012/2013 | Processo nº 59335.000469/2013-32 | Prefeitura de Capim/PB	CPTCE2022126	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 013/2013 | Processo nº 59335.000471/2013-10 | Prefeitura de Curral Velho/PB	CPTCE2022127	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 014/2013 | Processo nº 59335.000472/2013-56 | Prefeitura de Cuitegi/PB	CPTCE2022128	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 118/2013 | Processo nº 59335.000473/2013-09 | Prefeitura de Jaicós/PI	CPTCE2022129	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 119/2013 | Processo nº 59335.000475/2013-90 | Prefeitura de Lagoa do Sítio/PI	CPTCE2022130	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 111/2013 | Processo nº 59335.000477/2013-89 | Prefeitura de Floresta do Piauí/PI	CPTCE2022131	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 006/2013 | Processo nº 59335.000478/2013-23 | Prefeitura de Areial/PB	CPTCE2022132	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 101/2013 | Processo nº 59335.000479/2013-78 | Prefeitura de Aroazes/PI	CPTCE2022133	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 109/2013 | Processo nº 59335.000481/2013-47 | Prefeitura de Caridade do Piauí/PI	CPTCE2022134	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 112/2013 | Processo nº 59335.000482/2013-91 | Prefeitura de Francinópolis/PI	CPTCE2022135	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 100/2013 | Processo nº 59335.000483/2013-36 | Prefeitura de Algrete/PI	CPTCE2022136	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
Termo de Compromisso 102/2013 | Processo nº 59335.000484/2013-81 | Prefeitura de Aroeiras do Itaim/PI	CPTCE2022137	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 103/2013 | Processo nº 59335.000485/2013-25 | Prefeitura de Belém do Piauí/PI	CPTCE2022138	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 106/2013 | Processo nº 59335.000488/2013-69 | Prefeitura de Caldeirdão Grande/PI	CPTCE2022139	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 107/2013 | Processo nº 59335.000489/2013-11 | Prefeitura de Campinas do Piauí/PI	CPTCE2022140	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 108/2013 | Processo nº 59335.000490/2013-38 | Prefeitura de Campo Alegre do Fidalgo/PI	CPTCE2022141	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 149/2013 | Processo nº 59335.000514/2013-59 | Prefeitura de João Costa/PI	CPTCE2022142	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 152/2013 | Processo nº 59335.000561/2013-01 | Prefeitura de Sertãozinho/PB	CPTCE2022143	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Termo de Compromisso 150/2013 | Processo nº 59335.000562/2013-47 | Prefeitura de Sossego/PB	CPTCE2022144	-	A Iniciar	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Projeto de Desenvolvimento Federativo	CT2022001	2022	Em Andamento		Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	5. Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação			Diretoria de Planejamento	CGCP	-	-
Bioinsumos Edital	CT2022002	2022	Em Andamento		Resultados para a Sociedade.	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	2217 - Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano		DPLAN	CGDS	-	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
Acompanhamento da gestão das Argumentações Técnicas apresentadas à Sudene como irresignação à exclusão de municípios do Semiárido.	CT2022003	2022	Em Andamento		Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	5. Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação			DPLAN	CGEP	-	-
Relatório da Ouvidoria do FNE Exercicio 2021	OUV2022001	2022	Concluído	Não	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	Todos os Programas do PPA		Superintendência	Ouvidoria	-	-
Relatório de Ouvidoria da Sudene Exercicio 2021	OUV2022002	2022	Concluído	Não	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	Todos os Programas do PPA		Superintendência	Ouvidoria	-	-
Relatório de Pesquisa de Satisfação Externa 2021	OUV2022003	2022	Concluído	Não	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	Todos os Programas do PPA		Superintendência	Ouvidoria	-	-
Pesquisa de Satisf- 2022	OUV2022004	2022	Concluído	Não	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3. Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	Todos os Programas do PPA		Superintendência	Ouvidoria	-	-
TED - EMBRAPA ALGODÃO-CENTRAL DE LEITE	CGDS2022008	2022	Atrasado	Não	Resultados para a Sociedade.	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Programa 2217: Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano	Ação 214S	DPLAN	CGDS	525.000,00	-
PDA/Sudene 2022-2024	CGTI2022005	2022	Em Andamento	Não	Processos Internos	8. Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo		DAD	CGTI	-	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
Conselho Deliberativo da Sudene - Condel	GAB 2022001	2022	Em Andamento	Não	Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	6. Consolidar o Condel da Sudene como órgão superior de articulação e decisões estratégicas	0032 - Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo	-	GAB		-	
Convênio 383527 | Processo nº 59335.000598/2009-44 | Prefeitura de Gilbués/PI	CPTCE2022145	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 384007 | Processo nº 59335.000036/2008-10 | Chã de Alegria/PE	CPTCE2022146	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 384176 | Processo nº 59335.000114/2008-86 | Governo de Sergipe	CPTCE2022147	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 384001 | Processo nº 59335.000017/2011-99 | Governo do Ceará	CPTCE2022148	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 097/99 | Processo nº 59335.000744/2010-75 | Governo do Ceará	CPTCE2022149	-	Atrasado	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 326980 | Processo nº 59335.000721/2010-60 | ADM&TEC - Instituto de Administração e Tecnologia	CPTCE2022150	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Processo nº 59335.000098/2011-27 | UNIECO - Centro de Estudos e Pesquisas Ambientais do Nordeste	CPTCE2022151	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 348985 | Processo nº 59335.000152/2011-34 | Governo de Alagoas	CPTCE2022152	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 348984 | Processo nº 59335.000184/2010-59 | Governo de Alagoas	CPTCE2022153	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 368485 | Processo nº 59335.000321/2008-31 | Prefeitura de João Dourado/BA	CPTCE2022154	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
Convênio 348993 | Processo nº 59335.000168/2010-66 | Governo de Alagoas	CPTCE2022155	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 338794 | Processo nº 59333.000402/2006-16 | Governo do Piauí	CPTCE2022156	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 338464 | Processo nº 59335.000157/2012-48 | Governo da Paraíba	CPTCE2022157	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 368374 | Processo nº 59335.000087/2012-28 | Prefeitura de Assaré - CE	CPTCE2022158	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio SIAFI 371426 | Processo nº 59335.000544/2009-89 | Fundação Quinteto Violado	CPTCE2022159	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio SIAFI 328386 | Processo nº 59335.000060/2010-73 | Flexeiras/AL	CPTCE2022160	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 013/97 | Processo nº 59335.000717/2010-00 | Governo do Piauí	CPTCE2022161	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 337783 | Processo nº 59335.000206/2011-61 | Escola Técnica Federal do Piauí	CPTCE2022162	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio DPS 038/97 | Processo nº 59335.000032/2010-56 | Prefeitura de Morro Cabeça no Tempo/PI	CPTCE2022163	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio SIAFI 368482 | Processo nº 59335.000394/2009-11 | Chã de Alegria/PE	CPTCE2022164	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio SIAFI 407080 | Processo nº 59335.000550/2009-36 | Escada/PE	CPTCE2022165	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
Convênio SIAFI 406129 | Processo nº 59335.000005/2012-45 | Centro Nordestino de Medicina Popular-CNMP	CPTCE2022166	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 395799 | Processo nº 59335.000101/2010-21 | Prefeitura de Porto de Pedras- AL	CPTCE2022167	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Processo nº 59335.000063/2010-15 | IDSTP - Instituto do Desenvolvimento Social e do Trabalho de PE	CPTCE2022168	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 406420 | Processo nº 59335.000103/2011-00 | Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA	CPTCE2022169	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Processo nº 59335.000260/2012-98 | FUBRAS - Fundação Franco-Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento	CPTCE2022170	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio CPE 084/00 | Processo nº 59335.000102/2011-57 | Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA	CPTCE2022171	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio SIAFI 406593 | Processo nº 59335.000356/2009-08 | Autarquia Educacional do Araripe - AEDA	CPTCE2022172	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio SIAFI 407096 | Processo nº 59335.000571/2009-51 | Autarquia Educacional do Araripe - AEDA	CPTCE2022173	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio DDS 107/00 | Processo nº 59335.000035/2011-70 | Governo de Sergipe	CPTCE2022174	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio 406570 | Processo nº 59335.000209/2011-03 | Governo de Alagoas	CPTCE2022175	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Convênio SIAFI 406373 | Processo nº 59335.000720/2010-16 | Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA	CPTCE2022176	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
Convênio 406604 | Processo nº 59335.000707/2010-67 | Centro de Estudos e Pesquisas Josué de Castro	CPTCE2022177	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Processo nº 59335.000019/2011-88 | Secretaria de Estado de Ação Social – SEAS/RN (atual SETHAS - Secretaria	CPTCE2022178	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Processo nº 59335.000365/2011-66 | Cooperativa dos Artesãos em Couro de Ribeira de Cabaceiras LTDA - ARTEZA	CPTCE2022179	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
Processo nº 59336.000406/2021-86 | Grupo Gestão Pesquisa, Planejamento e Organização Social	CPTCE2022180	-	Em Andamento	Não					Superintendência	CPTCE	-	-
A2 INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	CGIF2022075	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	1402163,6	
ALBERTO SA INDUSTRIA E COMERCIO	CGIF2022076	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	1500000	
ARTHUR AZEVEDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L...	CGIF2022077	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	442979,84	
BELGO BEKAERT ARAMES LTDA	CGIF2022078	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	3224160	
BENTONIT UNIAO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CGIF2022079	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	340833,07	
BEZERRA INDUSTRIA DE ACO E SERVICOS LTDA	CGIF2022080	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	1126713	
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	CGIF2022081	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	207193228,8	
BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	CGIF2022082	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF		
CHEMTRADE BRASIL LTDA	CGIF2022083	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	7902072,42	
CIA DE GAS DO CEARA CEGAS	CGIF2022084	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	1410742	
COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO N...	CGIF2022085	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	106964068,8	
COMVAP ACUCAR E ALCOOL LTDA	CGIF2022086	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	67341606,05	
CONCESSIONARIA ESTRADA DO FEIJAO SPE S/A	CGIF2022087	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	123546,89	
CONVERT INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	CGIF2022088	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	500000	
COSTANOX ACOS INOXIDAVEIS EIRELI	CGIF2022089	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	813234,15	
COTESI DO BRASIL - COMERCIO, INDUSTRIA DE FIOS ...	CGIF2022090	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF		

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
DAKOTA CALCADOS S/A	CGIF2022091	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	17725265	
DIVISAGLASS LTDA	CGIF2022092	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF		
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA -...	CGIF2022093	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	371897435,7	
EMPRESA SUDESTE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.	CGIF2022094	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	549992000	
ENGPLAST LTDA	CGIF2022095	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	150000	
FERTIAL-FERTILIZANTES DE ALAGOAS LTDA	CGIF2022096	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	808000	
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	CGIF2022097	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	609301,54	
FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	CGIF2022098	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF		
FRIBARREIRAS AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS EIRELI	CGIF2022099	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	3000000	
GREEN PCR FLAKE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC...	CGIF2022100	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	3000000	
GRENDENE S A	CGIF2022101	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	187566268	
I.V.L. INDUSTRIAS VIEIRA LTDA	CGIF2022102	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	10000000	
IBAE - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS ESPECI...	CGIF2022103	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	17565155,04	
IBAE - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS ESPECI...	CGIF2022104	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	17565155,04	
ICONE MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPORTACA...	CGIF2022105	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	329505,29	
INDUSTRIA ALIMENTICIA TRES DE MAIO SA	CGIF2022106	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF		
INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO GUARANI LTD	CGIF2022107	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF		
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MARATA LTDA.	CGIF2022108	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	5000000	
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MARATA LTDA.	CGIF2022109	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	5000000	
INDUSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA	CGIF2022110	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	2960791	
INDUSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA	CGIF2022111	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF		
INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO LTDA	CGIF2022112	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	2300000	
INFAN INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	CGIF2022113	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	4560077,28	
IPVC INDUSTRIA DE PAPELAO LTDA	CGIF2022114	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	1488458,43	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
J MACEDO S/A	CGIF2022115	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF		
J. R. COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA	CGIF2022116	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	4744135,28	
JAV INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	CGIF2022117	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	20000000	
JAV INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	CGIF2022118	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF		
JOSE GONCALVES DANTAS EIRELI	CGIF2022119	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	3022023,85	
LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.	CGIF2022120	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	123416181	
LATICINIO SERTAO JUCURUTU EIRELI	CGIF2022121	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	4500000	
LATICINIO SERTAO JUCURUTU EIRELI	CGIF2022122	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF		
LAURA MILENA BARBOSA PATRIOTA LTDA	CGIF2022123	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	7761130	
LS HOTEL EIRELI	CGIF2022124	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	4000000	
LUMINAE S.A.	CGIF2022125	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	5376338,84	
MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	CGIF2022126	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	391026448,6	
MAR - MARACANAU RECICLAGEM DE SUBPRODUTOS LTDA	CGIF2022127	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	2183727,72	
MAR - MARACANAU RECICLAGEM DE SUBPRODUTOS LTDA	CGIF2022128	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	2183727,72	
MARSOL HOTEIS E TURISMO S/A	CGIF2022129	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	45180	
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLAS...	CGIF2022130	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	243000	
MINAS MINERACAO LTDA	CGIF2022131	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	6267328,72	
MOINHO TABAJARA LTDA	CGIF2022132	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	1400000	
MORAIS DE CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU...	CGIF2022133	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	700000	
MULTIPLAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	CGIF2022134	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	315000	
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	CGIF2022135	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	154433,07	
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	CGIF2022136	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	154433,07	
NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOG...	CGIF2022137	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	285299,72	
NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOG...	CGIF2022138	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	285299,72	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
NOGUEIRA DE LIMA E FILHOS LTDA	CGIF2022139	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	609693,49	
PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	CGIF2022140	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	7062984,45	
PARK HOTEL E ADMINISTRACAO LTDA	CGIF2022141	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF		
PERNAMBUCO QUIMICA S A	CGIF2022142	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	4000000	
PLASTMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	CGIF2022143	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	128168,96	
POLIMIX CONCRETO LTDA	CGIF2022144	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	4820076,67	
POLIMIX CONCRETO LTDA	CGIF2022145	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	32378931,31	
PRITAM FRUT EXPORTACAO LTDA	CGIF2022146	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	7000000	
PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA	CGIF2022147	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	9635668,41	
R DOIS INJETADOS NORDESTE LTDA	CGIF2022148	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	2951458	
RUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CGIF2022149	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	28944933,57	
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A	CGIF2022150	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF		
SAGA MEDICAO S/A	CGIF2022151	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF		
SANNY CONFECCOES FEMININAS SA	CGIF2022152	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	102565,01	
SF RANCHARIA LTDA.	CGIF2022153	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	14584510	
SF RANCHARIA LTDA.	CGIF2022154	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	14584510	
SF RANCHARIA LTDA.	CGIF2022155	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF		
SWEET FRUITS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS PARA...	CGIF2022156	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF		
THOR GRANITOS E MARMORES LTDA	CGIF2022157	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF		
THOR GRANITOS E MARMORES LTDA	CGIF2022158	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF		
THOR GRANITOS E MARMORES LTDA	CGIF2022159	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF		
TOMBADOR IRON MINERACAO LTDA	CGIF2022160	2022	Concluído	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	31035329,28	
TORMAQ RACOES LTDA	CGIF2022161	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	834638,92	
TRANSMISSORA SERTANEJA DE ELETRICIDADE S.A.	CGIF2022162	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	219294920,4	

Projeto	Número do Projeto	Ano	Status	Prioritário (Classificação 2017/18)	Perspectiva (PEI)	Objetivo estrátegico PEI	Programa do PPA	Ação do PPA	Diretoria responsável	Subunidade responsável	Valor Total do Projeto (R$)	Total Liberado até o exercício
UPPER DOG COMERCIAL LTDA	CGIF2022163	2022	Em Andamento	Não	Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação			DFIN	CGIF	8301743,39	

Anexo II - Projetos do Monitoramento (posição de 30.06.2022)

CGDS/CODEM - Projetos

CGDS2022009 - Pescado - INSA

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	CGDS/DPLAN	Concluído	10-dez-21	23-dez-21		10-dez-21	23-dez-21		100		
Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	21-dez-21	21-dez-21		21-dez-21	21-dez-21		100		
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	Sudene / INSA	Concluído	20-dez-21	23-dez-21		20-dez-21	23-dez-21		100		
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	Sudene / INSA	Concluído	20-dez-21	23-dez-21		20-dez-21	23-dez-21		100		
Publicação	Publicação do TED	Gabinete/Sudene	Concluído							100		
Descentralização	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS/DPLAN/ CGAF/DAD/GAB	Concluído	30-dez-21	30-dez-21	R$831.600,00	30-dez-21	30-dez-21	R$831.600,00	100		
META 1	Estruturação do Centro de Tecnologia e Inovação de Pescado Sustentável para o Semiárido	INSA	Atrasado	31-dez-20	30-jun-21					0	Consta nas Disposições Finais do TED Nº 12/2020, que a "DESCENTRALIZADA tem 03 (três) meses, a contar da assinatura deste termo, para a inserção de documentação que esclareça o item "4.1. Das metas e etapas" do Parecer Técnico nº 372/2020 (Doc SEI nº 0211727), bem como de qualquer outro esclarecimento que a equipe técnica da SUDENE julgar relevante para a boa execução deste instrumento. Até o momento, não foi apresentado pela Descentralizada os esclarecimentos solicitados. Por outro lado, informamos que este projeto tem como base física uma estação de piscicultura do DNOCS. Isto demandou articulações entre o INSA e o DNOCS para que fosse firmado um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre essas duas instituições para que o projeto pudesse ter a sua formatação concluída e sua execução iniciada. A celebração deste ACT demorou bastante, sendo necessária, no momento, a realização de uma reunião com as três partes envolvidas para que sejam discutidas as medidas necessárias que possam vir a viabilizar a execução deste projeto.	Agendar reunião com as três partes envolvidas (Sudene/ INSA/ DNOCS) para que possam ser discutidas as medidas necessárias que possam vir a viabilizar a execução deste projeto.
Etapa 1.1	Realizar um diagnóstico de atividades produtivas a serem implantadas nas instalações existentes do DNOCS na barragem do Amanari, no município de Maranguape, a fim de identificar as potencialidades para aplicação de tecnologias	INSA	Atrasado	31-dez-20	28-fev-21	R$20.000,00				0		
Etapa 1.2	Desenvolver ações de sensibilização para selecionar o público alvo do projeto, com foco nas atividades com potencial produtivo identificado, envolvendo rede de parceiros locais para execução e acompanhamento dessas ações	INSA	Atrasado	28-fev-21	30-jun-21	R$36.000,00				0		
META 2	Tecnologias aplicadas para produção local	INSA	Atrasado	31-jan-21	30-jun-22					0		
Etapa 2.1	Elaborar um Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Financeiro do Centro de Tecnologia	INSA	Atrasado	31-jan-21	31-mar-21	R$60.000,00				0		
Etapa 2.2	Implantar Unidade Demonstrativa Produtiva que envolvam desde a produção até o aproveitamento de seus resíduos em novas atividades, podendo levar a eficiência energética, segurança hídrica e alimentar.	INSA	Atrasado	30-jun-21	30-jun-22	R$326.000,00				0		
META 3	Implantar o programa "Qualificar para produzir" para capacitar os produtores de pescado	INSA	Atrasado	31-out-21	31-dez-22					0		
Etapa 3.1	Qualificar os beneficiários através de oficinas de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos, Técnicas de Beneficiamento do Pescado, Beneficiamento dos resíduos do pescado, Elaboração de derivados de pescado para agregação de valor e acompanhamento com chef para elaboração de formulações gastronômicas específicas alinhados com a tendência de mercado	INSA	Atrasado	31-out-21	31-dez-22	R$249.000,00				0		
META 4	Estimular o surgimento de novos negócios e/ou novos produtos, visando acessar nichos de mercado diferenciado, alinhado com as tendências de consumo de alimentos, no atendimento das legislações sanitárias, com agregação de valor	INSA	Atrasado	31-jan-22	31-dez-22					0		
Etapa 4.1	Inserir os produtos elaborados em ferramentas digitais que permitam facilitar a relação de quem produz e quem consome, visando ampliar as opções de mercado para o produtor e o acesso a produtos de qualidade com preços diferenciados aos consumidores	INSA	A Iniciar	31-jul-22	31-dez-22	R$26.000,00				0		
Etapa 4.2	Desenvolver identidade visual, rótulo e ficha técnica para os produtos e embalagens específicas.	INSA	Atrasado	31-jan-22	31-dez-22	R$15.000,00				0		
META 5	Sistematizar as ações realizadas, além de listar outras oportunidades de incentivo a produção, e divulgar entre os parceiros a boa prática para replicação da experiência em outras unidades do DNOCS	INSA	A Iniciar	31-jul-22	31-dez-22					0		
ETAPA 5.1	Realização de Workshop	INSA	A Iniciar	31-jul-22	31-dez-22	R$24.000,00				0		
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação	CODEM/CGDS	A Iniciar	2-jan-24	2-jan-25					0		
Resumo Projeto			Atrasado								Esta iniciativa envolve três instituições: Sudene, INSA e DNOCS. O INSA ainda apresenta pendências de ordem técnica com a Sudene. A relação do INSA com o DNOCS (ACT) foi recentemente resolvido. É necessário uma concertação entre as três instituições envolvidas para o bom andamento do projeto. Agendar reunião com a participação das três partes envolvidas. Após a formalização do ACT, entre o INSA e o DNOCS, é necessário fazer uma nova pactuação entre os participantes.	Encaminhar Ofício para as partes envolvidas para o agendamento de reunião/ oficina para adoção das medidas para a repactuação necessária para a retomada do projeto. Ofício elaborado encaminhado para assinatura solicitando informação e reunião para repactuação.
						R$1.587.600,00			**R$831.600,00**	**30**		

CGDS2022008 Embrapa Algodão - Central de Leite Caprino

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas

Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta, análise da mesma de acordo com os critérios e elaboração de pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS/DPLAN	Concluído	24-set-21	22-dez-21		24-set-21	22-dez-21		100	O TED foi aprovado considerando o mérito do seus objetivos. Entretanto, o Projeto Básico ainda não foi definitivamente aprovado, o que ocorrerá quando do seu devido envio pela Embrapa Algodão. No Plano de Trabalho consta "Cláusula de Pendência Técnica", onde são presentados itens a serem atendidos pela Embrapa, condicionante para que possa ocorrer a liberação da primeira parcela de recursos.	
Analise jurídica	Análise e parecer juridico da Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	23-dez-21	23-dez-21		23-dez-21	23-dez-21		100	Poderá haver um novo parecer quando da aprovação final.	
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	CODEM/CGDS COCIC/CGDS Gabinete Embrapa	Concluído	22-dez-21	28-dez-21		22-dez-21	28-dez-21		100	Informamos que o Plano de Trabalho poderá sofrer ajuste , quando o Projeto Básico for aprovado em definitivo.	
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	COCIC/CGDS Gabinete Embrapa	Concluído	6-dez-21	28-dez-21		6-dez-21	28-dez-21		100	Informamos que o TED poderá sofrer ajuste, quando o Projeto Básico for aprovado em definitivo.	
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ ASCOM	Concluído	22-dez-21	29-dez-21		22-dez-21	29-dez-21		100		
Descentralização de recursos	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Atrasado	1-jan-22	31-jan-22	R$262.500,00				0	Consta no Plano de Trabalho, assinado entre as partes, a "Cláusula de Pendência Técnica", onde são presentados itens a serem atendidos pela Embrapa, condicionante para que possa ocorrer a liberação da primeira parcela de recursos.	
Descentralização de recursos	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	A Iniciar	1-jan-23	31-jan-23	R$262.500,00				0		
Meta 1	Reforma do Laboratório (Central de Leite e Produtos Lácteos)	Embrapa Algodão	Atrasado	1-jan-22	31-dez-22	R$364.000,00				0		
Etapa 1.1	Estrutura física, elétrica, rede e telefônica, hidrossanitária predial reformada e Laboratório Central de Qualidade do Leite e Produtos Lácteos Caprinos implantado	Embrapa Algodão	Atrasado	1-jan-22	31-dez-22	R$350.000,00				0		
Etapa 1.2	Visitas da equipe de engenharia para acompanhamento da obra realizadas	Embrapa Algodão	Atrasado	1-jan-22	31-dez-22	R$14.000,00				0		
Meta 2	Emissão de 500 laudos de análise e orientação dos produtores	Embrapa Algodão	A Iniciar	1-set-22	31-dez-24	R$136.000,00				0		
Etapa 2.1	Contratação de bolsistas com Bolsas de técnicos modalidade A para emissão de laudos da central de qualidade e acompanhamento/orientação nutricional	Embrapa Algodão	A Iniciar	1-set-22	31-dez-24	R$80.000,00				0		
Etapa 2.2	Contratação de bolsistas com Bolsas de técnicos modalidade B para emissão de laudos da central de qualidade e acompanhamento/orientação nutricional	Embrapa Algodão	A Iniciar	1-nov-22	31-dez-24	R$56.000,00				0		
Meta 3	Realizar a gestão operacional, administrativa, financeira e prestação de contas	Embrapa Algodão	Atrasado	1-jan-22	31-dez-24	R$25.000,00				0		
Etapa 3.1	Execução e prestação de contas de despesas operacionais e administrativas	Embrapa Algodão	Atrasado	1-jan-22	31-dez-24	R$25.000,00				0		
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação	CODEM/CGDS COCIC/CGDS	A Iniciar	1-jan-25	31-dez-25					0		
Resumo Projeto			Atrasado			R$525.000,00					Foi encaminhada à Embrapa Algodão as informações referentes às pendências a serem atendidas, para que possa ocorrer o início desse projeto. A Embrapa Algodão ainda não deu o retorno referente às pendências identificadas. Devido ao tempo transcorrido, possivelmente, será necessário a repactuação das datas de realização das Metas/ Etapas. Por isso, o status "A Iniciar".	Encaminhar Ofício à Embrapa Algodão para solicitar a apresentação das pendências identificadas para o início do projeto, quando as datas deverão ser repactuadas. Ofício encaminhado à instituição parceira solicitando a solução das pendências identificadas.
						R$2.100.000,00			**R$0,00**	**31,25**		

CGDS2022007- SECTI Bahia - IA

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Seleção e análise técnica da Proposta	Seleção e análise técnica da Proposta	CODEM/CGDS	Concluído	9-dez-20	24-dez-20		9-dez-20	24-dez-20		100		
Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	28-dez-20	30-dez-20		28-dez-20	29-dez-20		100		
Termo de Convênio	Formatação e assinatura do Convênio	COCIC/CGDS Gabinete SECTI-BA	Concluído	24-dez-20	31-dez-20		24-dez-20	31-dez-20		100		
Publicação	Publicação do Convênio	Gabinete	Concluído	31-dez-20	5-jan-21		31-dez-20	5-jan-21		100		
Liberação - 1ª parcela	Repasse de recursos da primeira parcela prevista para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Atrasado	1-mar-21	30-abr-21	R$615.000,00				0	Vide linha 8 (meta 2). Parcela reprogramada para ser paga no primeiro semestre de 2022, após conclusão do processo seletivo relativo às bolsas.	Vide linha 8 (meta 2)
Meta 1	Dar início ao projeto com atividades de alinhamento de todos os membros e montagem da equipe	SECTI / BA	Atrasado	1-nov-21	30-nov-21	R$184.680,00	1-fev-21		R$0,00	20	Dificuldades na adesão das ICTs da Bahia na rede, levaram à demora na concretização da Rede da atores participantes, agravado pelas restrições impostas pela Pandemia do Covid-19	Trabalho de convencimento e alinhamento de expectativas, com respectivo ACT assinado entre os participantes
Meta 2	Construção de conteúdos de IA	SECTI / BA	Atrasado	1-dez-21	31-ago-22	R$145.105,00			R$0,00	20	Impasse e dificuldades na descisão de como viabilizar o pagamento das bolsas aos professores e alunos bolsistas participantes. Atividade ainda não concluída, no aguardo do resultado do Edital de seleção.	A SECTI Bahia resolveu assumir a operacionalização do pagamento das bolsas (no projeto seria a FAPESB - Fund de Amparo à Pesquisa da Bahia), construindo Edital de seleção dos professores participantes. Tanto do conteúdo quanto da disseminação das atividades de Rede Bah.IA
Meta 3	Definir e contratar o ambiente de armazenamento dos cursos e dos conteúdos para acesso pelos envolvidos	SECTI / BA	Atrasado	1-jan-22	31-mar-22	R$62.560,00			R$0,00	0	A Aquisição dos serviços de armazenamento somente vai acontecer após a definição dos conteúdos mínimos, dimensionando o total de armazenagem necessário.	
Meta 4	Disseminar o projeto para a sociedade	SECTI / BA	Atrasado	1-jan-22	31-out-22	R$193.475,00			R$0,00	20	Ainda não houve os seminários de divulgação e capacitação, aguardando os conteudos	Reuniões da Rede de parceiros está divulgando as ações, em caráter preliminar
Meta 5	Monitoramento e Avaliação	SECTI / BA	A Iniciar	1-nov-22	30-dez-22	R$30.780,00			R$0,00	0		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela convenente.	SECTI / BA	A Iniciar	2-jan-23	4-mar-23					0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CODEM/CGDS	A Iniciar	5-mar-23	15-abr-23					0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC/CGDS	A Iniciar	5-mar-23	15-abr-23					0		

Resumo Projeto			Atrasado								A convenente foi informada que é necessário a confirmação da publicação dos editais de seleção e inserção de todos os processos seletivos na Plataforma +Brasil, na aba Processo de Execução, item Inexibilidade, assim como o resultado final destas seleções, para análise da equipe técnica, com a finalidade de dar suporte à liberação da primeira parcela de recursos para este Convênio. A Convenente apresentou dúvidas quanto a necessidade de apresentação dos processos seletivos, na Plataforma +Brasil, para análise da equipe técnica. Editais de seleção dos bolsistas e o acordo de cooperação técnica da rede inteligência artificial (instituições participantes) encontram-se em análise pela PGE da Bahia desde Janeiro/2022.	Foi enviado Ofício para a Convenente, informando a necessidade de publicação dos editais de seleção e inserção de todos os processos seletivos na Plataforma +Brasil, para análise da equipe técnica, com o fim de dar suporte à liberação da primeira parcela de recursos para este Convênio. A Convenente confirmou o recebimento, informando que adotará as medidas necessárias.
						R$1.231.600,00			**R$0,00**	**35,38461538**		

CGDS2022006 - COOPEMAPI

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	Concluído	2-jun-21	21-dez-21		2-jun-21	21-dez-21		100		
Analise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	22-dez-21	23-dez-21		22-dez-21	23-dez-21		100		
Elaboração da minuta do Termo de Fomento	Elaboração do minuta do Termo de Fomento	COCIC	Concluído	17-dez-21	29-dez-21		17-dez-21	29-dez-21		100		
Assinatura do Termo de Fomento	Assinatura do Termo de Fomento	GABINETE / INSA	Concluído	30-dez-21	30-dez-21		30-dez-21	30-dez-21		100		
Publicação do Termo de Fomento	Publicação do Termo de Fomento no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	31-dez-21	31-dez-21		31-dez-21	31-dez-21		100		
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	Repasse dos recursos referente a primeira (única) parcela.	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	1-jan-22	31-jan-22		19-abr-22	19-abr-22		100	Ainda não foi realizado a liberação de recursos. A COOPEMAPI ainda não enviou nenhum relatório de acompanhamento e, não informou a contratação da empresa que realizará o Projeto. A liberação de recursos para esse projeto aconteceu em 19/04/2022.	
Meta 1	Contratação da Empresa Executora e Diagnostico produtivo da apicultura tradicional e orgânica da Região Norte de Minas Gerais - a partir dos orçamentos de menor preço oferecido.	COOPEMAPI	Atrasado	31-dez-21	30-jul-22	R$131.000,00				0		
Etapa 1.1	Cadastrar produtores de mel nos municípios de Bocaiúva/MG, Coração de Jesus/MG, Catuti/MG, Guaraciama/MG, São João da Ponte/MG, Brasília de Minas/MG, Montes Claros/MG, Ubaí/MG, Mato Verde/MG, Porteirinha/MG trabalhados pela COOPEMAPI	COOPEMAPI	Atrasado	1-fev-22	30-jul-22					0		
Etapa 1.2	Identificar o volume das produções	COOPEMAPI	Atrasado	1-fev-22	30-jul-22					0		
Etapa 1.3	Georreferenciamento das propriedades produtoras de mel e produtos das abelhas (rastreabilidade)	COOPEMAPI	Atrasado	1-fev-22	30-jul-22					0		
Etapa 1.4	Levantamento sobre a titularidade das propriedades a serem cadastradas	COOPEMAPI	Atrasado	1-fev-22	30-jul-22					0		
Etapa 1.5	Preenchimento da Solicitação de Cadastro de Organismo de Controle Social juntos aos produtores cadastrados.	COOPEMAPI	Atrasado	1-fev-22	30-jul-22					0		
Etapa 1.6	Realizar preenchimento do Termo de Compromisso com a Garantia da Qualidade Orgânica dos produtores cadastrados.	COOPEMAPI	Atrasado	1-fev-22	30-jul-22					0		
Etapa 1.7	1.7 Realizar preenchimento dos Dados Cadastrais da Unidade de Produção Vinculada a Organização de Controle Social dos produtores cadastrados	COOPEMAPI	Atrasado	1-fev-22	30-jul-22					0		
Meta 2	Capacitar 30 (trinta) Produtores (Apicultores)	COOPEMAPI	Atrasado	31-dez-21	30-jul-22	R$42.000,00				0		
Etapa 2.1	Realizar capacitação 30 produtores em plano de manejo para Produção Orgânica, preenchimento das fichas (anexo), legislação orgânica, identificações de áreas vocacionadas para a produção orgânica, orientações gerais.	COOPEMAPI	Atrasado	1-jun-22	30-jul-22					0		
Meta 3	Treinar 5 (cinco) multiplicadores	COOPEMAPI	Atrasado	31-dez-21	30-jul-22	R$18.000,00				0		
Etapa 3.1	Realizar treinamento de 5 (cinco) multiplicados para dar suporte e continuidade das atividades deste projeto nos temas: plano de manejo para produção orgânica, preenchimento das fichas (anexo a proposta),legislação orgânica, identificações de áreas vocacionadas para a produção orgânica, orientações gerais	COOPEMAPI	Atrasado	31-dez-21	30-jul-22					0		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela convenente.	COOPEMAPI	A Iniciar	22-mar-23	19-jun-23					0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CODEM/CGDS	A Iniciar							0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC/CGDS	A Iniciar							0		O cronograma de desembolso foi atualizado e os recursos foram liberados para a COOPEMAPI. Sugestação de encaminhar ofício à COOPEMAPI, registrando a liberação dos recursos para a execução deste projeto, bem como, abordando a necessidade de repactuação de datas para a execução de Metas/ Etapas. Ofício em elaboração para ser enviado à Coopemapi.
Resumo Projeto			Atrasado								A COOPEMAPI solicitou a liberação dos recursos, entretanto, a Sudene está aguardando a atualização no cronograma desembolso, pré-requisito para que seja realizado a liberação de recursos. O cronograma de desembolso foi atualizado e os recursos para execução deste projeto foram disponibilizados pelo MDR para serem disponibilizados à COOPEMAPI, tendo ocorrido a liberação dos recursos no dia 19/04/2022. Atraso no atendimento à atualização no cronograma de desembolso, e atraso na disponibilização dos recursos pelo MDR a serem liberados para a COOPEMAPI. Devido ao atraso transcorrido antes do início da execução, possivelmente, será necessária a repactuação das datas de realização das Metas/ Etapas. Por isso, o status "A Iniciar".	O cronograma de desembolso foi atualizado e os recursos foram liberados para a COOPEMAPI. Sugestação de encaminhar ofício à COOPEMAPI, registrando a liberação dos recursos para a execução deste projeto, bem como, abordando a necessidade de repactuação de datas para a execução de Metas/ Etapas. Ofício em elaboração para ser enviado à Coopemapi.
						R$191.000,00			**R$0,00**	**28,57142857**		

CGDS2022005 - EMBRAPA Mandiocultura

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	CODEM/CGDS	Concluído	30-nov-21	17-dez-21		30-nov-21	17-dez-21		100		

Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	23-dez-21	27-dez-21		23-dez-21	27-dez-21		100		
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	CODEM/CGDS Gabinete Embrapa	Concluído	23-dez-21	30-dez-21		23-dez-21	30-dez-21		100		
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	COCIC/CGDS Gabinete Embrapa	Concluído	23-dez-21	30-dez-21		23-dez-21	30-dez-21		100		
Publicação	Publicação do TED	Gabinete	Concluído	30-dez-21	30-dez-21		30-dez-21	30-dez-21		100		
Descentralização	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	30-dez-21	31-dez-21		31-dez-21	31-dez-21		100		
Meta 1	Identificação das principais doenças, pragas e viroses da cultura da mandioca em até 12 meses	Embrapa Semiárido	Atrasado	1-dez-21	1-dez-22	R$25.900,00				0	A área técnica da Embrapa Semiárido, até o momento, ainda não nos enviou posição mais atualizada. Assim,segue com base no que foi acordado no Plano de Trabalho, ficando sujeito a ajustes e atualizações posteriores quando do envio de informações pela Embrapa.	
Meta 2	Identificação de, pelo menos, uma cultivar de mandioca tolerante à bacteriose	Embrapa Semiárido	A Iniciar	1-jul-22	1-dez-23	R$11.500,00				0		
Meta 3	Identificação de, pelo menos, uma cultivar de mandioca tolerante à broca da haste	Embrapa Semiárido	A Iniciar	1-jul-22	1-dez-23	R$11.500,00				0		
Meta 4	Seleção de, pelo menos, um genótipo de mandioca mais tolerante ao estresse hídrico	Embrapa Semiárido	A Iniciar	1-abr-22	1-jan-24	R$70.350,00				0		
Meta 5	Material propagativo de, pelo menos, três cultivares elite de mandioca para agroindústria e quatro cultivares elite de mandioca para mesa multiplicados.	Embrapa Semiárido	Atrasado	1-abr-22	1-jun-23	R$12.000,00				0		
Meta 6	Estabelecimento de, pelo menos, duas unidades de validação de cultivares elite de mandioca na região do Cariri cearense	Embrapa Semiárido	A Iniciar	1-jul-22	1-jan-24	R$42.600,00				0		
Meta 7	Realização de, pelo menos, duas ações de transferência de tecnologia em mandiocultura para produtores de mandioca	Embrapa Semiárido	Atrasado	1-abr-22	1-jan-24	R$15.150,00				0		
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação	CODEM/CGDS	A Iniciar	2-jan-24	2-jan-25					0		
Resumo Projeto			Atrasado								É necessário que a Embrapa Semiárido apresente informações mais recentes para que este sistema seja alimentado/ atualizado.	Encaminhar ofício à Embrapa Semiárido solicitando informações para atualização do sistema. Ofício encaminhado à Embrapa Semiárido solicitando informações sobre o andamento do projeto.
						R$189.000,00			**R$0,00**	**42,85714286**		

CGDS2022004 - Pescado IFCE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	CODEM/CGDS	Concluído	6-dez-21	30-dez-21		6-dez-21	27-dez-21		100		
Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	28-dez-21	28-dez-21		28-dez-21	28-dez-21		100		
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	CODEM/CGDS Gabinete IFCE	Concluído	27-dez-21	31-dez-21		27-dez-21	30-dez-21		100		
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	COCIC/CGDS Gabinete IFCE	Concluído	29-dez-21	31-dez-21		29-dez-21	30-dez-21		100		
Publicação	Publicação do TED	Gabinete/ASCOM	Concluído	29-dez-21	31-dez-21		29-dez-21	30-dez-21		100		
Descentralização	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS/DPLAN/GAB/CGAF/DAD	Concluído	30-dez-21	30-jan-22		19-abr-22	19-abr-22		0	Mudança de dotação orçamentária causando atraso de liberação de recursos e readequação do cronograma físico e desembolso. Descentralização de recursos ocorreu em 19/04/2022.	O IFCE está em fase de readequação do cronograma físico e financeiro. O IFCE realizou os devidos ajustes no Plano de Trabalho e está em fase de liberação dos recursos.
Meta 1	Mobilização do público alvo (bolsas), Aquisição do entreposto móvel, Adequação do entreposto móvel, transporte, custos indiretos, Pessoa Jurídica - Treinamento equipe EMPP	IFCE	Atrasado	1-jan-22	1-fev-23	R$673.599,92				0	Em face da mudança orçamentária, ainda em tramitação, ocorre atraso no cronograma de execução; Isto traz repercussão em todas as fases operacionais do TED.	
Meta 2	Qualificaçãodos Beneficiários, Pessoa Jurídica - oficina beneficiamento do pescado, Aquisição do material de consumo para oficinas, bolsas	IFCE	Atrasado	1-abr-22	1-fev-23	R$175.900,00				0		
Meta 3	Workshop realizado, Aquisição de material para consumo para o workshop, relatório final	IFCE	A Iniciar	1-jan-23	29-mar-23	R$10.500,00				0		
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação	CODEM/CGDS	A Iniciar	30-mar-23	29-mar-24					0		
Resumo Projeto			Atrasado								Após a realização de diversos ajustes/ adequações a equipe técnica de acompanhamento concluiu que o projeto, sob o ponto de vista técnico, está apto a receber a liberação de recursos. Foram realizados ajustes no Plano de Trabalho que deverá ser assinado pelas partes para dar continuidade ao projeto. Após os ajustes no Plano de Trabalho foi possível realizar a liberação de recursos no dia 19/04/2022. Devido ao tempo transcorrido até a liberação dos recursos, possivelmente, será necessária a repactuação de datas para realização das Metas/ Etapas. Por isso, o status "A Iniciar".	Encaminhar ofício ao IFCE registrando a liberação dos recursos para a execução deste projeto, bem como, abordando a necessidade de repactuação de datas para a execução de Metas/ Etapas.
						R$859.999,92			**R$0,00**	**50**		

CGDS2022003- Solar - IFCE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	CODEM/CGDS	Concluído	3-dez-21	17-dez-21		3-dez-21	15-dez-21		100		
Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	18-dez-21	30-dez-21		16-dez-21	20-dez-21		100		
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	CODEM/CGDS Gabinete IFCE	Concluído	17-dez-21	23-dez-21		10-dez-21	23-dez-21		100		
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	COCIC/CGDS Gabinete IFCE	Concluído	16-dez-21	30-dez-21		17-dez-21	27-dez-21		100		
Publicação	Publicação do TED	Gabinete	Concluído	23-dez-21	30-dez-21		27-dez-21	27-dez-21		100		
Descentralização	Descentralização de recursos para entidade parceira.	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	27-dez-21	30-dez-21		28-dez-21	30-dez-21	R$230.000,00	100		

Meta 1	Aquisição de materiais e equipamentos para o curso Mobilização e seleção do público alvo Formar e certificar 35 alunos no semestre 2022.1	IFCE	Em Andamento	2-jan-22	30-jun-22	R$148.650,00	10-jan-22			30	Aulas iniciadas em 07/02/2022. Entre 3 e 4 alunos ausentes por dificuldade de transporte, já que são de uma cidade próxima à Juazeiro do Norte, local onde o curso está ocorrendo	Contato com os alunos, mobilização de parceiros para solução do transporte, possível suspensão da bolsa. Análise se daria para substituir os alunos
Meta 2	Mobilização e seleção do público alvo Formar e certificar 35 alunos no semestre 2022.2	IFCE	A Iniciar	1-jul-22	30-dez-22	R$81.350,00				0		
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação	CODEM/CGDS	A Iniciar	3-mar-23	2-mar-24					0		
Resumo Projeto			Em Andamento								Primeira turma está em andamento. Registra-se a dificuldade com frequência, pois tem-se 26 alunos, ao invés de 35. Sugestão de aumento da segunda turma, no segundo semestre, para 40 alunos.	
						R$230.000,00			**R$230.000,00**	**70**		

CGDS 2022001 - Webinares - Meta Institucional 2021-2022

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Planejamento do Projeto - Meta Institucional 11, ciclo 2021/2022	Realização de reuniões internas para definição do escopo do projeto, objetivos, medotologia, definição dos eventos, temas/focos, datas, públicos, parceiros, elaboração de cronograma, elaboração do TAP, entre outras atividades.	CODEM/CGDS	Em Andamento	17-jan-22	31-ago-22		10-mar-22			25	Segunda reunião técnica de planejamento e organização do evento realizada em 31/03/2022.	
Definição do modus operandi, Plataforma, para realização dos eventos On line	Reunião, contatos junto a Ascom e CGTI, para definição de ferramenta para realização dos eventos on line que permita participação do público e gravação das falas.	CODEM/CGDS/ ASCOM / CGTI	Concluído	1-mar-22	14-abr-22		31-mar-22			25	Discussão, definição (31/03/22): Tema central, período/data, formato, programação, potenciais parceiros, equipe responsável	
Articulação com parceiros para construção da programação, conteúdos e agenda conjunta	Realização de reuniões com parceiros por meio virtual, contatos por mensagens eletrônicas e telefone.	CODEM/CGDS	Em Andamento	1-mar-22	31-ago-22		31-mar-22			25		
Plano de divulgação dos eventos do Projeto: incluindo os quatro webinars	Solicitar a Ascom um plano de divulgação e comunicação do Projeto, com produtos definidos para cada um dos eventos.	CODEM/CGDS/ ASCOM	Concluído	1-abr-22	31-ago-22					25		
Evento On Line 1	Descrição do evento: título/tema, objetivo e proposta constará em documento específico	CODEM/CGDS	Concluído	1-mar-22	30-abr-22		31-mar-22			25		
Programação do evento	Definição do tema, da data e hórário ou outra atividade prévia. Detalhamento da programação realizada pela CODEM/CGDS junto com parceiros	CODEM/CGDS	Concluído	1-mar-22	14-abr-22		10-mar-22			50		
Convites	Elaboração dos convites para os parceiros específicos do evento	CODEM/CGDS	Concluído	1-mar-22	14-abr-22		31-mar-22			25		
Preparação materiais das apresentações	Apresentações serão elaboradas pela Codem/Sudene e também pelos parceiros que irão realizar apresentações	CODEM/CGDS	Concluído	16-mar-22	14-abr-22		31-mar-22			20		
Divulgação do evento	Divulgação via redes sociais. Levará em conta a especificidade do público do evento	CODEM/CGDS/ ASCOM	Concluído	16-mar-22	14-abr-22		31-mar-22			20		
Realização do 1º evento on line	O evento será gravado para fins de disponibilização no you tube da SUDENE	CODEM/CGDS/ ASCOM	Concluído	1-abr-22	30-abr-22					0		
Evento On Line 2	Descrição do evento: título/tema, objetivo e proposta constará em documento específico	CODEM/CGDS	Concluído	1-abr-22	31-mai-22					0		
Programação do evento	Definição do tema, da data e hórário ou outra atividade prévia. Detalhamento da programação realizada pela CODEM/CGDS junto com parceiros	CODEM/CGDS	Concluído	1-abr-22	17-mai-22					0		
Convites	Elaboração dos convites para os parceiros específicos do evento	CODEM/CGDS	Concluído	1-abr-22	17-mai-22					0		
Divulgação do evento	Divulgação via redes sociais. Levará em conta a especificidade do público do evento	CODEM/CGDS/ ASCOM	Concluído	20-abr-22	17-mai-22					0		
Preparação materiais das apresentações	Apresentações serão elaboradas pela Codem/Sudene e também pelos parceiros que irão realizar apresentações.	CODEM/CGDS	Concluído	20-abr-22	17-mai-22					0		
Realização do 2º evento on line	O evento será gravado para fins de publicação.	CODEM/CGDS/ ASCOM	Concluído	2-mai-22	31-mai-22					0		
Evento On Line 3	Descrição do evento: título/tema, objetivo e proposta constará em documento específico	CODEM/CGDS	Concluído	1-jun-22	30-jul-22					0		
Programação do evento	Definição do tema, da data e hórário ou outra atividade prévia. Detalhamento da programação realizada pela CODEM/CGDS junto com parceiros	CODEM/CGDS	Concluído	1-jun-22	15-jul-22					0		
Convites	Elaboração dos convites para os parceiros específicos do evento	CODEM/CGDS	Concluído	1-jun-22	15-jul-22					0		
Divulgação do evento	Divulgação via redes sociais. Levará em conta a especificidade do público do evento	CODEM/CGDS/ ASCOM	Concluído	20-jun-22	20-jul-22					0		
Preparação materiais das apresentações	Apresentações serão elaboradas pela Codem/Sudene e também pelos parceiros que irão realizar apresentações.	CODEM/CGDS	Concluído	20-jun-22	20-jul-22					0		
Realização do 3º evento on line	O evento será gravado para fins de publicação.	CODEM/CGDS/ ASCOM	Concluído	1-jul-22	30-jul-22					0		
Realização do 4º evento on line	O evento será gravado para fins de publicação.	CODEM/CGDS/ ASCOM	Em Andamento	1-ago-22	31-ago-22					0		
Programação do evento	Definição do tema, da data e hórário ou outra atividade prévia. Detalhamento da programação realizada pela CODEM/CGDS junto com parceiros	CODEM/CGDS	Em Andamento	1-jul-22	17-ago-22					0		
Convites	Elaboração dos convites para os parceiros específicos do evento	CODEM/CGDS	Em Andamento	1-jul-22	17-ago-22					0		
Divulgação do evento	Divulgação via redes sociais. Levará em conta a especificidade do público do evento	CODEM/CGDS/ ASCOM	Em Andamento	20-jul-22	17-ago-22					0		
Preparação materiais das apresentações	Apresentações serão elaboradas pela Codem/Sudene e também pelos parceiros que irão realizar apresentações.	CODEM/CGDS	Em Andamento	20-jul-22	17-ago-22					0		
Evento On Line 4	Descrição do evento: título/tema, objetivo e proposta constará em documento específico	CODEM/CGDS	A Iniciar	1-jul-22	31-ago-22					0		
Elaboração de Relatório Técnico descritivo da execução dos 4 eventos.	A Meta Institucional 11 do ciclo 2021/2022 será concluída com um relatório que contemple os quatro eventos e uma avaliação do projeto.	CODEM/CGDS	A Iniciar	1-set-22	30-set-22					0		
Resumo Projeto			Em Andamento								Encontra-se em andamento os preparativos para a realização do primeiro webinar, que terá como tema a energia solar. No sentido de atender à presença da gestão da Sudene no evento, a data do primeiro sofreu alguns ajustes, o que demandou a realização de novos contatos com os participantes no sentido de confirmar a participação. Dois participantes estão confirmados, faltando a confirmação do terceiro. Confirmação da participação de representante da DFIN. Material para divulgação encaminhado para a ASCOM. Já foram realizados três dos quatro eventos previstos	
						R$0,00			**R$0,00**	**8,275862069**		

CGDS 2020013 - Empreendedorismo - INSA

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	15-out-20	24-nov-20		15-out-20	24-nov-20		100		
Analise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	19-nov-20	19-nov-20		19-nov-20	19-nov-20		100		
Elaboração do Termo de Execução Descentralizada	Elaboração da minuta do TED	INSA e COCIC/ SUDENE	Concluído	26-nov-20	26-nov-20		26-nov-20	26-nov-20		100		
Assinatura do TED	Celebração do TED	GABINETE / INSA	Concluído	26-nov-20	26-nov-20		26-nov-20	26-nov-20		100		
Publicação do TED	Publicação do extrato do TED celebrado	GABINETE	Concluído	30-nov-20	30-nov-20		30-nov-20	30-nov-20		100		
Descentralização dos créditos	Transferencia de creditos orçamentários e desembolso financeiros do total de recursos pactuados	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	30-nov-20	30-nov-20	R$465.839,00	30-nov-20	2-out-21	R$465.839,00	100	* De acordo com mensagem Siafi (2021/0090208,de 02/02/2021) o INSA solicita a SUDENE o reenvio do financeiro (total), devolvido a SUDENE ainda em 2020, por meio do documento 533014/2020PF000053, para atender TED 11/2020. Solicitação autorizada pelo Superintendente. Reenvio, conforme programação financeira ocorrida em 10/02/2021.	
Meta 1 – Formalizar ao menos 01 parceria por estado presente no Semiárido brasileiro, contemplado nesse programa de aceleração.	Etapa 1.1. Formalizar pelo menos 01 parceria com instituição/ões de suporte ao programa de aceleração em cada um dos estados onde houver empreendimentos participantes do programa; Etapa 1.2. 01 Workshop de repasse metodológico para os candidatos a bolsas e parceiros das Unidades Multiplicadoras receberem a metodologia a ser aplicada no Programa com base no modelo CERNE de gestão adaptado; Etapa 1.3. Executar 05 mentorias por unidade multiplicadora, de 05 horas/mentoria, a cada dois meses para acompanhar os grupos das quatro Unidades Multiplicadoras.	INSA	Concluído	1-dez-20	31-dez-21		2-out-21	30-jun-21		100	Registre-se o envio pelo INSA e recebimento pela equipe técnica da SUDENE, em 26/07/2021, do relatório parcial de atividades, compreendendo o período da celebração até junho/2021, e da justificativa de ajuste/alteração do cronograma físico, em atendimento a solicitação reiterada pela CGDS, em reunião no 27/05/2021. A análise preliminar dos documentos consta do Parecer 242 (0264809), Processo SEI 59336.001673/2020-90. De acordo com referido Relatório a etapa 1.1 foi realizada em maio/2021, assim como a etapa 1.2.; quanto a etapa 1.3, o periodo informado foi maio-junho/2021.	
Meta 2 – Prospectar ao menos 40 empreendimentos elegíveis, considerando ao menos 10 de cada unidade federativa foco de atendimento deste projeto, aos requisitos de participação previstos no edital do programa de aceleração.	Etapa 2.1. Lançamento e divulgação do edital de seleção de empreendimentos rurais do Semiárido que fazem parte dos estados participantes do programa; Etapa 2.2 Promoção de 01 evento online com a participação de produtores rurais e parceiros para apresentar o programa e sensibilizar o público-alvo quanto a participação do edital de seleção; Etapa 2.3. Registrar no mínimo 20 atendimentos (online ou in loco) às comunidades rurais sensibilizadas e prospectadas para participar do edital de seleção do programa nos quatro estados.	INSA	Concluído	1-fev-21	31-mar-21		22-mar-21	30-abr-21		100	De acordo com o relatório parcial de execução do projeto relativo ao período da celebração até junho/2021, a etapa 2.1 ocorreu em 22/03/2021, quando do lançamento/abertura do Edital 008/2021, de 22/03/2021 - Processo Seletivo Simplificado, disponibilizado no site do PaqTc PB . Com relação a etapa 2.1, relativa ao evento on line de apresentação e sensibilização, este ocorreu em 07/04/2021, Quanto a etapa 2.3, dos atendimentos as comunidades rurais, com base no Relatório parcial de execução, não foram identificadas a/s data/s de sua realização. Há, no Relatório, imagens dos formulários de prospecção, contudo, não muito legíveis.	
Meta 3 – Formalizar ao menos 32 contratos de incubação com empreendimentos rurais do Semiárido, considerando ao menos 08 contratos por unidade federativa foco de atendimento deste projeto, contemplados no edital do programa de aceleração.	Etapa 3.1. Selecionar e firmar contrato com no mínimo 32 empreendimentos que serão beneficiados com o programa, considerando os critérios baseados nos 5 eixos de desenvolvimento do CERNE (Empreendedor, Gestão, Tecnologia, Capital e Mercado).	INSA	Concluído	1-mar-21	31-mar-21		26-mai-21	30-jun-21		100	A data de realização inicial se refere a do resultado final, com a identificação dos 41 empreendimentos selecionados. Quanto a firmatura dos contratos, não identificamos quando ocorreram.	
Meta 4 – Desenvolver ao menos 32 planos de desenvolvimento, sendo no mínimo 08 por unidade federativa foco de atendimento deste projeto, para os empreendimentos do Semiárido contemplados no programa.	Etapa 4.1. Manter pelo menos 32 Planos de Desenvolvimento atualizados a cada dois meses com plano inicial e revisão após monitoramentos para o alcance de metas; Etapa 4.2. Manter pelo menos 32 Monitoramentos realizados a cada dois meses para acompanhar o desenvolvimento dos empreendimentos, avaliar a maturidade e evolução nos eixos do CERNE (Empreendedor, Gestão, Tecnologia, Capital e Mercado); Etapa 4.3. Utilizar plataforma de gestão para registro de evidências das ações realizadas no programa e para acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas de forma contínua.	INSA	Em Andamento	1-dez-20	30-nov-22		1-jun-21			20	No Relatório parcial, consta referência a realização de atividades afetas as etapas 4.1 e 4.2, em junho/2021, não restando claro quanto e quando executadas.	
Meta 5 – Executar no mínimo 228 horas de capacitação para representantes dos empreendimentos selecionados no edital do programa.	Etapa 5.1. Oferecer no mínimo 228 horas de capacitações nos cinco eixos de desenvolvimento (Empreendedor, Gestão, Tecnologia, Capital e Mercado) para os empreendimentos participantes do programa; Etapa 5.2. Criar marcas, elaborar manuais de identidade visual para os empreendimentos participantes do programa e implementar elementos de comunicação como estratégia de divulgação dos produtos.	INSA	Atrasado	1-dez-20	31-jan-22		1-jul-21			50	Tendo por base informação trazida no Relatório parcial sobre as (08) capacitações do Programa de Aceleração de Empreendimentos Rurais no Semiárido do Brasil e os e-mail convite recebidos, até a data de atualização de 30/09/2021, ocorreram tres delas: 1.Crescimento Empreendedor (em data não sabida; não fomos informados);2. Modelo de Negócio de Impacto (19/08/2021);3. Mercado, Produtos e Serviços (16/09/2021); 10º Capacitação (última) programada para acontecer em 28/04/2022.	De acordo com mensagens eletrônica/ agenda zimbra, ocorreram no período, até 31/12/2021, mais três capacitações, a saber: Mínimo Negócio Viável (14/10/2021); Segmento de Clientes (11/11/2021); e Comunicação e Relacionamento com Clientes (09/12/2021).
Meta 6 – Executar ciclo de assessoramento e mentoria individual de ao menos 96 horas, por empreendimento participante do projeto.	Etapa 6.1. Assessorar e mentorar os empreendimentos rurais participantes do programa quanto ao uso de estratégias e ferramentas de gestão empresarial.	INSA	Atrasado	1-fev-21	31-jan-22					0		
Meta 7 – Promover um evento de graduação para os empreendimentos do Semiárido participantes do Programa de Aceleração.	Etapa 7.1. Realizar a graduação dos empreendimentos aptos a graduar em cada Unidade Multiplicadora de seus respectivos estados Etapa 7.2. Relacionamento com graduados por meio de monitoramento da evolução dos empreendimentos; Etapa 7.3. Relatório final do Programa e de evolução dos empreendimentos.	INSA	Atrasado	1-mar-21	30-nov-22					0	Conforme informação em reunião realizada em 25/04/2022, a graduação está prevista para ocorrer em maio2022.	
Meta 8 – Contratar Fundação para dar apoio operacional e administrativo ao projeto.	Etapa 8.1. Apoio operacional e administrativo ao projeto.	INSA	Em Andamento	1-dez-20	30-nov-22		10-fev-21			50		
Prestação de Contas	Análise e emissão de parecer técnico da prestação de contas final do TED,.	CGDS	Atrasado	1-fev-22	30-abr-22					0	As datas de previsão de realização desta item estão incorretos, pois devem se referir ao ano de 2023, uma vez que a última Meta está prevista para encerrar-se em 30/11/2022.	
Resumo Projeto			Atrasado								Projeto encontra-se em execução. Em elaboração, pela equipe técnica, de proposta de visitas in loco. Foi apresentado o Relatório Parcial 1 (jan-jun21), revisado/complementado; O Relatório Parcial 2 (jul-dez21) ainda não foi apresentado, estando pendente.	Encaminhar ofício ao INSA solicitando o envio do segundo Relatório de Acompanhamento deste projeto, contendo informações para atualização do sistema. Ofício encaminhado ao INSA com as solicitações indicadas.
						R$465.839,00			**R$465.839,00**	**68**		

CGDS 2020012 - Rota do Cordeiro - Embrapa Caprino

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Construção do Plano de Trabalho	Construção do Plano de Trabalho em conjunto com a Embrapa	CGDS	Concluído	19-mai-20	31-jul-20		19-mai-20	22-jun-20		100		
Analise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	1-jul-20	30-set-20		1-jul-20	2-set-20		100		
Elaboração do Plano de Trabalho	Elaboração do minuta do Plano de Trabalho	CCONT	Concluído	29-jun-20	29-jul-20		29-jun-20	23-jul-20		100		
Assinatura do TED	Assinatura	GABINETE / Embrapa	Concluído	19-mai-20	30-out-20		5-set-20	20-out-20		100		
Liberação da parcela única de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	1-dez-20	31-dez-20	R$426,47	25-nov-20	30-dez-20	R$426,47	100		
META 1. Aquisição de reagentes e serviços de assessoramento nutricional	Aquisição de diversos reagentes e equipamentos para melhoria da qualidade da produção dos polos Vale do Itaim-PI, Vale do Jacuípe-BA, e do Cariri Paraibano, que fazem parte da Rota do Cordeiro	Embrapa	Atrasado	1-nov-20	30-jun-21		5-fev-20			10	Reunião de Acompanhamento realizada em 09/06/2021.	A Sudene solicitou o relatório de acompanhamento a Embrapa Caprinos e Ovinos. A Sudene fez outras solicitações do relatório de acompanhamento. Até o encerramento deste ciclo, não foi apresentado o relatório.
META 2. Análises e Licenciamentos	Aquisição de equipamentos e contratação de estagiáriospara melhoria da qualidade da produção dos polos Vale do Itaim-PI, Vale do Jacuípe-BA, e do Cariri Paraibano, que fazem parte da Rota do Cordeiro	Embrapa	Atrasado	1-jul-21	30-ago-21					0		
Meta 3 Capacitações	Treinamento para uso das tecnologias	Embrapa	Atrasado	30-nov-20	30-set-22					0		
Meta 4. Apoio a Polos	Visitas técnicas para acompanhamento dos resultados e disseminação dos resultados gerados	Embrapa e Sudene	Atrasado	30-nov-20	30-abr-21					0		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela convenente.		A Iniciar	1-out-22	30-out-22					0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	A Iniciar	1-nov-22	15-nov-22					0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	A Iniciar	16-nov-22	30-nov-22					0		
Resumo Projeto			Atrasado								Por meio da apresentação deste projeto realizada no Agrinordeste, pode se constatar que este projeto está em andamento. Entretanto, como o relatório de acompanhamento, apesar de solicitado, não foi apresentado, não foi possível mensurar a execução das Metas indicadas acima, sendo portanto indicadas como atrasadas. Recursos liberados, Projeto em execução. Pendência: Envio do Primeiro Relatório Parcial, apesar de já ter sido solicitado por mensagem eletrônica. Apesar de solicitado em reuniões virtuais e registradas por e-mail a Embrapa Caprinos ainda não apresentou até o momento nenhum relatório de acompanhamento deste projeto.	Encaminhar ofício à Embrapa Caprinos e Ovinos solicitando a apresentação de Relatório de Acompanhamento deste projeto, contendo informações para atualização do sistema. Ofício encaminhado à Embrapa Caprinos e Ovinos solicitando apresentação de Relatório de Acompanhamento com informações mais recentes.
						R$426,47			**R$426,47**	**42,5**		

CGDS 2020011 - NE 4.0 - UPE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	1-dez-20	30-dez-20		1-dez-20	30-dez-20		100		
Analise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	21-dez-20	29-dez-20		21-dez-20	29-dez-20		100		
Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	Concluído	26-dez-20	30-dez-20		26-dez-20	30-dez-20		100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	Concluído	30-dez-20	30-dez-20		30-dez-20	30-dez-20		100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	Concluído	2-jan-20	17-jan-20		2-jan-20	17-jan-20		100		
Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	1-dez-20	31-dez-21	R$505.872,00	18-fev-22	18-fev-22		80	Primeira parcela liberada em 18/02/2022.	Analise de ofício enviado pela UPE para ajustes no cronograma e valor das parcelas. Ajustado. Convênio em duas parcelas
Meta 1: Lançamento do projeto, Mobilizacao de empresas e parceiros e diagnóstico/aplicacao da metodologia NE 4.0	Serao identificadas as empresas parceiras e participantes do projeto, escolha dos alunos e gestores a ser capacitados e incio do estudo e aplicacao da metodologia	UPE e universidades da Paraíba, Ceará, RGN, Alagoas e Sergipe parceiras do projeto	Concluído	1-fev-21	30-jul-21		1-fev-21	8-abr-22		70	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 1/2/2021. Lançamento do projeto programado para 17/02/2021. Reuniões quinzenais com os coordenadores de cada pólo e com o coordenador geral do programa. Alunos selecionados, aulas iniciadas no núcleo do RN/PB, em 30 de abril, e os demais iniciando em maio.	Equipe de Coordenadores dos Núcleos Estaduais montada. Identificação de empresas participantes em andamento e em processo de realização da adesão ao programa. Ajustes no termo de referencia, diante da continuidade da pandemia e no processo de adesão ao programa. Parte da Meta 1 ajustada, evento será ao final da capacitação. Diagnóstico programado para iniciar em setembro/outubro. Aulas programadas para novembro/dezembro 2021.
Meta 2: Capacitação de Residentes e Gestores	o Programa de Residência será desenvolvido pelo IIT e contará com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada e universidades federais no Nordeste. Terão 4 núcleos, um em Pernambuco, outro no RGN, outro no Ceará e outro em Sergipe, aulas à distância e presenciais (quando as condições da pandemia permitirem). O programa terá duração de 18 meses, com 12 módulos de 30hs, em cada um dos núcleos atividades acadêmicas, gerenciadas pelo IIT, e atividades de desenvolvimento, gerenciadas em conjunto com as instituições parceiras, com foco em projetos reais apresentados pelas empresas.	UPE	Em Andamento	1-out-21	30-jun-22		1-out-21			20	Grade finalizada. Inicio das construção do edital de seleção dos alunos; Seleção a se iniciar em agosto. Aulas programadas para inicio em novembro/dezembro de 2021. Convênio prorrogado para final de 2022.	Edital de seleção pronto. Abertura prevista para 4 de janeiro de 2022. edital de seleção dos professores, a ser lançado dia 11 de janeiro. Aulas a iniciar na segunda quinzena de fevereiro.
Meta 3: Elaboração de planos de ação	Realização dos projetos/planos de ação em industria 4.0, como resultado da Residencia, em cada uma das 40 empresas parcipantes	UPE e universidades da Paraíba, Ceará, RGN, Alagoas e Sergipe parceiras do projeto	Atrasado	1-jan-22	30-ago-22					0	Meta a se iniciar após a finalização do curso, com previsão entre outubro e dezembro deste ano.	
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	Atrasado	1-jan-22	28-fev-22					0	Prestação de contas da primeira parcela prevista para maio/2022.	
1ª Prestação de contas final	Envio e análise dos relatórios finais de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE e Sudene	Atrasado	30-jan-22	30-mar-22					0	Prestação de contas da primeira parcela prevista para maio/2022.	
Liberação da Segunda Parcela	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	Sudene	Atrasado	1-mar-22	30-mai-22	R$762.808,00				0	Liberação da segunda parcela prevista para junho/2022, a depender das restrições do período eleitoral.	
2ª Prestação de contas parcial e final	Envio e análise dos relatórios finais de execução parcial referente à 2ª parcela	UPE e Sudene	A Iniciar	1-jul-22	30-set-22					0		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela convenente.	UPE	A Iniciar	1-out-22	15-out-22					0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	A Iniciar	16-out-22	30-out-22					0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	A Iniciar	1-nov-22	30-nov-22					0		

Resumo Projeto			Atrasado								Primeira meta (diagnóstico das empresas) concluída. Alunos selecionados, de todos os pólos. Aulas iniciadas em abril, nos polos RN/PB e SE/AL, e deverá iniciar em maio nos demais polos (PE/BA e CE). Dificuldade em fechar com as empresas participantes e o prazo de seleção dos alunos bolsistas através de Edital provocou atraso inicial da execução das atividades da Meta 2 - Capacitação de Residentes e Gestores.	Foram intensificados os contatos para suprir as pendências indicadas. Projeto em execução, iniciado em todos os Estados, restando apenas o início no Ceará, que ocorrerá no dia 19/05/2022.
						R$1.268.680,00			**R$0,00**	**41,875**		
CGDS 2020010 - Saúde Digital - NUTES/UFPE												
Name	**Descrição das Atividades/ Etapas**	**Responsável**	**Status**	**Previsão Início**	**Previsão Término**	**Valor Previsto**	**Inicio**	**Data de Conclusão**	**Valor Realizado**	**Progresso**	**Observações/Problemas**	**Ações Corretivas**
Proposição de apoio de projetos	Articulação, realização de reuniões e elaboração de nota técnica para subsidiar a Diretoria para abertura de apoio de projetos nessa temática.	CGDS/SUDENE	Concluído	1-set-19	31-dez-19		1-set-19	28-abr-20		100	Rota de TIC instalada em junho/2019 a partir de uma oficina de planejamento realizada na Sudene sob a coordenação do MDR. Em set/2019, como desdobramento do Polo Mangue Digital, foram realizadas reuniões na Sudene com o NUTES/UFPE. Foi elaborada Nota técnica º 162/2020 - SEI/SUDENE em conjunto com a CGCP em 13/11/2019 para subsidiar a Diretoria para abertura de projetos nessa temática.	
Recebimento de proposta	Recebimento de propostas	Nutes/UFPE	Concluído	1-set-19	31-dez-19		1-set-19	28-abr-20		100	Proposta inicial do projeto foi apresentada pelo NUTES/UFPE à Sudene em set/2019. Em abril/2020, em decorrência da pandemia, o NUTES/UFPE reformulou o projeto a partir da análise técnica do Ministério da Saúde para apoio da Sudene com recursos da ação orçamentária Fortalecimentodas Adm. Locais (8917).	
Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	1-set-19	31-dez-19		2-jun-20	12-jun-20		100	Foram solicitadas referências de valores para subsidiar a análise do PT do projeto.	
Complementação da proposta	Complementação da proposta	CODEM/SUDENE	Concluído	1-set-19	31-dez-19		12-jun-20	27-jul-20		100	Proposta complementada pelo NUTES/UFPE para abranger toda a área de atuação da Sudene; adequar a plataforma INDU do Nutes para uso do +Gestão Municipal em capacitações EAD em outras temáticas e realizar levantamento da rede pública de saúde digital na área da Sudene.	
Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CODEM/SUDENE	Concluído	1-set-19	31-dez-19		27-jul-20	18-ago-20		100	Proposta foi apreciada pelo Ministério da Saúde e adequado ao novo Decreto n.º 10.426/2020 que regulamenta a parceria por meio de TED. Em 18/08/2020, CODEM emite parecer técnico n.º 220/2020 - SEI/SUDENE sugerindo aprovação do projeto.	
Aprovaçao do parecer técnico	Aprovaçao do parecer técnico (gestor)	CGDS/SUDENE	Concluído	1-set-19	31-dez-19		19-ago-20	21-ago-20		100	Projeto aprovado pela Diretoria Colegiada em 21/8/2020 na 363ª Reunião Extraordinária.	
Formalização do TED	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGDS/SUDENE	Concluído	1-set-19	31-dez-19		20-ago-20	16-nov-20		100	Extrato publicado em 17/11/2020.	
Descentralização de recursos	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	Concluído	1-nov-20	30-nov-20	R$969,57	18-nov-20	15-dez-20	R$969,57	100	O recurso foi descentralizado em 18/11/2020, porém, UG da unidade descentralizada do TED estava incorreta, bem como foi necessário ajustar o PT para adequar linha orçamentária. Após a realização dos ajustes, os recursos foram descentralizados em 15/12/2020.	
Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	Nutes/UFPE	Concluído	1-dez-20	31-dez-20		16-nov-20	31-dez-20		100	Em 31/12/2020, UFPE publicou no DOU extrato de dispensa de licitação, com justificativa de menor preço ofertado, contratando a Fundação de Apoio da UFPE.	
Reunião de planejamento	Reunião de planejamento das etapas do projeto pelas equipes técnicas da Sudene e UFPE.	CODEM/SUDENE NUTES/UFPE	Concluído	1-fev-21	15-mar-21		2-fev-21	3-mar-21		100	Em 3/3/2021, foi realizada a 1ª reunião técnica de acompanhamento, que entre outros pontos de pauta foram tratados a questão da abrangência do projeto e dos municípios alvo em alinhamento com a estratégia territorial do PRDNE (SUDENE), a necessidade de atualização dos prazos das etapas e o lançamento do projeto em um evento on line.	
Reunião de abertura de projeto	Evento para formalizar o início do projeto	CGDS/SUDENE NUTES/UFPE	Concluído	1-mar-21	31-mar-21		3-mar-21	12-mai-21		100	Em 30/3/2021, em reunião com a Prof.ª Magdala para tratar do webinar sobre saúde digital, foi proposta a data para realização do evento de lançamento do projeto em meados de abril. Transmitido pela plataforma do Nutes/UFPE que está responsável pela produção da arte para divulgação. Os representantes das cidades intermediadoras da área de atuação da Sudene, como também gestores de saúde dos municípios que serão contemplados com o projeto serão convidados. Será avaliada a possibilidade de participação do Ministério da Saúde como convidado do evento. O evento de lançamento foi realizado em 12/05/2021.	
META 1 - Desenvolver uma estratégia de Capacitação sobre as práticas de saúde digital para ACS e ACE.	Etapa 1.1: Elaborar o Plano de Ação Pedagógica (PAP)	Nutes/UFPE	Concluído	1-jan-21	30-abr-21		1-mar-21	30-jul-21		80	29/6, às 16h, (terça-feira), foi realizada a 2ª reunião de monitoramento do projeto Agente Digital com a equipe técnica de ambos os parceiros. Foram apresentadas as questões limitantes e os avanços realizados até aquela data.	
META 1 - Desenvolver uma estratégia de Capacitação sobre as práticas de saúde digital para ACS e ACE.	Etapa 1.2: Identificar a capacidade instalada de núcleos e unidades de saúde digital no contexto dos serviços públicos de saúde	Nutes/UFPE	Concluído	1-jan-21	31-mai-21		1-mar-21	31-dez-21		60	A identificação dos núcleos de telessaúde da área de atuação da Sudene está em andamento. Conforme 3ª reunião de monitoramento, trará um diagnóstico inicial importante para o desenvolvimento de outras ações.	
META 1 - Desenvolver uma estratégia de Capacitação sobre as práticas de saúde digital para ACS e ACE.	Etapa 1.3: Modernizar a plataforma de tele-educação INDU para contemplar o Programa +Gestão Municipal e implementação do Curso de Formação em Saúde Digital para ACS/ACE com 40h.	Nutes/UFPE	Concluído	1-mar-21	30-jun-22		1-mar-21	30-jul-21		80	A modernização da plataforma Indu está em fase avançada, para início, no 2º semestre de 2021, da 1ª turma do curso que contemplará os estados de PE e PB, programada/reformulada para 03/11/2021	
Acompanhamento Técnico	Reuniões de acompanamento técnico e análise de relatórios gerenciais serão realizados ao longo do projeto.	CODEM/SUDENE	Concluído				1-jun-21	30-set-21		70	A 3ª reunião de monitoramento foi realizada em 24/9/2021. Foi informado sobre o andamento do processo de inscrição da 1ª turma q foi concluído em 30/9/21. A 4ª reunião prevista para dez/2021 foi transferida para 27/1/22 por motivos de agenda interna da CODEM/Sudene. Em 15/3/22, foi realizada uma outra reunião para apresentar demandas do Nutes/UFPE, incluindo agenda com o Diretor e Superintendente da Sudene.	De acordo com o NUTES/UFPE, na 3ª reunião de Monitoramento e Avaliação, em 24/09/2021, a execução da Meta 1, alcançou um percentual de 75%; e um percentual geral de execução do projeto de 43,5%, até aquela data.
META 2 - Ofertar a capacitação para 2000 ACS e ACE na plataforma INDU com tutoria por 3 (três) meses após realização do curso.	Etapa 2.1: Capacitar os ACS/ACES com tutoria por 3 (três) meses após realização do curso.	Nutes/UFPE	Em Andamento	1-mai-21	31-dez-22		6-dez-21			20	Em relatório sintético encaminhado em 26/11, havia 423 alunos matriculados na turma 1 (PB e PE) com aulas para serem iniciadas em 6/12; 192 matriculados na turma 2 (CE, RN e MG) com aulas previstas para iniciarem em 13/12/21. Turma 3 (MA e PI) e turma 4 (BA, AL, SE, ES) não iniciaram as matrículas e as aulas estão previstas para começarem em abril/2022.	

META 2 - Ofertar a capacitação para 2000 ACS e ACE na plataforma INDU com tutoria por 3 (três) meses após realização do curso.	Etapa 2.2: Realizar estudos, monitorar e avaliar e estratégia de capacitação implementada, visando aperfeiçoar e ampliar a oferta para outros profissionais de nível médio e de nível superior, e disseminar o conhecimento da estratégia de capacitação implementada.	Nutes/UFPE	Em Andamento	1-abr-21	13-mai-23		1-out-21			0		
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de Relatório Técnico de Avaliação.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório Técnico Avaliação.	CODEM/SUDENE	A Iniciar	13-mai-23	13-mai-24					0		
Acompanhamento Técnico	Reunião de avaliação do projeto	CODEM/SUDENE NUTES/UFPE	A Iniciar							0		De acordo com o NUTERS/UFPE, na 3ª reunião de Monitoramento e Avaliação, em 24/09/2021, a execução da Meta2, alcançou cerca de 30% e um percentual geral de execução de 43,5%, até aquela data. Quanto aos cursos, foi estimado um atraso de dois meses, em razão da complexidade do processo, ações de sensibilização, inscrições, validação das inscrições. Conforme reformulação, T1: 03/11/2021; T2: 29/11/2021; T3: 18/02/2022 e T4: 08/03/2022.
Resumo Projeto			Em Andamento								Projeto em execução. Os cursos autoinstrucionais das turmas 1 e 2 foram concluídos; iniciarão em abril o Desafio Comunitário. As turmas 3 e 4 começarão em abril. Previsão de conclusão do projeto no início do 2º semestre de 2022, antes do término da vigência do TED.	
						R$969,57			**R$969,57**	**74,21052632**		

CGDS 2020009 - Reuso - São Raimundo Nonato

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação do programa 5320320200007	CODEM/CGDS	Concluído				3-jun-20	25-jun-20		100		
Recebimento de propostas	Recebimento de proposta	CODEM/CGDS	Concluído				3-jun-20	5-jul-20		100		
Análise da proposta e do plano de trabalho	Análise da proposta	CODEM/CGDS	Concluído				6-jul-20	24-jul-20		100		
Análise complementar e emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CODEM/CGDS	Concluído				1-ago-20	13-ago-20		100		
Medidas adm. para celebração	Medidas diversas/encaminhamentos: pré-convênio, empenho, minuta de convênio, análise jurídica, assinaturas	CGDS - CODEM - COCIC/ PRD/ GAB-SUDENE	Concluído				12-ago-20	28-dez-20		100		
Processo licitatório	Procedimentos administrativos referentes à licitação	Munic.SRN-PI	Atrasado	1-mar-21	30-mai-21		24-ago-21			20	Definição de prazos e procedimentos para início do processo licitatório. Reunião realizada com a Prefeitura de SRN. Prazos iniciais decididos. Formato do processo licitório em proposta pela Prefeitura até o dia 30/04. Nova reunião realizada, oficio analisado, formato definido. Em 24/8/21, convenente informa que o edital para chamamento público foi publicado.	Em consulta a Plataforma Mais Brasil em 14/12/21, não foi identificada mensagem de impedimento para receber transferência de recursos (em 21/10/2021 constava mensagem). Reunião de acompanhamento técnico realizada em 20/01/22 e acordado prazo para finalização da licitação. Contudo, a prefeitura não cumpriu o prazo e ainda não republicou o edital.
Análise e parecer de aceite da licitação	Etapa prevista nos art. 41 e 42 da Portaria n.º 424/2016	CODEM/CGDS	Atrasado							0		
Ajustes do cronograma físico e de desembolso	Atualização/adequação do plano de trabalho	Munic.SRN-PI	Atrasado	4-mai-21	30-ago-21					0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
Ingresso de contrapartida	Verificação da contrapartida	Munic.SRN-PI	Atrasado							0		
Liberação de Recursos	Medidas para liberação dos recursos, conforme desembolso	CGDS/SUDENE	Atrasado	1-fev-21						0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
Meta 1. Divulgação e mobilização do projeto	Divulgação e mobilização do projeto nas comunidades: Lagoa das Emas, Lagoa dos Moises, Lagoa dos Prazeres, Lagoa do Calango e Lagoa da Firmeza	Munic.SRN-PI	Atrasado	28-dez-20	1-fev-21					0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
Acompanhamento da Meta 1	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatorio parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	Atrasado							0		
Meta 2. Realização de 15 seminários no município de São Raimundo Nonato	Realização de 15 seminários com o tema central: Reaproveitamento de águas no município	Munic.SRN-PI	Atrasado	1-fev-21	1-abr-21					0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
Acompanhamento da Meta 2	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatorio parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	Atrasado							0		
Meta 3. Realização de 15 oficinas voltadas à produção familiar	Realização de 15 oficinas voltadas à produção familiar. Nº estimado de 100, por tema/grupo de 05.	Munic.SRN-PI	Atrasado	1-abr-21	1-jun-21					0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
Acompanhamento da Meta 3	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatorio parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	Atrasado							0		
Meta 4. Implantação de 28 Sistemas de Tratamento e Reuso de Águas Cinza	Implantação de 02 unidades modelo do Sistema de Tratamento e Reuso de águas cinza; Contratação de empresa especializada; Implantação 26 unidades de Sistema.	Munic.SRN-PI	Atrasado	1-jun-21	1-jun-22					0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
Acompanhamento da Meta 4	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatorio parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	Atrasado							0		
Meta 5. Realização de 15 minicursos voltados a Agricultura Familiar	Realização de 15 minicursos voltados a Agricultura Familiar. Nº estimado de beneficiários: 45, por curso.	Munic.SRN-PI	Atrasado	1-jun-21	1-dez-21					0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
Acompanhamento da Meta 5	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatorio parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	Atrasado							0		
Meta 6. Realização de 01 encontro municipal sobre o Sistema de Tratamento e Reuso de Águas Cinza	Realização de uma reunião com o comitê de monitoramento e avaliação do projeto e líderes comunitários. Realização de um encontro municipal com os beneficiários do projeto e população em geral e comitê de monitoramento e avaliação do projeto	Munic.SRN-PI	Atrasado	1-jun-22	26-jul-22					0	O ajuste de datas dos cronogramas do plano de trabalho será reajustado qdo a licitação for terminada.	
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de parecer final.	Análise da prestação de contas, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo/Parecer Técnico.	CODEM/CGDS	A Iniciar	25-set-22	25-nov-22					0		
Acompanhamento da Meta 6	Acompanhamento da execução do projeto, por meio de relatorio parcial e/ou visita in loco	CODEM/CGDS	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Atrasado								Município em fase de processo licitatório: finalizando, com atraso, o edital de licitação para ser publicado. Necessidade de informações atualizadas quanto ao andamento do projeto, em especial do processo licitatório, para atualização do sistema.	Encaminhar ofício ao município de São Raimundo Nonato solicitando informações atualizadas quanto ao estado atual de execução do projeto. Ofício encaminhado para a instituição parceira.
						R$0,00			**R$0,00**	**22,60869565**		

CGDS 2020008 - Biogás - INSA

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	15-dez-20	23-dez-20		15-dez-20	23-dez-20		100		
Análise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	21-dez-20	25-dez-20		21-dez-20	25-dez-20		100		
Elaboração do Termo de Execução Descentralizada	Elaboração da minuta do TED	INSA e COCIC/ SUDENE	Concluído	17-dez-20	21-dez-22		17-dez-20	21-dez-20		100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / INSA	Concluído	23-dez-20	23-dez-23		23-dez-20	23-dez-20		100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	Concluído	28-dez-20	28-dez-20		28-dez-20	28-dez-20		100		

Liberação da parcela única de recursos	Liberação da parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	28-dez-20	28-dez-20	R$550.000,00	28-dez-20	26-fev-21	R$550.000,00	100	Os recursos previstos, foram inicialmente liberados em 28/12/2020, entretanto, houve uma orientação do MCTIC para que acontecesse a devolução. Desta forma, os recursos foram definitivamente liberados em 26/02/2021.	
META 4 – Implantar 1 (uma) unidades piloto de produção de biogás no primeiro semestre de 2021 no RN em local a ser definido pelo INSA	Etapa 4.1 - Realizar a implantação de 1 (uma) unidade piloto de produção de biogás no CE ETAPA 4.2 - Avaliação trimestral da implantação da unidade	INSA	Atrasado	1-jan-21	31-dez-22					0		O processo passou pela Procuradoria e pela CGAF/COCF para tratar de questionamentos de mudança entre os códigos de natureza de despesa.
META 1 – Implantar 2 (duas) unidades piloto de produção de biogás no primeiro semestre de 2021 na PB, em locais a serem definido pelo INSA	Etapa 1.1 - Realizar a implantação de 2 (duas) unidades piloto de produção de biogás na PB ETAPA 1.2 - Avaliação trimestral da implantação das unidades	INSA	Atrasado	1-jan-21	31-dez-22					0	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto realizada em 27/05/2021	Aguardando entrega do relatório e ofício do parceiro indicando o responsável técnico. A previsão era de que fosse entregue 15 dias após a 1ª reunião de acompanhamento. Até o presente momento não foi recebido nenhum documento pela equipe técnica SUDENE. O processo passou pela Procuradoria e pela CGAF/COCF para tratar de questionamentos de mudança entre os códigos de natureza de despesa.
META 2 – Implantar 2 (duas) unidades piloto de produção de biogás no primeiro semestre de 2021 em PE em locais a serem definido pelo INSA	Etapa 2.1 - Realizar a implantação de 2 (duas) unidades piloto de produção de biogás em PE ETAPA 2.2 - Avaliação trimestral da implantação das unidades	INSA	Atrasado	1-abr-21	31-dez-22					0		O processo passou pela Procuradoria e pela CGAF/COCF para tratar de questionamentos de mudança entre os códigos de natureza de despesa.
META 3 – Implantar 1 (uma) unidades piloto de produção de biogás no primeiro semestre de 2021 no CE em local a ser definido pelo INSA	Etapa 3.1 - Realizar a implantação de 1 (uma) unidade piloto de produção de biogás no CE ETAPA 3.2 - Avaliação trimestral da implantação da unidade	INSA	Atrasado	1-set-21	31-dez-22					0		O processo passou pela Procuradoria e pela CGAF/COCF para tratar de questionamentos de mudança entre os códigos de natureza de despesa.
Prestação de Contas	Recebimento do relatório de cumprimento do objeto e elaboração do parecer técnico final	CGDS	Atrasado	1-jan-22	22-dez-22					0		
Resumo Projeto			Atrasado								Após um tempo paralisado devido a dúvidas relacionadas a mudanças entre os códigos de despesa, o INSA informou que enviará ofício solicitando Termo Aditivo de vigência e informando a situação atual do projeto, que se encontra em fase de chamamento público para adquirir equipamentos. O INSA enviou uma solicitação de aditivo , com a respectiva necessidade de ajuste do Plano de Trabalho, sendo analisado pela equipe técnica. Após análise do Plano de Trabalho pela Equipe Técnica, foi verificada a necessidade de revisão de alguns itens necessários à sua aprovação. Devido a impossibilidade de ajustes em rubricas orçamentárias a execução do projeto ficou comprometida, inviabilizando a sua execução.	Foi elaborada Minuta de Ofício a ser encaminhado ao INSA solicitando providências nesse sentido. Ofício enviado ao INSA solicitando providências. Foi elaborado Ofício a ser encaminhado ao insa
						R$550.000,00			**R$550.000,00**	**54,54545455**		

CGDS 2020007 - Plataforma Digital - UPE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	11-dez-19	27-dez-19		11-dez-19	27-dez-19		100		
Analise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	26-dez-19	27-dez-19		26-dez-19	27-dez-19		100		
Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	Concluído	26-dez-19	30-dez-19		26-dez-19	30-dez-19		100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	Concluído	30-dez-19	30-dez-19		30-dez-19	30-dez-19		100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	Concluído	17-jan-19	17-jan-19		17-jan-19	17-jan-19		100		
Liberação da parcela única de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Atrasado	1-dez-19	28-fev-22	R$649.777,57				0		
META 1. Estruturação do Datacenter	ETAPA 1.1. Aquisição dos equipamentos ETAPA 1.2. Instalações e testes	UPE	Em Andamento	30-dez-19	30-jun-22		5-fev-20			40	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 5/2/2020. Diante da pandemia e da alta do dólar foram repactuados os prazos deste convênio	Foi refeita a lista dos equipamentos a ser adquiridos, sem perder o objeto e objetivo do convênio
META 2. Estruturação dos Laboratórios	ETAPA 2.1. Aquisição dos equipamentos ETAPA 2.2. Instalações e testes	UPE	Em Andamento	1-jul-21	30-set-22		5-fev-20			50	Divesas reuniões foram realizadas, sendo ultima reunião de acompanhamento: dia 28/08. Processo licitatório em fase final para lançamento da concorrência. Envio de nova cotação, para início do processo licitatório. Cotação realizada. Processo licitatório a iniciar em outubro.	Envio de nova cotação, para início do processo licitatório. Cotação realizada. Processo licitatório a iniciar em outubro. Com a variação alta do dolar, houve nova dificuldade em conseguir outras cotações. Espera-se que em janeiro a licitação esteja em processo e em março de 2022, finalizada.
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	Atrasado	1-mar-22	30-abr-22					0		A vigência do projeto foi ampliada, porém o seu plano de trabalho na Plataforma +Brasil ainda não foi atualizado. No 1º de 2022 deverá ser verificada essa atualização.
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela convenente.		Atrasado	1-out-21	30-out-21					0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	Atrasado	1-nov-21	30-nov-21					0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	Atrasado	1-dez-21	15-dez-21					0		
Resumo Projeto			Atrasado								Devido ao aumento do dólar, bem como aumento dos preços dos equipamentos, o projeto foi reestruturado e atualmente se encontra em fase de processo licitatório ainda não concluído	Encaminhar ofício à UPE solicitando informações sobre o andamento do projeto para atualização do sistema, bem como alertando quando ao período de liquidação ou cancelamento dos recursos inscritos em Restos a Pagar 2019. Ofício enviado para a UPE solicitando informações sobre o andamento do projeto e alertando para os recursos inscritos em restos a pagar.
						R$649.777,57			**R$0,00**	**49,16666667**		

CGDS 2020006 - PE-4.0 - UPE - Revitalização da Indústria

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	12-nov-19	27-dez-19		12-nov-19			100		
Analise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído		27-dez-19					100		
Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	Concluído		30-dez-19			30-dez-19		100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	Concluído		30-dez-19					100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	Concluído		17-jan-19					100		
Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	3-jan-21	30-mar-21	R$241.376,80			R$241.376,80	100	Problemas relacionados à crise do covid19	Primeira parcela liberada em 16/03/2021.

Meta 1: Mobilizacao de empresas e aplicacao da metodologia PE 4.0	Serao identificadas as empresas parceiras e participantes do projeto, escolha dos alunos e gestores a ser capacitados e incio do estudo e aplicacao da metodologia	UPE	Concluído	30-set-20	30-mai-20		2-mai-20	30-nov-20		100	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 5/2/2020. Listagem das empresas parceiras enviada dia 19/02/2020	Programa foi refeito com novas datas
Meta 2: Capacitação de Gestores e Elaboração de planos de ação	o Programa de Residência será desenvolvido pelo IIT e contará com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada. O local de execução será o prédio do IIT, localizado no Parqtel. O programa terá duração de 8 a 12 meses, com 12 módulos de 30hs mesclando atividades acadêmicas, gerenciadas pelo IIT, e atividades de desenvolvimento, gerenciadas em conjunto com as instituições parceiras, com foco em projetos reais apresentados pelas empresas.	UPE	Concluído	30-set-20	30-ago-21		30-set-20	31-ago-21		90	Lançamento no dia 30/09/2020 Atualmente em fase de seleção dos alunos participantes. Alunos selecionados. Empresas visitadas em dezembro de 2020, com diagnostico inicial realizado. Gestores das empresas indicados para participar do curso. Aulas iniciadas em janeiro/2021.	Ajuste no PT inseridas e aprovadas no Siconv. Aulas foram iniciadas em 20/01/2021. Aulas previstas para encerramento em agosto de 2021. Aulas a encerrar na primeira semana de outubro. Após será a apresentação dos projetos de intervenção nas empresas, no final de outubro ou primeira quinzena de novembro.
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	Atrasado	4-jan-21	31-jul-21		5-mai-21			60	Relatório de Pagamentos Realizados em análise.	
Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Atrasado	6-jan-21	28-fev-22	R$98.623,20				0	Prestação de contas da primeira parcela em andamento	A vigência do projeto foi ampliada, porém o seu plano de trabalho na Plataforma +Brasil ainda não foi atualizado. No 1ª de 2022 deverá ser verificada essa atualização.
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	UPE	Atrasado	9-jan-21	30-mar-22					0		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela convenente.		Atrasado	10-jan-21	30-out-21					0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	Atrasado	11-jan-21	30-nov-21					0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	Atrasado	12-jan-21	15-dez-21					0		
Resumo Projeto			Atrasado								Aulas encerradas, projetos construídos. Em fase de análise da prestação de contas da primeira parcela e liberação da segunda em valor menor e ajustado, diante de gastos menores que o programado. Vigência do projeto prorrogada até 30/06/2022, entretanto, o seu cronograma físico precisa ser atualizado em função desta nova vigência. Processo de prestação de contas da primeira parcela e solicitação da segunda parcela de recursos. Necessidade de ajuste/ repactuação de datas para adequar ao recebimento da segunda parcela restante.	Encaminhar ofício à UPE solicitando ajustes/ adequações nos Cronogramas físico e desembolso, em função da prorrogação da vigência e redução do valor da segunda parcela. A UPE solicitou um aditivo de prazo, que no momento está em análise pela Procuradoria.
						R$340.000,00			**R$241.376,80**	**60,71428571**		

CGDS 2020005 - Nuvem UPE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	11-dez-19	27-dez-19		11-dez-19			100		
Analise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	26-dez-19	27-dez-19		26-dez-19			100		
Elaboração do Termo de Convênio	Elaboração do minuta do Termo de Convênio	CCONT	Concluído	26-dez-19	30-dez-19		26-dez-19	30-dez-19		100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	GABINETE / UPE	Concluído	30-dez-19	30-dez-19		30-dez-19			100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio no DOU	GABINETE	Concluído	17-jan-19	17-jan-19		17-jan-19			100		
Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	1-abr-21	30-abr-21	R$319.360,49	20-mai-21		R$319.360,49	100	A liberação da primeira parcela de recursos ocorreu em maio/2021. Diante da pandemia (Covid 19) as ações presenciais sofreram ajustes, sendo remanejadas para o final do primeiro semestre de 2021.	Em função da análise dos processos licitatórios apresentados para análise e aprovação da concedente, houve ajuste no valor liberado na primeira parcela. Reprogramação das ações presenciais e intensificação de ações à distância. Recursos solicitados
Meta 1: Realizar um (1) Seminário de Inovação do Polo Mangue Digital.	Será realizado um Seminário de Inovação do Polo mangue Digital para toda a comunidade TIC de Pernambuco e adjacências. Há uma expectativa de 100 a 150 pessoas no Seminário.	UPE	Atrasado	1-mai-21	30-nov-21		5-fev-20			50	1ª Reunião de Acompanhamento do Projeto foi realizada no dia 5/2/2020. 2ª reunião dia 03/03 diversas reuniões, onde foi priorizada a meta de caoacitação que pode ser iniciada à distância. Necesidades de ajustes no PT diante da Pandemia e de ajustes nos recursos. Está sendo analisada a possibilidade de realizar o evento de forma on line. Essa Meta foi repactuada e agora será a última a ser realizada. É necessário o ajuste deste cronograma para o período do segundo semestre de 2022.	Evento reprogramado diante da pandemia. Mudança para evento à distância. Solicitado ajustes no PT incluído no Siconv. Seminário estruturado, devendo ocorrer até a primeira quinzena de dezembro/2021 (questões relativas à finalização do Curso e realização das JOrnadas, adiaram este COnvênio e o evento final). Evento reprogramado para início do segundo semestre de 2022, em princípio, em formato híbrido, presencial e remoto. Necessidade de ajuste do Cronograma Físico na Plataforma +Brasil (SICONV).
Meta 2: Realizar Jornada de Eventos (8) de Capacitação do Polo Mangue Digital.	Será realizada uma jornada de 8 eventos em diversas cidades do estado de Pernambuco, preferencialmente em cidades com escolas técnicas que tenham cursos na área de tecnologia e polos econômicos fora da região metropolitana do Recife. Os eventos serão organizados e conduzidos por uma equipe técnica formada por um coordenador, dois pesquisadores e um motorista. A cada evento tem-se uma expectativa de 30 a 60 pessoas por evento.	UPE	Atrasado	1-abr-21	30-out-21		28-ago-20			60	Diante da pandemia (covid 19) as ações presenciais sofreram ajustes, sendo remanejadas para o segundo semestre de 2020 e com a sua continuidade para o primeiro semestre de 2021.. Reunião dia 28/08 - ajustes a partir de novo PT, remanejamento de rubricas e perspectivas de finalização da pandemia. Está sendo analisada a possibilidade de realizar as capacitações de forma on line.	Reprogramação das ações presenciais e intensificação de ações à distância. Montado grupo de trabalho para desenho final e mobilização para os eventos. Eventos serão híbridos, presencial com pequena comissão local e on line, à distancia, transmitido pelo Canal da UPE no youtube. Constituição de grupo de trabalho com diversos parceiros para organização dos eventos. Primeiro evento em Agosto/2021. ultimo em outubro, eventos quinzenais. 4 eventos realizados até o dia 30/09/2021. Mais dois programados para o mês de outubro. Diante da pouca frequencia e da perspecetiva de volta de evento presenciais no final do ano e em 2022, será feito um aditivo de prazo para conclusão dos eventos até abril de 2022. Aditivo de prazo realizado, convênio prorrogado até 31 de dezembro de 2022. Jornadas programadas para finalizar em maio-2022.
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	UPE	Atrasado	1-abr-21	30-jan-22		30-set-21			30		
Meta 3: Formar (10) residentes em curso de especialização de computação.	o Programa de Residência será desenvolvido pelo IIT e contará com a participação de diversos parceiros da iniciativa privada. O local de execução será o prédio do IIT, localizado no Parqtel. O programa terá duração de 12 meses, com 12 módulos de 30hs mesclando atividades acadêmicas, gerenciadas pelo IIT, e atividades de desenvolvimento, gerenciadas em conjunto com as instituições parceiras, com foco em projetos reais apresentados pelas empresas.	UPE	Concluído	1-jul-20	30-set-21		7-jan-21			90	Empresas participantes selecionadas e edital de seleção dos residentes lançado. Residentes selecionados. Aulas iniciadas em janeiro, em andamento, finalização prevista para setembro de 2021.	Solicitada a prorrogação do convênio no Siconv. Aulas com finalização em outubro/2021. Trabalhos apresentados até dezembro. Evento de finalização da residência ate a fevereiro de 2022. Convênio prorrogado até dezembro de 2022.
Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Atrasado	1-jul-21	28-fev-21	R$105.639,51				20	Análise da Prestação de contas da 1ª parcela em andamento.	
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	UPE	Atrasado	1-out-21	10-nov-21					0		A vigência do projeto foi ampliada, porém o seu plano de trabalho na Plataforma +Brasil ainda não foi atualizado. No 1ª de 2022 deverá ser verificada essa atualização.

Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela convenente.		Atrasado	16-nov-21	30-nov-21		1-dez-21			0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	Atrasado	1-dez-21	15-dez-21					0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	Atrasado	16-dez-21	30-dez-21					0		
Resumo Projeto			Atrasado								Projeto em execução. Em processo de prestação de contas da primeira parcela e solicitação da segunda parcela de recursos. Necessidade de ajuste/ repactuação de datas em Metas/Etapas para adequar à execução das Metas restantes.	Encaminhar ofício à UPE solicitando informações atualizadas, bem como, ajustes/ adequações nos Cronogramas físico e desembolso.
						R$425.000,00			**R$319.360,49**	**56,66666667**		

CGDS 2020002 - Palma - EPAMIG 2020

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Proposição de apoio de projetos	Elaboração de nota técnica e aprovação pela Diretoria Colegiada	CODEM/CGDS/SUDENE	Concluído				4-fev-20	25-mai-20		100	Elaboração de nota técnica N.º 77/2020 em 06/04/2020 e aprovação na 358ª reunião da Diretoria Colegiada em 25/05.	
Cadastramento do Programa e recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	Concluído				5-jun-20	5-jul-20		100	Programa n.º 5320320200008 na Plataforma +Brasil	
Análise da proposta	Análise e aprovação da proposta	CODEM/SUDENE	Concluído				6-jul-20	9-set-20		100	Parecer técnico n.º 210/2020 sugerindo aprovação da proposta elaborado em 3/9/2020.	
Análise do plano de trabalho	Análise do plano de trabalho, realização de ajustes e aprovação para celebração	CODEM/SUDENE	Concluído				10-set-20	11-dez-20		100	Parecer técnico n.º 276/2020 sugerindo aprovação do plano de trabalho elaborado em 5/11/2020	
Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGDS/COCIC/SUDENE	Concluído				############	5-jan-21		100	Convênio celebrado em 31/12/2020. e extrato publicado em 5/1/2021.	
Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	EPAMIG/MG	Atrasado	1-fev-20	31-jan-22		4-abr-21			10	Processo licitatório em elaboração.	Reunião de acompanhamento, em 18/03/2021, entre coordenação e equipes técnicas, para verificar andamento. Processos em elaboração (2018, 2019, 2020).
Contrapartida	Liberação da contrapartida	EPAMIG/MG	Atrasado	2-jan-20	31-mai-20	R$1.000,00				0		
Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos	CGDS/SUDENE	Atrasado	1-dez-20	31-dez-20	R$200.000,00				0	A liberação da 1ª parcela ou parcela única dos recursos está condionada a realização do processo licitatório pela convenente e ao aceite do concedente (PI 424/2016). Só uma parte dos processos de execução foram concluidos e registrados (aquisição de EPI's e Fertilizantes). Esses, analisados suscitaram orientações e medidas de ajuste da EPAMIG.	Reunião para entendimento, em 02/06/2021, sobre processos de licitação (EPI's e Fertilizantes), considerando análise e orientações (Parecer 08/2020 - PF/SUDENE), quanto a liberação proporcional aos itens licitados/contratados. Informando também a necessidade de apresentar justificativas e submeter novos TR's, considerando ajustes/alterações. A Epamig não apresentou o novo TR e a justificativa. Até a data de atualização não foram idenficados avanços nestes processos.
Meta 1 - Implantação dos campos de multiplicação	1.1) Preparação do Campo Experimental Jaíba - CEJA; 1.2) aquiisição de mudas; 1.3) implantação do sistema de irrigação.	EPAMIG/MG	A Iniciar	31-dez-23	31-jul-23					0		
Meta 2 -Manutenção dos campos de produção	2.1) Tratos culturais; 2.2) manejo de irrigação.	EPAMIG/MG	A Iniciar	31-dez-23	31-jul-23					0		
Meta 3 - Distribuição de mudas aos agricultores.	3.1) reuniões preparatórias; 3.2) seleção dos beneficiários; 3.3) visitas técnicas às propriedades selecionadas; 3.4) análise dos solos; 3.5) distribuição das mudas aos agricultores.	EPAMIG/MG	A Iniciar	31-dez-23	31-jul-23					0		
Meta 4 - Eventos de Transferência e Difusão deTecnologia.	4.1 - Capacitação de Técnicos; 4.2 - Dias de campo; 4.3 - Jornada da Inovação.	EPAMIG/MG	A Iniciar	31-dez-23	31-jul-23					0		
Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A Iniciar							0		
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Contas, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório de Avaliação.	CODEM/SUDENE	A Iniciar	31-dez-23	30-jun-24					0		
Resumo Projeto			Atrasado								Execução em atraso. Sem liberação de recursos pela não realização e/ou não aceite dos processos de execução. Recursos do convênio inscritos em RAP em 31/12/2020, sujeitos a liquidação ou cancelamento em 31/12/2023. Encaminhada solicitação de informação (e-mail), à Epamig sobre andamento, ainda não atendida.	Encaminhar ofício à Epamig solicitando informações sobre o andamento do projeto para atualização do sistema, bem como alertando quando ao período de liquidação ou cancelamento dos recursos inscritos em Restos a Pagar 2020. Ofício enviado para a EPAMIG solicitando informações sobre o andamento do projeto e alertando para os recursos inscritos em restos a pagar.
						R$201.000,00			**R$0,00**	**36,42857143**		

CGDS 2020001 - Palma - SAPE/RN

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Proposição de apoio de projetos	Elaboração de nota técnica e aprovação pela Diretoria Colegiada	CODEM/CGDS/SUDENE	Concluído	6-abr-20	25-mai-20		6-abr-20	25-mai-20		100	Elaboração de nota técnica N.º 77/2020 em 06/04/2020 e aprovação na 358ª reunião da Diretoria Colegiada em 25/05.	
Cadastramento do Programa e recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	5-jun-20	5-jul-20		5-jun-20	5-jul-20		100	Programa n.º 5320320200008 na Plataforma +Brasil	
Análise da proposta	Análise e aprovação da proposta	CODEM/SUDENE	Concluído	6-jul-20	30-nov-20		6-jul-20	3-nov-20		100	Parecer técnico n.º 210/2020 sugerindo aprovação da proposta elaborado em 3/9/2020.	
Análise do plano de trabalho	Análise do plano de trabalho, realização de ajustes e aprovação para celebração	CODEM/SUDENE	Concluído	6-jul-20	31-dez-20		10-set-20	23-dez-20		100	Parecer técnico n.º 274/2020 sugerindo aprovação do plano de trabalho elaborado em 3/11/2020	
Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGDS/COCIC/SUDENE	Concluído	6-jul-20	31-dez-20		6-jul-20	31-dez-20		100	Convênio celebrado em 31/12/2020. e extrato publicado em 4/1/2021.	
Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	SAPE/RN	Atrasado	1-jan-21	31-jan-21					15	A SAPE/RN apresentou parte do processo licitátorio, sendo que a outra parte deu deserta.	A parte da licitação apresentada foi aprovada pela Sudene.
Contrapartida	Liberação da contrapartida	SAPE/RN	Parado	1-fev-21	28-fev-21	R$19.961,00				0	Depósito do valor da contrapartida deve ocorrer por ocasião da liberação da primeira parcela.	
Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos	CGDS/SUDENE	Concluído	1-fev-21	28-fev-21	R$100,00	9-mar-22	9-abr-22		0	A SAPE/RN apresentou pendência no CAUC, o que impediu a continuidade do processo para liberação da primeira parcela de recursos. Devido a dificuldades apresentadas durante os processos licitatórios, a primeira parcela de recursos ocorreu no valor de R$ 33.198,84. O depósito da contrapartida ocorreu em 21/02/2022.	
Meta 1 - Capacitação de extensionistas/ técnicos/estudantes e produtores.	1.1) Realização de dois cursos de manejo da palma forrageira voltados aos extensionistas, técnicos e estudantes das unidades parceiras (2 cursos x 16 horas x 30 participantes);	SAPE/RN	Atrasado	31-dez-20	31-dez-23	R$9,44				0		
Meta 1 - Capacitação de extensionistas/ técnicos/estudantes e produtores.	1.2) Realização de dois dias de campo voltados aos produtores selecionados pelas entidades parceiras. (1 dia de campo x 100 participantes).	SAPE/RN	Atrasado	31-dez-20	31-dez-23	R$8,20				0		
Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	Atrasado							0		

Relatório de Execução referente à 1ª parcela	Apresentação pelo convenente dos relatórios de execução via Plataforma +Brasil, análise técnica pela Codem e análise financeira pela COCIC.	SAPE/RN - CGDS/SUDENE	Atrasado							0		
Liberação 2ª parcela	É condição para liberação da 2ª parcela o mínimo de 70% de execução da 1ª parcela liberada.	CGDS/SUDENE	Atrasado	1-set-21	30-set-21	R$99,41						
Meta 2 -Disponibilização de 500 mil de raquetes-semente de variedades de palma forrageira tolerantes à cochonilha do carmim por ano, com atendimento de 555 produtores anualmente.	2,2) Fertilização, manutenção do sistema de irrigação, controle de ervas daninhas e distribuição de raquetes-sementes - Manutenção de 16 ha de Palma Irrigada por Gotejamento existentes	SAPE/RN	Atrasado	31-dez-20	31-dez-23	R$150,83				0		
Meta 2 -Disponibilização de 500 mil de raquetes-semente de variedades de palma forrageira tolerantes à cochonilha do carmim por ano, com atendimento de 555 produtores anualmente.	2.2) Implantação de 2 ha irrigados de variedades tolerantes a cochonilha do carmim - ampliação	SAPE/RN	Atrasado	31-dez-20	31-dez-23	R$31,14						
Relatório de Execução referente à 2ª parcela	Apresentação pelo convenente dos relatórios de execução via Plataforma +Brasil, análise técnica pela Codem e análise financeira pela COCIC.	SAPE/RN - CODEM/SUDENE	A Iniciar	31-dez-23	30-jun-24					0		
Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	A Iniciar							0		
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Contas, sob o aspecto físico, para emissão de Relatório de Avaliação.	CODEM/SUDENE	A Iniciar	1-jan-24	31-dez-24					0		
Resumo Projeto			Atrasado								Após dificuldades relacionadas à realização de processos licitatórios, ocorreu a liberação da primeira parcela de recursos no valor de R$ 33.198,84, valore menor que o previsto para a primeira parcela. Isto demandou ajustes no Plano de Trabalho. Necessidade de atualização de informações sobre o andamento do projeto, uma vez que a primeira liberação ocorreu em um valor menor do que o previsto, o que vem afetar negativamente o andamento deste projeto. Vem tentando realizar processos licitatórios, porém, sem sucesso. Planeja realizar ajustes em itens do projeto de forma a viabilizá-lo.	Encaminhar ofício à SAPE/RN solicitando informações sobre o andamento do projeto para atualização do sistema, bem como alertando quando ao período de liquidação ou cancelamento dos recursos inscritos em Restos a Pagar 2020.
						R$20.360,02			**R$0,00**	**32,1875**		

CGDS 2019001 - Palma - EPAMIG 2019

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	Concluído	6-dez-19	11-dez-19		6-dez-19	11-dez-19		100		
Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	6-dez-19	11-dez-19		6-dez-19	11-dez-19		100		
Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	13-dez-19	31-dez-19		13-dez-19	31-dez-19		100		
Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	13-dez-19	31-dez-19		13-dez-19	31-dez-19		100		
Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	Concluído	13-dez-19	31-dez-19		30-dez-19	30-dez-19		100		
Aprovaçao do parecer técnico	Aprovaçao do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	Concluído	13-dez-19	31-dez-19		31-dez-19	31-dez-19		100		
Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	Concluído	13-dez-19	31-dez-19		31-dez-19	31-dez-19		100		
Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	EPAMIG/MG	Atrasado	1-fev-20	31-jan-22		4-abr-21			10	A Convenente atendeu a todas as condições da Cláusula Suspensiva e iniciou os procedimentos licitatórios. Até 30/06/2021 foram apresentados / registrados 3 processos de execução (aquisição de: EPI's, Ferramentas e Fertilizantes), uma pequena parte do todo.	Reunião de acompanhamento, em 18/03/2021, entre coordenação e equipes técnicas, para verificar andamento. Processos em elaboração (2018, 2019, 2020).
Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	Atrasado	2-jan-20	31-mai-20	R$163.000,00				0	A liberação dos recursos da 1ª parcela está condicionada a realização do processo licitatório pela convenente e o aceite pela concedente. Até 30/06/2021,só uma parte dos processos de execução foram registrados (aquisição de: EPI's, Ferramentas,Fertilizantes) . Esses, analisados demandaram medidas da EPAMIG. A pandemia do Covid-19 e seus impactos sobre os preços dos insumos do projeto tem trazido grande dificuldade para a execução.	Reunião para entendimento, em 02/06/2021, sobre processos de licitação (EPI's, Ferramentas e Fertilizantes), considerando análise e orientações (Parecer 08/2020 - PF/SUDENE), quanto a liberação proporcional aos itens licitados/contratados. Informando também a necessidade de apresentar justificativas e submeter novos TR's, considerando ajustes/alterações propostas. A Epamig não apresentou o novo TR e a justificativa. Até a data de atualização, não foram identificados avanços nos processos de licitação.
Liberação 2ª parcela	Liberação 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	Atrasado	1-dez-20	31-dez-20	R$43.730,00				0		
Implantação dos campos de multiplicação	Implantação dos campos de multiplicação (Meta 1).	EPAMIG/MG	Atrasado	2-jan-20	31-dez-22	R$102.180,63				0		
Manutenção dos campos de produção (Meta 2).	Manutenção dos campos de produção (Meta 2).	EPAMIG/MG	Atrasado	2-jan-20	31-dez-22	R$56.453,84				0		
Distribuição de mudas aos agricultores.	Distribuição de mudas aos agricultores (Meta 3).	EPAMIG/MG	Atrasado	2-jan-20	31-dez-22	R$33.160,29				0		
Eventos de Transferência e Difusão deTecnologia.	Eventos de Transferência e Difusão de Tecnologia (Meta 4).	EPAMIG/MG	Atrasado	2-jan-20	31-dez-22	R$15.940,51				0		
Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento para elaboração do Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	A Iniciar							0		
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	A Iniciar	2-mar-23	1-mai-23					0		
Resumo Projeto			Atrasado								Execução em atraso. Sem liberação, pela não realização e/ou não aceite dos processos de execução. *Recursos do convênio inscritos em RAP em 31/12/2019, sujeitos a liquidação ou cancelamento em 31/12/2022. Encaminhada solicitação de informação (e-mail), à Epamig sobre andamento, ainda não atendida.	Encaminhar ofício à Epamig solicitando informações sobre o andamento do projeto para atualização do sistema, bem como alertando quando ao período de liquidação ou cancelamento dos recursos inscritos em Restos a Pagar 2019. Ofício enviado para a EPAMIG solicitando informações sobre o andamento do projeto e alertando para os recursos inscritos em restos a pagar.
						R$414.465,27			**R$0,00**	**44,375**		

CGDS 2018005 - Reuso - Embrapa Semiárido

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGDS	Concluído	27-mai-18	17-jun-18		27-mai-18	17-jun-18		100	Todas as etapas anteriores estão detalhadas no PO 7-CGDS-REUSO Águas (CGDS 1º ciclo 2019 - Prioritários)	
Analise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	15-out-18	31-out-18		15-out-18	31-out-18		100		
Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	CCONT	Concluído	1-nov-18	15-nov-18		9-nov-18	4-dez-18		100	A minuta do TED precisou ser alterada devido a uma modificação na programação orçamentária da Sudene na disponibilização de recursos financeiros de investimento para 2018.	Foi elaborada nova minuta de TED com alterações em alguns valores previstos no Plano de Trabalho
Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / Embrapa	Concluído	15-nov-18	31-dez-18		6-dez-18	6-dez-18		100		
Publicação do TED	Publicação do TED no DOU	GABINETE	Concluído	15-nov-18	31-dez-18		7-dez-18	26-fev-19		100	O extrato do TED foi publicado originalmente em 07/12/2018, mas, em razão de ter sido publicado o TED com uma numeração equivocada, foi publicado extrato de errata com nova numeração de TED (nº 006/2018)	Termo de Apostilamento ao TED N.º 006/2018 - SUDENE/EMBRAPA-CPATSA e publicação de Extrato

Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	7-dez-18	31-dez-18	R$90.000,00	7-dez-18	13-fev-19	R$90.000,00	100		
Meta 1: Mobilização e realização do diagnóstico participativo/cadastramento das famílias que serão beneficiadas	Realização de oficinas de sensibilização; Aplicação de questionários aos beneficiários; Cadastramento das famílias beneficiárias nas comunidades.	Embrapa	Concluído	1-nov-18	31-dez-18	R$8.800,00	19-fev-19	18-abr-19		100	Houve atraso na liberação da primeira parcela de recursos, o que gerou atraso na execução. Mesmo assim, a Embrapa realizou as ações com recursos de contrapartida	
Meta 2: Caracterização Ambiental e análise da estrutura da paisagem nas duas comunidades	Caracterização das comunidades quanto aos ao tipo de solos, vegetação e relevo; Tabulação e confecção de mapas; Prepara material para publicação.	Embrapa	Concluído	1-jan-19	30-jun-21	R$20.275,00	13-fev-19	31-dez-21	R$1.200,00	70	Segundo o último relatório parcial enviado em 10/6/21, a caracterização ambiental nas comunidades rurais está sendo realizada com a confecção de mapas e imagens de drones.	As metas que estão com o status de "em andamento" referem-se às informações prestadas no último relatório parcial, enviado em 10/6/21 para a Sudene. A finalização das metas estão previstas para término em 31/12/21 e as informações constarão do retatório final do projeto.
Meta 3: Avaliação de pelo menos 8 sistemas de bioágua familiar com o uso de energia solar visando à sustentabilidade do sistema	Instalação do kit de energia solar integrado ao sistema bioágua familiar.	Embrapa	Concluído	1-mar-19	30-jun-21	R$19.410,00	13-fev-19	31-dez-21	R$19.410,00	20	Segundo o último relatório parcial enviado em 10/6/21, a viabilidade econômica do sistema quanto ao uso de energia solar e elétrica será realizada, os dados estão sendo coletados para essa avaliação e será apresentado no próximo relatório.	A coordenadora do projeto, Dr.ª Roseli Freire, pesquisadora da Embrapa Semiárido, apresentou o projeto detalhando o sistema bioágua familiar no Semiárido Show realizado na modalidade on line no período de 23 a 25/11/21.
Meta 4: Definição de modelos (composição e dimensionamento) de sistemas de cultivo a partir da disponibilidade hídrica em cada propriedade	Avaliação da quantidade de água disponível (fluxo de água) do sistema bioágua familiar para definição de modelos de sistema produtivo irrigação quanto a dimensionamento e composição (espécies de plantas).	Embrapa	Concluído	1-jan-19	30-jun-21	R$4.973,00	1-set-20	31-dez-21		50	A instalação dos sistemas de irrigação foi iniciada, conforme mensagens, vídeo e fotos encaminhados em 29/9/20. Foi concluída na comunidade de Uauá - BA, a definição dos modelos a partir da instalação dos 12 sistemas bioágua e será feito também na Comunidade Sítio Coelho, de acordo o último relatório parcial datado de 10/6/21.	Fotos e mensagens compartilhadas com a coordenadora do projeto informaram o avanço da instação dos sistemas na comunidade Sítio Coelho, que constarão do relatório final do projeto.
Meta 5: Instalação de 22 sistemas bioágua familiar em área de produtor com reservatório e sistema de irrigação	Realização de 02 oficinas de capacitação de construção da tecnologia; Instalação dos 20 sistemas bioágua familiar; Definição de pelo menos 4 modelos de sistema de produção; Realização de, no mínimo, 04 oficinas sobre gestão de águas, educação ambiental e cultivo produtivo; Seleção e implantação de 14 culturas (hortaliças, frutíferas e forrageiras) de forma participativa	Embrapa	Concluído	1-fev-19	30-jun-21	R$188.081,86	13-fev-19	31-dez-21	R$62.190,00	75	Em visita técnica de acompanhamento realizada em 18/11/19 à comunidade indígena Aticum, foi possível observar parte da meta concluída (incluindo compra de materiais). A instalação dos sistemas bioágua estavam previstos para serem concluídos no final de março, contudo, foram interrompidos por conta da pandemia. Contudo, nessa comunidade foram finalizados, incluindo o sistema de irrigação. Em 16/12/2020, conforme mensagem enviada pela Embrapa, foi iniciada a etapa da Comunidade Sítio Coelho com a realização da capacitação. O primeiro sistema de reúso foi instalado em fevereiro/2021, contudo, diante do segundo lockdown em decorrência da pandemia, as atividades de campo foram suspensas e retomadas no segundo semestre de 2021. O relatório final do projeto trará informações sobre a finalização dos sistemas na Comunidade Sítio Coelho.	
Meta 6: Implantação de 01 (um) sistema bioágua como unidade demonstrativa em área experimental na Embrapa Semiárido	Instalação de 01 sistema bioágua familiar como unidade demonstrativa; Realização de no mínimo 08 dias de campo sobre o uso e manejo do bioágua familiar; Realização de no mínimo 06 cursos sobre instalação, manejo e segurança alimentar e nutricional, sustentabilidade ambiental no Semiárido	Embrapa	Concluído	1-mar-19	30-jun-21	R$19.000,00	1-out-19	31-mai-21	R$7.200,00	100	Unidade demonstrativa apresentada no Semiárido Show no período de 19 a 22/11/19. Foi também instalado um minhocário, no relatório parcial enviado pela Embrapa em 10/6/2021, há informações sobre os outros cursos realizados.	
Meta 7: Avaliação de pelo menos 20 amostras de qualidade da água, solo e planta nos 23 sistemas bioágua familiar	Avaliação da qualidade da água para análise física, química e microbiológica durante a execução do projeto; Monitoramento das características físicas, químicas e microbiológica do solo durante a execução do projeto; Avaliação da qualidade microbiológicas dos alimentos produzidos nos sistemas bioágua familiar	Embrapa	Concluído	1-mai-19	30-jun-21	R$33.139,14	1-out-19	31-mai-21		100	O relatório parcial enviado pela Embrapa em 10/6/2021 traz informações de avaliação da qualidade da água e do solo.	
Meta 8: Avaliação da integração de pelo menos 08 sistemas de bioágua (em área de agricultores familiares) com a criação de galinhas adaptadas localmente	Seleção das 08 famílias aptas a integrar o sistema bioágua com a criação de galinhas já existente em sua propriedade	Embrapa	Concluído	1-jan-19	30-jun-21	R$1.196,00	4-jan-21	31-dez-21		50	De acordo com o relatório parcial datado de 10/6/21, a integração com a galinha caipira está sendo realizada, incluindo as criações dos agricultores. Informações sobre a conclusão deverá fazer parte do relatório final do projeto.	
Meta 9: Avaliação do Projeto	Avaliação da contribuição do sistema bioágua na produtividade das culturas e eficiência hídrica; Avaliação da contribuição do sistema bioágua integrado na segurança alimentar e nutricional da família; Avaliação da contribuição do sistema bioágua integrado na sustentabilidade ambiental, por meio de indicadores da qualidade do solo e da água; Avaliação socioeconômica ex-ante e ex-post do impacto da tecnologia de reuso de água por meio do sistema familiar integrado a culturas alimentares para as famílias beneficiadas na renda das famílias; Publicações; Relatórios anuais	Embrapa	Concluído	1-abr-19	30-jun-21	R$31.592,00	4-jan-21	31-dez-21		50	De acordo com o relatório parcial datado de 10/6/21, a meta está em andamento e mais informações sobre a conclusão deverá fazer parte do relatório final do projeto.	
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	Embrapa/CGDS	Concluído	1-jan-19	28-fev-19		2-mai-19	6-jun-19		100		
Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	1-mai-19	30-jun-19	R$212.767,00	5-jun-19	21-jun-19	R$212.767,00	100	Liberação da 2ª parcela realizada em 21/06/19.	Em 26/12/19, foi devolvido o valor de R$ 47.674,65 que não foi possível executar em 2019 referente ao 2º repasse do TED.
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	Embrapa/CGDS	Concluído	1-out-19	30-nov-19		15-dez-19	19-mai-20		100	O relatório de execução da 2ª parcela foi finalizado pela Embrapa em 9/3/20 e aprovado em 19/5/20, a partir do parecer técnico n.º 129/2020, de 28/4/20. Em 16/6/2021, a Embrapa encaminhou relatório de atividades do projeto referente ao período de dezembro de 2020 a maio de 2021.	Em 12/12/19, Embrapa solicitou ajuste de PT, conforme Carta nº 146/2019-CPATSA/CHGE, que foi tecnicamente aprovada por meio do Parecer Técnico n.º 391/2019 - SEI/SUDENE em 19/12/19.
Liberação da terceira parcela de recursos	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	1-mar-20	1-abr-20	R$23.700,00	14-mar-20	9-set-20	R$36.750,00	100	A 3ª parcela foi paga em 9/9/20, após consulta à COCF e Procuradoria sobre mudança de ação orçamentária e complementação de recursos.	Em 14/3/2020, a Embrapa solicitou complementação de recursos da 3ª parcela no valor de R$ 13.050,00, que foi aprovada em 21/5/20, a partir do parecer técnico n.º 132/2020, de 6/5/20.
3ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 3ª parcela	Embrapa/CGDS	Em Andamento	30-jun-21	30-jun-22		1-mai-21			0	Esta linha deve ser retirada, pois não há necessidade da análise da prestação de contas parcial dessa parcela porque é a última. Então, deve-se apresentar a Prestação de Contas Final	
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	Embrapa	Em Andamento	1-jan-22	31-dez-22		3-jan-22			0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGDS	Em Andamento	1-jan-22	31-dez-22					0		Após a apresentação e análise preliminar do Relatório Final a ser apresentado pela Embrapa Semiárido, dependendo das condições apresentadas pela pandemia de COVID19, será avaliada a realização de uma visita técnica final deste projeto.
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CCONT	A Iniciar	1-jan-23	31-dez-22					0		

Resumo Projeto			Em Andamento								Projeto concluído no final de 2021. Relatório final apresentado pela Embrapa Semiárido para análise da equipe técnica. A visita técnica teve que ser adiada por conta de indisponibilidade de técnicos da Embrapa Semiárido.	Relatório final apresentado pela Embrapa Semiárido para análise da equipe técnica. Agendamento de visita técnica para elaboração da análise final. Visita técnica final terá que ser reagendada.
						R$652.934,00			**R$429.517,00**	**70,2173913**		

CGDS 2018004 - Reuso - Caraúbas

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Assinatura do convênio	Convênio firmado em 31/12/2018 com vigência até 20/09/2020.	Caraúbas/ Gabinete/ CGDS	Concluído	15-out-18	21-dez-18		8-out-18	31-dez-18		100	As etapas de planejamento estão descritas no PO 07 Reúso de Águas - 1º ciclo prioritários 2019.	
Liberação de Cláusula Suspensiva	Convênio firmado com pendência no CAUC	Caraúbas/ CGDS	Concluído	31-dez-18	31-mar-19		1-jan-19			100		
Processo licitatório	Procedimentos administrativos referentes à licitação	Caraúbas	Concluído	31-mar-19	1-jul-19		31-mar-19	21-ago-20		100	O processo licitatório foi concluído em 21/08/20. O atraso da licitação ocorreu pela necessidade de solicitar suspensão do edital para realizar ajustes e consulta à Procuradoria Federal junto à Sudene sobre a possibilidade de contratação de entidades da sociedade civil. A Procuradoria Sudene pronunciou-se de forma favorável por meio de parecer n. 205/2019/PF-SUDENE/PGF/AGU e a prefeitura realizou os ajustes necessários, de acordo com o parecer técnico n.º 342/2019.	
Análise e aceite da licitação	Etapa prevista nos art. 41 e 42 da Portaria n.º 424/2016	Codem/ CGDS	Concluído	1-jul-19	19-jul-19		31-ago-20	19-out-20		100	19/10/2020, a Sudene realiza o aceite da licitação na Plataforma + Brasil.	
Ajuste dos cronogramas físico e de desembolso	Ajuste das etapas de execução do projeto	Caraúbas/ Codem	Concluído	1-out-20	30-nov-20		29-out-20	3-fev-21		100	Realizada reunião de acompanhamento técnico por meio de videoconferência em 29/10/20. Convenente solicita em 6/11/2020 prorrogação da vigência do convênio. 2º Termo Aditivo assinado em 18/12/2020 e define que a visita técnica deverá ser realizada para liberação de 2ª parcela. Todas as datas do cronograma físico foram ajustadas para nova vigência do convênio: 31/12/2022. O cronograma de desembolso foi alterado de 3 para 2 parcelas, sendo a primeira alterada de R$ 99.673,80 para R$ 102.896,80.	
Ingresso de contrapartida	Liberação dos recursos do convenente	Caraúbas	Cancelado	1-jan-21	30-set-21	R$20.000,00	27-jan-21			33	1ª parcela no valor de R$ 1.387,00 paga pelo convenente em 27/01/2021. 2ª e 3ª parcelas previstas para fevereiro e setembro de 2021.	
Liberação da 1ª parcela	Verificação das exigências para solicitar liberação da 1ª parcela	CGDS/ COCF	Cancelado	1-fev-21	28-fev-21	R$102.896,80	1-fev-21			0	Em 3/2/2021, a CODEM solicita liberação da primeira parcela tendo como base o Parecer nº 6/2021 - SEI/SUDENE que aprova os ajustes do plano de trabalho e afirma não haver impedimento técnico para o repasse.	Em 22/3/2021, por meio do Ofício nº 519/2021/COCIC, a Sudene oficializou o município a respeito do impedimento para recebimento da 1ª parcela do convênio por ter recursos transferidos do governo federal sem utilização há 180 dias (Art. 41º, da Portaria nº 424/ 2016). Em 19/10/21, o convenente continua impedido de receber recursos por registro no CAUC. Em 27/12/2021, a Sudene encaminha o OFÍCIO Nº 2987/2021/GAB/SUDENE, informando da suspensão para recebimento de recursos da Sudene por persistir pendência no CAUC. Por se tratar de recursos de restos a pagar de 2018, o empenho será cancelado automaticamente no SIAFI a partir de 31/12/2021, resultando no impedimento de continuidade do projeto e ao início dos procedimentos de rescisão do convênio.
Mobilização de 6 comunidades rurais	Mobilização de 120 famílias de 6 comunidades rurais no município de Caraúbas.	Caraúbas	Cancelado	1-fev-21	28-fev-21					0	Aguardando liberação da 1ª parcela.	
Seleção de famílias a serem beneficiadas com o SBF	Seleção de 42 famílias a serem beneficiadas com o SBF.	Caraúbas	Cancelado	1-fev-21	31-mar-21					0	Aguardando liberação da 1ª parcela.	
Capacitações	Realização de 18 capacitações, sendo 3 em cada uma das 6 comunidades.	Caraúbas	Cancelado	1-abr-21	30-nov-21					0		
Visita técnica	Visita técnica para liberação de parcela	Codem	Cancelado							0	O Termo Aditivo do convênio alterou a previsão de visita técnica como condição para liberação da 2ª parcela, antes do início da instalação dos sistemas de reúso.	
1ª Prestação de contas parciais	Análise dos relatórios de execução da 1ª parcela	Caraúbas/ CGDS	Cancelado	1-out-19	31-out-19					0		
Liberação da 2ª parcela	Verificação do cumprimento das exigências para liberação da 1ª parcela	CGDS/ COCF	Cancelado	1-set-21	30-set-21	R$444.472,52				0		
Implantação dos Sistemas Bioágua Familiar	Implantação de 42 SBF em 6 comunidades.	Caraúbas	Cancelado	1-set-21	31-jul-22					0		
Articulação com controle social e avaliação do projeto	Realização de 6 reuniões do comitê de controle social e avaliação do projeto, sendo uma reunião em cada uma das 6 comunidades.	Caraúbas	Cancelado	1-ago-22	31-ago-22					0		
2ª Visita técnica	Acompanhamento técnico da execução do projeto.	Codem	Cancelado							0		
2ª Prestação de contas parciais	Análise dos relatórios de execução da 2ª parcela	Caraúbas/ CGDS	Cancelado	1-set-22	31-dez-22					0		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas pelo convenente	Caraúbas	Cancelado	1-jan-23	28-fev-23					0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CODEM	Cancelado	1-jan-23	30-jun-23					0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	CGDS	Cancelado	1-jul-23	31-dez-23					0		
Resumo Projeto			Cancelado								Empenho dos recursos do convênio, inscritos em RAP 2018, cancelado em 31/12/2021. Convênio a extinguir/encerrar.	Voto encaminhado à Diretoria Colegiada, sugerindo a extinção do convênio, bem como, para autorizar o registro de extinção do convênio em tela na Plataforma +Brasil, caso aprovado. Aguardando a realização do próxima reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e deliberação.
						R$567.369,32			**R$0,00**	**26,65**		

CGDS 2018003 - Palma - EPAMIG 2018

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	Concluído	10-abr-18	15-mai-19		10-abr-18	15-mai-19		100		
Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	16-mai-18	7-jun-18		16-mai-18	7-jun-18		100		
Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	16-jun-18	16-jun-18		16-jun-18	16-jun-18		100		
Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	17-jun-18	12-dez-18		17-jun-18	12-dez-18		100		
Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	Concluído	13-dez-18	13-dez-18		13-dez-18	13-dez-18		100		
Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	Concluído	14-dez-18	26-dez-18		14-dez-18	26-dez-18		100		
Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	Concluído	27-dez-18	11-jan-19		27-dez-18	11-jan-19		100		
Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços	EPAMIG/MG	Cancelado	31-dez-18	24-dez-21		17-dez-19			10	A Epamig está reformulando o processo de licitação para atender a legislação.	Reunião de acompanhamento, em 18/03/2021, entre coordenação e equipes técnicas, para verificar andamento da reformulação do processo licitatório (processos em elaboração).

Liberação 1ª parcela (única)	Liberação de recursos	CGDS/SUDENE	Cancelado	1-mar-19	31-mar-19					0	A liberação da 1ª parcela ou parcela única dos recursos está condionada a realização do processo licitatório pela convenente e ao aceite do concedente (PI 424/2016). Só uma parte dos processos de execução foram concluídos e registrados. Esses, analisados demandaram medidas de ajuste da EPAMIG. A pandemia do Covid-19 e seus impactos sobre os preços dos insumos do projeto tem trazido grande dificuldade para a execução.	Reunião para entendimento, em 02/06/2021, sobre processos de licitação (EPI's, Ferramentas e Fertilizantes), considerando análise e orientações (Parecer 08/2020 - PF/SUDENE), quanto a liberação proporcional aos itens licitados/contratados. Informando também a necessidade de apresentar justificativas e submeter novos TR's, considerando ajustes/alterações da quantidade. A Epamig não apresentou o novo TR e justificativa, nem avançou nos processos de execução (licitações). Por se tratar de recursos de restos a pagar de 2018, o empenho será cancelado automaticamente no SIAFI a partir de 31/12/2021, resultando no impedimento de continuidade do projeto e ao início dos procedimentos de rescisão do convênio.
Manejo da Fertilidade do solo com cobertura vegetal, adubação orgânica e química	Manejo da Fertilidade do solo com cobertura vegetal, adubação orgânica e química, na produção de palma forrageira (Meta 1).	EPAMIG/MG	Cancelado	1-jan-19	25-dez-21					0		
Instalação dos experimentos	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 01)	EPAMIG/MG	Cancelado	1-jan-19	31-jul-19	R$18.250,00				0		
Condução dos Experimentos e Coleta de Dados	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 01)	EPAMIG/MG	Cancelado	1-ago-19	25-dez-21	R$31.260,00				0		
Multiplicação In Vitro de Palma Forrageira	Multiplicação In Vitro de Palma Forrageira (Meta 2)	EPAMIG/MG	Cancelado	1-jan-19	25-dez-21	R$48.890,00				0		
Instalação dos experimentos	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 02)	EPAMIG/MG	Cancelado	1-jan-19	31-jul-19	R$24.890,00				0		
Condução dos Experimentos e Coleta de Dados	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 02)	EPAMIG/MG	Cancelado	1-ago-19	25-dez-21	R$24.000,00				0		
Flutuação populacional e avaliação de métodos alternativos de controle de insetos	Flutuação populacional e avaliação de métodos alternativos de controle de insetos que ocorrem na cultura da palma forrageira no semiário mineiro (Meta 3).	EPAMIG/MG	Cancelado	1-jan-19	25-dez-21	R$24.350,00				0		
Instalação dos experimentos	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 03)	EPAMIG/MG	Cancelado	1-jan-19	31-jul-19	R$18.350,00				0		
Condução dos Experimentos e Coleta de Dados	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 03)	EPAMIG/MG	Cancelado	1-ago-19	25-dez-21	R$6.000,00				0		
Manejo de doenças na cultura da palma em sistema orgânico para produção de frutos e forragem.	Manejo de doenças na cultura da palma em sistema orgânico para produção de frutos e forragem (Meta 4).	EPAMIG/MG	Cancelado	1-jan-19	25-dez-21	R$40.600,00				0		
Instalação e Condução dos Experimentos e Coleta de Dados	Instalação e Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 01 - Meta 04).	EPAMIG/MG	Cancelado	1-jan-19	31-jul-19	R$40.600,00				0		
Desenvolvimento da palma forrageira sob diferentes níveis de déficit hídrico	Desenvolvimento da palma forrageira sob diferentes níveis de déficit hídrico (Meta 5).	EPAMIG/MG	Cancelado	1-jan-19	25-dez-21	R$29.900,00				0		
Instalação dos experimentos	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 05)	EPAMIG/MG	Cancelado	1-jan-19	31-jul-19	R$29.000,00				0		
Condução dos Experimentos e Coleta de Dados	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 05)	EPAMIG/MG	Cancelado	1-ago-19	25-dez-21	R$900,00				0		
Rede Mineira de seleção, multiplicação e distribuição de palma forrageira (REDEPALMA)	Rede Mineira de seleção, multiplicação e distribuição de palma forrageira - REDEPALMA (Meta 6).	EPAMIG/MG	Cancelado	1-jan-19	25-dez-21	R$62.750,00				0		
Instalação dos experimentos	Instalação dos experimentos (Etapa 01 - Meta 06)	EPAMIG/MG	Cancelado	1-jan-19	31-jul-19	R$34.050,00				0		
Condução dos Experimentos e Coleta de Dados	Condução dos Experimentos e Coleta de Dados (Etapa 02 - Meta 06)	EPAMIG/MG	Cancelado	1-ago-19	25-dez-21	R$28.700,00				0		
Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento	CGDS/SUDENE	Cancelado							0		
Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento para elaboração do Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	Cancelado							0		
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	Cancelado	24-fev-22	24-abr-22					0		
Resumo Projeto			Cancelado								Empenho dos recursos do convênio, inscritos em RAP 2018, cancelado em 31/12/2021. Convênio a extinguir/encerrar.	Voto encaminhado à Diretoria Colegiada, sugerindo a extinção do convênio, bem como, para autorizar o registro de extinção do convênio em tela na Plataforma +Brasil, caso aprovado. Aguardando a realização do próxima reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e deliberação.
						R$462.490,00			**R$0,00**	**24,48275862**		

CGDS 2018002 - Publicação Palma

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Planejamento da Atualização da literatura sobre a cultura da palma.	Mediante identificação, articulação e negociação da Rede Palma, que trabalharão a produção de publicações atualizadas sobre palma.	CGDS/DPLAN	Concluído	4-set-17	16-mar-18		4-set-17	16-mar-18		20	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.	
Reuniões Externas			Concluído	4-set-17	16-mar-18		4-set-17	16-mar-18		100	Nos encontros realizados com os parceiros, em particular, na I Reunião Técnica de Articulação da Rede Palma, foi levantada a necessidade de haver uma maior quantidade de publicações sobre a cultura da Palma.	
Reuniões Internas (CGDS)			Concluído	4-set-17	16-mar-18		4-set-17	16-mar-18		100	Realização de reuniões da equipe técnica da CGDS/DPLAN para identificação de possíveis parceiros e publicações relativas à cultura da palma a serem apoiadas, bem como, montar a estratégia de atuação.	
Articulações com Parceiros.		CGDS/DPLAN	Concluído							40	O percentual total de execução desta Meta é de 40%.	
Articulacão com a Embrapa.	Contato por telefone.		Concluído	19-mar-18	17-jul-18		19-mar-18	17-jul-18		100	Não foi possível firmar parceria com a Embrapa, devido aos entraves burocráticos seguidos por essa instituição para elaborações de publicações.	
Articulação com a FAO.			Concluído	20-ago-18	28-set-18			3-set-18		100	Foi identificada a publicação "Ecología del cultivo, manejo y usos do nopal", produzida pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO). Esta publicação já existe nos idiomas inglês, francês e espanhol. Neste sentido, a articulação que a Sudene realizou junto à FAO foi no sentido de traduzir esta publicação para a língua portuguesa para que este seja mais um suporte à implementação da Rede Palma.	
Contatos iniciais/ articulação	Contatos telefônicos		Concluído	28-ago-18	28-set-18		28-ago-18	28-set-18		100	Nesta ocasião foi realizado o agendamento de uma reunião técnica presencial, em Brasília/DF, bem como, para os desdobramentos adivindos desta reunião, como, por exemplo, a consulta à sede da FAO, em Roma, Itália, para autorização da tradução da publicação citada acima.	
Reunião Técnica	Reunião no escritório da FAO de Brasília/DF		Concluído	3-set-18	3-set-18		3-set-18	3-set-18		100	Reunião realizada com o Sr. Gustavo Chianca, assistente do representante da FAO no Brasil. Nesta ocasião, foram tratados os diversos aspectos envolvidos da parceria Sudene FAO: indicação da publicação da FAO que trata da cultura da palma; verificação da possibilidade de disponibilização da publicação.	

Consulta e manifestação do parceiro quanto a possíveis publicações		CGDS/DPLAN	Cancelado							2	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.	Em função da prioridade apresentada pela elaboração do PRDNE, que demandou a cessão de técnicos desta CGDS/DPLAN para a Força Tarefa, foi necessário priorizar outras atividades já em andamento, como convênios e emendas, em detrimento de outras. Posteriormente, a priorização, conforme orientação superior, recaiu sobre a elaboração de cartilha para os produtores. No momento, é necessário levar à apreciação da atual gestão se oportuno retomar as articulações com a FAO para verificar o interesse recíproco em realizar esta ação. Aguardando definição da gestão quanto ao encaminhamento a ser dado a este projeto.
Parceria com Embrapa			Cancelado								Uma vez que a articulação com a Embrapa não prosperou, este item foi cancelado.	
Parceria com a FAO.			Cancelado	3-set-18	31-out-18		20-set-18			10	Na ocasião foram realizados alguns procedimentos burocráticos com a elaboração de uma minuta de Ofício a ser encaminhada a FAO.	
Relatório Técnico		CGDS/DPLAN	Cancelado	3-set-18	30-mar-18		3-set-18			4	O percentual total de execução desta Meta é de 20%.	
Elaboração de Relatório Técnico descritivo da execução.			Cancelado	1-ago-18	30-mar-18		3-set-18			20	Relatório Técnico descritivo teve sua elaboração iniciada, porém paralisada.	
Resumo Projeto			Cancelado								É necessária apreciação da atual gestão se oportuno retomar as articulações com a FAO para verificar o interesse recíproco em realizar esta ação. Foi aberto um processo para apreciação e deliberação da gestão atual	Foi aberto um processo para apreciação e deliberação da gestão atual, que concordou com o encerramento do Plano Operativo, bem como, autorizando as respectivas providências no Monday. Processo encaminhado à CGGI para providências. Foi autorizada a exclusão do processo em 14.04.2022, de acordo com o Despacho DPLAN 0343197 Assinado por: Sérgio Wanderley Silva / Diretor, Substituto.
						R$0,00			**R$0,00**	**58**		

CGDS 2014001 - Caprinocultura - EMPAER/PB

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Cadastramento e divulgação	Cadastramento e divulgação de programas	CGDS/SUDENE	Concluído	26-fev-14	17-abr-14		26-fev-14	17-abr-14		100		
Recebimento de proposta	Recebimento de proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	26-fev-14	17-abr-14		15-abr-14	15-abr-14		100		
Análise da proposta	Análise da proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	15-abr-14	15-out-14		15-abr-14	15-out-14		100		
Complementação da proposta	Complementação da proposta	CGDS/SUDENE	Concluído	15-out-14	17-out-14		15-out-14	17-out-14		100		
Emissão de parecer técnico final	Emissão de parecer técnico final (analista)	CGDS/SUDENE	Concluído	17-out-14	18-dez-14		17-out-14	18-dez-14		100		
Aprovação do parecer técnico	Aprovação do parecer técnico (gestor)	CGC/SUDENE	Concluído	18-dez-14	23-dez-14		18-dez-14	23-dez-14		100		
Formalização do Convênio	Formalização do Convênio (Assinatura e Publicação)	CGC/SUDENE	Concluído	31-dez-14	8-jan-15		31-dez-14	8-jan-15		100	De acordo com as metas institucionais de 2014/2015, que é de apoiar a formalização de 02 projetos para Desenvolvimento Econômico, Social, Cultural e Ambiental para o semiárido (02 formalizações da Rota do Cordeiro).	
Liberação 1ª parcela	Liberação 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	Concluído	1-dez-14	31-dez-14	R$206.151,42	8-abr-15	22-abr-15	R$206.151,42	100		
Contratação	Contratação de 02 técnicos de nível médio e 01 de nível superior - (Etapa 01 - Meta 01)	EMPAER-PB	Concluído	3-ago-15	30-nov-16		3-out-15	3-mai-16		100	Técnicos contratados e incorporados às atividades do projeto.	
Confecção de 50 blocos multinutricionais	Confecção de 50 blocos multinutricionais para demonstração nos Núcleos - (Etapa 02 - Meta 01)	EMPAER-PB	Concluído	21-set-15	30-nov-16		4-nov-15	5-nov-16		100		
Disponibilização de 48 reprodutores	Disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças leiteiras - (Etapa 01 - Meta 02)	EMPAER-PB	Concluído	21-set-15	22-mar-20		24-out-15			96	Foram distribuidos 46 reprodutores caprinos de leite. A previsão era que todos os animais fossem entregues até 22/03/2020. Paralisado devido à pandemia.	A posição final desta ação deverá ser exposta por ocasião da apresentação do Relatório Final deste projeto.
Coleta de sêmen	Coleta de sêmen (1.200 doses) - (Etapa 02 - Meta 02)	EMPAER-PB	Concluído	13-out-15	22-mar-20		3-dez-15			80	A maior parte das doses já foram coletadas (cerca de 960 doses). No momento, encontra-se paralisado devido à pandemia.	A posição final desta ação deverá ser exposta por ocasião da apresentação do Relatório Final deste projeto.
36 Visitas técnicas para acompanhamento	36 Visitas técnicas para acompanhamento das atividades de disponibilização de 48 reprodutores caprinos de raças - (Etapa 03 - Meta 02)	EMPAER-PB	Concluído	21-set-15	22-dez-19		14-set-15	4-jan-19		100	Foram realizadas pela as 36 visitas técnicas de acompanhamento	
Realização de 36 cursos de capacitação	Realização de 36 cursos de capacitação destinados produtores de caprinos leiteiros da base familiar - (Meta 03)	EMPAER-PB	Concluído	5-out-15	22-mar-20		27-nov-15			65	Foram ministrados os Módulos I e II do curso de Produção e Conservação de Forragens e Manejo da Caatinga para 9 associações; Modulo I e II do Curso do Manejo Alimentar para 5 associações; Módulos I e II do Curso de Manejo Sanitário e Boas Práticas de Produção Associadas à Higiene na Ordenha e Qualidade do Leite para 5 associações e nenhum Módulo do curso sobre Curso de Manejo Reprodutivo e Genético. Paralisado devido à pandemia. *A situação ainda não permitiu realizar as atividades faltantes, em particular, as capacitações. No período até 30/06/21, como encaminhamento da reunião de acompanhamento ocorrida na 2ª quinzena de março, a EMPAER enviou por email proposta de ajuste do plano de trabalho, para análise, considerando a retomada das ações pendentes, quando possível.	*Acompanhamento remoto do projeto; realização de reunião, contatos e/ou entendimentos; recebimento e análise preliminar da proposta de ajuste do plano de trabalho. Recebimento de solicitação de ajuste do Plano de Trabalho, conforme Ofício nº293/2021, 15/09/2021, visando adequações para a retomada e conclusão das atividade do projeto. A Sudene aprovou a solicitação de ajustes na didática, na forma de ministrar o módulo, contido na Meta 3 /etapa/fase 1, do plano de trabalho, com o objetivo de concluir o módulo III e revisão do conteúdo programático dos cursos ministrados. A Empaer informou que concluiu as atividades finais do projeto. Aguarda-se a apresentação do Relatório Final deste projeto.
Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento	CGDS/SUDENE	Concluído	1-ago-16	5-ago-16		10-ago-16	12-ago-16		100		
Liberação 2ª parcela	Liberação 2ª parcela de recursos financeiros	CGDS/SUDENE	Concluído	1-ago-16	31-ago-16	R$137.434,28	23-mar-18	23-mar-18	R$137.434,28	100	A demora para liberação da segunda parcela ocorreu em função de ajustes para aprovação dos relatórios de execução (parcial) e do plano de trabalho	
Visita Técnica de Acompanhamento	Realização de visita técnica para acompanhamento para elaboração do Laudo Técnico	CGDS/SUDENE	A Iniciar							0	A 2a visita de acompanhamento ainda não foi feita. A Empaer informou que concluiu o módulo restante.	A Sudene aprovou a solicitação de ajustes na didática, na forma de ministrar o módulo, contido na Meta 3 /etapa/fase 1, do plano de trabalho, com o objetivo de concluir o módulo III e revisão do conteúdo programático dos cursos ministrados. A Empaer informou que concluiu as atividades finais do projeto. Após a apresentação e análise preliminar do Relatório Final a ser apresentado pela Convenente, dependendo das condições apresentadas pela pandemia de COVID19, será avaliada a realização de uma visita técnica final deste projeto.
Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise das Prestação de Conta, sob o aspecto físico, para emissão de Laudo Técnico.	CGDS/SUDENE	Atrasado	26-dez-21	26-dez-22					0		

Resumo Projeto			Atrasado								Projeto concluído. Aguardando apresentação da Prestação de Contas. Prestação de contas ainda não enviada. A prestação de contas final ainda não foi apresentada devido a um valor bloqueado na conta do Convênio.	Elaborar Ofício a ser encaminhado à EMPAER solicitando a apresentação da prestação de contas final do projeto.
						R$343.585,70			**R$343.585,70**	**85,61111111**		

CGDS 2012001 - Zoneamento - SEMAS/PE - Desertificação

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
1. Seleção de propostas	Seleção de propostas para a Ação 8689 - Elaboração e Implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico	CGDS/SUDENE	Concluído	20-mar-12	11-mai-12		20-mar-12	11-mai-12		100		
2. Lançamento do Chamamento Público	Lançamento do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	Concluído	20-mar-12	19-abr-12		20-mar-12	19-abr-12		100		
3. Análise de propostas	Análise de propostas	CGDS/SUDENE	Concluído	20-abr-12	9-mai-12		20-abr-12	9-mai-12		100		
4. Resultado do Chamamento Público	Resultado do Chamamento Público 2012	CGDS/SUDENE	Concluído	11-mai-12	11-mai-12		11-mai-12	11-mai-12		100		
5. Ajustes do projeto para formalizar convênio	Ajustes do projeto para formalizar convênio	CGDS/SUDENE	Concluído	24-abr-12	8-jun-12		24-abr-12	8-jun-12		100		
6. Formalização do convênio	Etapas de formalização do convênio	CGDS/SUDENE	Concluído	9-jun-12	14-dez-12		9-jun-12	14-dez-12		100		
7. Assinatura do convênio	Assinatura do convênio	CGC/SUDENE	Concluído	28-dez-12	28-dez-12		28-dez-12	28-dez-12		100		
8. Publicação do convênio	Publicação do convênio	CGC/SUDENE	Concluído	3-jan-13	3-jan-13		3-jan-13	3-jan-13		100		
9. Liberação da 1ª parcela	Liberação da primeira parcela	SUDENE/CGDS	Concluído	1-ago-13	31-ago-13	R$265.241,25	15-ago-13	15-ago-13	R$265.241,25	100		
10. Realização de proc. Licitatório	Realização de proc. licitatório para contratação de serviços no valor de R$ 325.222,88	SEMAS/PE	Concluído	1-set-13	24-jun-20		15-nov-14	6-dez-19		100	Processo licitatório concluído em dez 2019 para contratação dos serviços de sistematização e confecção do documento final/livro e do Seminário Nordestino.	
11. Realizar 76 eventos	META 1 - Realizar 76 eventos de mobilização, sensibilização e validação para o Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco- Valor: R$ 356.560,00	SEMAS/PE	Concluído	1-jul-14	24-jun-20		8-dez-14			100		
12. Realizar 61 encontros	META1/ETAPA 1 – Realizar 61 encontros com duração de 2 dias (16h), cada um, no Sertão e Agreste Pernambucano. Valor: R$ 146.400,00	SEMAS/PE	Concluído	8-dez-14	29-jun-16		8-dez-14	29-jun-16		100		
13. Visita técnica de acompanhamento	Visita técnica de acompanhamento	CGDS/SUDENE	Concluído	10-dez-14	11-dez-14		10-dez-14	11-dez-14		100		
14. Liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	SUDENE	Concluído	8-jan-18	31-ago-18	R$265.241,25	20-ago-18	20-ago-18	R$265.241,25	100	A segunda parcela de recursos ocorreu no dia 20/08/2018.	
15. Realizar quatorze (14) workshops	META 1/ETAPA 2 – Realizar quatorze (14) workshops com duração de dois (2) dias cada em regiões do Sertão e Agreste Pernambucano para a socialização, discussão e contribuições na elaboração do projeto. Valor: R$ 176.960,00	SEMAS/PE	Concluído	9-jul-18	24-jun-20		9-jul-18	30-jul-19		100		
16. Realizar Seminário Nordestino	META1/ETAPA 3 – Realizar Seminário Nordestino com duração de 3 (três) dias para socializar o documento e uniformizar a modelagem de vulnerabilidade da Desertificação na Região Nordeste. Valor: R$ 33.200,00	SEMAS/PE	Atrasado	5-nov-18	24-jun-20					40	Este evento estava previsto para ser realizado presencialmente. Programado inicialmente por volta do dia 28/04/2020 - Dia Nacional da Caatinga, foi paralizado por motivo da pandemia. Convenente solicitou aditivo de prazo do convênio para 31/12/2022 para realizar o evento em 2022. Termo aditivo foi assinado em 27/12/21 e inserido na Plataforma +Brasil após o sistema ter identificado necessidade de ajuste de PT.	
17. Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação	META 2 - Realizar a identificação, mapeamento e caracterização do processo de desertificação no Estado de Pernambuco. Valor: R$ 232.865,00	SEMAS/PE	Concluído	1-mai-14	24-jun-20		1-mai-14	4-mar-21		100		
18. Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais	META 2/ ETAPA1 – Realizar a identificação/ caracterização de fatores sócio-ambientais (Solos, ambientes, cobertura vegetal ,clima e socioeconomia) Mapeamento; Processamento Digital e Verificação da verdade terrestre para finalização dos mapas. Valor: R$ 182.865,00	SEMAS/PE	Concluído	1-mai-14	15-jun-17		1-mai-15	31-out-17		100	O material produzido nesta Etapa foi apresentado para a equipe técnica da Sudene em 30/05/2019, presencialmente e por meio de videoconferência.	
19. Confeccionar documento final/ livro	META2/ ETAPA2 – Confeccionar documento final/ livro contendo os produtos obtidos com a realização das Metas previstas. Valor R$ 50.000,00	SEMAS/PE	Concluído	1-nov-18	24-jun-20		17-fev-20	4-mar-21		100	Foi realizado em 4/3/2021, o lançamento do documento "Zoneamento das Áreas Vulneráveis à Desertificação do Estado de Pernambuco" em evento on line promovido pela SEMAS/PE com a participação da SUDENE, nas pessoas do Superintendente e do Coordenador da CODEM/CGDS, Victor Uchôa.	
20. Visita técnica final de acompanhamento	Visita técnica final de acompanhamento.	CGDS/SUDENE	Concluído	20-mar-19	11-jul-19		20-mar-19	11-jul-19		100	Foram realizados acompanhamentos em parte dos workshops (março e julho/2019), assim como, uma reunião técnica com as partes envolvidas, na Embrapa Semiárido (Petrolina/PE), com videoconferência para participação da equipe técnica em Recife/PE (maio/2019).	
21. Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Análise da PTC, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	CGDS/DPLAN/ SUDENE	Atrasado	1-jan-22	31-dez-22					0	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.	
Resumo Projeto			Atrasado								Aguardando informação sobre o restabelecimento das condições e retomada das atividades com vistas a realização do Seminário Regional, única atividade pendente para conclusão do projeto.	Enviar ofício à Convenente solicitando informações quanto ao agendamento deste evento final. Minuta de Ofício elaborada a ser encaminhada para apreciação superior.
						R$530.482,50			**R$530.482,50**	**92,38095238**		

CGDS/COCIC - Projetos

CGDS2022002 - Transferência Voluntária

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Acompanhamento da indicação dos beneficiários no SIOP	Verificação das indicações dos beneficiários das emendas parlamentares, indicados por Deputados Federais e/ou Senadores, no SIOP	COCIC	Atrasado	1-fev-22	15-mai-22							
Disponibilização dos Programas na Plataforma +Brasil (P+B)	Preenchimento das informações técnicas e jurídicas, em acordo com os programas e ações orçamentárias indicadas pelos Parlamentares, de forma a nortear o envio das propostas e planos de trabalho.	CGDS	Atrasado	1-mai-22	25-mai-22							
Acompanhamento das propostas/planos de trabalhos enviados na Plataforma +Brasil	Verificação periódica do envio das propostas/planos de trabalho pelos beneficiários indicados, em acordo com o cronograma de envio disponibilizado pela SEGES/Ministério da Economia.	COCIC	Atrasado	25-mai-22	10-jun-22							
Análise das propostas/planos de trabalho encaminhadas na Plataforma +Brasil	Análise das propostas/planos de trabalho, encaminhadas na Plataforma +Brasil, com emissão de pareceres técnicos e realização dos comandos necessários na P+B.	COCIC/NÚCLEO DE EMENDAS	Atrasado	10-jun-22	25-jun-22							
Acompanhamento das complementação das Propostas e Plano de Trabalho	Verificação periódica do envio das complementações pelos proponentes, em acordo com o cronograma disponibilizado pela SEGES/Ministério da Economia.	COCIC	Atrasado	25-jun-22	15-jul-22							
Reanálise das propostas/planos de trabalho complementadas	Análise das complementações às propostas/planos de trabalho enviadas pelos proponentes na Plataforma +Brasil, com emissão de pareceres técnicos e realização dos comandos necessários na P+B.	COCIC/NÚCLEO DE EMENDAS	A Iniciar	15-jul-22	25-ago-22							
Aprovação/rejeição das propostas/planos de trabalho	Elaboração de despachos e realização de comandos de aprovação/rejeição das propostas/planos de trabalho na Plataforma +Brasil.	CGDS	A Iniciar	25-ago-22	30-ago-22							
Registro de impedimentos técnicos no SIOP	Indicação no SIOP dos impedimentos técnicos referentes às propostas/planos de trabalho rejeitadas, em acordo com o cronograma disponibilizado pela SEGES/Ministério da Economia.	COCIC/NÚCLEO DE EMENDAS	A Iniciar	1-set-22	10-set-22							
Comunicação do resultado das análises aos proponentes	Comunicação aos proponentes da aprovação e/ou rejeição das propostas/planos de trabalhos encaminhadas, via Plataforma +Brasil ou e-mail cadastrado.	COCIC	A Iniciar	25-ago-22	10-set-22							
Resumo Projeto			Atrasado									
						0			0	#DIV/0!		

Emendas Parlamentares

Emendas

Nome	Descrição Projeto	UF	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin.	Iniciação	1ª Liberação	2ª Liberação	3ª Liberação	4ª Liberação	Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
COCIC2016002	Pavimentação de diversas ruas no município de Tangará/RN	RN	R$ 250.000,00	R$ 262.869,00	R$ 250.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	24/08/2022	Em Andamento
COCIC2016003	Pavimentação de diversas ruas no município de Tibau do Sul/RN	RN	R$ 500.000,00	R$ 514.509,00	R$ 500.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	24/08/2022	Em Andamento
COCIC2016004	Requalificação arquitetônica e urbanística do Bosque das Mangueiras no Municípios de Natal	RN	R$ 1.000.000,00	R$ 1.020.000,00	R$ 813.633,00	81	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/2024	Em Andamento
COCIC2016005	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 1	RN	R$ 1.172.497,00	R$ 1.234.958,00	R$ 926.955,00	79	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	16/12/2023	Em Andamento
COCIC2016006	Pavimentação de diversas ruas no município de São Gonçalo do Amarante/RN - 2	RN	R$ 600.000,00	R$ 611.925,00	R$ 559.953,00	93	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	16/12/2023	Em Andamento
COCIC2016008	Pavimentação de diversas ruas no município de Jucurutu/RN	RN	R$ 500.000,00	R$ 503.902,00	R$ 500.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/2024	Em Andamento
COCIC2017001	Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 1	BA	R$ 500.000,00	R$ 501.000,00	R$ 400.000,00	80	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/07/2024	Em Andamento
COCIC2017002	Pavimentação de Vias no Município de Tremedal - 2	BA	R$ 1.000.000,00	R$ 1.001.500,00	R$ 500.000,00	50	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	24/02/2024	Em Andamento
COCIC2017003	Recuperação e Encascalhamento de Estradas Vicinais do Município de Gentio do Ouro	BA	R$ 500.000,00	R$ 500.800,00	R$ 500.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Atrasado	28/02/2021	Atrasado
COCIC2017004	Aquisição de equipamentos para o Município de Gentio do Ouro	BA	R$ 385.000,00	R$ 641.000,00	R$ 385.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	20/02/2024	Em Andamento
COCIC2017005	Pavimentação das Vias no Município de Gentio do Ouro	BA	R$ 500.000,00	R$ 500.800,00	R$ 500.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Atrasado	23/12/2020	Atrasado
COCIC2017008	Ampliação e reforma do Mercado da sede do município de Wanderley	BA	R$ 1.000.000,00	R$ 1.274.003,00	R$ 1.000.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Atrasado	21/01/2022	Atrasado
COCIC2017009	Implantação de sistema de abastecimento de água em diversas localidades da zona rural do município de Oliveira dos Brejinhos-BA.	BA	R$ 1.989.238,00	R$ 1.991.738,00	R$ 1.989.238,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	30/08/2022	Em Andamento
COCIC2017010	Pavimentação em TSS de estrada vicinal do Município de Brumado	BA	R$ 1.500.000,00	R$ 1.548.119,00	R$ 1.500.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Atrasado	01/03/2022	Atrasado
COCIC2017012	Pavimentação nas ruas da sede do município de Matina.	BA	R$ 500.000,00	R$ 520.000,00	R$ 400.000,00	80	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/05/2024	Em Andamento
COCIC2017013	Pavimentação e drenagem de ruas - Município de MANSIDÃO	BA	R$ 700.855,00	R$ 705.855,00	R$ 490.599,00	85	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	29/08/2023	Em Andamento
COCIC2017018	Pavimentação de estrada vicinal - Município de Canguaretama	RN	R$ 250.000,00	R$ 274.181,00	R$ 44.382,00	18	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/11/2024	Em Andamento
COCIC2017019	Modernização e Adequação de Mercado Público - Município de João Câmara	RN	R$ 250.000,00	R$ 274.342,00	R$ 50.000,00	20	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	27/08/2023	Em Andamento
COCIC2017020	Pavimentação de ruas - Município de Extremoz	RN	R$ 264.608,00	R$ 266.608,00	R$ 52.922,00	20	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/04/2024	Em Andamento
COCIC2017021	Recuperação de Estradas Vicinais - Município de Mutuípe	BA	R$ 390.020,00	R$ 433.931,00	R$ 390.020,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	28/05/2023	Em Andamento
COCIC2017024	Pavimentação de estradas vicinais - Município de Coronel João Pessoa	RN	R$ 250.493,00	R$ 260.930,00	R$ 210.000,00	84	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	21/09/2022	Em Andamento
COCIC2017025	CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS ACESSOS A PRAIA DE REDONDA MUNICIPIO DE ICAPUI	CE	R$ 1.000.000,00	R$ 1.025.964,00	R$ 700.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	24/02/2023	Em Andamento
COCIC2018001	Pavimentação - Municipio de Uruçuca	BA	R$ 1.000.000,00	R$ 1.002.500,00	R$ 1.000.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/2024	Em Andamento
COCIC2018002	Pavimentação com paralelepípedo e guias de sarjeta na zona urbana do município de pé de serra, Bahia.	BA	R$ 250.000,00	R$ 252.500,00	R$ 200.000,00	80	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/07/2023	Em Andamento
COCIC2018003	Pavimentação em paralelepípedo de vias de povoado localizado na zona rural do município de Paulo Afonso	BA	R$ 586.135,00	R$ 633.026,00	R$ 586.135,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	24/02/2023	Em Andamento
COCIC2018004	Pavimentação com paralelepípedos em ruas de povoados e comunidades no município de Lucrécia- RN.	RN	R$ 250.000,00	R$ 251.000,00	R$ 175.000,00	70	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Concluído	Concluído	19/05/2022	Concluído
COCIC2018005	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Jardim de Piranhas/RN.	RN	R$ 250.000,00	R$ 251.628,00	R$ 50.000,00	20	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/08/2023	Em Andamento
COCIC2018006	Pavimentação de vias públicas no município de Filadélfia	RN	R$ 1.000.000,00	R$ 1.025.000,00	R$ 1.000.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	24/08/2023	Em Andamento
COCIC2018007	Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD da estrada na Zona Rural no Município de Brumado / BA.	BA	R$ 1.500.000,00	R$ 1.673.298,00	R$ 1.500.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	24/01/2023	Em Andamento
COCIC2018008	Pavimentação diversas vias do município de Xique-Xique/BA	BA	R$ 250.000,00	R$ 252.500,00	R$ 50.000,00	20	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	19/10/2024	Em Andamento
COCIC2018009	Pavimentação Asfáltica nos bairros Alegria e Jurema no município de Vitória da Conquista	BA	R$ 1.755.787,00	R$ 1.773.345,00	R$ 1.298.524,73	73,96	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	22/09/2023	Em Andamento
COCIC2018010	Aquisição de Trator Agricola e Implementos. - Cairu/BA	BA	R$ 150.000,00	R$ 167.500,00	R$ -	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/2024	Em Andamento
COCIC2018011	Recuperação e encascalhamento de estrada vicinal na zona rural do município de Tanhaçu - BA, para apoio a atividade produtiva.	BA	R$ 400.000,00	R$ 416.000,00	R$ 400.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	24/08/2022	Em Andamento
COCIC2018019	Pavimentação em paralelepípedo e em concreto armado com drenagem de ruas, em área urbana do município de São Domingos – BA	BA	R$ 500.000,00	R$ 501.000,00	R$ 500.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	24/08/2023	Em Andamento
COCIC2018012	Objeto: pavimentação asfáltica de ruas na sede do município de Simões Filho-BA.	BA	R$ 300.000,00	R$ 451.240,00	R$ -	0	Concluído		Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			19/02/2023	Cancelado
COCIC2018013	Drenagem e Pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do Município de Serra Negra do Norte/RN	RN	R$ 250.000,00	R$ 251.000,00	R$ 250.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	21/02/2023	Em Andamento
COCIC2018014	Construção de Praça com quiosque no bairro da Pera no Município de Senhor do Bonfim.	BA	R$ 700.000,00	R$ 703.500,00	R$ 490.000,00	70	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/2024	Em Andamento
COCIC2018015	Pavimentação de Ruas e Vias no município de Sátiro Dias-BA	BA	R$ 1.000.000,00	R$ 1.001.100,00	R$ 995.819,00	99,58	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/2024	Em Andamento
COCIC2018018	Pavimentação em paralelepípedo de ruas na zona urbana do município de São Fernando/RN.	RN	R$ 250.000,00	R$ 250.744,00	R$ 49.629,00	19	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/2024	Em Andamento
COCIC2018020	Reforma do Mercado Público na área urbana do município de Santo Antônio/RN.	RN	R$ 250.000,00	R$ 255.000,00	R$ 213.520,47	85	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/2024	Em Andamento
COCIC2018021	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	RN	R$ 250.000,00	R$ 259.298,00	R$ 200.000,00	80	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	04/11/2023	Em Andamento
COCIC2018022	Drenagem e pavimentação de vias públicas, em paralelepípedo pelo método convencional, na zona urbana do município de Santa Cruz/RN	RN	R$ 250.000,00	R$ 258.524,00	R$ -	0	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	08/08/2024	Em Andamento

Nome	Descrição Projeto	UF	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin.	Iniciação	1ª Liberação	2ª Liberação	3ª Liberação	4ª Liberação	Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
COCIC2018023	Aquisição de Retroescavadeiras e Tratores com Implementos Agrícolas para beneficiar diversos Municípios do Estado da Bahia. Salvador/BA	BA	R$ 802.937,00	R$ 811.047,00	R$ -	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/2024	Em Andamento
COCIC2018024	Pavimentação de ruas do município de Rafael Jambeiro/BA	BA	R$ 300.000,00	R$ 303.000,00	R$ 300.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	24/08/2023	Em Andamento
COCIC2018025	Aquisição de Trator Agrícola, Grade Aradora e Roçadeira para o Município de Porto do Mangue/RN.	RN	R$ 150.000,00	R$ 151.000,00	R$ 150.000,00	100	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	24/07/2023	Em Andamento
COCIC2018026	Pavimentação a paralelepípedo com drenagem em diversas ruas na sede do município, Pintadas - BA.	BA	R$ 250.000,00	R$ 253.000,00	R$ 175.000,00	70	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/2023	Em Andamento
COCIC2018027	Pavimentação de vias públicas no município de Pindobaçu.	BA	R$ 500.000,00	R$ 512.500,00	R$ 500.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/2024	Em Andamento
COCIC2018028	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no município de Ouro Branco/RN.	RN	R$ 250.000,00	R$ 251.031,00	R$ 115.000,00	46	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	16/05/2024	Em Andamento
COCIC2018029	Pavimentação em paralelepipedos de ruas no distrito de Duas Barras, município de Morro do Chapéu-BA	BA	R$ 500.000,00	R$ 505.000,00	R$ 500.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/2022	Em Andamento
COCIC2018030	Pavimentação em Paralelepípedos em Ruas da Sede do Município de Monte Santo/BA.	BA	R$ 500.000,00	R$ 505.000,00	R$ -	0	Concluído		Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			24/02/2022	Cancelado
COCIC2018031	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de vias no Distrito de Maracajaú em Maxaranguape/RN.	RN	R$ 250.000,00	R$ 253.241,00	R$ 183.485,84	73	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	21/11/2023	Em Andamento
COCIC2018032	Pavimentação da via de acesso ao Castelo Garcia d'Ávila, Requalificação da Alameda da Lua e construção de Ciclovia em Praia do Forte, Construção do Mercado Municipal de Mata de São João/BA	BA	R$ 3.000.000,00	R$ 3.425.197,00	R$ 3.000.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	23/08/2023	Em Andamento
COCIC2018034	Reforma, Ampliação e Modernização do Mercado Municipal de Maragogipe/BA	BA	R$ 600.000,00	R$ 602.000,00	R$ 600.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	24/02/2023	Em Andamento
COCIC2018035	Pavimentação de ruas na Comunidade rural Lagedo Grande no município de Jundiá/RN.	RN	R$ 260.000,00	R$ 267.527,00	R$ 159.708,52	61,43	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	10/02/2023	Em Andamento
COCIC2018036	Recuperação da avenida principal, com pavimentação asfáltica, na sede do Município de Jacaraci/BA	BA	R$ 1.000.000,00	R$ 1.005.000,00	R$ 1.000.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	19/02/2023	Em Andamento
COCIC2018037	Pavimentação em Paralelos na Zona Urbana de Itapetinga-BA	BA	R$ 2.000.000,00	R$ 2.004.800,00	R$ 2.000.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	24/02/2024	Em Andamento
COCIC2018038	Aquisição de um trator de roda, agrícola, destinado a dar suporte às atividades de manejo agropecuário das culturas locais, visando o aumento da produção e produtividade da agricultura - especialmente a agricultura familiar - do município de Itajuípe.	BA	R$ 100.000,00	R$ 101.000,00	R$ -	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/02/2024	Em Andamento
COCIC2018039	Pavimentação e drenagem superficial de via na Sede do Município de Itajá/RN.	RN	R$ 250.000,00	R$ 256.187,00	R$ 250.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	Atrasado	24/02/2022	Atrasado
COCIC2018040	Pavimentação em paralelepípedo na sede e distrito de Bento Simões – área urbana – município de Irará/BA	BA	R$ 500.000,00	R$ 505.000,00	R$ 500.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/11/2023	Em Andamento
COCIC2018041	Pavimentação em paralelo das diversas ruas do município de Irará/BA	BA	R$ 500.000,00	R$ 505.000,00	R$ 350.000,00	70	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/11/2023	Em Andamento
COCIC2018042	Pavimentação em paralelepípedo e drenagem de ruas, em área urbana do município de Ibirataia - BA	BA	R$ 1.438.556,00	R$ 1.440.477,00	R$ 1.187.711,00	83	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/2024	Em Andamento
COCIC2018043	Pavimentação com paralelepípedo em ruas das comunidades de: São Bento, Brejo, Riacho do Cedro e Ibitunane, município de Gentio do Ouro/BA	BA	R$ 500.000,00	R$ 501.000,00	R$ 500.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/10/2023	Em Andamento
COCIC2018044	Construção de sistema de abastecimento de água no município de Feira da Mata	BA	R$ 1.050.000,00	R$ 1.060.500,00	R$ -	0	Concluído		Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			26/10/2022	Cancelado
COCIC2018045	Pavimentação de Rua no Município de Espírito Santo/RN.	RN	R$ 500.000,00	R$ 500.980,00	R$ 500.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	03/09/2023	Em Andamento
COCIC2018046	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Currais Novos/RN.	RN	R$ 250.000,00	R$ 252.637,00	R$ 50.000,00	20	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	17/10/2023	Em Andamento
COCIC2018047	Pavimentação em paralelepípedo de ruas no Município de Cordeiros-BA.	BA	R$ 300.000,00	R$ 300.400,00	R$ 300.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar		23/08/2023	Em Andamento
COCIC2018048	Pavimentação de Ruas em Paralelepípedo no Distrito de Santana do Sobrado, localizada no Município de Casa Nova.	BA	R$ 1.000.000,00	R$ 1.005.000,00	R$ 1.000.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar		23/06/2024	Em Andamento
COCIC2018049	Pavimentação e Drenagem Superficial de Ruas no município de Carnaubais/RN	RN	R$ 300.000,00	R$ 301.000,00	R$ 150.000,00	50	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	02/08/2024	Em Andamento
COCIC2018050	Aquisição de caminhão trucado com tração 6x2 - equipado com tanque reservatório (pipa) para o município de Caraúbas/RN.	RN	R$ 250.000,00	R$ 332.853,00	R$ -	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/06/2023	Cancelado
COCIC2018052	Construção de um polo comercial de artesanato no município de Cachoeirinha - PE	PE	R$ 800.000,00	R$ 832.000,00	R$ -	0	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/2024	Em Andamento
COCIC2018053	Pavimentação Asfáltica do Trecho ABA/Barrocão – LOTE 02,zona rural do município de Barreiras. BA	BA	R$ 1.000.000,00	R$ 1.100.000,00	R$ 1.000.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	24/02/2023	Em Andamento
COCIC2018055	Pavimentação em Paralelipípedo de vias públicas no distrito de Barra Nova para apoio ao desenvolvimento sustentável do município de Barra do Choça – Bahia.	BA	R$ 500.000,00	R$ 501.000,00	R$ 400.000,00	80	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/08/2025	Em Andamento
COCIC2018056	Construção de Mercado no Município de Baía da Traição - PB	PB	R$ 350.000,00	R$ 350.500,00	R$ 286.910,00	81,97	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/11/2024	Em Andamento
COCIC2018057	Pavimentação em paralelepípedos das ruas G, rua I, Travessa Estrada do Clube, Rua Vasco da Gama e Travessa Antonio Bispo de Almeida, Travessa Estrada do Clube, localizadas na sede do município de Município de Antonio Gonçalves - BA	BA	R$ 500.000,00	R$ 500.501,00	R$ 100.000,00	0	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/2024	Em Andamento
COCIC2018058	Aquisição de máquina retroescavadeira para atender as necessidades da zona rural de Agrestina/PE - Associção de Desenv. Comunitário de Barra do Chata	BA	R$ 389.158,00	R$ 389.158,00	R$ -	20	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14/02/2024	Em Andamento
COCIC2019001	Pavimentação e Drenagem Superficial em Diversas ruas no município de Sítio Novo/RN	RN	R$ 250.000,00	R$ 255.996,00	R$ 162.500,00	65	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14/01/2024	Em Andamento
COCIC2019002	Construção de Mercado Público do município de Sitio Novo/RN	RN	R$ 300.000,00	R$ 312.836,00	R$ -	0	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14/01/2024	Em Andamento
COCIC2019003	Pavimentação em Paralelepípedo na zona urbana de GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO	RN	R$ 250.000,00	R$ 254.837,00	R$ -	0	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	20/12/2024	Em Andamento
COCIC2019004	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de FELIPE GUERRA	RN	R$ 250.000,00	R$ 257.705,00	R$ 250.000,00	100	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/12/2024	Em Andamento
		RN					Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento

Nome	Descrição Projeto	UF	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin.	Iniciação	1ª Liberação	2ª Liberação	3ª Liberação	4ª Liberação	Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
COCIC2019005	Ampliação do sistema de Abastecimento de água do Município de Catú.	BA	R$ 250.000,00	R$ 260.000,00	R$ -	0	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/01/2024	Em Andamento
COCIC2019006	Pavimentação Asfáltica de Vias Públicas de PARELHAS	RN	R$ 850.000,00	R$ 855.000,00	R$ -	0	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	09/01/2024	Em Andamento
COCIC2019007	Pavimentação em Paralelepípedo de Vias Publicas com Construção e Meio Fio no Município de Mulungu do Morro, Estado da Bahia	BA	R$ 320.000,00	R$ 393.325,00	R$ 320.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	23/05/2023	Em Andamento
COCIC2019008	Pavimentação em paralelepípedo pelo método Bripar de diversas ruas no bairro Guajiru, município de São Gonçalo do Amarante – RN	RN	R$ 291.831,01	R$ 292.431,01	R$ 291.831,01	100	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	20/12/2023	Em Andamento
COCIC2019009	Pavimentação asfáltica em TSD de ruas no bairro Paratí no município de Assú/RN	RN	R$ 900.000,00	R$ 1.064.313,00	R$ 900.000,00	100	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	02/01/2024	Em Andamento
COCIC2019010	Pavimentação e drenagem superficial de ruas no Município de Umarizal-RN.	RN	R$ 300.000,00	R$ 1.064.313,00	R$ -	0	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/05/2024	Em Andamento
COCIC2019011	Pavimentação em paralelepípedos em vias do Bairro Novo Coqueiral no Município de Toritama/PE.	PE	R$ 1.700.000,00	R$ 1.707.445,00	R$ 340.000,00	20	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/02/2025	Em Andamento
COCIC2019012	Pavimentação em paralelepípedos em vias urbanas no Município de Sirinhaém/PE.	PE	R$ 500.000,00	R$ 607.329,00	R$ -	0	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/2024	Em Andamento
COCIC2019013	Reforma do Mercado Público do município de São Vicente/RN.	RN	R$ 300.000,00	R$ 301.000,00	R$ -	0	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	06/12/2023	Em Andamento
COCIC2019014	Pavimentação em Paralelepípedo com Drenagem Superficial de Ruas na Zona Urbana do Município de Santana do Matos/RN.	RN	R$ 250.000,00	R$ 254.864,00	R$ 50.000,00	20	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	09/06/2024	Em Andamento
COCIC2019015	Pavimentação em paralelepípedo em via pública no povoado de João Vaz, município de Rio de Contas/BA.	BA	R$ 260.000,00	R$ 265.000,00	R$ 220.086,98	84,65	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	22/07/2023	Em Andamento
COCIC2019017	Pavimentação em paralelepípedo de ruas da Vila do Vitorino e Vila de Trapiá no município de Riacho das Almas	PE	R$ 700.000,00	R$ 703.867,00	R$ 280.000,00	40	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/02/2025	Em Andamento
COCIC2019018	Drenagem superficial e pavimentação em paralelepípedos de diversas ruas nos bairros Boqueirão, Cruz do Monte e Centro no município de Parelhas.	RN	R$ 300.000,00	R$ 305.115,00	R$ 60.000,00	20	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	09/01/2024	Em Andamento
COCIC2019019	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO CAÇAMBA E UMA RASPADEIRA PARA O MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/RN.	RN	R$ 300.000,00	R$ 306.000,00	R$ 300.000,00	100	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	A Iniciar	10/12/2023	Em Andamento
COCIC2019020	Pavimentação em CBUQ-Concreto Betuminoso Usinado a Quente e Paralelo de Vias Públicas na zona urbanas no Município de Mata de São João	BA	R$ 2.410.387,00	R$ 3.237.722,00	R$ 2.086.232,00	87	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	26/01/2024	Em Andamento
COCIC2019021	Pavimentação Em piso intertravado de vias publicas da zona urbana do município de Mata de São João.	BA	R$ 2.000.000,00	R$ 2.237.065,00	R$ 2.000.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	26/01/2024	Em Andamento
COCIC2019022	PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DE POVOADOS E COMUNIDADES NO MUNICÍPIO DE LUCRÉCIA- RN.	RN	R$ 250.000,00	R$ 251.000,00	R$ 150.000,00	20	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	06/05/2024	Em Andamento
COCIC2019023	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO EM RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E EM VERMELHOS EM LAGOA GRANDE/PE	PE	R$ 1.700.000,00	R$ 1.723.118,00	R$ 340.000,00	20	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/2024	Em Andamento
COCIC2019024	Pavimentação em paralelepípedos, pelo método convencional, de ruas na Comunidade rural Arisco dos Pires, no município de Jundiá/RN.	RN	R$ 250.000,00	R$ 251.757,00	R$ 172.191,48	69	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14/01/2024	Em Andamento
COCIC2019025	Pavimentação em paralelepípedo granítico de ruas no Município de Itapissuma/PE, na área Urbana do Município Itapissuma/PE	PE	R$ 779.525,00	R$ 838.599,00	R$ 779.525,47	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/2024	Em Andamento
COCIC2019026	Pavimentação em paralelepípedos em vias na area urbana do Município de Itambé/PE.	PE	R$ 886.246,29	R$ 887.134,29	R$ 736.111,49	83,06	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/2024	Em Andamento
COCIC2019027	Construção do Mercado Público Municipal - Ipanguaçu/RN.	RN	R$ 250.000,00	R$ 259.999,00	R$ -	0	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	18/12/2023	Em Andamento
COCIC2019028	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA DESTINA AO MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA.	PE	R$ 1.000.000,00	R$ 1.027.826,00	R$ 1.000.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Concluído	Concluído	24/02/2024	Concluído
COCIC2019029	Construção de Pavimentação em Paralelepípedos em Vias Urbanas e Rurais do Município de Cupira/PE.	PE	R$ 2.000.000,00	R$ 2.216.520,00	R$ 2.000.000,00	100	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	31/05/2023	Em Andamento
COCIC2019030	Pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas da zona Rural e Urbana do Município de Cumaru/PE.	PE	R$ 1.000.000,00	R$ 1.005.000,00	R$ 700.000,00	70	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/2024	Em Andamento
COCIC2019031	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAÉM/BA	BA	R$ 300.000,00	R$ 310.000,00	R$ 60.000,00	20	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	28/01/2024	Em Andamento
COCIC2019032	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BUÍQUE/PE	PE	R$ 600.000,00	R$ 602.868,00	R$ 240.000,00	40	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/02/2024	Em Andamento
COCIC2019033	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Municipio de Arcoverde/PE.	PE	R$ 700.000,00	R$ 890.978,48	R$ -	0	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/02/2024	Em Andamento
COCIC2019034	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO-TANQUE PARA APOIO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE APODI/RN	RN	R$ 300.000,00	R$ 310.000,00	R$ -	0	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/02/2024	Em Andamento
COCIC2019035	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na Zona Urbana do Município da Aliança/PE	PE	R$ 1.000.000,00	R$ 1.010.000,00	R$ 846.588,72	85	Concluído	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/2024	Em Andamento
COCIC2019036	Obra de Pavimentação Asfáltica em (CBUQ),na zona urbana, da Sede do Município de Alagoinhas-Ba..	PE	R$ 350.000,00	R$ 457.045,00	R$ 70.000,00	20	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/02/2024	Em Andamento
COCIC2019037	Pavimentação em Paralelepípedos, na zona urbana, no município de Jurema PE.	BA	R$ 800.000,00	R$ 801.000,00	R$ -	0	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/02/2024	Em Andamento
COCIC2020001	Requalificação da Cobertura do Mercado Municipal de Uruçuca/Ba	PE	R$ 500.000,00	R$ 500.500,50	R$ -	0	Concluído		Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica			16/09/2024	Cancelado
COCIC2020002	CONSTRUÇÃO DE CERCAMENTO DO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO COMERCIAL, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE-RN	BA	R$ 194.555,54	R$ 195.055,54	R$ 194.555,54	100	Concluído	Em Andamento	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	15/09/2024	Em Andamento
COCIC2020003	Aquisição de 1 Trator com Implementos Agrícolas em Campo Redondo/RN	RN	R$ 150.000,00	R$ 152.000,00	R$ -	0	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/09/2023	Em Andamento
COCIC2020004	Construção de Cais e Pavimentação com Drenagem no Município de Belmonte/BA. (Cais Moça Bonita)	RN	R$ 450.227,00	R$ 460.000,00	R$ -	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	25/10/2023	Em Andamento
COCIC2020005	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Afonso Bezerra – RN.	RN	R$ 150.000,00	R$ 154.000,00	R$ 150.000,00	100	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/10/2023	Em Andamento
		RN					Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento

Nome	Descrição Projeto	UF	Valor SUDENE	Valor Total	Valor Liberado	% Orç./ Fin.	Iniciação	1ª Liberação	2ª Liberação	3ª Liberação	4ª Liberação	Visita	Emissão do Laudo	Previsão de Conclusão	Status
COCIC2020006	Reforma e Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto e Ampliação das Redes Coletoras no Bairro Santa Terezinha, Distrito do Guaibim no Município de Valença - BA.	BA	R$ 1.000.000,00	R$ 1.010.000,00	R$ -	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/02/2024	Em Andamento
COCIC2020007	Pavimentação em Paralelepípedo de Rua no Sítio Serra das Almas no município de Agua Nova/RN.	BA	R$ 250.000,00	R$ 251.669,00	R$ 250.000,00	100	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	16/02/2024	Em Andamento
COCIC2020008	Construção de Galpão Industrial em concreto armado no município de Ceará Mirim/RN.	RN	R$ 250.000,00	R$ 266.403,00	R$ -	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	10/11/2024	Em Andamento
COCIC2020009	Aquisição de um Trator agrícola e de uma Carreta Tanque, para este município de Caicó – RN.	RN	R$ 150.000,00	R$ 185.459,00	R$ -	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	24/07/2023	Em Andamento
COCIC2020010	Ampliação e adequação da passagem molhada entre os bairros Paraíba e Soledade no Município de Caicó/RN.	RN	R$ 250.000,00	R$ 252.000,00	R$ 250.000,00	100	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	31/03/2024	Em Andamento
COCIC2020011	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM PARALELEPÍPEDO, EM DIVERSOS POVOADOS NO MUNICÍPIO DE CORONEL JOÃO PESSOA - RN.	RN	R$ 300.000,00	R$ 350.168,00	R$ 210.000,00	70	Concluído	Concluído	A Iniciar	A Iniciar	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/01/2025	Em Andamento
COCIC2020012	Adequação de Estradas Vicinais no Município de Valença - BA. -CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MOSAICO DAS APAS DO BAIXO SUL	BA	R$ 1.000.000,00	R$ 1.005.000,00	R$ -	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	15/02/2025	Em Andamento
COCIC2021001	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, COM EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMARIO (PIÇARRAMENTO), LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TABULEIRO DO NORTE - CE.	CE	R$ 500.000,00	R$ 501.040,45	R$ -	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	15/11/2025	Em Andamento
COCIC2021002	Pavimentação em pedra tosca com iluminação na zona rural do Município de Piquet Carneiro – Ce.	CE	R$ 500.000,00	R$ 502.942,00	R$ -	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/11/2024	Em Andamento
COCIC2021003	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE IBIAPINA-CE	CE	R$ 500.000,00	R$ 557.054,00	R$ -	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	16/05/2024	Em Andamento
COCIC2021004	CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NO MUNICIPIO DE IBARETAMA-CE.	CE	R$ 500.000,00	R$ 545.826,00	R$ -	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	20/11/2024	Em Andamento
COCIC2021005	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL NA LOCALIDADE DE FLORESTA E MURIÇOCA DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS - CE	CE	R$ 500.000,00	R$ 534.344,00	R$ -	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	21/11/2025	Em Andamento
COCIC2021006	AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA O MUNICIPIO DE SERRITA/PE.	PE	R$ 307.230,00	R$ 371.976,00	R$ -	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	11/02/2025	Em Andamento
COCIC2021007	aquisição de uma retroescavadeira para a Associação Comunitária do Sitio VArzinha dos Grossos	PE	R$ 389.158,00	R$ 389.158,00	R$ 389.158,00	100	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/05/2026	Em Andamento
COCIC2021008	Pavimentação em pedra tosca no município de Paracuru-CE	CE	R$ 502.465,00	R$ 500.000,00	R$ -	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	22/12/2024	Em Andamento
COCIC2021009	Aquisição de Equipamento Agrícola em Lago do Itaenga/PE	PE	R$ 184.338,00	R$ 184.338,00	R$ 184.338,00	100	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	13/02/2024	Em Andamento
COCIC2021010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS em Ipubi/PE	PE	R$ 2.984.100,00	R$ 3.150.000,00	R$ 2.984.100,00	100	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	15/02/2024	Em Andamento
COCIC2021011	Aquisição de maquina retroescavadeira para atender as necessidades da ZONA RURAL ATRAVES da ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO FLORESTAN FERNANDES em Goiana/PE	PE	R$ 389.158,00	R$ 389.158,00	R$ 389.158,00	100	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	19/02/2025	Em Andamento
COCIC2021012	Pavimentação asfáltica em vias do município de Crateús-CE.	CE	R$ 1.021.208,00	R$ 1.000.000,00	R$ -	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	14/12/2024	Em Andamento
COCIC2021013	O Objetivo desse termo de parceria é aquisição de Trator agrícola e com implementos agrícolas para Associação das Famílias do Quilombo de Tanquinhos Maria de Nazaré da Silva em Águas Belas/PE	PE	R$ 368.676,00	R$ 368.676,00	R$ 368.676,00	100	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	13/02/2025	Em Andamento
COCIC2021014	Aquisição de máquina retroescavadeira para atender as necessidades da zona rural de Agrestina/PE - Associção de Desenv. Comunitário de Barra do Chata	PE	R$ 425.000,00	R$ 425.000,00	R$ 389.158,00	91,57	Concluído	Em Andamento	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	12/02/2025	Em Andamento
COCIC2021015	Recuperação de estradas vicinais, com execução de revestimento primário (empiçarramento), localizadas na Zona Rural do município de Abaiara/CE	CE	R$ 1.005.808,01	R$ 1.000.000,00	R$ -	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	09/12/2025	Em Andamento
COCIC2022001	Aquisição de caminhão para suporte ao escoamento da produção local e a pequenas obras de auxílio à atividades rurais, no município de Santa Cruz da Baixa Verde-PE	PE	R$ 307.230,00	R$ 390.000,00	R$ -	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	23/02/2025	Em Andamento
COCIC2022002	Aquisição de dois veículos automotores tipo pick-up em Paranatama/PE	PE	R$ 368.676,00	R$ 372.376,00	R$ -	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	29/01/2024	Em Andamento
COCIC2022003	Pavimentação em paralelepípedos de ruas na zona urbana e rural do Municipio de João Alfredo/PE.	PE	R$ 530.750,00	R$ 606.234,77	R$ -	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	26/02/2025	Em Andamento
COCIC2022004	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE IBIRAJUBA PE	PE	R$ 1.078.135,24	R$ 1.116.533,34	R$ -	0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	01/08/2025	Em Andamento
COCIC2022005	Pavimentação em pedras de paralelepípedos nas ruas da zona urbana do município de Ferreiros/PE.	PE	R$ 434.250,00	R$ 449.276,71		0	Concluído	A Iniciar	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	13/02/2025	Em Andamento
COCIC2022006	Aquisição de EQUIPAMENTOS AGRICULAS para atender as necessidades da zona rural de Bonito/PE - ASSOC. DOS PEQ PRODUTORES RURAIS DO ST AGUA VERMELHA.	PE	R$ 368.676,00	R$ 368.676,00	R$ 368.676,00	100	Concluído	Concluído	Não se Aplica	Não se Aplica	Não se Aplica	A Iniciar	A Iniciar	18/02/2025	Em Andamento
			R$ 89.642.914,09	**R$ 95.367.045,09**	**R$ 57.362.032,25**	**56,16819444**								**De 2020-12-23 até 2026-05-2**	

CGCP - Projetos

CGCP 2022003 OnuHabitat

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Etapa 0 - Plano de Trabalho	Plano de Trabalho	OnuHabitat/CGCP	Concluído	1-jan-21	30-set-21		22-set-21	22-out-21		100		
Produto 1.1. - Estratégia de Comunicação e Advocacy	Estratégia de Comunicação e Advocacy	OnuHabitat/CGCP	Concluído	1-out-21	31-dez-21		1-out-21	31-dez-21		100		
Produto 1.2. - Oficina de Intercâmbio	Oficina de Intercâmbio	OnuHabitat/CGCP	Concluído	1-jan-22	28-fev-22		1-jan-22	22-fev-22		100		
Produto 2.1 - Avaliação das necessidades de capacitação	Avaliação e priorização das necessidades de capacitação do conjunto de municípios da rede	OnuHabitat/CGCP	Concluído	1-jan-22	28-fev-22		1-jan-22	29-abr-22		100	Foram solicitados em 21/03/2022 ajustes nos Produtos 1.2 e 1.1 o que atrasou a execução deste Produto e, por consequência, a execução do 2.2 também sofreu atraso.	Aditivo de contrato foi encaminhado pelo ONU Habitat à SUDENE e recebeu parecer técnico solicitando ajustes no cronograma da proposta.
Produto 2.2 - Módulos de treinamento	Módulos de treinamento para o desenvolvimento de capacidades	OnuHabitat/CGCP	Em Andamento	1-mar-22	30-jun-22		1-mar-22			70		
Produto 3.1 - Realização do Desafio de Inovação	Realização do Desafio de Inovação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis e Governos Digitais, relacionados aos ODS	OnuHabitat/CGCP	Em Andamento	1-mai-22	31-ago-22		1-mai-22			30		
Produto 3.2 - Evento virtual/Assinatura de carta de adesão	Evento virtual público de apresentação dos resultados dos produtos construídos de maneira compartilhada e assinatura de Carta de adesão à rede	OnuHabitat/CGCP	A Iniciar	1-set-22	30-set-22					0		
Resumo Projeto			Em Andamento			R$309.985,00			R$52.435,00			
						R$309.985,00			**R$52.435,00**	**71,42857143**		

CGCP 2022002 - Diretrizes e Prioridades FDNE 2023

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento de dados das aplicações do FDNE do ano anterior	Levantamento de dados das aplicações do FNE do ano anterior	DPLAN/CGCP	A Iniciar	1-set-22	30-set-22	R$0,00						
Incorporação de estudos atualizados	Incorporação de estudos atualizados	DPLAN/CGCP	A Iniciar	1-set-22	30-set-22	R$0,00						
Análise e integração dos dados	Análise e integração dos dados	DPLAN/CGCP	A Iniciar	1-out-22	15-out-22	R$0,00						
Elaboração de Nota Técnica conjunta CGCP/CGDF	Elaboração de Nota Técnica conjunta CGCP/CGDF	DPLAN/CGCP/CGDF	A Iniciar	15-out-22	12-nov-22	R$0,00						
Voto Diretoria Colegiada	Elaboração de Voto Diretoria Colegiada com objeto de aprovação da Nota Técnica que propõe ao Condel as diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FNE.	CGCP e CGFD	A Iniciar	12-nov-22	15-nov-22	R$0,00						
Apreciação pela Diretoria Colegiada	Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada.	DC/SUDENE	A Iniciar	15-nov-22	17-nov-22	R$0,00						
Proposição ao Condel	Elaboração de Proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene sobre a definição das diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FDNE.	CGGI	A Iniciar	17-nov-22	24-nov-22	R$0,00						
Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	CGDF	A Iniciar	24-nov-22	24-nov-22	R$0,00						
Resolução Condel	Elaboração de Resolução do Conselho Deliberativo da Sudene sobre a definição das diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FDNE.	CGGI	A Iniciar	24-nov-22	30-nov-22	R$0,00						
Apreciação e deliberação pelo Condel	Apreciação e deliberação pelo Condel.	CONDEL/SUDENE	A Iniciar	30-nov-22	15-dez-22	R$0,00						
Resumo Projeto			A Iniciar									
						R$0,00			**R$0,00**	**#DIV/0!**		

CGCP 2022001 Diretrizes e Prioridades FNE 2023

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta a atores de referência	Envio de ofício com questionário aos atores a serem consultados acerca dos setores prioritários da agropecuária e indústria e territórios dos APLs de cada Estado e recebimento das respostas.	Superintendente/CGCP	Concluído	1-jun-22	20-jun-22		1-jun-22					
Indicação de setores estratégicos	Indicação de setores intensos em mão de obra, intensos em conhecimento e inovação e outros critérios que a CGEP julgar necessário para subsidiar a indicação de diretrizes e prioridades do FNE 2023 por unidade federativa ou região geográfica intermediária	CGEP	Concluído	1-jun-22	20-jun-22		1-jun-22					
Levantamento de estudos e pesquisas	Consolidação das contribuições que os Estudos, Pesquisas e Avaliações realizados pela CGEP podem oferecer para subsidiar as diretrizes e prioridades do FNE 2023 (avaliação FNE, vocações e potencialidades; inventário de políticas públicas; complexidade econômica; pesquisa covid19).	CGEP	Concluído	1-jun-22	20-jun-22		1-jun-22					
Análise das respostas aos questionários	Análise dos questionários com as contribuições dos atores consultados.	CGCP/CGDF	Em Andamento	21-jun-22	1-jul-22							
Elaboração de Nota Técnica	Elaboração da nota técnica de Diretrizes e Prioridades do FNE 2023.	CGCP/CGDF	A Iniciar	4-jul-22	14-jul-22							
Voto Diretoria Colegiada	Elaboração de Voto Diretoria Colegiada com objeto de aprovação da Nota Técnica que propõe ao Condel as diretrizes e prioridades para aplicação dos recursos do FNE.	CGCP/CGDF	A Iniciar	15-jul-22	16-jul-22							
Apreciação pela Diretoria Colegiada	Apreciação da Nota Técnica com a proposta de Diretrizes e Prioridades do FNE 2023 pela Diretoria Colegiada da SUDENE.	DPLAN/DFIN	A Iniciar	19-jul-22	26-jul-22							
Proposição ao Condel	Envio da resolução da diretoria colegiada encaminhando ao comitê técnico do CONDEL a proposta de Diretrizes e Prioridades FNE 2023	CGGI	A Iniciar	27-jul-22	28-jul-22							
Apreciação pelo comitê técnico Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	CGDF	A Iniciar	1-ago-22	4-ago-22							
Apreciação e deliberação pelo Condel	Apreciação da proposta de Diretrizes e Prioridades FNE 2023 pelo CONDEL	CONDEL/SUDENE	A Iniciar	10-ago-22	11-ago-22							
Resumo Projeto			Em Andamento								Status do Projeto	
						R$0,00			**R$0,00**	**#DIV/0!**		

CGCP 2021006 Estudo Bacias - RHA

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Processo de Início de Projeto	Recebimento de demanda, elaboração e aprovação do TAP, Elaboraçaõ de notas técnicas	DPLAN/CGCP	Concluído	8-mai-20	1-set-20		8-mai-20	1-set-20		100		
Elaboração do Termo de Referência	Elaboração dos documentos de requisição de compras (Termo de Referência, Memória de Cálculo, Lista de Fornecedores, Cronograma) e Validação dos Gestores de Projeto	CGCP/PNUD	Concluído	2-set-20	28-set-20		2-set-20	28-set-20		100		

Abertura de Edital	Abertura do edital, recebimento de propostas, audiências prévias	JOF/PNUD/CGCP	Concluído	6-out-20	9-nov-20		6-out-20	4-dez-20		100		
Seleção das propostas	Definição de equipe, seleção das propostas em 2 fases (técnica e financeira). Validação da JOF/PNUD da empresa vencedora do certame	Comissão de Avaliação/JOF	Concluído	4-dez-20	5-mar-21		4-dez-20	5-mar-21		100		
Assinatura do Contrato	Assinatura do Contrato	PNUD/JOF/Consórcio RHA	Concluído	15-abr-21	15-abr-21		15-abr-21	15-abr-21		100		
Reuniões de acompanhamento técnico - Quinzenal	Reuniões de apresentação das equipes e estabalecimento de acordos sobre a dinâmica do acompanhamento, reuniões de ajuste e validação de conteúdo e cronograma.	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Concluído	15-abr-21	10-abr-22		15-abr-21			100		
Produto 1 - Detalhamento Metodológico	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Consórcio RHA-VERTRAG	Concluído	15-abr-21	5-mai-21	R$22.345,23	15-abr-21	5-mai-21	R$22.345,23	100		
Produto 2 - Documento Preliminar de Estudo de Complexidade Econômica	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Consórcio RHA-VERTRAG	Concluído	5-jun-21	18-ago-21	R$178.761,83	5-jun-21	29-set-21	R$178.761,83	100		
Produto 3 - Documento Final de Estudo de Complexidade Econômica	Entrega do Produto, Elaboração de Pareceres	Consórcio RHA-VERTRAG	Concluído	5-jul-21	17-set-21	R$245.797,51	5-jul-21	13-dez-21	R$245.797,51	100		
Produto 4 - Análise Integrada das Políticas Públicas da Bacia São Francisco e PISF	Entrega do Produto	Consórcio RHA-VERTRAG	Em Andamento	13-dez-21	4-jul-22	R$44.690,46	13-dez-21			70	O Produto 4 consiste de 4 entregas parciais, sendo que duas delas foram realizadas e as duas últimas serão efetuadas em 04/07..	Será formalizada solicitação de aditivo pelo Consórcio até o dia 10/06 em que constará repactuação das datas de entrega.
Revisão do Produto e elaboração de Parecer de Aprovação do Produto 4	Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Em Andamento	20-mai-22	22-jul-22		6-jun-22			70		
Produto 5 - Análise Integrada das Políticas Públicas da Bacia do Parnaíba	Entrega do Produto	Consórcio RHA-VERTRAG	Concluído	13-dez-21	20-mai-22	R$44.690,46	13-dez-21	15-jun-22		70	O Produto 5 consiste de 3 entregas parciais, sendo que duas delas foram realizadas e a última será efetuadas em 13/06.	Será formalizada solicitação de aditivo pelo Consórcio até o dia 10/06 em que constará repactuação das datas de entrega.
Revisão do Produto e elaboração de Parecer de Aprovação do Produto 5	Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	Em Andamento	13-mai-22	11-jul-22		2-jun-22			80	Em análise. Previsão de conclusão: 04/07 (10 dias úteis após a entrega do Produto)	
Produto 6 - Plano de Ação Estratégico para a Bacia do São Francisco e PISF	Entrega do Produto	Consórcio RHA-VERTRAG	Em Andamento	3-jun-22	15-ago-22	R$178.761,83	3-jun-22			70		
Revisão do Produto e elaboração de Parecer de Aprovação do Produto 6	Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	A Iniciar	8-jul-22	7-ago-22					0		
Produto 7 - Plano de Ação Estratégico para a Bacia do Parnaíba	Entrega do Produto	Consórcio RHA-VERTRAG	Em Andamento	20-mai-22	18-jul-22	R$178.761,83	20-mai-22			70		
Revisão do Produto e elaboração de Parecer de Aprovação do Produto 7	Elaboração de Pareceres	Equipe Técnica Sudene, PNUD, Consórcio RHA	A Iniciar	18-jul-22	18-ago-22					0		
Encerramento do Projeto	Relatório Final de Encerramento do Projeto	Consórcio RHA-VERTRAG	A Iniciar	10-jul-22	4-set-22					0		
Elaboração de Relatório Final	Análise e elaboração de parecer final de Projeto	Sudene/PNUD	A Iniciar	4-set-22	19-set-22					0		
Resumo Projeto			Em Andamento								Status do Projeto	
						R$893.809,15			**R$446.904,57**	**70**		

CGCP 2021004 CINEP

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do Programa SICONV	Autorização da Diretoria Colegiada para abertura de chamada de projetos, elaboração de edital de publicação e outros documentos técnicos de modelos para recebimento de propostas	CGCP	Concluído	21-out-20	11-nov-20	R$0,00	21-out-20	11-nov-20	R$0,00	100	Processo: 59336.001698/2020-93. Relatório do Processo de Chamada SEI Nº 0217183	
Selção e análise das propostas	A análise das propostas enviadas para o Programa 5320320200012 foi realizada pela equipe técnica da CGCP/DPLAN Sudene em 3 etapas (eliminatória, classificatória, e ajustes de propostas selecionadas	CGCP	Concluído	30-nov-20	31-dez-20	R$0,00	30-nov-20	31-dez-20	R$0,00	100		
Analise juridica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	24-dez-20	31-dez-20	R$0,00	24-dez-20	31-dez-20	R$0,00	100		
Elaboração da minuta do Convênio	Elaboração do minuta do Convênio	COCIC	Concluído	24-dez-20	31-dez-20	R$0,00	24-dez-20	31-dez-20	R$0,00	100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	Superintendente	Concluído	31-dez-20	31-dez-20	R$0,00	31-dez-20	31-dez-20	R$0,00	100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio	GABINETE/ASCOM	Concluído	31-dez-20	5-jan-21	R$0,00	31-dez-20	5-jan-21	R$0,00	100		
Análise do Termo de Referência	Elaboração do Termo de Referência pela equipe técnica do convenente, reuniões de orientações e ajustes e elaboração de pareceres de análise do Termo de Referência, ajustes do Plano de Trabalho.	Equipe Técnica da CINEP e Equipe Técnica CGCP	Concluído	23-dez-20	30-jun-21	R$0,00	23-dez-20	30-jun-21	R$0,00	100	Pareceres Técnicos de Análise do TR: Parecer Técnico 23 (0220716), 136 (0249542), 171 (0254469) e Nota Técnica 24 (0224241)	Pelo tempo decorrido na elaboração do TR do convênio, será necessário fazer um Termo Aditivo para ampliação da vigência. A partir do T.A. as datas serão repactuadas
Ajustes no Plano de Trabalho	Incorporação dos ajustes executados no Termo de Referência ao Sistema da Plataforma +Brasil e elaboração de Termo Aditivo	Equipe Técnica da CINEP e Equipe Técnica CGCP	Concluído	30-jun-21	31-jul-21	R$0,00	30-jun-21	9-ago-21	R$0,00	100		
Processo Licitatório	Elaboração dos procedimentos para realização do Processo Licitatório	Equipe Técnica da CINEP	Atrasado	30-jun-21	31-ago-21	R$0,00				0	Em 26/10/2021, foi publicado no DOU o Aviso de Licitação, com data marcada para 11/01/2022. A convenente comunicou informalmente que o processo licitatório não houve concorrentes, no entanto não formalizou o resultado na Plataforma Mais Brasil. Foram encaminhadas solicitações de esclarecimento referente ao resultado do Processo licitatório em 3 ocasiões (18/10/2021, 31/01 e 07/03/2022) bem como encaminhado Ofício solicitando esclarecimentos (Ofício 439/2022 de 14/02/2022) que não foram respondidos. Equipe técnica recomenda cancelamento do convênio uma vez que não houve demonstração de interesse de continuidade pelo CINEP e nem capacidade técnica de execução do convênio.	Será formalizado pelo convente solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma.
Aceite do processo licitatório	Emissão de parecer técnico sobre o aceite do processo licitatório	Equipe Técnica CGCP	Atrasado	31-ago-21	5-set-21	R$0,00				0	Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas não foram iniciadas.	Será formalizado pelo convente solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, devido a atraso no procedimento licitatório.
Liberação da Parcela Única	Liberação da Parcela Única	CGAF	Atrasado	5-set-21	5-set-21	R$750.000,00				0	Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas não foram iniciadas.	Será formalizado pelo convente solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, devido a atraso no procedimento licitatório.
Meta 1	Preparatória: Detalhamento Metodológico	Equipe Técnica da CINEP	Atrasado	5-set-21	5-out-21	R$0,00				0	Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas não foram iniciadas.	Será formalizado pelo convente solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, devido a atraso no procedimento licitatório.
Meta 2	Mapeamento das vocações e potencialidades da Paraíba	Equipe Técnica da CINEP	Atrasado	5-set-21	4-nov-21	R$0,00				0	Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas não foram iniciadas.	Será formalizado pelo convente solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, devido a atraso no procedimento licitatório.
Meta 3	Priorização do Eixo Estratégico e seu diganóstico detalhado: Por mesorregião	Equipe Técnica CGCP	Atrasado	4-nov-21	4-dez-21	R$0,00				0	Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas não foram iniciadas.	Será formalizado pelo convente solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, devido a atraso no procedimento licitatório.

Meta 4	Cenarização e carteira estratégica do eixo prioritário	Equipe Técnica da CINEP	Atrasado	4-dez-21	2-fev-22	R$0,00				0	Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas não foram iniciadas.	Será formalizado pelo convente solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, devido a atraso no procedimento licitatório.
Meta 5	Planos táticos para o eixo prioritário	Equipe Técnica da CINEP	Atrasado	2-fev-22	2-jul-22	R$0,00				0	Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas não foram iniciadas.	Será formalizado pelo convente solicitação de Termo Aditivo ao Convênio para repactuação de cronograma, devido a atraso no procedimento licitatório.
Acompanhamento e Fiscalização	Realização de reuniões, acompanhamento da execução das metas, elaboração de pareceres técnicos, eventuais ajustes no plano de trabalho	Equipe Técnica CGCP	Em Andamento	30-jun-21	2-jul-22	R$0,00	30-jun-21			10		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	Equipe Técnica da CINEP	A Iniciar	2-jul-22	1-ago-22	R$0,00				0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGCP	A Iniciar	3-jul-22	16-ago-22	R$0,00				0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	A Iniciar	2-jul-22	1-mar-22	R$0,00				0		
Resumo Projeto			Atrasado									
						R$750.000,00			**R$0,00**	**40,5**		

CGCP 2021003 Guarabira

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do Programa SICONV	Autorização da Diretoria Colegiada para abertura de chamada de projetos, elaboração de edital de publicação e outros documentos técnicos de modelos para recebimento de propostas	CGCP	Concluído	21-out-20	11-nov-20	R$0,00	21-out-20	11-nov-20	R$0,00	100	Processo: 59336.001698/2020-93. Relatório do Processo de Chamada SEI Nº 0217183	
Selção e análise das propostas	A análise das propostas enviadas para o Programa 5320320200012 foi realizada pela equipe técnica da CGCP/DPLAN Sudene em 3 etapas (eliminatória, classificatória, e ajustes de propostas seleciionadas	CGCP	Concluído	30-nov-20	31-dez-20	R$0,00	30-nov-20	31-dez-20	R$0,00	100		
Analise juridica	Análise e parecer juridico	PROCURADORIA	Concluído	24-dez-20	31-dez-20	R$0,00	24-dez-20	31-dez-20	R$0,00	100		
Elaboração da minuta do Convênio	Elaboração do minuta do Convênio	COCIC	Concluído	24-dez-20	31-dez-20	R$0,00	24-dez-20	31-dez-20	R$0,00	100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	Superintendente	Concluído	31-dez-20	31-dez-20	R$0,00	31-dez-20	31-dez-20	R$0,00	100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio	GABINETE/ASCOM	Concluído	31-dez-20	5-jan-21	R$0,00	31-dez-20	5-jan-21	R$0,00	100		
Análise do Termo de Referência	Elaboração do Termo de Referência pela equipe técnica do convenente, reuniões de orientações e ajustes e elaboração de pareceres de análise do Termo de Referência, ajustes do Plano de Trabalho.	Equipe Técnica do Município de Guarabira e Equipe Técnica CGCP	Concluído	23-dez-20	29-jun-21	R$0,00	23-dez-20	29-jun-21	R$0,00	100	Pareceres Técnicos de Análise do TR: Parecer Técnico 164 (0254046)	
Processo Licitatório	Elaboração dos procedimentos para realização do Processo Licitatório	Equipe Técnica do Município de Guarabira	Atrasado	29-jun-21	27-set-21	R$0,00	29-jun-21			50	A licitação realizada em Setembro/2021 foi cancelada pela prefeitura em razão da inadequação da empresa habilitada ao processo. Em contato com a Prefeitura, a equipe técnica foi informada que a data prevista para nova licitação será no dia 16/03/2022.' Foi solicitado esclarecimento na plataforma +Brasil no dia 07/03/2022 e estabelecido o prazo 1/03/2022 para realização da resposta por parte da convenente. A convenente não respondeu ao pedido de esclarecimento. A Sudene concedeu ampliação de prazo para a resposta (25/03/2022). Convenente respondeu indicando lançamento de novo edital de licitação. Foi realizada nova licitação no dia 28/04, três empresas concorreram mas todas foram inabilitadas.	Ofício enviado. Novo edital de licitação lançado e em andamento. Solicitação de atualização de informações enviada em 09.05.2022 ao convenente.
Aceite do processo licitatório	Emissão de parecer técnico sobre o aceite do processo licitatório	Equipe Técnica CGCP	Atrasado	27-set-21	2-out-21	R$0,00				0	Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas não foram iniciadas.	
Liberação da Parcela Única	Liberação da Parcela Única	CGAF	Atrasado	1-mar-22	1-mar-22	R$483.189,57				0	Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas não foram iniciadas.	
Etapa 1	ELABORAÇÃO DA METODOLOGIA E MOBILIZAÇÃO SOCIAL	Equipe Técnica do Município de Guarabira	Atrasado	1-mar-22	21-mar-22	R$0,00				0	Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas não foram iniciadas.	
Etapa 2	CARACTERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO SITUACIONAL	Equipe Técnica do Município de Guarabira	Atrasado	21-mar-22	10-abr-22	R$0,00				0	Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas não foram iniciadas.	
Acompanhamento e Fiscalização Etapas 1 e 2	Realização de reuniões, acompanhamento da execução das metas, elaboração de pareceres técnicos, eventuais ajustes no plano de trabalho	Equipe Técnica CGCP	Atrasado	1-mar-22	10-abr-22	R$0,00				0	Devido ao atraso no Processo Licitatório, esta e as demais etapas não foram iniciadas.	
Etapa 3	DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS E PROPOSIÇÕES	Equipe Técnica do Município de Guarabira	Atrasado	10-abr-22	10-mai-22	R$0,00				0		
Etapa 4	ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA	Equipe Técnica do Município de Guarabira	Atrasado	10-mai-22	31-dez-22	R$0,00				0		
Acompanhamento e Fiscalização Etapa 3 e 4	Realização de reuniões, acompanhamento da execução das metas, elaboração de pareceres técnicos, eventuais ajustes no plano de trabalho	Equipe Técnica CGCP	Atrasado	10-abr-22	31-dez-22	R$0,00				0		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	Equipe Técnica do Município de Guarabira	A Iniciar	31-dez-22	30-jan-23	R$0,00				0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGCP	A Iniciar	30-jan-23	14-fev-23	R$0,00				0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	A Iniciar	31-dez-22	1-mar-22	R$0,00				0		
Resumo Projeto			Atrasado									
						R$483.189,57			**R$0,00**	**39,47368421**		

CGCP 2021002 Codanorte

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do Programa SICONV	Autorização da Diretoria Colegiada para abertura de chamada de projetos, elaboração de edital de publicação e outros documentos técnicos de modelos para recebimento de propostas	CGCP	Concluído	21-out-20	11-nov-20	R$0,00	21-out-20	11-nov-20	R$0,00	100	Processo: 59336.001698/2020-93. Relatório do Processo de Chamada SEI Nº 0217183	
Selção e análise das propostas	A análise das propostas enviadas para o Programa 5320320200012 foi realizada pela equipe técnica da CGCP/DPLAN Sudene em 3 etapas (eliminatória, classificatória, e ajustes de propostas seleciionadas	CGCP	Concluído	30-nov-20	31-dez-20	R$0,00	30-nov-20	31-dez-20	R$0,00	100		
Analise juridica	Análise e parecer juridico	PROCURADORIA	Concluído	24-dez-20	31-dez-20	R$0,00	24-dez-20	31-dez-20	R$0,00	100		
Elaboração da minuta do Convênio	Elaboração do minuta do Convênio	COCIC	Concluído	24-dez-20	31-dez-20	R$0,00	24-dez-20	31-dez-20	R$0,00	100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	Superintendente	Concluído	31-dez-20	31-dez-20	R$0,00	31-dez-20	31-dez-20	R$0,00	100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio	GABINETE/ASCOM	Concluído	31-dez-20	5-jan-21	R$0,00	31-dez-20	5-jan-21	R$0,00	100		

Análise do Termo de Referência	Elaboração do Termo de Referência pela equipe técnica do convenente, reuniões de orientações e ajustes e elaboração de pareceres de análise do Termo de Referência, ajustes do Plano de Trabalho.	CODANORTE e Equipe Técnica CGCP	Concluído	23-dez-20	27-mai-21	R$0,00	23-dez-20	27-mai-21	R$0,00	100	Pareceres Técnicos de Análise do TR: Parecer Técnico 82 (0237986), Parecer Técnico Nº 116 (0246441)	
Processo Licitatório	Elaboração dos procedimentos para realização do Processo Licitatório	CODANORTE	Concluído	27-mai-21	25-ago-21	R$0,00	27-mai-21	10-set-21	R$0,00	100		
Aceite do processo licitatório	Emissão de parecer técnico sobre o aceite do processo licitatório	Equipe Técnica CGCP	Concluído	25-ago-21	30-ago-21	R$0,00	10-set-21	1-out-21	R$0,00	100	Parecer Técnico 319 (278927)	
Liberação da Parcela Unica	Liberação da Parcela Unica	CGAF	Concluído	30-ago-21	30-ago-21	R$725.810,00	1-out-21	1-out-21	R$725.810,00	100	SEI 281376	
META 01 - Projeto de Mobilização Social e Divulgação do PIGIRS	Etapa 1.1 - Formação do Grupo de Trabalho, Etapa 1.2 - Evento de divulgação do plano de trabalho para elaboração do PIGIRS, Etapa 1.3 - Elaboração da Caracterização dos municípios que compõe a área da SUDENE e fazem parte do agrupamento regionalizado	CODANORTE	Concluído	30-ago-21	28-dez-21	R$0,00	20-dez-21	27-jan-22	R$0,00	100	Parecer Técnico 13 (0320587)	
META 02 - Diagnóstico dos Resíduos Sólidos do PIGIRS	Etapa 2.1 - Elaboração do Diagnóstico Técnico Participativo da Gestão Intermunicipal de Resíduos Sólidos, Etapa 2.2 - Realização de Audiências Públicas para a apresentação do Diagnóstico Técnico Participativo da Gestão Intermunicipal de Resíduos Sólido	CODANORTE	Concluído	28-dez-21	27-abr-22	R$0,00	28-dez-21	7-abr-22	R$0,00	100	Último Produto entregue por Codanorte dentro do prazo (07/04).	
Acompanhamento e Fiscalização Metas 1 e 2	Realização de reuniões, acompanhamento da execução das metas, elaboração de pareceres técnicos, eventuais ajustes no plano de trabalho	Equipe Técnica CGCP	Concluído	30-ago-21	27-abr-22	R$0,00	31-ago-21	26-mai-22	R$0,00	100		
META 03 - Prognóstico e Planejamento das Ações do CODANORTE	Etapa 3.1 - Realização de Audiências Públicas microrregionais para apresentação do Prognóstico contendo as metas, programas e ações da Gestão Intermunicipal de Resíduos Sólidos.Etapa 3.2 - Evento de validação do planejamento das ações	CODANORTE	Concluído	27-abr-22	27-mai-22	R$0,00	27-abr-22	20-mai-22	R$0,00	100		
META 04 - Publicação e Divulgação do PIGIRS do CODANORTE	Etapa 4.1 - Publicação do Plano Intermunicipal de gestão Integrada da Região do CODANORTE, Etapa 4.2 - Conferência Regional para Divulgação e Finalização do PIGIRS	CODANORTE	Atrasado	27-mai-22	30-jun-22	R$0,00	20-mai-22			0		
Acompanhamento e Fiscalização Metas 3 e 4	Realização de reuniões, acompanhamento da execução das metas, elaboração de pareceres técnicos, eventuais ajustes no plano de trabalho	Equipe Técnica CGCP	Atrasado	27-abr-22	30-jun-22	R$0,00	27-abr-22			50		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	CODANORTE	Atrasado	30-jun-22	30-jul-22	R$0,00				0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGCP	A Iniciar	30-jul-22	14-ago-22	R$0,00				0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	Atrasado	30-jun-22	29-ago-22	R$0,00				0		
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$725.810,00			**R$725.810,00**	**76,31578947**		

CGCP 2021001 Convênio ABDI

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do Programa SICONV	Abertura do Programa no Siconv para recebimento de proposta	CGCP	Concluído	15-nov-20	2-dez-20	R$0,00	15-nov-20	2-dez-20	R$0,00	100		
Análise e aprovação de propostas	Análise e aprovação das propostas enviadas pelo Siconv	CGCP	Concluído	3-dez-20	10-dez-20	R$0,00	3-dez-20	10-dez-20	R$0,00	100		
Analise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	11-dez-20	20-dez-20	R$0,00	11-dez-20	20-dez-20	R$0,00	100		
Elaboração da minuta do Convênio	Elaboração do minuta do Convênio	COCIC	Concluído	21-dez-20	24-dez-20	R$0,00	21-dez-20	24-dez-20	R$0,00	100		
Assinatura do Convênio	Assinatura do Convênio	Superintendente	Concluído	28-dez-20	30-dez-20	R$0,00	28-dez-20	30-dez-20	R$0,00	100		
Publicação do Convênio	Publicação do Convênio	GABINETE/ASCOM	Concluído	31-dez-20	31-dez-20	R$0,00	31-dez-20	31-dez-20	R$0,00	100		
Meta 1: 01 (uma) área de demonstração de soluções tecnológicas de Cidades Inteligentes definida, com foco em segurança pública, em Campina Grande.	Produto: Elaboração do diagnóstico contendo: área de demonstração, perfil do município, requisitos técnicos para a implementação das soluções tecnológicas, constituição da governança local e definição de indicadores de resultados.	ABDI	Concluído	1-jan-21	30-jun-21	R$0,00	1-jan-21	30-jun-21	R$0,00	100	Aceite dado pela NOTA TÉCNICA Nº 104/2021	
Meta 2: 50 (cinquenta) gestores públicos de Campina Grande capacitados em temas de Cidades Inteligentes, com disseminação de informações, projetos e ações relacionadas a temática	Produto: 50 gestores capacitados	ABDI	Concluído	1-mar-21	30-nov-21	R$0,00	1-mar-21	25-nov-21		100	Foram realizadas capacitações nos temas Cidades Inteligentes (13/07, 20/07 e 27/07) e Sandbox (18/08 e 25/08) e Tecnologias Inteligentes em Segurança Pública (25/11/2021). A data prevista para início desta etapa foi antecipada.	
Meta 3: 01 (uma) área de demonstração de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes implementada, com foco em segurança pública, em Campina Grande.	Produto: Aquisição de equipamentos conforme Termo de Referência	ABDI	Concluído	1-fev-21	31-out-21	R$0,00	1-fev-21	5-nov-21		100	Houve atraso por parte de Prefeitura de Campina Grande na disponibilização de conexões de internet e de energia em locais de instalação dos equipamentos. A data prevista para final desta etapa foi alterada.	A inauguração da área de demonstração de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes foi realizada no dia 05/11/2021, que contou com a presença dos técnicos Frederico Bezerra e Paula Aragão. O Superintendente interino da Sudene, Dr. Raimundo Matos palestrou na ocasião (SEI 302354).
Aceite do processo licitatório	Emissão de parecer sobre o processo licitatório da Meta 3	CGCP	Concluído	1-ago-21	15-ago-21	R$0,00	23-jul-21	30-jul-21	R$0,00	100		
Liberação da Parcela Unica	Liberação da Parcela Unica	CGCP	Concluído	16-ago-21	30-ago-21	R$1.998.021,94	30-jul-21	14-set-21	R$1.998.021,94	100		
Meta 4: 04 (quatro) relatórios de monitoramento dos indicadores relacionados a melhoria da qualidade de vida do cidadão com foco em segurança pública	Produto: relatórios de monitoramento dos indicadores relacionados a melhoria da qualidade de vida do cidadão com foco em segurança pública	ABDI	Em Andamento	1-ago-21	31-dez-22	R$0,00	15-set-21			0		
Meta 5: 05 (cinco) visitas guiadas, direcionadas a gestores públicos, para divulgação da área de demonstração e promoção da cadeia produtiva associada ao mercado de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes.	Produto: visitas guiadas, direcionadas a gestores públicos, para divulgação da área de demonstração e promoção da cadeia produtiva associada ao mercado de soluções tecnológicas para Cidades Inteligentes	ABDI	Em Andamento	1-jan-22	31-dez-22	R$0,00	1-mar-22			0		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	ABDI	A Iniciar	1-jan-23	31-jan-23	R$0,00				0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGCP	A Iniciar	1-fev-23	28-fev-23	R$0,00				0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	A Iniciar	1-mar-23	30-mar-23	R$0,00				0		
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$1.998.021,94			**R$1.998.021,94**	**68,75**		

CGCP 2020002- ACTs

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Minuta de Acordo de Cooperação	Documento Oficial do BNDES que propõe Acordo de Cooperação Técnica.	SUDENE/GAB	Concluído	1-out-19	30-out-19	R$0,00	30-out-19	27-nov-19	R$0,00	100		
Elaboração de Nota Técnica	Elaboração de Nota Técnica referente ao Acordo de Cooperação Técnica	SUDENE DPLAN/CGCP	Concluído	30-out-19	30-nov-19	R$0,00	27-nov-19	28-nov-19	R$0,00	100	Parecer Técnico nº 329/2019	

Elaboração de Plano de Trabalho específico.	Elaboração de Plano de Trabalho específico (Equipe CGCP) sobre o Acordo de Cooperação, incluindo metodologias, prazos, articulações, recursos, metas, desenho do monitoramento, produtos e mudanças esperadas para a execução do Acordo	SUDENE DPLAN/CGCP	Concluído	30-out-19	30-jan-20	R$0,00	17-jan-20	13-jul-20	R$0,00	100	O Plano de Trabalho elaborado foi aprovado na 360ª Diretoria Colegiada.	
Assinatura de Parceiros Signatários (4)	Ata de assinatura de Parceiros Signatários do Acordo de Cooperação	SUDENE/GAB - Diretoria Colegiada	Concluído	30-out-19	30-jan-20	R$0,00	19-dez-19	19-dez-19	R$0,00	100		
Acompanhamento do Plano de Trabalho do ACT	Desenvolvimento de atividades de execução e coordenação do Plano de Trabalho previsto no ACT.	SUDENE DPLAN/CGCP	Em Andamento	1-fev-20	12-dez-22	R$0,00	6-jan-20			60	Trata-se de uma atividade contínua. Desde o primeiro trimestre de 2020 não houve avanço nesta pauta. Como os projetos do PRDNE não estão detalhados suficientemente, foi considerado dar continuidade nas atividades do ACT após elaboração de Sumários Executivos ou Business Cases dos projetos prioritários.	Em 30/12/2021 foi assinado novo aditivo a Carta de Acordo em que o P4 (Fichas de Projetos) é retirado. A retirada do P4 foi solicitada pela contratada que não conseguiu atender ao previsto no instrumento. Com a nova contratação para o município de Feira de Santana (Processo: 59336.000817/2021-71) será possível ter um conjunto de projetos detalhados como subsídio para continuidade das atividades do ACT.
Avaliação do ACT	Avaliação das atividades executadas no escopo do ACT.	SUDENE DPLAN/CGCP	Em Andamento	1-jun-22	30-jul-22	R$0,00	7-jun-22			0		
Prorrogação ou encerramento do ACT	Decisão sobre prorrogação ou encerramento do ACT em conjunto com o BNDES.	SUDENE DPLAN/CGCP	A Iniciar	1-dez-22	12-dez-22	R$0,00				0		
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$0,00			**R$0,00**	**65,71428571**		

CGEP - Projetos

CGEP2022003 Monitoramento de Índices Socioeconômicos

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Monitoramento do Coeficiente de Desequilíbrio Regional 2021	Monitorar a divulgação do Coeficiente de Desequilíbrio Regional visando à sua apuração do seu resultado para o ano de 2021	CGEP	Em Andamento	1-jun-22	30-jul-22	R$0,00	1-jun-22				Dado de 2020 atualizado pelo IBGE em 26/05/2021. Para 2020, o CDR (Coeficiente de Desequilíbrio Regional) foi de 0,66. A atualização da informação está condicionada à sua divulgação pelo IBGE. https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/17270-pnad-continua.html?=&t=coeficiente-de-desequilibrio-regional	
Monitoramento do Percentual do PIB da área de atuação da Sudene 2020	Monitorar a divulgação do Percentual do PIB da área de atuação da Sudene visando à apuração do seu resultado para o ano de 2020	CGEP	A Iniciar	1-dez-22	31-dez-22	R$0,00					Dado de 2019 atualizado pelo IBGE em 17/12/2021. O percentual do PIB da área de atuação da Sudene (R$1.112.391.040,50) é de 15,05%. Considerando a entrada dos novos municípios em 2021 (R$1.133.749.664,50), 15,34%. Brasil R$7.389.131.000,00. A atualização da informação pelo IBGE acontece com defasagem de dois anos. Em 2022 será divulgado o indicador para 2020. Provável data de atualização é dezembro. https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938	
Monitoramento doRanking de competitividade dos Estados - CLP 2022	Monitorar a divulgação do Ranking de competitividade dos Estados - CLP visando à sua apuração do seu resultado para o ano de 2022	CGEP	A Iniciar	31-ago-22	31-dez-22	R$0,00					Dado de 2021 atualizado pelo CLP em agosto de 2021. A média das notas do Brasil é 47,7, a dos estados da área de atuação da Sudene era 42,6, o indicador é 89,3%. A apuração do índice 2022 está condicionada à divulgação do Ranking pelo CLP, podendo ocorrer no período especificado. https://www.rankingdecompetitividade.org.br/estados	
Monitoramento da Taxa de mortalidade infantil 2021	Monitorar a divulgação da Taxa de mortalidade infantil visando à sua apuração do seu resultado para o ano de 2021	CGEP	Em Andamento	1-jun-22	30-jul-22	R$0,00	1-jun-22				Dado de 2020 atualizado pelo DATASUS - Ministérios da Saúde. Centro-Oeste: 11.44, Nordeste: 16.36, Norte: 15.30, Sudeste: 10.58, Sul: 10.36. Consolidação dos dados do ano anterior costuma acontecer em abril do próximo ano. Dados de 2022 devem ser atualizados em abril de 2023. http://svs.aids.gov.br/dantps/centrais-de-conteudos/paineis-de-monitoramento/mortalidade/infantil-e-fetal/	
Monitoramento da Taxa de analfabetismo - 15 anos ou mais de idade (2020)	Monitorar a divulgação da Taxa de analfabetismo - 15 anos ou mais de idade visando à sua apuração de seu resultado para o ano de 2020	CGEP	A Iniciar	1-jul-22	31-ago-22	R$0,00					O indicador de 2019 está atualizado, com atualização em 15/07/2020. Brasil 6,6%, Nordeste 13,9% (resultados da PNAD contínua). A atualização da informação está condicionada à sua divulgação pelo IBGE https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/7113	
Monitoramento do Percentual da população com acesso à abastecimento de água (2021).	Monitorar a divulgação do Percentual da população com acesso à abastecimento de água visando à sua apuração de seu resultado para o ano de 2021	CGEP	A Iniciar	1-dez-22	31-dez-22	R$0,00					Já disponível no SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento) as informações de 2020. Nordeste 74,9%, Brasil 84,1%. Os dados anuais são atualizados no Sistema em Dezembro do ano seguinte. http://www.snis.gov.br/diagnosticos	
Monitoramento do Percentual da população com acesso à abastecimento de água (2021).	Monitorar a divulgação do Percentual da população com acesso a serviço de coleta de esgotos sanitários visando à sua apuração de seu resultado para o ano de 2021	CGEP	A Iniciar	1-dez-22	31-dez-22	R$0,00					Já disponível no SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento) as informações de 2020. Nordeste 30,3%, Brasil 55%. Os dados anuais são atualizados no Sistema em Dezembro do ano seguinte. http://www.snis.gov.br/diagnosticos	
Monitoramento do Percentual de tratamento de esgoto (2021).	Monitorar a divulgação do Percentual de tratamento de esgoto visando à sua apuração de seu resultado para o ano de 2021.	CGEP	A Iniciar	1-dez-22	31-dez-22	R$0,00					Já disponível no SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento) as informações de 2020. Nordeste 34,1%, Brasil 50,7%. Os dados anuais são atualizados no Sistema em Dezembro do ano seguinte. http://www.snis.gov.br/diagnosticos	
Monitoramento da Proporção de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e possuem renda domiciliar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo (de 2010, Censo) (de 2020, PNAD contínua)	Monitorar a divulgação da Proporção de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e possuem renda domiciliar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo visando à sua apuração de seu resultado para o ano de 2020	CGEP	A Iniciar	1-jul-22	31-ago-22	R$0,00					Como ainda não está disponível novo Censo Demográfico, as informações mais atuais são as de 2019, para Estados e Regiões Metropolitanas, e 2010, para municípios. Centro-Oeste: 6,25%, Nordeste: 19,07%, Norte: 15,74%, Sudeste: 6,71%, Sul: 4,65%. https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/7205	
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$0,00			**R$0,00**	**#DIV/0!**		

CGEP2022002 Nutrição Palma

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	CGEP	Concluído	30-jan-21	30-mai-21		30-jan-21	30-mai-21		100	De início, a proposta foi aprovada pelo mérito, mas foram solicitadas cotações atualizadas de alguns itens previstos no projeto, a fim de complementar a análise de custos e compatibilidade de preços com os praticados no mercado	
Análise Jurídica	Análise pela Procuradoria Federal junto à Sudene.	Procuradoria	Concluído	30-jun-21	30-jun-21		30-jun-21	30-jun-21		100		
Plano de Trabalho	Formatação e assinatura do Plano de Trabalho	CGEP Gabinete INSA	Concluído	30-jun-21	30-ago-21		30-jun-21	30-dez-21		100	O Plano de Trabalho inicial precisou ser alterado em função de modificações no cronograma de desembolso e plano de aplicação	
Termo de Execução Descentralizada (TED)	Formatação e assinatura do TED	COCIC/CGDS Gabinete INSA	Concluído	30-dez-21	30-dez-21		30-dez-21	30-dez-21		100	TED assinado em 09/12/2021, com vigência prevista de 54 meses	
Publicação	Publicação do TED	Gabinete	Concluído	30-dez-21	30-dez-21		30-dez-21	30-dez-21		100	TED publicado pela ASCOM no sítio eletrônico da Sudene em 10/12/2021	
Descentralização	Liberação da primeira parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	30-dez-21	30-dez-21	R$303.706,70	30-dez-21	30-dez-21	R$303.706,70	100	Transferência da 1a parcela de recursos financeiros realizada em 14/12/2021	
Meta A	Determinar as taxas de recuperação de N e K para a palma forrageira, em função das doses aplicadas, visando subsidiar as recomendações de adubação.	INSA	Em Andamento	30-jan-22	30-abr-26		30-jan-22			20	R$ 246432, já realizado R$ 24757,86. A atualização de 20% da meta A foi informada pelo INSA em e-mail e 18/05/2022.	
Meta B	Estabelecer os níveis críticos de N e K no solo e na planta, nas diferentes zonas fisiográficas do semiárido.	INSA	Atrasado	30-mar-22	30-abr-26					0	R$ 148,593.60	
Meta C	Determinar os níveis de correlação dos parâmetros biométrico, fisiológicos e bioquímicos da palma forrageira com as características físicas, químicas e biológicas do solo	INSA	A Iniciar	30-set-22	30-jun-26					0	R$ 295,400.00	
Meta D	Estimar a produção da palma forrageira em resposta às doses de N e K aplicadas ao solo	INSA	A Iniciar	30-mar-23	30-abr-26					0	R$ 4,220.00	
Meta E	Gerar dados científicos na área de nutrição mineral da palma forrageira	INSA	A Iniciar	30-abr-23	30-jun-26					0	R$ 24,839.30	
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	Atrasado	30-jun-22	30-jul-22					0		

Descentralização	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Atrasado	30-jun-22	30-jul-22	R$277.498,16				0		
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 2ª parcela	INSA/CGEP	A Iniciar	30-jun-23	30-jul-23					0		
Descentralização	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	A Iniciar	30-jun-23	30-jul-23	R$138.280,04				0		
3ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 3ª parcela	INSA/CGEP	A Iniciar	30-dez-23	30-jan-24					0		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	INSA	A Iniciar	30-mai-26	30-mai-26					0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	A Iniciar	30-mai-26	30-jun-26					0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	A Iniciar	30-mai-26	30-jun-26					0		
Resumo Projeto			Atrasado							32		
						R$719.484,90			**R$303.706,70**	**32,6**		

CGEP2022001 TED UFV

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / UFV	Concluído	6-nov-21	10-nov-21		9-dez-21	9-dez-21		100		
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	13-nov-21	15-nov-21		10-dez-21	10-dez-21		100		
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	Liberação da primeira parcela dos recursos (50% do valor total previsto)	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	15-nov-21	22-nov-21	R$199.972,50	10-dez-21	10-dez-21	R$199.972,50	100	Descentralização realizada, conforme Documento SEI 0305008 e Despacho COCF 0305009.	
Meta 1: Articulação e fortalecimento do grupo de trabalho na avaliação do FNE: aprofundamento metodológico e descritivo. Produto 1: Plano de Trabalho detalhado e aspectos conceituais e metodológicos para a execução das avaliações do FNE	Relatório contendo a estratégia detalhada para a execução das avaliações do FNE contendo/considerando: - articulação dos diversos fatores materiais e humanos necessários à pesquisa. - revisão da literatura e especificação do referencial teórico e dos modelos analíticos a serem empregado na análise - descrição da estratégia metodológica para cada objetivo de avaliação - reuniões com os técnicos da área de estudos econômicos da Sudene visando um melhor acompanhamento dos produtos acordados.	UFV	Concluído	9-dez-21	8-abr-22		9-jan-22	7-abr-22		100	Circunstâncias associadas aos trâmites internos da UFV para formalização da gestão dos recursos financeiros do projeto por intermédio da Fundação Arthur Bernardes (FUNARBE) impactaram o início dos trabalhos, que se deu efetivamente a partir do início de janeiro de 2022 (SEI 0329219).Ademais, as tratativas com o Banco do Nordeste para disponibilização da base de dados demorou mais do que o previsto, devido à sobrecarga de demandas internas daquele Banco. Em 11/03/22 o percentual de execução desse produto era de 70%. Em 04/04/22. o percentual de execução desse produto é de 95% (SEI 0339516). Relatório entregue em 07/04/2022 (SEI 0340981, 0340982 e 0340983).	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	Atrasado	22-abr-22	6-mai-22					0		
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFV	Atrasado	6-mai-22	14-mai-22					0		
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	Atrasado	14-mai-22	22-mai-22					0		
Meta 1: Articulação e fortalecimento do grupo de trabalho na avaliação do FNE: aprofundamento metodológico e descritivo. Produto 2: Relatório de construção de banco de dados	Relatório descritivo acerca da construção do banco de dados necessário para a execução do diagnóstico socioeconômico da região, da análise exploratória quanto a aplicação dos recursos do FNE e das avaliações dos resultados e impactos do Fundo, detalhando as bases, fontes e variáveis utilizadas, tratamentos iniciais e estatísticas descritivas gerais sobre o banco de dados construído.	UFV	Atrasado	9-dez-21	22-abr-22		9-jan-22			35	do TED firmado (SEI 0329219), circunstâncias associadas aos trâmites internos da UFV para formalização da gestão dos recursos financeiros do projeto por intermédio da Fundação Arthur Bernardes (FUNARBE) impactaram o início dos trabalhos, que se deu efetivamente a partir do início de janeiro de 2022, conforme foi informado para a gestão da Coordenação de Avaliação e Estudos - COAE, unidade desta Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação - CGEP da Sudene.Além disso, sobretudo em relação ao não cumprimento do prazo de entrega do Produto 2 - "Relatório de construção de banco de dados", que se trata de um "relatório descritivo acerca da construção do banco de dados necessário para a execução do diagnóstico socioeconômico da região, da análise exploratória quanto a aplicação dos recursos do FNE e das avaliações dos resultados e impactos do Fundo, detalhando as bases, fontes e variáveis utilizadas, tratamentos iniciais e estatísticas descritivas gerais sobre o banco de dados construído" , que estava previsto para o dia 09/02/2022, o responsável técnico do projeto por parte da UFV, expõe que: i. os dados básicos sobre as contratações do FNE para a realização da pesquisa não foram disponibilizados pela Sudene; eii. o acesso da equipe técnica da UFV aos microdados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS ainda está sob análise da a Equipe de Estatísticas e Estudos do Trabalho do Ministério da Fazenda.Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391). Conforme informado o produto 2 será entregue em	Em relação aos dados básicos sobre as contratações do FNE para a realização da pesquisa, a Sudene está em tratativas com o BNB visando o compartilhamento das informações no período e formato requisitados para as avaliações, conforme demonstra o documento SEI 0332759. Da mesma forma, as tratativas sobre os dados da RAIS foram realizadas, conforme demonstram os documentos SEI 0329084; 0329085; 0329086; 0329088; 0329089; 0329090. Concomitantemente, a área técnica da COAE segue com o tratamento dos microdados, estruturação das bases do FNE e da RAIS e desindentificação das informações para compartilhar com a equipa da UFV. Em 27/04/2022, foi necessária a instalação pela CGTI do software R e R studio em computador institucional para uma versão mais nova, para possibilitar a continuidade das verificações nas bases a serem disponibilizadas à UFV. Conforme o resultado indicado no documento (SEI 0347201), será mantido contato com a CGTI e com a UFV para verificar outras possibilidade de transferência dos arquivos para a UFV.
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	Atrasado	22-abr-22	6-mai-22						Datas repactuadas: 22/04/2022 a 06/05/2022	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFV	Atrasado	6-mai-22	14-mai-22						Datas repactuadas: 06/05/2022 a 14/05/2022	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	Atrasado	14-mai-22	22-mai-22						Datas repactuadas: 14/05/2022 a 22/05/2022	
Meta 1: Articulação e fortalecimento do grupo de trabalho na avaliação do FNE: aprofundamento metodológico e descritivo. Produto 3: Diagnóstico socioeconômico da área de atuação da Sudene considerando o período de 2000 a 2019	O Relatório de diagnóstico deverá considerar, entre outros, os aspectos demográficos, econômicos, sociais e ambientais que caracterizam a área de atuação da Sudene, área de intervenção do FNE, no período de 2000 a 2019. Integra ainda o relatório a construção de tabelas, quadros, figuras, gráficos e mapas.	UFV	Concluído	2-fev-22	8-abr-22		9-fev-22	5-abr-22		100	Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391).Datas: 09/02/2021 a 08/04/2022. Em 11/03/22 o percentual de execução desse produto era de 65%. Em 04/04/22. o percentual de execução desse produto é de 95% (SEI 0339516). Relatório entregue em 05/04/22 (SEI 0340050, 0340051, 0340056)	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	Atrasado	8-abr-22	23-abr-22						Datas repactuadas: 08/04/2022 a 23/04/2022	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFV	Atrasado	23-abr-22	1-mai-22						Datas repactuadas: 23/04/2022 a 01/05/2022	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	Atrasado	1-mai-22	8-mai-22						Datas repactuadas: 01/05/2022 a 08/05/2022	
Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	Liberação da segunda parcela dos recursos (50% do valor total previsto)	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Atrasado	8-mai-22	15-mai-22	R$199.972,50					Datas repactuadas: 08/05/2022 a 15/05/2022	
Meta 2: Avaliação de eficácia, eficiência, efetividade e retorno econômico do FNE Produto 4: Análise exploratória sobre a execução e distribuição dos financiamentos do FNE no período de 2000 a 2019.	Relatório contendo os modelos a serem utilizados na avaliação da aplicação dos recursos do FNE: Diferenças em Diferenças (Dif-Dif), Propensity Score Matching, Regressão Quantílica, análise de convergência, funções dose-resposta, estimadas pelo Escore de Propensão Generalizado.	UFV	Atrasado	9-mai-22	8-ago-22					0	Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391). Datas: 09/05/2022 a 08/08/2022	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	A Iniciar	8-ago-22	23-ago-22					0	Datas repactuadas: 08/08/2022 a 23/08/2022	

Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFV	A Iniciar	23-ago-22	31-ago-22					0	Datas repactuadas: 23/08/2022 a 31/08/2022	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos		A Iniciar	31-ago-22	8-set-22					0	Datas repactuadas: 01/08/2022 a 08/08/2022	
Meta 2: Avaliação de eficácia, eficiência, efetividade e retorno econômico do FNE Produto 5: Avaliação da eficácia da aplicação dos recursos do FNE	Relatório contendo a Avaliação da eficácia da aplicação dos recursos do FNE, indicando a forma de estimação dos efeitos dos financiamentos do FNE sobre o emprego e renda, entre outros indicadores que se mostrarem pertinentes, a combinação dos métodos de Diferenças em Diferenças (Dif-Dif) e Propensity Score Matching, além da Regressão Quantílica aplicada a Dados em Painel (efeitos fixos). Para a execução das análises, sugere-se considerar um painel de dados para os anos 2000 a 2019 (ou outro recorte temporal factível, considerando os dados mais recentes disponíveis).	UFV	Atrasado	9-mai-22	8-jul-22					0	Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391). Datas: 09/05/2022 a a 08/07/2022	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	A Iniciar	8-jul-22	2-ago-22					0	Datas repactuadas: 08/07/2022 a 02/08/2022	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFV	A Iniciar	2-ago-22	10-ago-22					0	Datas repactuadas: 02/08/2022 a 10/08/2022	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	A Iniciar	10-ago-22	18-ago-22					0	Datas repactuadas: 10/08/2022 a 18/08/2022	
Meta 2: Avaliação de eficácia, eficiência, efetividade e retorno econômico do FNE Produto 6: Avaliação da eficiência da aplicação dos recursos do FNE	Relatório da avaliação da eficiência da aplicação dos recursos do FNE com os modelos de utilizados no estudo. Para tanto, propõem-se de início o uso da Análise envoltória de dados (DEA), considerando dois modelos. O primeiro, é um modelo Global, cujo objetivo é verificar onde e em quais setores ocorre maior eficiência no faturamento das empresas, considerando dois recortes de estudo: municipal e setorial. O segundo modelo, denominado como modelo FNE, o objetivo principal é verificar em quais setores produtivos o FNE é mais eficiente na geração de emprego, renda e faturamento dos beneficiários, nos diversos períodos. Para as duas análises, sugere-se considerar um painel de dados para os anos 2000 a 2019 (ou outro recorte temporal factível, considerando os dados mais recentes disponíveis), o que sugere que será empregado uma abordagem dinâmica DEA.	UFV	Atrasado	9-mai-22	8-jul-22					0	Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391). Datas: 09/05/2022 a a 08/07/2022	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	A Iniciar	8-jul-22	2-ago-22					0	Datas repactuadas: 08/07/2022 a 02/08/2022	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFV	A Iniciar	2-ago-22	10-ago-22					0	Datas repactuadas: 02/08/2022 a 10/08/2022	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	Atrasado	10-ago-22	18-jun-22					0	Datas repactuadas: 10/08/2022 a 18/08/2022	
Meta 2: Avaliação de eficácia, eficiência, efetividade e retorno econômico do FNE Produto 7: Avaliação da efetividade da aplicação dos recursos do FNE.	Relatório contendo os resultados da avaliação da efetividade da aplicação dos recursos do FNE. Para tanto, sugere-se de início adotar os modelos de Regressão Quantílica e de Dados em Painel. Para a execução das análises, sugere-se considerar um painel de dados para os anos 2000 a 2019 (ou outro recorte temporal factível, considerando os dados mais recentes disponíveis).	UFV	Atrasado	9-mai-22	8-ago-22					0	Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391). Datas: 09/05/2022 a 08/08/2022	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	A Iniciar	8-ago-22	23-ago-22					0	Datas repactuadas: 08/08/2022 a 23/08/2022	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFV	A Iniciar	23-ago-22	31-ago-22					0	Datas repactuadas: 23/08/2022 a 31/08/2022	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	A Iniciar	31-ago-22	8-set-22					0	Datas repactuadas: 31/08/2022 a 08/09/2022	
Meta 2: Avaliação de eficácia, eficiência, efetividade e retorno econômico do FNE Produto 8: Avaliação do retorno econômico e social do FNE.	Relatório da Avaliação do retorno econômico e social do FNE, indicando a metodologia utilizada no estudo. Para tanto, sugere-se de início considerar como estratégia metodológica o uso Matriz de Insumo-Produto e do Modelo de Equilíbrio Geral, com suas versões dinâmicas. Por sua vez, ao estimar os custos com a política e de posse dos resultados da avaliação de efetividade, objetiva-se adotar a Razão Custo-Efetividade para mensuração do retorno da política. Para a execução das análises, sugere-se considerar um painel de dados para os anos 2000 a 2019 (ou outro recorte temporal factível, considerando os dados mais recentes disponíveis).	UFV	Atrasado	9-mai-22	8-ago-22					0	Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391). Datas: 09/05/2022 a 08/08/2022	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	A Iniciar	8-ago-22	23-ago-22					0	Datas repactuadas: 08/08/2022 a 23/08/2022	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFV	A Iniciar	23-ago-22	31-ago-22					0	Datas repactuadas: 23/08/2022 a 31/08/2022	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	A Iniciar	31-jul-22	8-set-22					0	Datas repactuadas: 31/08/2022 a 08/09/2022	
Meta 3: Gestão de conhecimento no uso de metodologia de avaliação de impactos Produto 9: Oficina(s), manuais e cartilhas com as rotinas e metodologias de avaliação empregados no estudo.	Documento técnico com a estruturação detalhada da descrição das metodologias de avaliação e das rotinas de programação empregadas no estudo. Integra ainda este produto a realização de oficina(s) e curso(s) sobre as metodologias de avaliação empregados no estudo.	UFV	A Iniciar	9-jul-22	8-set-22					0	Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391). Datas: 09/07/2022 a 08/09/2022	
Realização de Oficina	Realização de oficina por parte da descentralizada com repasse dos conhecimentos e metodologias utilizadas no estudo.	UFV	A Iniciar	8-set-22	16-set-22					0	Datas repactuadas: 08/09/2022 a 16/09/2022	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	A Iniciar	16-set-22	24-set-22					0	Datas repactuadas: 16/09/2022 a 24/09/2022	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFV	A Iniciar	24-set-22	1-out-22					0	Datas repactuadas: 24/09/2022 a 01/10/2022	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	A Iniciar	1-out-22	9-out-22					0	Datas repactuadas: 01/10/2022 a 09/10/2022	
Meta 4: Resultados e Impactos socioeconômicos do FNE e discussões de melhorias. Produto 10: Relatório(s) consolidado (s) da avaliação dos resultados sociais e econômicos do FNE acerca da eficácia, eficiência, efetividade e retorno econômico da política	Relatório(s) Final(is) em pdf e em formato editável (Word) consolidando as avaliações quanto à eficácia, eficiência, efetividade e retorno econômico dos financiamentos do FNE. Versão final do banco de dados, das rotinas de programação implementadas em software estatístico, protocolos, vídeos, etc.	UFV	A Iniciar	9-set-22	8-nov-22					0	Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391). Datas: 09/09/2022 a 08/11/2022	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	A Iniciar	8-nov-22	23-nov-22					0	Datas repactuadas: 08/11/2022 a 23/11/2022	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFV	A Iniciar	23-nov-22	1-dez-22					0	Datas repactuadas: 23/11/2022 a 01/12/2022	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	A Iniciar	1-dez-22	9-dez-22					0	Datas repactuadas: 01/12/2022 a 09/12/2022	
Meta 4: Resultados e Impactos socioeconômicos do FNE e discussões de melhorias. Produto 11: Resumo Executivo sobre os resultados e impactos socioeconômicos decorrentes dos financiamentos do FNE	Relatório voltado para gestores que sintetiza os resultados identificados nas análises de diagnóstico e avaliações de eficácia, eficiência, efetividade e do retorno econômico, com destaque também para os desafios identificados e contribuições de melhoria para a política de financiamento do FNE como instrumento de Política de Desenvolvimento Regional do país.	UFV	A Iniciar	9-set-22	8-nov-22					0	Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391). Datas: 09/09/2022 a 08/11/2022	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	A Iniciar	10-set-22	23-nov-22					0	Datas repactuadas: 08/11/2022 a 23/11/2022	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFV	A Iniciar	23-nov-22	1-dez-22					0	Datas repactuadas: 23/11/2022 a 01/12/2022	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	A Iniciar	1-dez-22	9-dez-22					0	Datas repactuadas: 01/12/2022 a 09/12/2022	

Meta 4: Resultados e Impactos socioeconômicos do FNE e discussões de melhorias. Produto 12: Workshop para discussão dos resultados	Realização de Workshop. Nesta etapa está prevista a entrega de apresentações por parte da descentralizada no formato editável e não editável.	UFV/CGEP	A Iniciar	9-set-22	8-nov-22					0	Prazos repactuados, conforme documentos do Processo 59336.001165/2020-10: Novo calendário UFV (SEI 0329219); Parecer Técnico nº 54/2022 (SEI 0329708); Despachos CGEP (SEI 0330281 e 0330331); e-mail (SEI 0330391). Datas: 09/09/2022 a 08/11/2022	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	A Iniciar	8-nov-22	23-nov-22					0	Datas repactuadas: 08/11/2022 a 23/11/2022. Esta etapa refere-se à análise dos documentos de apresentação que integram o produto P12.	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFV	A Iniciar	23-nov-22	1-dez-22					0	Datas repactuadas: 23/11/2022 a 01/12/2022 Esta etapa refere-se à análise dos documentos de apresentação que integram o produto P12.	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	A Iniciar	1-dez-22	9-dez-22					0	Datas repactuadas: 01/12/2022 a 09/12/2022 Esta etapa refere-se à análise dos documentos de apresentação que integram o produto P12.	
Prestação de Contas Final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	UFV	A Iniciar	8-nov-22	23-nov-22					0	Datas repactuadas: 08/11/2022 a 23/11/2022	
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	A Iniciar	23-nov-22	18-dez-22					0	Datas repactuadas: 23/11/2022 a 18/12/2022	
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	A Iniciar	23-nov-22	18-dez-22					0	Datas repactuadas: 23/11/2022 a 18/12/2022	
Resumo Projeto			Atrasado									
						R$399.945,00			**R$199.972,50**	**10,91836735**		

CGEP 2021004 Estudo Calçados

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do Projeto - apresentação da necessidade para a realização do projeto	Encaminhamento da demanda para os gestores e técnicos da Coordenação	COAE/CGEP	Concluído	8-mar-21	8-mar-21		8-mar-21	8-mar-21		100		
Levantamento de informações sobre o setor Calçadista no Nordeste	Pesquisa sobre estudos e informações socioecômicas sobre o setor Calçadista para a região Nordeste	COAE	Concluído	1-abr-21	30-abr-21		1-abr-21	30-abr-21		100	Adequações de agenda em função da priorização para a execução de outros projetos e atividades em curso na CGEP (Acompanhamento e análise de produtos relacionados à pesquisa Covid, Avaliações do FNE e dos Incentivos Fiscais, Planejamento Estratégico Institucional, capacitações, Trilha de Inteligência do PRDNE e etc).	
Reunião interna COAE/CGEP	Apresentação das informações iniciais identificadas e definição por contratação de um estudo	COAE/CGEP	Concluído	16-abr-21	16-mar-21		19-abr-21	19-abr-21		100		
Elabroração de documento com dados sobre o setor	Documento com análise técnica inicial sobre os dados do setor Calçadista	COAE/CGEP	Concluído	3-mai-21	7-mai-21		3-mai-21	7-mai-21		100		
Pesquisa e análise de dados e documentos para subsidiar a elaboração de Termo de Referência (TR)	Levantamento e análise de dados econômicos, estudos, diagnósticos sobre o setor de Calçados nos estados da área de atuação da Sudene	COAE/CGEP	Concluído	3-mai-21	31-mai-21		14-jun-21	30-jun-21		100	Em paralelo ao desenvolvimento das atividades para elaboração de documentos para a contratação do estudo sobre o setor de Calçados, a equipe técnica estava envolvida em atividades relacionadas à elaboração de Termo de Referência para o monitoramento do PRNDE, às avaliações do FNE, às análises do Produto 15 da Trilha de Inteligência, à apreciação do Relatório de Resultados e Impactos do FNE, à Pesquisa sobre os efeitos da Covid-19, às Avaliações de Políticas em parceria com a UFC (TED 14/2020) e a UFPE (TED 17/2020), ao Projeto de Bacias Hidrográficas, ao Planejamento Estratégico Institucional, entre outros. Como resultado, seguiu-se com a realocação de esforços da equipe técnica e, consequentemente, interrupção da dedicação ao presente projeto, ao passo que a gestão deu sequência às tratativas internas acerca das questões orçamentárias e planejamento da execução para a referida contratação.	
Tratativas com o PNUD para apoio na contratação do estudo sobre o setor de Calçados	Tratativas junto ao PNUD para viabilização da contratação do estudo e plano estratégico para o setor de Calçados por meio da portal do Joint Operations Facility Brasil (JOF/BR)	CGEP e PNUD	Concluído	1-jun-21	30-jun-21		1-jun-21	30-jun-21		100		
Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre o setor de Calçados	Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre o setor de Calçados e adequações ao Template	COAE/CGEP	Concluído	1-jul-21	30-jul-21		1-jul-21	30-jul-21		100		
Apreciação da 1ª versão do TR pela Coordenação-Geral e PNUD	Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do PNUD.	CGEP e PNUD	Concluído	2-ago-21	13-ago-21		2-ago-21	9-ago-21		100		
Ajustes na 1ª versão do TR	Respostas aos questionamentos, sugestões recebidas, adequações da minuta inicial do TR e envio para os coordenadores da COAE e da CGEP	COAE/CGEP	Concluído	16-ago-21	20-ago-21		9-ago-21	23-ago-21		100	Em 13/08/2021 foi encaminhada versão ajusta da 1ª minuta de TR para a Coordenação-Geral. Após apreciação e ajustes adicionais, em 23/08/2021 nova versão foi encaminhada para a Coordenação-Geral, que repassou para a análise do PNUD na mesma data. Ao longo do mês de agosto e setembro, paripasso às novas solicitações de ajustes na Minuta do TR para o estudo sobre o setor de Calçados, a equipe também esteve envolvida com o TR para o Estudo Têxtil e de Confecções e o TR para as avaliações sobre os incentivos fiscais da Sudene, que também seguiram em tramitação junto ao PNUD, bem como com os demais projetos vigentes sob responsabilidade da CGEP. Acerca da estimativa de preços do projeto, pesquisa e análise de documentos adicionais foram necessárias para a elaboração da memória de cálculo, assim como discussões junto aos Coordenadores da COAE e CGEP e à equipe do PNUD para tratar sobre dúvidas e contribuições. A versão final do documento foi encaminhada para a CGEP em 22/09/21, que remeteu ao PNUD na sequência.	
Estimativa de preços e elaboração da memória de cálculo	Consulta de preços para estimar os custos do projeto e elaboração da memória de cálculo.	COAE/CGEP	Concluído	23-ago-21	10-set-21		24-ago-21	16-set-21		100		
Apreciação da minuta de TR e da memória de cálculo pela Coordenação-Geral e PNUD	Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do PNUD.	CGEP e PNUD	Concluído	6-set-21	8-set-21		17-set-21	21-set-21		100		
Elaboração de versão final do TR	Elaboração de versão final do TR e envio para a Coordenação-Geral, após a apreciação anterior dos coordenadores da COAE e CGEP e do PNUD.	COAE/CGEP	Concluído	8-set-21	14-set-21		21-set-21	22-set-21		100		

Apreciação e envio da versão final do TR para o PNUD	Apreciação e envio de versão final do TR e da memória de cálculo para o PNUD pela Coordenação-Geral da CGEP	CGEP	Concluído	15-set-21	20-set-21		22-set-21	23-set-21		100		
Elaboração de Nota Técnica com justificativa para a contratação do estudo	Elaboração de Nota Técnica com justificativa a contratação do estudo no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Sudene/PNUD BRA 17/019, nos termos do Decreto nº 5.151/2004, e envio da análise técnica e documentos relacionados para apreciação da DPLAN	COAE/CGEP	Concluído	27-set-21	29-set-21		1-nov-21	3-nov-21		100	Concluída a elaboração do TR e memória de cálculo, após seguidos sucessivos revisões e ajustes, articulações internas acerca dos trâmites administrativos, financeiros e orçamentários foram necessárias para viabilizar a aprovação e execução do projeto no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Sudene/PNUD BRA 17/019	
Apreciação por parte da DPLAN	Apreciação e aprovação da proposta por parte da DPLAN e encaminhamentos relacionados para a Diretoria de Administração - DAD e Gabinete da Superintendência	DPLAN/SUDENE	Concluído	30-set-21	6-out-21		4-nov-21	4-nov-21		0		
Apreciação por parte da DAD	Apreciação por parte da DAD/Sudene e encaminhamentos relacionados	DAD/SUDENE	Concluído	7-out-21	15-out-21		5-nov-21	19-nov-21		100		
Apreciação por parte do Gabinete da Superintendência	Apreciação por parte do Gabinete/Sudene e encaminhamentos relacionados	Gabinete/SUDENE	Concluído	7-out-21	15-out-21		5-nov-21	5-nov-21		100		
Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada	Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada	CGEP	Concluído	18-out-21	18-out-21		9-nov-21	9-nov-21		100		
Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada	Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	Concluído	18-out-21	26-out-21		9-nov-21	10-nov-21		100		
Definição da comissão técnica para avaliação das propostas	Tratativas junto à DPLAN, DFIN, CGGI, Gabinete e DAD para formação de uma comissão técnica para avaliação das propostas juntamente com técnicos da CGEP	Gabinete/SUDENE	Concluído	26-out-21	5-nov-21		10-nov-21	19-nov-21		100		
Publicação de Portaria com a instituição de comissão técnica para avalioação das propostas	Elaboração e Publicação de Portaria Interna da Sudene com a instituição de comissão técnica para a avaliação das propostas para contratação de Consultoria (Pessoa Jurídica) no âmbito do processo licitatório JOF-3476/2021	Gabinete/SUDENE	Concluído	8-nov-21	10-nov-21		19-nov-21	19-nov-21		100		
Reunião Prepatarória para o processo licitatório	Reunião Preparatória com a JOF/PNUD/SUDENE sobre o processo licitatório 3476/2021, que abordará todo o processo licitatório referente ao estudo sobre os polos Calçadistana área de atuação da Sudene	Sudene e PNUD	Concluído	24-nov-21	24-nov-21		24-nov-21	24-nov-21		100		
Reunião Interna para alinhamento do Projeto	Reunião Interna com os gestores da COAE e CGEP e técnicos envolvidos para alinhamento sobre o Projeto	Sudene	Concluído	10-dez-21	10-nov-21		13-dez-21	13-dez-21		100		
Divulgação do Edital	Publicação do Edital 3476/2021 no eTendering e o Aviso de Edital publicado no Portal da JOF	JOF-BR/PNUD	Concluído	3-dez-21	3-dez-21		3-dez-21	3-dez-21		100		
Audiência prévia	Videoconferência com possíveis interessados para apresentar os objetivos do projeto e sanar possíveis dúvidas.	Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	14-dez-21	14-dez-21		14-dez-21	14-dez-21		100		
Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	CGEP e JOF-BR/PNUD	Concluído	14-dez-21	15-dez-21		14-dez-21	15-dez-21		100		
Repostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	Respostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	CGEP e JOF-BR/PNUD	Concluído	15-dez-21	17-dez-21		15-dez-21	17-dez-21		100		
Recebimento das propostas	Recebimento das propostas (técnica e financeira) por meio da plataforma eTendering	JOF-BR/PNUD e Sudene	Concluído	25-nov-21	7-jan-22		25-nov-21	7-jan-22		100	O edital previa o recebimento das propostas pela JOF-BR/PNUD até 07/01/2022. A disponibilização das propostas à Sudene ocorreu em 13/01/2022	
Análise das Propostas Técnicas - 1ª fase de avaliação	Análise das propostas propostas técnicas e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação - Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	17-jan-22	4-fev-22		17-jan-22	27-abr-22		100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação. Em 07/03, foi produzida a 1ª versão da Nota Técnica e Financeira, elaboradas conjuntamente em decorrência de peculiaridades do processo. Em 11/03, ocorreu reunião com a equipe de avaliadores e o PNUD para discussão de pontos a esclarecer. Por necessidade de diligências, foram encaminhados questionamentos às licitantes, com documento de resposta disponibilizado em 15/03/22. Nova análise é procedida com elaboração da 2ª Versão da Nota Técnica e Financeira elaborada pela equipe de avaliadores, em 24/03. Persistindo alguns pontos a esclarecer, aguardamos reunião com o PNUD. Reunião com o PNUD realizada em 31/04, com nova diligência encaminhada à Licitante, com prazo de resposta até 01/04/22. Em 04/04/22, foi compartilhado o resultado da diligência efetuada. Em 11/04/22, é elaborada a 3ª versão da Nota técnica e financeira. Tendo em vista diligências necessárias junto à Licitante do processo JOF 3477, aguarda-se o resultado para definição quanto ao andamento da Nota desta contratação. Devido a peculiaridades do processo, a nota técnica e financeira estão sendo elaboradas em um único relatório. Após o período de aguardo para dirimir dúvidas no processo JOF 347/2022, a equipe de avaliadores foi autorizada à conclusão e assinatura das Notas Técnicas e Financeiras, ocorrida em 27/04/2022.	
Comunicação do resultado da análise das propostas técnicas às licitantes	Comunicação do resultado da primeira fase da avaliação às licitantes	JOF-BR/PNUD	Concluído	7-fev-22	7-fev-22		1-abr-22	1-abr-22		100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Devido a peculiaridades do processo, não ocorreu esta fase.	
Recepção e análise dos Pedidos de Reconsiderações	Recepção e análise dos pedidos de reconsiderações de resultados enviados pelas licitantes	JOF-BR/PNUD, SUDENE e Consultor Técnico	Concluído	7-fev-22	17-fev-22		1-abr-22	1-abr-22		100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Dadas as peculiaridades ocorridas no processo, não houve pedidos de reconsideração. Devido a peculiaridades do processo, não ocorreu esta fase.	

Análise das Propostas Comercias - 2ª fase de avaliação	Análise das propostas propostas comerciais/financeiras e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação - Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	18-fev-22	25-fev-22		17-jan-22	27-abr-22		100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação. Em 07/03, foi produzida a 1ª versão da Nota Técnica e Financeira, elaboradas conjuntamente em decorrência de peculiaridades do processo. Por necessidade de diligências, foram encaminhados questionamentos às licitantes e nova análise é procedida com elaboração de nova Nota Técnica e Financeira elaborada pela equipe de avaliadores, em 24/03. Persistindo alguns pontos a esclarecer, aguardamos reunião com o PNUD. Reunião com o PNUD realizada em 31/04, com nova diligência encaminhada à Licitante, com prazo de resposta até 01/04/22. Em 04/04/22, foi compartilhado o resultado da diligência efetuada. Em 11/04/22, é elaborada a 3ª versão da Nota técnica e financeira. Tendo em vista diligências necessárias junto à Licitante do processo JOF 3477, aguarda-se o resultado para definição quanto ao andamento da Nota desta contratação. Devido a peculiaridades do processo, a nota técnica e financeira estão sendo elaboradas em um único relatório. Após o período de aguardo para dirimir dúvidas no processo JOF 347/2022, a equipe de avaliadores foi autorizada à conclusão e assinatura das Notas Técnicas e Financeiras, NT 130/2022 (SEI 0346241), ocorrida em 27/04/2022. Em 27/04/2022 é disponibilizada no Portal JOF a NT 130/2022 (SEI 0346241).	
Elaboração e consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	Elaboração e Consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	SUDENE	Concluído	3-mar-22	9-mar-22		27-abr-22	5-mai-22		100	O Relatório Final é produzido a partir das informações constantes das Notas Tecnicas e Financeiras, já elaboradas. Aguarda-se reunião com o Pnud para esclarecimentos necessários às informações advindas da diligência efetuada. Reunião com o PNUD realizada em 31/04, com nova diligência encaminhada à Licitante, com prazo de resposta até 01/04/22. Em 04/04/22, foi compartilhado o resultado da diligência efetuada. Em 11/04/22, é elaborada a 3ª versão da Nota técnica e financeira. Tendo em vista diligências necessárias junto à Licitante do processo JOF 3477, aguarda-se o resultado para definição quanto ao andamento da Nota desta contratação. Após várias diligências, foram finalizadas as Notas Técnica e Financeira SEI 0344489, NT 130/2022, Processo 59336.001159/2022-16. Em 27/04/22, a JOF/PNUD iniciou a elaboração do Relatório Final sobre a licitação, tendo sido disponibilizado à Sudene através do Portal da JOF/PNUD em 05/05/2022 (SEI 0348844). A fase seguinte se refere à homologação e a Sudene aguarda o encaminhamento do Modelo para iniciar a elaboração do documento de homologação. Foi identificada informação incorreta no Relatório Final e foi encaminhado e-mail ao PNUD/JOF solicitando conserto e remessa de nova versão SEI (0350221). O Relatório Final ajustado foi remetido em 11/05/2022 (SEI 0350492 e SEI 0350499).	Foi encaminhado e-mail ao PNUD/JOF solicitando conserto e remessa de nova versão SEI (0350221). O Relatório Final ajustado foi remetido em 11/05/2022 (SEI 0350492 e SEI 0350499).
Homologação do Resultado do Certame	Homologação do Resultado do Certame	JOF	Concluído	10-mar-22	11-mar-22		9-mai-22	14-mai-22		100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. A jof encaminhou os modelos de homologação do Resultado final do certame em 06/05/22, que serão utilizados tanto para produção do Ofício de homologação para o estudo calçadista quanto para o estudo Têxtil/confecções (SEI 0349275, 0349276, 0349277, 0349278, 0349371). Processo 59336.001159/2022-16. Inserido no Portal JOF o ofício de homologação assinado pelo Superintendente (SEI 0351273).	
Apreciação do processo licitatório e do resultado do certame	Submissão do processo para revisão do Comitê. Respostas aos questionamneots do JPRC e deliberação do JPRC.	SUDENE e JOF-BR/PNUD	Concluído	11-mar-22	22-mar-22		16-mai-22	6-jun-22		100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. O Processo foi submetido ao JPRC no dia 16/05/2022, o Joint Procurement Review Committee - JPRC é o Comitê que revisa os processos e encaminha para aprovação do DRR. Assim que recebermos o sinal verde do Comitê, vamos convocar o Consórcio classificado em primeiro lugar no certame para reunião de negociação. Em 06/06/2022, foi alterado o status da apreciação ao processo licitatório pelo JPRC, transcorridos 23 dias da submissão ao JPRC, ultrapassando 13 dias ao planejamento original, cuja previsão era de 10 dias. (SEI 0359233, 0359235, 0359268)	
Reunião de Negociação com a Licitante melhor classificada	Reunião de Negociação com a Licitante melhor classificada	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	25-mar-22	25-mar-22		10-jun-22	10-jun-22		100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Encontra-se em tratativas o dia para a reunião de negociação com a licitante melhor colocada (SEI 0359974). Conforme documentos SEI 0359974, 0360104 e 0360858, Processo 59336.001159/2022-16).	
Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante melhor classificada	Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante melhor classificada	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Atrasado	28-mar-22	29-mar-22		20-jun-22				Conforme SEI 0363799, 0363803), foi encaminhado documento com os esclarecimentos da Licitante melhor colocada com base nas condições explícitas constantes do Ofício de homologação1286 (SEI 0350940). Os documentos remetidos estão de posse dos técnicos para análise.	
Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato	Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato	JOF-BR/PNUD	Atrasado	30-mar-22	31-mar-22					0		
Assinatura do Contrato	Assinatura eletrônica do contrato via Docusing	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Atrasado	1-abr-22	11-abr-22					0		

Reunião de início do contrato	Reunião inaugural do projeto com discussão de cronograma, escopo dos produtos entre outros.	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Atrasado	11-abr-22	18-abr-22					0	Inserimos uma janela de uma semana entre a assinatura do contrato e a reunião inaugural do projeto por questões de agenda e organização de documentos, bases para o planejamento e etc.	
Elaboração e envio do Produto 1	Detalhamento Metodológico	Contratada	Atrasado	11-abr-22	11-mai-22					0		
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	Comissão Técnica - SUDENE	Atrasado	12-mai-22	25-mai-22					0		
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da contratada	Contratada	Atrasado	26-mai-22	6-jun-22					0		
Aprovação do Produto 1	Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto	Comissão Técnica - SUDENE	Atrasado	7-jun-22	20-jun-22					0		
Elaboração e envio do Produto 2	Identificação dos principais polos regionais do setor de Calçadista na área de atuação da Sudene	Contratada	Atrasado	11-abr-22	31-mai-22					0		
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	Comissão Técnica - SUDENE	Atrasado	1-jun-22	21-jun-22					0	Há um sombreamento entre a etapa de aprovação do Produto 1, após ajustes da Contratada, e a etapa de análise do Produto 2. Desta forma, foi extendido o prazo de análise em relação ao Produto 2.	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da contratada	Contratada	Atrasado	22-jun-22	1-jul-22					0		
Aprovação do Produto 2	Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto	Comissão Técnica - SUDENE	A Iniciar	4-jul-22	15-jul-22					0		
Elaboração e envio do Produto 3	Estudo de competitividade do setor Calçadista na área de atuação da Sudene	Contratada	Atrasado	11-abr-22	19-ago-22					0		
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	Comissão Técnica - SUDENE	A Iniciar	22-ago-22	2-set-22					0		
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da contratada	Contratada	A Iniciar	5-set-22	15-set-22					0		
Aprovação do Produto 3	Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto	Comissão Técnica - SUDENE	A Iniciar	16-set-22	29-set-22					0		
Elaboração e envio do Produto 4	Plano de ações estratégicas para desenvolvimento do setor Calçadista na área de atuação da Sudene	Contratada	Atrasado	11-abr-22	28-set-22					0		
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	Comissão Técnica - SUDENE	A Iniciar	30-set-22	14-out-22					0	O início da etapa de análise do Produto 4 coincide com a concidiria com a conclusão da etapa de aprovação do Produto 3, após os ajustes realizados pela Contratada. Por isso, foi extendido o prazo para a análise do Produto 4.	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da contratada	Contratada	A Iniciar	17-out-22	26-out-22					0		
Aprovação do Produto 4	Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto	Comissão Técnica - SUDENE	A Iniciar	27-out-22	11-nov-22					0		
Elaboração e envio do Produto 5	Resumo Executivo com os principais resultados do Estudo de Competitividade (Produto 3) e do Plano de Ações (Produto 4) para o desenvolvimento da cadeia Calçadista da área de atuação da Sudene	Contratada	Atrasado	11-abr-22	28-out-22					0		
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	Comissão Técnica - SUDENE	A Iniciar	31-out-22	28-nov-22					0	O início da etapa de análise do Produto 5 coincide com a concidiria com a conclusão da etapa de aprovação do Produto 4, após os ajustes realizados pela Contratada. Por isso, foi extendido o prazo para a análise do Produto 5.	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da contratada	Contratada	A Iniciar	29-nov-22	9-dez-22					0		
Aprovação do Produto 5	Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto	Comissão Técnica - SUDENE	A Iniciar	12-dez-22	23-dez-22					0		
Resumo Projeto			Atrasado									
						R$0,00			**R$0,00**	**59,3220339**		

CGEP 2021003 Estudo Têxtil

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do Projeto - apresentação da necessidade para a realização do projeto	Encaminhamento da demanda para os gestores e técnicos da Coordenação	COAE/CGEP	Concluído	23-fev-21	23-fev-21		23-fev-21	23-fev-21		100	Em 23/02 (SEI 0265143) foi realizada reunião com a Prefeitura de Caruaru, na qual se discutiu a necessidade de realizar um estudo sobre o Polo de Confecções da área de atuação da Sudene (ou para Caruaru e entorno).	
Levantamento de informações sobre o setor Têxtil/Confecções no Nordeste	Pesquisa sobre estudos e informações socioecômicas sobre o setor Têxtil/Confecções para a região Nordeste	COAE	Concluído	24-fev-21	9-mar-21		1-mar-21	18-mar-21		100	Adequações de agenda em função da priorização para a execução de outros projetos e atividades em curso na CGEP (Acompanhamento e análise de produtos relacionados à pesquisa Covid, Avaliações do FNE e dos Incentivos Fiscais, Planejamento Estratégico Institucional, capacitações, Trilha de Inteligência do PRDNE e etc), além da prospecção de novas parcerias para os estudos, como com a Confederação Nacional das Indústrias - CNI.	
Reunião interna COAE/CGEP	Apresentação das informações iniciais identificadas e definição por contratação de um estudo	COAE/CGEP	Concluído	9-mar-21	9-mar-21		9-mar-21	9-mar-21		100		
Reunião com a Prefeitura de Caruaru	Contribuições para a elaboração do diagnóstico sobre o setor Têxtil/Confecções	COAE/CGEP e Prefeitura de Caruaru	Concluído	10-mar-21	10-mar-21		19-mar-21	19-mar-21		100		
Elabroração de relatório inicial sobre o setor Têxtil/Confecções no Nordeste	Documento com análise técnica inicial sobre os dados econômicos relacionados ao setor Têxtil/Confecções do Nordeste (emprego, produção, comércio exterior e etc)	COAE/CGEP	Concluído	15-mar-21	19-mar-21		22-mar-21	26-mar-21		100		
Reunião interna COAE/CGEP	Apresentação dos dados e informações trabalhos e definição dos direcionamentos para a contratação do estudo	COAE/CGEP	Concluído	26-mar-21	26-mar-21		19-abr-21	19-abr-21		100		
Pesquisa e análise de dados e documentos para subsidiar a elaboração de Termo de Referência (TR)	Levantamento e análise de dados econômicos, estudos, diagnósticos sobre o setor Têxtil/Confecções nos estados da área de atuação da Sudene	COAE/CGEP	Concluído	3-mai-21	31-mai-21		17-mai-21	28-mai-21		100	Em paralelo ao desenvolvimento das atividades para elaboração de documentos para a contratação do estudo sobre o setor Têxtil/Confecções, a equipe técnica estava envolvida em atividades relacionadas à elaboração de Termo de Referência para o monitoramento do PRDNE, às avaliações do FNE, às análises do Produto 15 da Trilha de Inteligência, à apreciação do Relatório de Resultados e Impactos do FNE, à Pesquisa sobre os efeitos da Covid-19, às Avaliações de Políticas em parceria com a UFC (TED 14/2020) e a UFPE (TED 17/2020), ao Projeto de Bacias Hidrográficas, ao Planejamento Estratégico Institucional, entre outros. Como resultado, seguiu-se com a realocação de esforços da equipe técnica e, consequentemente, interrupção da dedicação ao presente projeto, ao passo que a gestão deu sequência às tratativas internas acerca das questões orçamentárias e planejamento da execução para a referida contratação.	
Elaboração de proposta de escopo para contratação de estudo sobre o setor Têxtil/Confecções	Elaboração do escopo, objetivos e descrição das prinicipais etapas/produtos relacionados ao Projeto	COAE/CGEP	Concluído	3-mai-21	31-mai-21		17-mai-21	28-mai-21		100		
Tratativas com o PNUD para apoio na contratação do estudo sobre o setor Têxtil/Confecções	Tratativas junto ao PNUD para viabilização da contratação do estudo e plano estratégico para o setor Têxtil/Confecções por meio da portal do Joint Operations Facility Brasil (JOF/BR)	CGEP e PNUD	Concluído	1-jun-21	30-jun-21		1-jun-21	2-jul-21		100		

Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre o setor Têxtil/Confecções	Elaboração da 1ª versão do TR para contratação de estudo sobre o setor Têxtil/Confecções e adequações ao Template	COAE/CGEP	Concluído	1-jun-21	30-jun-21		1-jun-21	2-jul-21		100		
Apreciação da 1ª versão do TR pela Coordenação-Geral e PNUD	Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do PNUD.	CGEP e PNUD	Concluído	1-jul-21	7-jul-21		2-jul-21	20-jul-21		100		
Ajustes na 1ª versão do TR	Respostas aos questionamentos, sugestões recebidas, adequações da minuta inicial do TR e envio para os coordenadores da COAE e da CGEP	COAE/CGEP	Concluído	8-jul-21	12-jul-21		20-jul-21	28-jul-21		100	Em 22/07/2021 foi encaminhada versão ajustada da minuta de TR para a Coordenação. Em 27/07/2021, os coordenadores da COAE e CGEP fizeram novas considerações no documento. Seguidos os novos ajustes, a nova versão do TR foi encaminhada para a Coordenação no dia 28/07/2021, que, por sua vez, remeteu ao PNUD na mesma data.	
Estimativa de preços e elaboração da memória de cálculo	Consulta de preços para estimar os custos do projeto e elaboração da memória de cálculo.	COAE/CGEP	Concluído	30-jul-21	31-ago-21		30-ago-21	16-set-21		100	Após envio da nova versão revisada da minuta do TR que foi encaminhada para o PNUD no dia 28/07/2021, foi encaminhado pelo parceiro modelo para elaboração de memória de cálculo para precificação do projeto no dia 30/07. Ao longo do mês de agosto foram solicitados novos ajustes na Minuta do TR para os estudos sobre o setor Têxtil/Confecções, bem como, em relação ao TR para os estudos sobre o setor Calçadista e TR para as avaliações sobre os incentivos fiscais da Sudene, que foram encaminhadas em 13/08/21 para a Coordenação-Geral da CGEP.	
Apreciação da minuta de TR e da memória de cálculo pela Coordenação-Geral e PNUD	Apreciação e sugestão de ajustes e melhorias no documento por parte dos coordenadores da COAE, da CGEP e da equipe do PNUD.	CGEP e PNUD	Concluído	1-set-21	7-set-21		17-set-21	22-set-21		100		
Elaboração de versão final do TR	Elaboração de versão final do TR e envio para a Coordenação-Geral, após a apreciação anterior dos coordenadores da COAE e CGEP e do PNUD.	COAE/CGEP	Concluído	8-set-21	14-set-21		22-set-21	23-set-21		100	Após envio da nova versão revisada da minuta do TR que foi encaminhada para o PNUD no dia 28/07/2021, foi enviado pelo parceiro modelo para elaboração de memória de cálculo para precificação do projeto no dia 30/07. Ao longo do mês de agosto foram solicitados novos ajustes na Minuta do TR para os estudos sobre o setor Têxtil e de Confecções, bem como, em relação ao TR para os estudos sobre o setor Calçadista e ao TR para as avaliações sobre os incentivos fiscais da Sudene, todos estes formatados para contratação em parceria com o PNUD. A versão revisada desses TRs foi encaminhada para a Coordenação-Geral da CGEP, em 13/08/21. Após apreciação da gestão da CGEP e do PNUD, a equipe técnica da COAE/CGEP realizou novos ajustes nos documentos tanto no mês de agosto quanto em setembro. Acerca da estimativa de preços do projeto, pesquisa e análise de documentos adicionais foram necessárias para a elaboração da memória de cálculo, assim como discussões junto aos Coordenadores da COAE e CGEP e à equipe do PNUD para tratar sobre dúvidas e contribuições. A versão final do documento foi encaminhada para a CGEP em 23/09/21, que remeteu ao PNUD na mesma data.	
Apreciação e envio da versão final do TR para o PNUD	Apreciação e envio de versão final do TR e da memória de cálculo para o PNUD pela Coordenação-Geral da CGEP	CGEP	Concluído	15-set-21	20-set-21		23-set-21	23-set-21		100		
Apreciação da versão final do TR pelo PNUD	Apreciação da versão final do TR pelo PNUD	PNUD	Concluído	21-set-21	24-set-21		24-set-21	27-out-21		100		
Elaboração de Nota Técnica com justificativa para a contratação do estudo	Elaboração de Nota Técnica com justificativa a contratação do estudo no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Sudene/PNUD BRA 17/019, nos termos do Decreto nº 5.151/2004, e envio da análise técnica e documentos relacionados para apreciação da DPLAN	COAE/CGEP	Concluído	27-set-21	29-set-21		1-nov-21	3-nov-21		100	Concluída a elaboração do TR e memória de cálculo, após sucessivas revisões e ajustes, articulações internas acerca dos trâmites administrativos, financeiros e orçamentários foram necessárias para viabilizar a aprovação e execução do projeto no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Sudene/PNUD BRA 17/019	
Apreciação por parte da DPLAN	Apreciação e aprovação da proposta por parte da DPLAN e encaminhamentos relacionados para a Diretoria de Administração - DAD e Gabinete da Superintendência	DPLAN/SUDENE	Concluído	30-set-21	6-out-21		4-nov-21	4-nov-21		100		
Apreciação por parte da DAD	Apreciação por parte da DAD/Sudene e encaminhamentos relacionados	DAD/SUDENE	Concluído	7-out-21	15-out-21		5-nov-21	19-nov-21		100		
Apreciação por parte do Gabinete da Superintendência	Apreciação por parte do Gabinete/Sudene e encaminhamentos relacionados	Gabinete/SUDENE	Concluído	7-out-21	15-out-21		5-nov-21	5-nov-21		100		
Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada	Elaboração de Minuta de Voto à Diretoria Colegiada	CGEP	Concluído	18-out-21	18-out-21		9-nov-21	9-nov-21		100		
Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada	Aprovação do Projeto em Diretoria Colegiada	Diretoria Colegiada	Concluído	18-out-21	26-out-21		9-nov-21	10-nov-21		100		
Definição da comissão técnica para avaliação das propostas	Tratativas junto à DPLAN, DFIN, CGGI, Gabinete e DAD para formação de uma comissão técnica para avaliação das propostas juntamente com técnicos da CGEP	Gabinete/SUDENE	Concluído	26-out-21	5-nov-21		10-nov-21	19-nov-21		100		
Publicação de Portaria com a instituição de comissão técnica para avaliação das propostas	Elaboração e Publicação de Portaria Interna da Sudene com a instituição de comissão técnica para a avaliação das propostas para contratação de Consultoria (Pessoa Jurídica) no âmbito do processo licitatório JOF-3477/2021	Gabinete/SUDENE	Concluído	8-nov-21	10-nov-21		19-nov-21	19-nov-21		100		
Reunião Prepatarória para o processo licitatório	Reunião Preparatória com a JOF/PNUD/SUDENE sobre o processo licitatório 3477/2021, que abordará todo o processo licitatório referente ao estudo sobre os polos têxteis e de confecções área de atuação da Sudene	Sudene e PNUD	Concluído	24-nov-21	24-nov-21		24-nov-21	24-nov-21		100		
Reunião Interna para alinhamento do Projeto	Reunião Interna com os gestores da COAE e CGEP e técnicos envolvidos para alinhamento sobre o Projeto	Sudene	Concluído	24-nov-21	24-nov-21		24-nov-21	24-nov-21		100		
Divulgação do Edital	Publicação do Edital 3477/2021 no eTendering e o Aviso de Edital publicado no Portal da JOF	JOF-BR/PNUD	Concluído	25-nov-21	25-nov-21		25-nov-21	25-nov-21		100		
Audiência prévia	Videoconferência com possíveis interessados para apresentar os objetivos do projeto e sanar possíveis dúvidas.	Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	10-dez-21	10-dez-21		16-dez-21	16-dez-21		100	Publicação de errata do Edital 3477/2021 e ampliação do prazo para realização da audiência prévia.	
Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	Recebimento de questionamentos referentes à audiência prévia	CGEP e JOF-BR/PNUD	Concluído	10-dez-21	15-dez-21		16-dez-21	20-dez-21		100		
Repostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	Respostas aos questionamentos relativos à audiência prévia	CGEP e JOF-BR/PNUD	Concluído	15-dez-21	17-dez-21		20-dez-21	21-dez-21		100		
Recebimento das propostas	Recebimento das propostas (técnica e financeira)	JOF-BR/PNUD e Sudene	Concluído	25-nov-21	7-jan-21		25-nov-21	7-jan-22		100	O edital previa o recebimento das propostas pela JOF-BR/PNUD até 07/01/2022. A disponibilização das propostas à Sudene ocorreu em 13/01/2022	

Análise das Propostas Técnicas - 1ª fase de avaliação	Análise das propostas propostas técnicas e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação - Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	17-jan-22	4-fev-22		17-jan-22	16-mar-22		100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Em 25/02 a equipe de avaliadores finalizou a análise das propostas recebidas. A proposta foi encaminhada ao PNUD em 25/02 /22 para apreciação. Em 04 /03 o Pnud compartilha a Nota Técnica formulada pela equipe avaliadora, com notas de revisão. Em 16/03/22, após retorno de férias de um dos avaliadores, é concluída a nova Nota Técnica pela equipe e seu resultado é inserido na plataforma JOF.	
Recepção e análise dos Pedidos de Reconsiderações	Recepção e análise dos pedidos de reconsiderações de resultados enviados pelas licitantes	JOF-BR/PNUD, SUDENE e Consultor Técnico	Concluído	7-fev-22	17-fev-22		31-mar-22	1-abr-22		100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Em 01/04/22, foi comunicado através do Portal da JOF que não foram recebidos pedidos de reconsideração até o dia 31/03/22. Foram solicitadas as senhas aos licitantes para abertura das propostas comerciais, em 01/04/22.	
Comunicação do resultado da análise das propostas técnicas às licitantes	Comunicação do resultado da primeira fase da avaliação às licitantes	JOF-BR/PNUD	Concluído	7-fev-22	7-fev-22		25-mar-22	25-mar-22		100	Em 25/03/22 foi lançada mensagem no portal JOF informando que as notas das licitantes foram informadas, com prazo de manifestação até o dia 31/03/22.	
Análise das Propostas Comercias - 2ª fase de avaliação	Análise das propostas propostas comerciais/financeiras e emissão de parecer técnico	Comissão de Avaliação - Sudene e JOF-BR/PNUD	Concluído	18-fev-22	25-fev-22		4-abr-22	26-abr-22		100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. As senhas das propostas comerciais foram recebidas e compartilhadas com a Comissão de avaliação. Em 06/04/22 são encaminhados à JOF/PNUD pedido de esclarecimentos aos modelos de documentos e instruções encaminhados. Em 11/04 a equipe de avaliadores encaminharam a 1ª versão da Nota técnica sobre as propostas financeiras e encaminha a Matriz de riscos. Em 13/04/22 são encaminhados questionamentos ao PNUD/JOF. Reunião de esclarecimento é feita entre Sudene e PNUD, em 13/04/22. 1ª Diligência é encaminhada em 14/04/22, com prazo de resposta até 18/04/22. Em 18/04/2022 a JOF compartilha com a equipe de avaliadores o resultado da diligência efetuada, com as respostas da licitante. Em 22/04/2022 as minutas de nota técnica são encaminhadas à JOF para apreciação. Em 25/04 a JOF se posiciona positivamente à assinatura das NT. Em 26/05/2022 a equipe de avaliadores assinam a NT 133/2022 (SEI 0345548), disponibilizada à JOF, através da inserção de documentos no Portal JOF,, juntamente com a Matriz de Riscos, em 27/04/2022 (SEI 0346240).	
Elaboração e consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	Elaboração e Consolidação de Relatório Final - Processo de Avaliação	Sudene	Concluído	3-mar-22	9-mar-22		27-abr-22	9-mai-22		100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. As senhas das propostas comerciais foram recebidas e compartilhadas com a Comissão de avaliação. Em 06/04/22 são encaminhados à JOF/PNUD pedido de esclarecimentos aos modelos de documentos e instruções encaminhados. Em 11/04 a equipe de avaliadores encaminharam a 1ª versão da Nota técnica sobre as propostas financeiras e encaminha a Matriz de riscos. Em 13/04/22 são encaminhados questionamentos ao PNUD/JOF. Reunião de esclarecimento é feita entre Sudene e PNUD, em 13/04/22. 1ª Diligência é encaminhada em 14/04/22, com prazo de resposta até 18/04/22. Após várias diligências encaminhadas à Licitante, foi possível finalizar as Notas técnicas e financeiras pela equipe de avaliadores, entregues à JOF/PNUD em 26/04/2022. Em 27/04/22, a JOF/PNUD iniciou a elaboração do Relatório Final sobre a licitação, tendo sido disponibilizado à Sudene através do Portal da JOF/PNUD em 09/05/2022 (SEI 0349692). A fase seguinte se refere à homologação e a Sudene aguarda o encaminhamento do Modelo para iniciar a elaboração do documento de homologação.	
Homologação do Resultado do Certame	Homologação do Resultado do Certame	JOF	Concluído	10-mar-22	11-mar-22		10-mai-22	14-mai-22		100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. A jof encaminhou o modelo de homologação do Resultado final do certame em 06/05/22, que serão utilizados tanto para produção do Ofício de homologação para o estudo calçadista quanto para o estudo Têxtil/confecções (SEI 0349698, 034900, 0349705, 0349706, 0349799). Processo 59336.000584/2022-98. Devido à particularidades da licitação, em que o mesmo licitante resultou melhor colocado aos dois processos de contratação pelo PNUD, foram necessários vários esclarecimentos aos termos a serem postos no ofício de homologação, resultando em tempo maior que o previsto. Elaboração Despacho CGEP 0350784, 0350815, solicitando assinatura do Superintendente ao Ofício de homologação ao Processo JOF 3477/2021, Processo 59336.000584/2022-98. Inserido no Portal JOF o ofício de homologação assinado pelo Superintendente (SEI 0351272)	

Apreciação do processo licitatório e do resultado do certame	Submissão do processo para revisão do Comitê. Respostas aos questionamneots do JPRC e deliberação do JPRC.	SUDENE e JOF-BR/PNUD	Concluído	11-mar-22	22-mar-22		16-mai-22	6-jun-22		100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. O Processo foi submetido ao JPRC no dia 16/05/2022. o Joint Procurement Review Committee - JPRC é o Comitê que revisa os processos e encaminha para aprovação do DRR. Assim que recebermos o sinal verde do Comitê, vamos convocar o Consórcio classificado em primeiro lugar no certame para reunião de negociação. Em 06/06/2022, foi alterado o status da apreciação ao processo licitatório pelo JPRC, transcorridos 23 dias da submissão ao JPRC, ultrapassando 13 dias ao planejamento original, cuja previsão era de 10 dias. (SEI 0359236, 0359237, 0359269)	
Reunião de Negociação com a Licitante melhor classificada	Reunião de Negociação com a Licitante melhor classificada	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Concluído	25-mar-22	25-mar-22		10-jun-22	10-jun-22		100	Adequações do cronograma em razão do período de férias de parte dos servidores que integram a comissão de avaliação, bem como substituição de integrante da comissão de avaliação devido a uma nova demanda prioritária por parte da Superintendência. Estão em tratativas a reunião de negociação com a licitante melhor colocada (SEI 0359973). Conforme documentos SEI 0359973, 0360105 e 0360857).	
Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante melhor classificada	Consolidação dos encaminhamentos da reunião com a Licitante melhor classificada	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Atrasado	28-mar-22	29-mar-22		20-jun-22				Conforme SEI 0363793, 0363797, foi encaminhado documento com os esclarecimentos da Licitante melhor colocada com base nas condições explícitas constantes do Ofício de homologação1287 (SEI 0351042). Os documentos remetidos estão de posse dos técnicos para análise	
Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato	Adjudicação e elaboração de minuta de Contrato	JOF-BR/PNUD	Atrasado	30-mar-22	31-mar-22					0		
Assinatura do Contrato	Assinatura eletrônica do contrato via Docusing	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Atrasado	1-abr-22	11-abr-22					0		
Reunião de início do contrato	Reunião inaugural do projeto com discussão de cronograma, escopo dos produtos entre outros.	SUDENE, JOF-BR/PNUD e Licitante Vencedora	Atrasado	11-abr-22	18-abr-22					0	Inserimos uma janela de uma semana entre a assinatura do contrato e a reunião inaugural do projeto por questões de agenda e organização de documentos, bases para o planejamento e etc.	
Elaboração e envio do Produto 1	Detalhamento Metodológico	Contratada	Atrasado	11-abr-22	11-mai-22					0		
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	Comissão Técnica - SUDENE	Atrasado	12-mai-22	25-mai-22					0		
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da contratada	Contratada	Atrasado	26-mai-22	6-jun-22					0		
Aprovação do Produto 1	Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto	Comissão Técnica - SUDENE	Atrasado	7-jun-22	20-jun-22					0		
Elaboração e envio do Produto 2	Identificação dos principais polos regionais do setor Têxtil/Confecções na área de atuação da Sudene	Contratada	Atrasado	11-abr-22	31-mai-22					0		
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	Comissão Técnica - SUDENE	Atrasado	1-jun-22	21-jun-22					0	Há um sombreamento entre a etapa de aprovação do Produto 1, após ajustes da Contratada, e a etapa de análise do Produto 2. Desta forma, foi extendido o prazo de análise em relação ao Produto 2.	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da contratada	Contratada	Atrasado	22-jun-22	1-jul-22					0		
Aprovação do Produto 2	Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto	Comissão Técnica - SUDENE	A Iniciar	4-jul-22	15-jul-22					0		
Elaboração e envio do Produto 3	Estudo de competitividade do setor Têxtil/Confecções na área de atuação da Sudene	Contratada	Atrasado	11-abr-22	19-ago-22					0		
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	Comissão Técnica - SUDENE	A Iniciar	22-ago-22	2-set-22					0		
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da contratada	Contratada	A Iniciar	5-set-22	15-set-22					0		
Aprovação do Produto 3	Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto	Comissão Técnica - SUDENE	A Iniciar	16-set-22	29-set-22					0		
Elaboração e envio do Produto 4	Plano de ações estratégicas para desenvolvimento do setor Têxtil/Confecções na área de atuação da Sudene	Contratada	Atrasado	11-abr-22	28-set-22					0		
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	Comissão Técnica - SUDENE	A Iniciar	30-set-22	14-out-22					0		
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da contratada	Contratada	A Iniciar	17-out-22	26-out-22					0		
Aprovação do Produto 4	Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto	Comissão Técnica - SUDENE	A Iniciar	27-out-22	11-nov-22					0		
Elaboração e envio do Produto 5	Resumo Executivo com os principais resultados do Estudo de Competitividade (Produto 3) e do Plano de Ações (Produto 4) para o desenvolvimento das cadeias Têxtil e de Confecções da área de atuação da Sudene	Contratada	Atrasado	11-abr-22	28-out-22					0		
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	Comissão Técnica - SUDENE	A Iniciar	31-out-22	28-nov-22					0	Há um sombreamento entre a etapa de aprovação do Produto 4, após ajustes da Contratada, e a etapa de análise do Produto 5. Desta forma, foi extendido o prazo de análise em relação ao Produto 5.	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da contratada	Contratada	A Iniciar	29-nov-22	9-dez-22					0		
Aprovação do Produto 5	Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto	Comissão Técnica - SUDENE	A Iniciar	12-dez-22	23-dez-22					0		
Resumo Projeto			Atrasado									
						R$0,00			**R$0,00**	**63,49206349**		

CGEP 2021002 Apoio a PD&I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Encaminhamentos administrativos e tratativas para viabilização da celebração de ACTs não financeiros com FAPEs MA< PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA, MG, ES e SEBRAE/RN para apoio a editais de inovação de...		MCTI, FINEP, Sudene	Concluído	1-jun-20	15-out-21		1-jun-20	19-out-21		100		
Nota Técnica conjunta com proposta de critérios e prioridades ao Condel	Definição dos critérios para aplicação da parcela de 1,5% do retorno do FDNE destinados para custeio de atividades em pesquisa, desenvolvimento e tecnologia de interesse desenvolvimento regional.	CGCP, CGEP	Concluído	1-jun-20	12-jun-20		1-jun-20	12-jun-20		100		

Articulações com Parceiros (BNB, Confap, FINEP)	Proposta de parceria com o Programa Centelha	CGEP	Concluído	13-jun-20	30-out-20		13-jun-20	10-nov-20		100	Foi definido pelo superintendente que não se iria colocar no Regulamento a ser aprovado no Condel a questão da delegação de competências de acompanhamento e fiscalização para o BNB e que a questão de editais conjuntos seriam definidos a posteriori. Assim, foi considerada como última reunião de articulação a de 11/10/2020 e as demais etapas foram paralisadas. Além disso, em conversa com o BNB, este indicou a impossibilidade de realização de edital conjunto no 1o semestre de 2021.	Nova estratégia foi definida de forma a se estudar com a Procuradoria a custodia dos recursos pelo BNB nos termos estabelecidos para aplicação dos recursos com base no § 2º, art. 3º da MP 2.156-5, alterado pela Lei nº 13.682/2018, onde a custodia será operacionalizada pelo Banco do Nordeste S.A. e aplicado na forma regulamentada pelo Conselho Deliberativo.
Critérios e prioridades para aplicação de 1,5% do FDNE em projetos de P,D&I	Aprovação pelo Conselho Deliberativo da Sudene	CONDEL/SUDENE	Concluído	9-dez-20	9-dez-20		9-dez-20	9-dez-20		100	Resolução Condel nº 140, de 09/12/2020, disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-condel/sudene-n-140-de-9-de-dezembro-de-2020-296161700	
Regulamento para a gestão contábil e financeira do 1,5% proveniente do retorno das operações do FDNE para aplicação em projetos de P,D&I.	Aprovação pelo Conselho Deliberativo da Sudene	CONDEL/SUDENE	Concluído	9-dez-20	9-dez-20		9-dez-20	9-dez-20		100	Resolução Condel nº 141, de 09/12/2020, disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-condel/sudene-n-141-de-9-de-dezembro-de-2020-296154469	
Manifestações das áreas técnicas da CGEP/DPLAN, CGDF/DFIN, BNB, bem como, posicionamentos jurídicos da Sudene destinados à viabilização da gestão orçamentária e financeira para aplicação de 1,5% do...		CGEP/DPLAN, CGDF/DFIN	Concluído	13-mai-20	9-jun-21		13-mai-20	29-jun-21		100	Os encaminhamentos aqui tratadose documentos vinculados encontram-se nos Processos SEI 59336.000587/2020-60, 000846/2020-52, 001082/2020-29, 002219/2020-56 e 002148/2020-64.	
Assinatura do contrato de Custódia com o BNB.		GAB/Sudene e GAB/BNB	Concluído	30-jun-21	30-jun-21		30-jun-21	30-jun-21		100	Regula direitos e obrigações tanto para a Sudene como para o BNB na gestão orçamentária, contábil e financeira pelas partes.	Assinado o contrato de Custória Sudene-FDNE nº 3/2021, entre a Sudene e o BNB, em 30/06/2021.
Retomada das tratativas com as Fundações de Amparo à Pesquisa dos estados da área da Sudene para utilização do modelo do Programa Centelha II da FINEP, com a Sudene participando por meio de Acordo ...		Coord. Geral da CGEP. Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN, GAB/Sudene, FAPEs e SEBRAE/RN	Concluído	2-jun-21	15-out-21		2-jun-21	19-out-21		100		
Elaboração e celebração de ACT e Plano de Trabalho entre a Sudene e a FAPE Alagoas para servir de padrão entre as demais fundações e SEBRAE/RN		FAPEs, SEBRAE/RN, Coord. Geral da CGEP. Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN	Concluído	2-jun-21	7-jan-22		2-jun-21	28-dez-21		100		
Articulação com MCTI, FINEP, FAPEs para alinhamento da participação da Sudene por meio de ACT com as FAPEs MA, PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA, MG, ES e SEBRAE-RN, via Programa Centelha II da FINEP		Coord. Geral da CGEP. Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN, GAB/Sudene, FAPEs e SEBRAE/RN	Concluído	2-jun-21	15-out-21		2-jun-21	21-out-21		100	Reuniões com o MCTI dia 02/06/21; FINEP, 20/08 e 19/10/21; FAPEs, 29/06, 09 e 19/07, 24/08/21; SEBRA/RN, 01 e 23/09/21 para alinhamentos institucionais e operacionais visando a participação da Sudene no Programa Centelha II da FINEP.	
Apresentação de proposta FAPE Alagoas de Acordo de Cooperação Técnica e Plano de Trabalho para padronização junto a outras FAPEs e SEBRAE/RN para participação da Sudene nos editais do Programa Cent...		Coord. Geral da CGEP. Coordenador da COTI/CGEP e FAPE AL	Concluído	21-out-21	21-out-21		21-out-21	21-out-21		100	Encaminhamento de documentação feito pela FAPE-AL via e-mail de 21/10/2021 (Atos de constituição da entidade, de designação do titular, e propostas de ACT e Plano de Trabalho para fins de análise técnica e jurídica pela Sudene.	
Análise pela COTI/CGEP, das propostas de ACT e Plano de Trabalho e preparação de Nota Técnica		Coordenador da COTI/CGEP	Concluído	21-out-21	22-out-21		22-out-21	22-out-21		100	Emitida a Nota Técnica COTI/CGEP/DPLAN nº 233/2021 para subsidiar análise da PRD Sudene. Processo 59336.002353/2021-38.	
Encaminhamento de consulta à Procuradoria Jurídica da Sudene sobre a minuta de ACT e PT da FAPE-Al para fins de padronização junto às demais FAPEs e SEBRAE/RN.	Aqui cabem possíveis observações/esclarecimentos ou solicitações de documentos pela Procuradoria da Sudene para melhor instruir o processo 59336.0023532021-38, no que tange à análise da minuta de ACT e PT a ser padronizado, caso se faça necessário.	Coordenador da COTI/CGEP	Concluído	25-out-21	17-nov-21		22-out-21	12-nov-21		100	Emitido o Parecer nº 00229/2021/GAB/PFSUDENE/PGF/AGU de 111/11/2021 com recomendações de ajuste ao texto do ACT. O Plano de Trabalho, segundo o Procurador Diogo Moraes, não requereu recomendações. Posição retransmitida pelo Diretor da DPLAN à CGEP via Despacho SEI 0292727 em 12/11/2021.	Todas as recomendações foram incorporadas ao texto do ACT pela COTI/CGEP em 12/11/2021 e novo texto disponibilizado ao Coordenador-Geral da CGEP em 12/11/2021 via Despacho CGEP SEI 0292920 de 12/11/2021, para remessa à FAPEAL como ACT padronizável.
Remessa das observações da Procuradoria Sudene à FAPEAL para avaliação.		Coord-Geral da CGEP	Concluído	18-nov-21	18-nov-21		12-nov-21	16-nov-21		100	Encaminhamento à FAPEAL realizado pelo Coordenador-Geral da CGEP, Marcos Falcão, via e-mail de 16/11/2021 e por whatsapp.	
Retorno da FAPEAL sobre correções apresentadas pela Procuradoria da Sudene		FAPEAL	Concluído	19-nov-21	3-dez-21		16-nov-21	1-dez-21		100	Verificado que a proposta já foi compartilhada pelo Sr. João Vicente da FAPEAL para as demais Fundações de Amparo à Pesquisa dos estados da área da Sudene conforme observado no Grupo de Whatsapp: "GT Conv. SUDENE FAPs", porém, propostas apresentadas pela FAPE-BA e FAPE -ES mostraram não conformidades gritantes ao que foi convencionado como padrão.	
Reunião de alinhamento COTI/CGEP/SUDENE com todas as FAPEs para orientação e produção de ACT padrão e PT que servirá como espelho para todas aas Fundações		Coordenador de COTI	Concluído	1-dez-21	1-dez-21		1-dez-21	1-dez-21		100	Realizada reunião em 01/12/21 com todas as FAPEs para novo alinhamento de orientação e nova padronização de ACT e PT que servirá a todas as demais FAPEs, tendo em vista que a FAPEAL reconheceu falha na comunicação com os seus pares, o que levou à apresentação à Sudene, de propostas da BA e ES, dissonantes do padrão estabelecido pois a esperada articulação não ocorreu com a eficiência esperada.	A FAPEAL, ponto focal entre as demais FAPEs, reconheceu falhas no processo de comunicação entre si e se comprometeu a articular com cada entidade uma proposta de ACT que contenha e represente direiros e obrigações comuns, inclusive com leitura do jurídico, para nova análise da equipe técnica da COTI/CGEP e da Procuradoria, de forma a se ter um ACT e PT padrão para todas as entidades, como se almeja.
Encaminhamento de nova minuta de ACT e PT pela FAPEAL que servirá como padrão para todas as Fundações de Amparo à Pesquisa da área da Sudene.		FAPEAL	Concluído	3-dez-21	3-dez-21		3-dez-21	3-dez-21		100		Nova versão de ACT e PT foi encaminhada pela FAPEAL por e-mail de 03/12/2021 como documento definitivo, para análise da Sudene.
Análise pela COTI/CGEP, das propostas de ACT e Plano de Trabalho para fins de padronização		COTI/CGEP	Concluído	3-dez-21	14-dez-21		3-dez-21	14-dez-21		100		
Posicionamento da Procuradoria da Sudene sobre a nova minuta de ACT e PT FAPEAL para padronização		PRD Sudene	Concluído	14-dez-21	22-dez-21		14-dez-21	22-dez-21		100		Em 22/12/2021 a proposta de ACT e PT foi normalizada pela COTI/CGEP e encaminhada à FAPEAL para validação. No mesmo dia a FAPEAL retornou por e-mail informando acatamento dos ajustes recomendados pela Procuradoria. Com isso, os documentos se mostraram habilitados à apreciação pela Diretoria Colegiada da Sudene.
Encaminhamento da proposta de ACT e PT da FAPEAL à Diretoria Colegiada para apreciação e deliberação		Coordenação-Geral da CGEP	Concluído	22-dez-21	23-dez-21		22-dez-21	23-dez-21		100	Com base na validação do ACT e PT, em 22/12/2021, a COTI/CGEP adequou a versão de ACT e PT ao modelo SEI, preparando ainda, a minuta de voto para encaminhamento ao Diretor da DPLAN, o extrato de publicação do ato e o Despacho ao Coordenador-Geral da CGEP, para envio desses documentos ao Diretor da DPLAN.	Em 23/12/2021 o Coordenador-Geral da CGEP e o Diretor da DPLAN enviaram seus Despachos para o Gabinete do Superintendente visando apreciação do assunto na próxima reunião da Diretoria Colegiada.
Apreciação e deliberação do ACT e PT da FAPEAL pela Diretoria Colegiada		Diretoria Colegiada da Sudene	Concluído	23-dez-21	31-dez-21		27-dez-21	27-dez-21		100	Proposta de ACT/PT FAPEAL aprovada na 409ª reunião da Diretoria Colegiada realizada em 27/12/2021	Esse ACT servirá como padrão para os de outras fundações de Amparo à Pesquisa.

Assinatura de ACT (incluso PT) pelo Superintendente da Sudene e Presidente da FAPEAL	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	23-dez-21	31-dez-21		23-dez-21	28-dez-21		100	Inclue a tramitação da documentação no Gabinete da Sudene até à celebração do ato.	
Publicação do ACT FAPEAL padronizável (incluso PT) no DOU		ASCOM/GAB/SUDENE	Concluído	31-dez-21	7-jan-22		30-dez-21	30-dez-21		100		
Celebração de ACTs (incluso PTs) entre a Sudene e as FAPEs MA, PI, CE, PB, PE, SE, BA, MG, ES e SEBRAE/RN com base no ACT padronizado FAPEAL		FAPEs, SEBRAE/RN, Coord. Geral da CGEP. Coordenador da COTI/CGEP, Diretoria DPLAN e Superintendente	Em Andamento	3-jan-22	30-set-22		30-dez-21			70	Celebrados ACTs PB, PE, SE, BA e MG (até 06/06/2022)	Repactuar datas previstas de término para 30/09/2022 de forma manter a lógica com a data prevista de térimno das apreciações e celebrações de ACTs, item que foi repactuado.
Envio à Sudene, dos 10 ACTs e respectivos Planos de Trabalho, juntamente com os atos de constituição de cada FAPE e SEBRAE/RN e atos de designação do titular, além de documentos para assinatura usu...		FAPEs e SEBRAE/RN	Em Andamento	3-jan-22	30-set-22		29-dez-21			80	Não inclui o ACT e PT da FAPEAL, tratado no bloco anterior por se destinar a servir de padronização para os das demais fundações de amparo à pesquisa	Repactuar datas previstas de término para 30/09/2022 de forma manter a lógica com a data prevista de térimno das apreciações e celebrações de ACTs, item que foi repactuado.
Análise técnica e jurídica de 10 ACTs e respectivos PTs (9 FAPEs e SEBRAE/RN) face ao ACT e PT padronizados da FAPEAL	Conferência de cada ACT e PT com o modelo de documento padronizado, e análise jurídica de cada ato.	Equipe da COTI/CGEP e Procuradoria da Sudene	Em Andamento	3-jan-22	30-set-22		30-dez-21			75	Inclui verificação de compatibilidade com o ACT e PT padronizado da FAPEAL, possíveis ajustes e tratativas com o interessado, posicionamento da Procuradoria da Sudene, e encaminhamentos internos da Sudene até a celebração.	Repactuar datas previstas de término para 30/09/2022 de forma manter a lógica com a data prevista de térimno das apreciações e celebrações de ACTs, item que foi repactuado.
Apreciação e deliberação sobre os 10 ACTs e respectivos PTs (FAPEs MA, PI, CE, PB, PE, SE, BA, MG e ES, e SEBRAE/RN) pela Diretoria Colegiada da Sudene		Diretoria Colegiada	Em Andamento	24-fev-22	30-set-22		24-fev-22			70	Deliberações da Diretoria Colegiada até 06/06/2022 (PB, PE, SE, BA MG)	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE MA	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	4-fev-22	30-set-22		4-fev-22	16-jun-22		100	Envolve todas as etapas precedentes.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE PI	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	3-jan-22	30-set-22		29-dez-21	20-jun-22		100	Envolve todas as etapas precedentes.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE CE	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Em Andamento	8-mar-22	30-set-22		8-mar-22			36	Processo enviado pelo Diretor da DPLAN à Procuradoria para análise da proposta de ACT.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE PB	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	3-jan-22	30-jun-22		10-jan-22	29-abr-22		100	Envolve todas as etapas precedentes.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE PE	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	15-fev-22	30-jun-22		15-fev-22	6-jun-22		100	Envolve todas as etapas precedentes.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE SE	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	11-fev-22	30-jun-22		11-fev-22	2-jun-22		100	Envolve todas as etapas precedentes.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE BA	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	3-jan-22	30-jun-22		24-fev-22	29-abr-22		100	Envolve todas as etapas precedentes. Proposta de ACT encontra-se no Gabinete para apreciação da Diretoria Colegiada.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE MG	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Concluído	3-jan-22	30-jun-22		1-dez-21	2-jun-22		100	Envolve todas as etapas precedentes.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente de FAPE ES	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente da FAPE	Em Andamento	3-jan-22	30-set-22		29-nov-21			19	Envolve todas as etapas precedentes.	
Assinatura de ACT pelo Superintendente da Sudene e Presidente do SEBRAE/RN	Formalização do ato de cooperação.	Superintendente da Sudene e Presidente do SEBRAE/RN	Em Andamento	1-jul-22	30-set-22		15-fev-22			4	O SEBRAE/RN foi novamente acionado em 21/06/22 para envio de sua proposta de ACT.	
Publicação de 10 ACTs (incluso PTs) no DOU	Publicização oficial	GAB/Sudene e ASCOM	Em Andamento	3-mai-22	30-set-22		3-mai-22			70		
Encaminhamento de correspondência a cada FAPE e SEBRAE de cópia do ACT para publicação no DO do estado, quando couber	Publicização oficial no DO do estado de cada entidade de amparo à Pesquisa.	GAB Sudene	Em Andamento	3-jan-22	30-set-22		30-dez-21			73	As FAPES farão publicar no Diário Oficial de seu respectivo estado, extrato co ACT e PT celebrado.	Em 30/12/21 foi enviado cópia do extrato à FAPEAL para publicação também no DOE.
Valor planejado/autorizado pelo Diretor da DPLAN (a ser disponibilizado no exercício) para aplicação em projetos de P,D&I (2022/2024)			Concluído	3-jan-22	30-jun-24		29-mar-22	30-mar-22		100	Trata-se da decisão da Diretoria de DPLAN, de anualmente disponibilizar fração dos recursos empenhados no BNB para aplicação em projetos de P&D, oriundos de 1,5% do retorno das operações do FDNE. Trata-se também, de denominador que entra no cálculo de indicador do PEI Sudene, no objetivo: Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação. (Orçamento 2020) Esse indicador é calculado percentualmente na razão: (Valor desembolsado ao beneficiário final / Valor planejado para P&D no exercício) * 100. O numerador é dado pela somatória dos recursos autorizados via Termos de Outorga para as empresas de P,D&I, informado pelo BNB. O denominador toma por base a previsão anual aprovada pelo Diretor da DPLAN ou Diretoria colegiada conforme aqui mencionado. (Orçamento 2020)	Esse indicador é calculado percentualmente na razão: (Valor desembolsado ao beneficiário final / Valor planejado para P&D no exercício) * 100. O numerador é dado pela somatória dos recursos autorizados via Termos de Outorga para as empresas de P,D&I, informado pelo BNB. O denominador toma por base a previsão anual aprovada pelo Diretor da DPLAN ou Diretoria colegiada conforme aqui mencionado.
Planejamento e aprovação de programação de recursos para P&D, destinado às entidades de amparo à pesquisa dos estados da área de atuação da Sudene, para os editais Sudene/Centelha II - exercício 2...	Estabelecimento, por parte da Diretoria da DPLAN, do montante a ser disponibilizado para aplicação em projetos de P&D no ano.	Diretor da DPLAN	Concluído	3-jan-22	30-jun-22		29-mar-22	30-mar-22		100	Trata-se da decisão da Diretoria de DPLAN, de anualmente disponibilizar fração dos recursos empenhados no BNB para aplicação em projetos de P&D, oriundos de 1,5% do retorno das operações do FDNE. Trata-se também, de denominador que entra no cálculo de indicador do PEI Sudene, no objetivo: Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação. (Orçamento 2020) Esse indicador é calculado percentualmente na razão: (Valor desembolsado ao beneficiário final / Valor planejado para P&D no exercício) * 100. O numerador é dado pela somatória dos recursos autorizados via Termos de Outorga para as empresas de P,D&I, informado pelo BNB. O denominador toma por base a previsão anual aprovada pelo Diretor da DPLAN ou Diretoria colegiada conforme aqui mencionado. (Orçamento 2020)	As FAPs dos estados do MA, PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA e SEBRAE/RN receberão cada, R$ 586.674,00. (R$ 53.334,00 x 11 cotas por FAPE), resultando no total de R$ 5.280.066,00. A FAPEMIG receberá seis cotas (arredondamento de 5,5 cotas originalmente estipuladas) no valor unitário de R$ 66.000,00, resultando no total de R$ 396.000,00. A FAPES receberá seis cotas (arredondamento de 5,5 cotas originalmente estipuladas) no valor unitário de R$ 60.000,00, resultando no total de R$ 360.000,00. O aporte total na forma de subvenção econômica somará R$ 6.036.066,00
Processo de acompanhamento da execução do ACT			Em Andamento	11-mai-22	30-dez-25		11-mai-22			1		
Apresentação de relatórios parciais pelas FAPES (MA, PI, CE, PB, PE, AL, SE, BA, MG e ES) e SEBRAE/RN sobre acompanhamento do ACT	Compromisso das FAPEs e SEBRAE/RN previsto no plano de trabalho do ACT.	FAPEs e SEBRAE/RN	A Iniciar	30-mar-23	30-dez-25					0		

Reuniões peiódicas de acompanhamento das medidas adotadas pelas FAPEs e SEBRAE/RN quanto à efetividade dos instrumentos previstos pelos ACTs e resultados alcançados (essencialmente sobre os editais)	Acompanhamento dos resultados e etapas do ACT, incluindo na pauta o andamento dos editais (inscrições, seleção, resultados, acompanhamento e fiscalização dos editais, emissão de relatórios, prestações de contas, dificuldades enfrentadas, desvios verificados, encaminhamentos administrativos extraordinários)	Sudene, FAPEs e SEBRAE/RN	Em Andamento	11-mai-22	30-dez-25		11-mai-22			1		
Reuniões peiódicas de acompanhamento das medidas adotadas pelas FAPEs e SEBRAE/RN quanto às decisões de gestão da Sudene	Reuniões periódicas para acompanhamento da execução do ACT, incluindo na pauta as decisões da Diretoria Colegiada da Sudene, ou decisões/demandas administrativas da Diretoria de Planejamento ou da Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas, Avaliação, Tecnologia e Inovação (CGEP/DPLAN), a exemplo de homologação de lista de projetos habilitados para recepção de apoio após seleção da FAPEAL, comunicação de crédito, de Termo de Outorga, de demandas do banco custodiador dos recursos (BNB), dificuldades encontradas)	Sudene	A Iniciar	30-mar-23	30-dez-25					0		
Relatórios finais de execução do ACT	Relatório final de execução do ACT, procedimentos de baixa de execução, outros encaminhamentos administrativos sobre o cumprimento dos objetivos do ACT para envio à Sudene	FAPEs e SEBRAE/RN	A Iniciar	31-jan-24	30-dez-25					0		
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$0,00			**R$0,00**	**80,41304348**		

CGEP 2020010 TED UFC

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	Concluído	4-dez-20	16-dez-20		4-dez-20	16-dez-20		100		
Analise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	17-dez-20	22-dez-20		17-dez-20	22-dez-20		100		
Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	COCIC	Concluído	16-dez-20	23-dez-20		16-dez-20	23-dez-20		100	A minuta do TED precisou ser alterada devido a aprovação do DECRETO Nº 10.426, DE 16 DE JULHO DE 2020. Foi necessário também alterar a minuta padrão de TED e de Plano de Trabalho	
Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / UFC	Concluído	23-dez-20	23-dez-20		23-dez-20	23-dez-20		100		
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	23-dez-20	28-dez-20		23-dez-20	28-dez-20		100		
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	Recursos liberados em parcela única	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	31-dez-20	31-dez-20	R$480.600,00	28-dez-20	28-dez-20	R$480.600,00	100		
Meta 2: Educação Infantil: Oferta, Demanda e as Medidas de Qualidade da Educação Infantil	Produto 1: Relatório contendo estudo sobre as Metas do PNE para educação Infantil (matrículas em creche e pré escola) por Unidades da Federação	UFC	Concluído	1-jan-21	30-abr-21		1-jan-21	29-abr-21		100	No dia 04 de março de 2021 foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. O Produto 1 da Meta 2 foi encaminhado à Coordenação dentro do previsto, cujo prazo limite acordado era 30 de abril de 2021.	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	Concluído	18-out-21	29-out-21		6-out-21	19-out-21		100	Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por orientações da Coordenação, a análise desse Produto foi postergada. A data limite acordada para conclusão da análise técnica é o dia 30/07/2021 (Despacho SEI 0251383) Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização da análise foi redefinido para 29/10/2021	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	Concluído	30-out-21	14-nov-21		1-dez-21	30-dez-21		100	Conforme acordado com a gestão da COAE/CGEP, a segunda versão do Produto 1 da Meta 2 (SEI 0311526) foi encaminhada pela UFC no dia 30/12/2021.	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	Concluído	15-nov-21	29-nov-21		3-mar-22	9-mar-22		100	Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado com a gestão da COEA/CGEP (SEI 0326132), a análise da versão revisada do Produto 1 da Meta 1 foi programada para 25/02/2022. Contudo, prazo adicional foi necessário para essa nova apreciação, em razão priorização das atividades do TED 004/2021 com a UFC e das etapas de análise para contratação consultoria para realização de Estudo e Plano de Ações para os Polos Têxtil e de Confecções. A apreciação final do Produto do TED com a UFC foi efetivada por meio do Parecer Técnico 63 (0332400), no dia 09/03/2022.	
Meta 1: Avaliar os impactos da Cota-Parte Municipal do ICMS na Educação	Produto 1: Relatório contendo estudo sobre as legislações das Unidades da Federação (Estados e Distrito Federal) sobro o modelo de repartição da cota parte do ICMS com os municípios.	UFC	Concluído	1-jan-21	30-mai-21		1-jan-21	29-abr-21		100	No dia 04 de março de 2021 foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. O Produto 1 da Meta 1 foi encaminhado à Coordenação cerca de um mês antes do previsto, cujo prazo limite acordado era 31 de maio de 2021.	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	Concluído	4-out-21	15-out-21		15-out-21	29-out-21		100	Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por orientações da Coordenação, a análise desse Produto foi postergada. A data limite acordada para conclusão da análise técnica é o dia 30/07/2021 (Despacho SEI 0251383) Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização da análise foi redefinido para 15/10/2021	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	Concluído	16-out-21	31-out-21		1-dez-21	30-dez-21		100	Conforme acordado com a gestão da COAE/CGEP, a segunda versão do Produto 1 da Meta 2 (SEI 0311526) foi encaminhada pela UFC no dia 30/12/2021.	

Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	Concluído	1-nov-21	15-nov-21		14-fev-22	18-fev-22		100	Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado com a gestão da COEA/CGEP (SEI 0326132), a análise da versão revisada do Produto 1 da Meta 1 foi programada para 25/02/2022. Contudo, prazo adicional foi necessário para essa nova apreciação, em razão priorização das atividades do TED 004/2021 com a UFC e das etapas de análise para contratação consultoria para realização de Estudo e Plano de Ações para os Polos Têxtil e de Confecções. A apreciação final do Produto do TED com a UFC foi efetivada por meio do Parecer Técnico 63 (0332400), no dia 09/03/2022.	
Meta 3: Nordeste Pacífico: Perda de Capital humano e econômica no Brasil a partir dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI)	Produto 1: Relatório contendo a identificação/descrição do perfil das vítimas de CVLI para o Brasil com foco nos estados do Nordeste	UFC	Concluído	1-jan-21	31-mai-21		1-jan-21	31-mai-21		100	No dia 04 de março de 2021 foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. O Produto 1 da Meta 3 foi encaminhado à Coordenação dentro do previsto, cujo prazo limite acordado era 31 de maio de 2021.	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	Concluído	1-nov-21	12-nov-21		1-nov-21	12-nov-21		100	Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por orientações da Coordenação, a análise desse Produto foi postergada. A data limite acordada para conclusão da análise técnica é o dia 30/07/2021 (Despacho SEI 0251383) Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização da análise foi redefinido para 12/11/2021	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	Concluído	13-nov-21	28-nov-21		1-dez-21	30-dez-21		100	Conforme acordado com a COAE/CGEP, a segunda versão do Produto 1 da Meta 3 (SEI 0311526) foi encaminhada pela UFC no dia 30/12/2021. Em complementação, foram encaminhados os links de acesso às bases e correções ao Relatório já remetido e aprovado (SEI 0357055, 0357606, 0357059, 0357695, 0357056 e 0357696)	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	Concluído	29-nov-21	13-dez-21		28-out-21	12-abr-22		100	Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado com a gestão da COAE/CGEP (SEI 0326132), a apreciação da versão revisada do Produto 1 da Meta 1 foi programada para 09/03/2022. Contudo, prazo adicional foi necessário para essa nova apreciação, em razão priorização das atividades do TED 004/2021 com a UFC e das etapas de análise para contratação consultoria para realização de Estudo e Plano de Ações para os Polos Têxtil e de Confecções. Em 17/03/22 foi concluída a análise técnica da segunda versão (SEI 0311526) do Produto 1 da Meta 3, gerando o Parecer Técnico 70/2022 (SEI 0334739), apontando necessidade de novos ajustes. Após apreciação, em 18/03 novos ajustes são solicitados (SEI 0335467). Recebida a 3ª versão (SEI 0337313), em 24/03/22 e solicitados ajustes. Recebida a 4ª versão (SEI 0338589), em 30/03/22 e solicitados ajustes. Recebida a 5ª versão, em 06/04/22 e solicitado novo encaminhamento por ausência de gráficos no arquivo. Produto aprovado Parecer Técnico 105/22 (SEI 0342437)	
Meta 1: Avaliar os impactos da Cota-Parte Municipal do ICMS na Educação	Produto 2: Relatório descrevendo e analisando os indicadores educacionais dos municipios nordestinos, além dos municípios mineiros e capixabas. Além de estatísticas de desempenho educacional com base no IDEB (a partir de 2005) dos municípios.	UFC	Concluído	1-jan-21	30-jun-21		1-jan-21	30-jun-21		100	No dia 04 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. O Produto 2 da Meta 1 foi encaminhado à Coordenação dentro do previsto, cujo prazo limite acordado era 30 de junho de 2021.	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	Concluído	16-nov-21	23-nov-21		6-dez-21	17-dez-21		100	Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por orientações da Coordenação, a análise dos Produtos 2 das Metas 1, 2 e 3 foi postergada. A data limite acordada para conclusão da análise técnica é o dia 30/09/2021 (Despacho SEI 0255067) Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização da análise foi redefinido para 23/11/2021. Após nova programação acordadada com a gestão da COAE/CGEP, a análise foi concluída em 17/12/2022, por meio da Nota Técnia 286 (SEI 0308050).	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	Concluído	24-nov-21	9-dez-21		23-dez-21	7-jan-22		100	Foi acordado com a UFC uma nova pactuação para encaminhado do Produto 2 da Meta 1 revisado até o dia 07/01/2022 (SEI 0311526 e 0315194), que foi entregue na data prevista. A nova pacutação não implicou em prejuízos para o andamento do projeto, tendo em vista que a vigência do TED se estende até abril de 2022, conforme previsto no seu Plano de Trabalho (SEI 0211534).	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	Concluído	10-dez-21	24-dez-21		22-dez-21	31-mar-22		100	Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado com a gestão da COAE/CGEP (SEI 0326132), a apreciação da versão revisada do Produto 2 da Meta 1 foi programada para 30/03/2022. O Parecer Tecnico 97 aprova o produto (0338373)	

Meta 2: Educação Infantil: Oferta, Demanda e as Medidas de Qualidade da Educação Infantil	Produto 2: Relatório descrevendo e analisando os indicadores de Educação Infantil dos municípios nordestinos, além dos municípios mineiros e capixabas. Além de estatísticas de desempenho educacional, Alfabetização - 2º ano, dos municípios em 2014 e 2016. Análise da demanda por educação infantil (PNAD 2015).	UFC	Concluído	1-jan-21	30-jun-21		1-jan-21	30-jun-21		100	No dia 04 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. O Produto 2 da Meta 2 foi encaminhado à Coordenação dentro do previsto, cujo prazo limite acordado era 30 de junho de 2021.	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	Concluído	24-nov-21	1-dez-21		20-jan-22	1-fev-22		100	Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por orientações da Coordenação, a análise dos Produtos 2 das Metas 1, 2 e 3 foi postergada. A data limite acordada para conclusão da análise técnica é o dia 30/09/2021 (Despacho SEI 0255067)Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização da análise foi redefinido para 01/12/2021. Nova pactuação se fez necessária (SEI 0321651), devido à priorização de outros projetos (Produtos do TED 17/2020 - UFPE, do Projeto de Bacias Hidrográficas e do Estudo sobre IDEB, a análise (em regime parcial ou integral) das propostas referente aos TRs dos Estudos sobre os Polos Têxtil e Confecções e os Polos Calçadistas na área de atuação, cuja contratação está sendo apoiada pela JOF-BR/PNUD, o acompanhamento do TED firmado com a UFV para as avaliações do FNE - 1º ano de avaliações referente à Portaria Interministerial Nº 07/2020), férias de servidores e atividades relacionadas ao período de substituição da coordenação da COAE e de apoio ao Coordenador-Geral. A apreciação foi concluída por meio do Parecer Técnico 17 (0322680), no dia 01/02/2022, que solicitou alguns ajustes no Produto.	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	Concluído	2-dez-21	17-dez-21		7-fev-22	14-fev-22		100	A segunda versão do Produto 2 da Meta 2 foi encaminhada pela UFC no dia 14/02/2022, conforme acordado com a gestão da COAE/CGEP (SEI 0324375)	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	Concluído	31-mar-22	6-abr-22		29-abr-22	3-mai-22		100	Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado com a COAE/CGEP (SEI 0326132), a apreciação da versão revisada do Produto 2 da Meta 2 foi programada para 06/04/2022. O parecer tecnico 17 (0322680) analisou e solicitou ajustes. Novos ajustes solicitados, Parecer Técnico 102/22 (SEI 0340503). Encaminhada 3ª Versão com os ajustes apontados no Parecer 102/22, em 11/04/22. O produto teve aprovação Técnica pela análise exarada no Parecer Técnico 121/22 (SEI 0347880).	Além da várias demandas prioritárias que atrasaram as análises, foram produzidos vários Pareceres de análise (PT 17/22, de 01/02/22, SEI 0322680; PT 102/22, de 06/04/22, SEI 0340503), devido à reincidência da UFPE em não atender totalmente aos ajustes solicitados. Procedeu-se ao contato com o Coordenador do Projeto frente à UFC solicitando atenção e cumprimento total ao constante nos Pareceres Técnicos emitidos pela Sudene
Meta 3: Nordeste Pacífico: Perda de Capital humano e econômica no Brasil a partir dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI)	Produto 2: Relatório contendo as estimações de perdas econômica e de capital humano usando a medida de APVP para o Brasil com foco nos estados da região Nordeste	UFC	Concluído	1-jan-21	30-jun-21		1-jan-21	30-jun-21		100	No dia 04 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 14/2020 firmado com a UFC. O Professor responsável pelo projeto, Guilherme Irff (UFC), juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. O Produto 2 da Meta 3 foi encaminhado à Coordenação dentro do previsto, cujo prazo limite acordado era 30 de junho de 2021.	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	Concluído	2-dez-21	15-dez-21		10-mar-22	23-mar-22		100	Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por orientações da Coordenação, a análise dos Produtos 2 das Metas 1, 2 e 3 foi postergada. A data limite acordada para conclusão da análise técnica é o dia 30/09/2021 (Despacho SEI 0255067)Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização da análise foi redefinido para 15/12/2021Nova reprogramação do cronograma para as análises por parte da CGEP foi necessária (SEI 0311527), em razão da alocação dos técnicos para a execução de projetos que demandavam respostas mais urgentes, a exemplo da avaliação das propostas do FNE e dos trâmites neecessários para formalização de parceria para avaliação dos resultados do Fundo, Produto 15 da Trilha de Inteligência e suporte técnico à CGDF/DFIN. Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado com a gestão da COAE/CGEP (SEI 0326132), a primeira apreciação do Produto 2 da Meta 3 foi programada para 23/03/2022. Logo, os prazos para o ajuste e análise final para aprovação, se necessário, será revista. O parecer Tecnico 84 (0336428) solicita ajustes	

Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	Concluído	16-dez-21	31-dez-21		24-mar-22	6-abr-22		100	Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por orientações da Coordenação, a análise dos Produtos 2 das Metas 1, 2 e 3 foi postergada. A data limite acordada para conclusão da análise técnica é o dia 30/09/2021 (Despacho SEI 0255067) Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização da análise foi redefinido para 15/12/2021 Nova reprogramação do cronograma para as análises por parte da CGEP foi necessária (SEI 0311527), em razão da alocação dos técnicos para a execução de projetos que demandavam respostas mais urgentes, a exemplo da avaliação das propostas do FNE e dos trâmites neecessários para formalização de parceria para avaliação dos resultados do Fundo, Produto 15 da Trilha de Inteligência e suporte técnico à CGDF/DFIN. Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado com a gestão da COAE/CGEP (SEI 0326132), a primeira apreciação do Produto 2 da Meta 3 foi programada para 23/03/2022. Logo, os prazos para o ajuste e análise final para aprovação, se necessário, será revista.	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	Concluído	1-jan-22	15-jan-22		13-abr-22	14-abr-22		100	Em razão da priorização de outros projetos e atividades em curso na CGEP que demandam maior dedicação dos técnicos, por orientações da Coordenação, a análise dos Produtos 2 das Metas 1, 2 e 3 foi postergada. A data limite acordada para conclusão da análise técnica é o dia 30/09/2021 (Despacho SEI 0255067) Conforme o Despacho CGEP 0275680, o prazo para realização da análise foi redefinido para 15/12/2021 Nova reprogramação do cronograma para as análises por parte da CGEP foi necessária (SEI 0311527), em razão da alocação dos técnicos para a execução de projetos que demandavam respostas mais urgentes, a exemplo da avaliação das propostas do FNE e dos trâmites neecessários para formalização de parceria para avaliação dos resultados do Fundo, Produto 15 da Trilha de Inteligência e suporte técnico à CGDF/DFIN. Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado com a gestão da COAE/CGEP (SEI 0326132), a primeira apreciação do Produto 2 da Meta 3 foi programada para 23/03/2022. Logo, os prazos para o ajuste e análise final para aprovação, se necessário, será revista. Aprovado Parecer Técnico 106/2022 (SEI 0343398).	
Meta 1: Avaliar os impactos da Cota-Parte Municipal do ICMS na Educação	Produto 3: Relatório sobre as evidências da literatura em relação aos efeitos dos mecanismos de incentivos à educação, foco em análises de impacto na política de distribuição de cota parte municipal do ICMS, estratégia de identifição e estimação dos efeitos causais (avaliação de impacto) da distribuição de recursos da cota parte municipal do ICMS com base em resultados educacinais.	UFC	Concluído	1-abr-21	20-dez-21		1-abr-21	20-dez-21		100	Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado com a gestão da COAE/CGEP (SEI 0326132), a primeira apreciação do Produto 3 da Meta 1 foi programada para 27/04/2022. Logo, os prazos para o ajuste e análise final para aprovação, se necessário, será revista.	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	Concluído	14-abr-22	27-abr-22		14-abr-22	17-mai-22		100	Aprovação de produto, conforme Parecer Técnico 131/2022 (SEI 0350514).	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	Concluído	28-abr-22	4-mai-22		17-mai-22	17-mai-22		100	A aprovação do produto pelo Parecer 131/2022 (SEI 0350514) tornou sem efeito essa etapa	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	Concluído	26-mai-22	1-jun-22		17-mai-22	17-mai-22		100	A aprovação do produto pelo Parecer 131/2022 (SEI 0350514) tornou sem efeito essa etapa. Foram disponibilizados novas versões SEI 0357055, 0357056, 0357059.	
Meta 2: Educação Infantil: Oferta, Demanda e as Medidas de Qualidade da Educação Infantil	Produto 3: Análise de impacto da Educação Infantil sobre os indicadores de: 1) Alfabetização no Ensino Fundamental I e 2) Medidas de rendimento dos anos iniciais do Ensino Fundamental	UFC	Concluído	1-abr-21	20-dez-21		1-abr-21	13-dez-21		100	Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado com a gestão (SEI 0326132), a primeira análise do Produto 3 da Meta 2 foi programada para 11/05/2022. Logo, os prazos para o ajuste e análise final para aprovação, se necessário, será revista.	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	Concluído	28-abr-22	11-mai-22		26-abr-22	3-mai-22		100	A análise Técnica exarada pelo Parecer Técnico 119/2022 apontou pela necessidade de ajustes, estando o produto em 95% de atendimento ao seu resultado esperado (SEI 0347780).	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	Concluído	12-mai-22	18-mai-22		4-mai-22	11-mai-22		100	Os ajustes foram encaminhados ao Coordenador do Projeto (SEI 0348348)	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	Concluído	2-jun-22	8-jun-22		2-jun-22	7-jun-22		100	Conforme Parecer Técnico 179/2022 (SEI 0359622). ODe acordo com o parecer, o produto alcançou 100% do que estava previsto.	
Meta 3: Nordeste Pacífico: Perda de Capital humano e econômica no Brasil a partir dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI)	Produto 3: Relatório contendo a avaliação de impacto das políticas públicas executadas pelos estados da região Nordeste (Ceará Pacífico; Pacto pela Vida - Pernambuco, etc)	UFC	Concluído	1-abr-21	20-dez-21		1-abr-21	20-dez-21		100	Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado com a gestão da COAE/CGEP (SEI 0326132), a primeira análise do Produto 3 da Meta 3 foi programada para 25/05/2022. Logo, os prazos para o ajuste e análise final para aprovação, se necessário, será revista.	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	Concluído	12-mai-22	25-mai-22		12-mai-22	25-mai-22		100	Conforme parecer Técnico 160/2022 (SEI 0355372), Processo 59336.002083/2020-84	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	Concluído	26-mai-22	1-jun-22		26-mai-22	1-jun-22		100	Conforme Solicitação encaminhada SEI 0355850 e confirmação 0355868.	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	Atrasado	9-jun-22	15-jun-22		28-jun-22				A servidora responsável pela análise deste produto foi acometida por Covid-19 e a data da análise foi repactuada, conforme SEI 0366111.	
Meta 1: Avaliar os impactos da Cota-Parte Municipal do ICMS na Educação	Produto 4: Divulgação dos Resultados e sumário executivo	UFC	Concluído	1-nov-21	15-dez-21		1-nov-21	17-jan-22		100	Foi acordada repactuação de prazos para as entregas relacionadas ao Produto 4 das Metas 1, 2 e 3, passando de 15/12/2021 para janeiro de 17/01/2022 (SEI 0311526 e 0315194). A nova pacutação não impacta em prejuízos para o andamento do projeto, tendo em vista que a vigência do TED, conforme previsto no Plano de Trabalho SEI 0211534, se estende até abril de 2022. A área técnica se colocou favorável à repactuação, tendo em vista o comprometido e empenho do Parceiro, por meio do Coordenador-Geral da UFC e equipe técnica, que vem cumprindo as entregas anteriores no prazo acordado e, até mesmo, com antecedência e com o envio de análises adicionais para além do que havia sido previsto no Plano de Trabalho pactuado (SEI 0311527) O Sumário Executivo que compõe o Produto 4 de cada uma das três Metas foi encaminhada no dia 17/01/2022, dentro do previsto.	

Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	Atrasado	16-jun-22	27-jun-22						A servidora responsável pela análise deste produto foi acometida por Covid-19 e a data da análise foi repactuada, conforme SEI 0366111.	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	Atrasado	28-jun-22	4-jul-22						Os ajustes serão encaminhados após a conclusão da análise pela servidora designada, que esteve em licença médica devido ao acometimento de covid-19.	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	A Iniciar	15-jul-22	21-jul-22							
Meta 2: Educação Infantil: Oferta, Demanda e as Medidas de Qualidade da Educação Infantil	Produto 4: Divulgação dos Resultados e sumário executivo	UFC	Concluído	1-nov-21	15-dez-21		1-nov-21	17-jan-22		100	Foi acordada repactuação de prazos para as entregas relacionadas ao Produto 4 das Metas 1, 2 e 3, passando de 15/12/2021 para janeiro de 17/01/2022 (SEI 0311526 e 0315194). A nova pacutação não impacta em prejuízos para o andamento do projeto, tendo em vista que a vigência do TED, conforme previsto no Plano de Trabalho SEI 0211534, se estende até abril de 2022. A área técnica se colocou favorável à repactuação, tendo em vista o comprometido e empenho do Parceiro, por meio do Coordenador-Geral da UFC e equipe técnica, que vem cumprindo as entregas anteriores no prazo acordado e, até mesmo, com antecedência e com o envio de análises adicionais para além do que havia sido previsto no Plano de Trabalho pactuado (SEI 0311527) O Sumário Executivo que compõe o Produto 4 de cada uma das três Metas foi encaminhada no dia 17/01/2022, dentro do previsto.	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	Concluído	28-jun-22	5-jul-22		10-jun-22	22-jun-22		100	Conforme Parecer Técnico 195/2022 (SEI 0364296)	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	Em Andamento	6-jul-22	12-jul-22		27-jun-22				Conforme SEI 0365993, foram solicitados os ajustes ao produto Sumário Executivo.	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	A Iniciar	22-jul-22	28-jul-22							
Meta 3: Nordeste Pacífico: Perda de Capital humano e econômica no Brasil a partir dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI)	Produto 4: Divulgação dos Resultados e sumário executivo	UFC	Concluído	1-nov-21	15-dez-21		1-nov-21	17-jan-22		100	Foi acordada repactuação de prazos para as entregas relacionadas ao Produto 4 das Metas 1, 2 e 3, passando de 15/12/2021 para janeiro de 17/01/2022 (SEI 0311526 e 0315194). A nova pacutação não impacta em prejuízos para o andamento do projeto, tendo em vista que a vigência do TED, conforme previsto no Plano de Trabalho SEI 0211534, se estende até abril de 2022. A área técnica se colocou favorável à repactuação, tendo em vista o comprometido e empenho do Parceiro, por meio do Coordenador-Geral da UFC e equipe técnica, que vem cumprindo as entregas anteriores no prazo acordado e, até mesmo, com antecedência e com o envio de análises adicionais para além do que havia sido previsto no Plano de Trabalho pactuado (SEI 0311527) O Sumário Executivo que compõe o Produto 4 de cada uma das três Metas foi encaminhada no dia 17/01/2022, dentro do previsto.	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	A Iniciar	6-jul-22	14-jul-22					0	Nova reprogramação do cronograma para as análises por parte da CGEP foi necessária (SEI 0311527), em razão da alocação dos técnicos para a execução de projetos que demandavam respostas mais urgentes, a exemplo da avaliação das propostas do FNE e dos trâmites neecessários para formalização de parceria para avaliação dos resultados do Fundo, Produto 15 da Trilha de Inteligência e suporte técnico à CGDF/DFIN. Segundo o novo calendário para análise dos Produtos acordado com a gestão da COAE/CGEP (SEI 0326132), a primeira análise de cada produto foi programada para: 27/06/2022 - Produto 4 da Meta 1; 14/07/2022 - Produto 4 da Meta 2; e 21/07/2022 - Produto 4 da Meta 3.	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFC	A Iniciar	15-jul-22	21-jul-22					0		
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	A Iniciar	29-jul-22	4-ago-22					0		
Realização do Seminário Técnico	Seminário técnico da UFC para a Sudene para apresentação dos resultados finais do projeto	UFC e CGEP	A Iniciar	8-ago-22	12-ago-22							
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	UFC	A Iniciar	15-ago-22	15-set-22					0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	A Iniciar	19-set-22	19-nov-22					0		
Resumo Projeto			Atrasado									
						R$480.600,00			**R$480.600,00**	**90**		

CGEP 2020009 TED UFPE

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Decreto 10.426/2020 e elaboração de pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	Concluído	11-nov-20	4-dez-20		11-nov-20	12-abr-20		100		
Analise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	7-dez-20	22-dez-20		12-jul-20	22-jan-21		100		
Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	COCIC	Concluído	7-dez-20	7-dez-20		12-jul-20	12-jul-20		100		
Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / UFPE	Concluído	23-dez-20	23-dez-20		23-jan-21	23-dez-20		100		
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	24-dez-20	28-dez-20		24-dez-20	28-jan-21		100		
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	Recursos liberados em parcela única	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	31-dez-20	31-dez-20	R$384.000,00	24-dez-20	28-dez-20	R$384.000,00	100		
Meta 1: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de mercado de trabalho	Relatório parcial: relatório parcial deve conter tabelas de dados descritivos, tabelas de resultados, gráficos, figuras e mapas, para todos os outcomes previstos (resultados preliminares e sujeitos a mudanças até o relatório final, dado feedback da equipes da UFPE e da SUDENE).	UFPE	Concluído	1-jan-21	30-jun-21		1-jan-21	30-jun-21		100	No dia 25 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 17/2020, firmado com a UFPE. O Professor responsável pelo projeto, Breno Sampaio, juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. Em 30/06/2021, conforme previsto, o Relatório parcial foi entregue pela UFPE.	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	Concluído	30-jun-21	30-set-21		7-jan-21	9-out-21		100	Conforme o Despacho CGEP 0255150, o prazo para realização da análise foi redefinido para 30/09/2021.	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	Concluído	1-out-21	16-out-21		20-set-21	8-out-21		100	Conforme o Despacho CGEP 0275255, o prazo para realização dos ajustes foi pactuado para 08/10/2021.	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	Concluído	17-out-21	31-out-21		15-out-21	26-nov-21		100		

Meta 2: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de saúde	Relatório parcial: relatório parcial deve conter tabelas de dados descritivos, tabelas de resultados, gráficos, figuras e mapas, para todos os outcomes previstos (resultados preliminares e sujeitos a mudanças até o relatório final, dado feedback da equipes da UFPE e da SUDENE).	UFPE	Concluído	1-jan-21	30-set-21		1-jan-21	30-set-21		100	No dia 25 de março de 2021, foi realizada a primeira reunião de acompanhamento do TED 17/2020, firmado com a UFPE. O Professor responsável pelo projeto, Breno Sampaio, juntamente com outros pesquisadores envolvidos nas avaliações, apresentaram o andamento das atividades. De modo geral, o projeto segue conforme previsto inicialmente. Em 30/09/2021, conforme previsto, o relatório parcial foi entregue pela UFPE.	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	Concluído	1-out-21	31-out-21		10-abr-21	9-nov-21		100		
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	Concluído	1-nov-21	16-nov-21		9-nov-21	16-mar-22		100	No dia 09 de novembro de 2021 foram solicitados ajustes na primeira versão do produto. No dia 25 de novembro de 2021 a versão ajustada foi enviada pela descentralizada. No dia 1º de dezembro de 2021 foram solicitados novos ajustes, tendo em vista que os primeiros ajustes não atenderam ao esperado. Os novos ajustes ainda são aguardados. As justificativas para o não atendimento de alguns ajustes foram encaminhadas SEI 0334967. Demais ajustes aguardados para o relatório final.	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	Concluído	17-nov-21	2-dez-21		25-mar-22	12-abr-22		100	Várias solicitações de ajustes foram procedidas, (SEI 0339443, 0339444, 0339445, 0339446, 0339447, 0339448, 0339448, 0339449, 0339450, 0339451). Em primeira análise, foi considerado o percentual de 95% de execução. Após várias tratativas para entendimentos quanto ao atendimento aos ajustes solicitados, mencionados nos documentos SEI anteriores. Por fim, foi iniciada a análise definitiva em 25/03, com conclusão em 12/04/22	
Meta 1: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de mercado de trabalho	Relatório final: relatório final deve conter introdução, descrição dos dados e tabelas de dados descritivos, metodologia detalhada, apresentação dos resultados, descrição dos resultados, tabelas de resultados, gráficos, figuras e mapas, conclusões e implicações políticas.	UFPE	Concluído	1-jan-21	31-dez-21		1-jan-21	31-dez-21		100	Conforme previsto, no dia 31/12/2021 foi realizada a entrega do relatório final.	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	Concluído	6-abr-22	15-abr-22		14-abr-22	29-abr-22		100	A análise deste produto (Parecer Técnico 117/2022 - SEI 0346950) foi procedida concomitantemente às análises relativas as propostas de licitantes recebidas no âmbito do Estudo dos Setores Têxteis e de Confecções, ocasionando o atraso. Foram solicitados ajustes ao produto entregue., sendo o percentual de alcance do produto de 95%.	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	Concluído	18-abr-22	22-abr-22		3-mai-22	15-mai-22		100	O Parecer Técnico 117/2022 foi encaminhado à UFPE para ajustes em 03/05/2022 (SEI 0347579). Foi remetido à UFPE novo e-mail, solicitando a versão ajustada do Produto, agendada para ser entregue em 10/05/2022, mas não encaminhada (SEI 0350227). Nova cobrança realizada e contato mantido (SEI 0350946). Ocorreu a entrega do produto ajustado em versão PDF (SEI 0351254) tendo sido necessário pedido de complementação com a remessa da versão editável (SEI 0351256). A versão editável dos relatórios forma disponibilizados em 15/05/2022 (SEI 0351428).	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	Concluído	25-abr-22	29-abr-22		16-mai-22	17-mai-22		100	A demanda foi encaminhada à análise Técnica com prazo de entrega para 20/05/2022 (SEI 0351442). O produto teve aprovação nos ajustes procedidos, conforme Parecer Técnico 139/2022 (SEI 0351730).	
Meta 1: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de mercado de trabalho	Seminário técnico para apresentação do relatório final, contando pdf da apresentação	UFPE	Concluído	1-out-21	31-dez-21		1-out-21	31-dez-22		100	Conforme previsto, no dia 31/12/2021 foi realizada a entrega da apresentação em formato pdf. A apresentação em seminário será marcada em data oportuna.	
Análise	Análise do produto entregue para possíveis ajustes	CGEP	Concluído	18-abr-22	22-abr-22		4-mai-22	6-mai-22		100	Destaque-se que a análise refere-se apenas à Apresentação em pdf. Para este produto, considera-se que 95% da Apresentação em pdf foi executada, conforme Parecer Técnico 126/22 (SEI 0349056). Foram solicitados ajustes.	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	Concluído	25-abr-22	29-abr-22		6-mai-22	15-mai-22		100	Encaminhamento de e-mail com solicitação de ajustes, pactuados com o coordenador do projeto. (SEI 0349258). O produto apresenta um percentual de execução de 95%. Foram encaminhadas duas cobranças para a entrega do produto previsto (SEI 0350227 e 0350946). Ocorreu a entrega do produto ajustado em versão PDF (SEI 0351254) tendo sido necessário pedido de complementação com a remessa da versão editável (SEI 0351256). A versão editável dos relatórios forma disponibilizados em 15/05/2022 (SEI 0351428).	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto	CGEP	Concluído	2-mai-22	6-mai-22		16-mai-22	17-mai-22		100	A demanda foi encaminhada à análise Técnica com prazo de entrega para 20/05/2022 (SEI 0351442). A análise Técnica aprovou os ajustes procedidos, conforme Parecer Técnico 140/2022 (SEI 0352061).	
Meta 1: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de mercado de trabalho	Resumo executivo	UFPE	Concluído	1-out-21	31-dez-21		1-out-22	2-jan-22		100	A entrega dos sumários executivos ocorreu em 02/01/2022.	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	Concluído	9-mai-22	13-mai-22		9-mai-22	13-mai-22		100	A análise foi concluída Parecer Técnico 134/2022 (SEI 0351094), Processo 59336.001886/2020-11.	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	Concluído	16-mai-22	20-mai-22		13-mai-22	30-mai-22		100	A análise exarada no Parecer 134/2022 indicou a necessidade de ajustes, pactuados com o parceiro e devidamente remetida a solicitação dos ajustes SEI 0351258). O produto ajustado não foi encaminhado no prazo pactuado e foram encaminhadas 4 reiterações à solicitação de ajustes, conforme SEI 0352484, SEI 0353546, SEI 0354340, SEI 0355151. O produto foi entregue na data de 30/05/2022, conforme e-mails SEI 0357156, 0357157, 035758, 0357158.	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	Concluído	25-mai-22	31-mai-22		31-mai-22	31-mai-22		100	Conforme Parecer Técnico 171/2022 (SEI 0357585), que ainda aponta a necessidade de ajustes ao produto recebido, estando em 95% de atendimento. . Tais ajustes foram encaminhados por e-mail, conforme SEI 0359761.	
Meta 2: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de saúde	Relatório final: relatório final deve conter introdução, descrição dos dados e tabelas de dados descritivos, metodologia detalhada, apresentação dos resultados, descrição dos resultados, tabelas de resultados, gráficos, figuras e mapas, conclusões e implicações políticas.	UFPE	Concluído	1-jan-21	31-dez-21		1-jan-21	31-dez-21		100	Conforme previsto, no dia 31/12/2021 foi realizada a entrega do relatório final.	

Análise	Análise do produto entregue para possíveis ajustes	CGEP	Concluído	16-mai-22	24-mai-22		10-mai-22	24-mai-22		100	Conforme Parecer Técnico 157/2022 (SEI 0355087), Processo 59336.001886/2020-11. De acordo com o Parecer em questão, e esclarecimentos constantes do Despacho CGEP 0355299,serão necessários ajustes ao produto entregue, estando em 95% o percentual de execução deste.	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	Concluído	25-mai-22	31-mai-22		25-mai-22	1-jun-22		100	Conforme Documento SEI 0355353, os ajustes foram encaminhados ao Coordenador do Projeto. A UFPE não entregou o produto previsto e nova solicitação de entrega foi feita (SEI 0357764). Em 01/06/2022, às 21:36, foi encaminhado e-mail com a versão docx do produto.	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto	CGEP	Concluído	1-jun-22	7-jun-22		3-jun-22	7-jun-22		100	Conforme Parecer Técnico 178/2022 (SEI 0359546). O parecer apontou a necessidade de encaminhamento de esclarecimentos, já solicitados quando da análise da 1a versão do produto, com o alcance do produto totalizando o percentual de 97%. Novo encaminhamento será dado para remessa dos esclarecimentos. Do ponto de vista da execução pela coordenação para o que foi previsto, o Parecer foi elaborado em 100%.	
Meta 2: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de saúde	Seminário técnico para apresentação do relatório final, contando pdf da apresentação	UFPE	Concluído	1-out-21	31-dez-21		1-out-21	31-dez-21		100	Conforme previsto, no dia 31/12/2021 foi realizada a entrega da apresentação em formato pdf. A apresentação em seminário será marcada em data oportuna.	
Análise	Análise do produto entregue para possíveis ajustes	CGEP	Concluído	8-jun-22	14-jun-22		25-mai-22	26-mai-22		100	Conforme Parecer Técnico 161/2022, SEI 0355524, Processo 59336.001886/2020-11	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	Concluído	15-jun-22	21-jun-22		30-mai-22	28-jun-22		100	Conforme documento SEI 0357154, processo 59336.001886/2020-11. A entrega não foi efetuada no prazo previsto e foi encaminhado e-mail reencaminhando o Parecer, conforme SEI (0364159). O produto foi entregue, conforme SEI 0366065 e 0366066, extemporâneo.	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação do produto	CGEP	Concluído	22-jun-22	29-jun-22		28-jun-22	29-jun-22		100	A análise incia no dia de hoje devido à entrega atrasada do produto, ocorrida no dia de hoje, conforme SEI 0366065 e 0366066. Conforme Parecer Técnico 209/2022 (SEI 0366721), o produto alcançou 100% de aprovação.	
Meta 2: Avaliar os efeitos socioeconômicos do Programa Cisterna 1ª Água sobre resultados de saúde	Resumo executivo	UFPE	Concluído	1-out-21	31-dez-21		1-out-21	2-jan-22		100	A entrega dos sumários executivos ocorreu em 02/01/2022	
Análise	Análise dos produtos entregues para possíveis ajustes	CGEP	Concluído	15-jun-22	21-jun-22		14-jun-22	22-jun-22		100	Conforme PT 192/2022 (SEI 0364049), Processo 59336.001886/2020-11. Antes que a primeira versão do Resumo Executivo fosse analisada, a UFPE enviou, em 13/06/2022 (SEI 0364027), uma nova versão (SEI 0364045), após entendimentos alcançados em reunião realizada em 06/06/2022 (SEI 0359306) entre a Diretoria de Planejamento da Sudene e a UFPE.	
Ajustes	Ajustes que sejam necessários por parte da descentralizada	UFPE	Concluído	22-jun-22	29-jun-22		22-jun-22	22-jun-22		100	Dada a aprovação 100% do produto, não há necessidade dessa etapa.	
Aprovação	Análise dos ajustes realizados e aprovação dos produtos	CGEP	Concluído	30-jun-22	6-jul-22		22-jun-22	22-jun-22		100	Dada a aprovação 100% do produto, não há necessidade dessa etapa.	
Realização do Seminário Técnico	Seminário técnico da UFPE para a Sudene para apresentação dos resultados finais do projeto	UFPE e CGEP	A Iniciar	11-jul-22	15-jul-22					0		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	UFPE	A Iniciar	18-jul-22	18-ago-22					0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	A Iniciar	19-ago-22	19-out-22					0		
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$384.000,00			**R$384.000,00**	**92,68292683**		

CGEP 2020004 TED INSA Leite

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	Concluído	13-jul-20	11-ago-20		13-jul-20	11-ago-20		100		
Analise jurídica	Análise e parecer jurídico	PROCURADORIA	Concluído	11-ago-20	1-set-20		11-ago-20	1-set-20		100		
Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	COCIC	Concluído	1-set-20	29-set-20		1-set-20	29-set-20		100	A minuta do TED precisou ser alterada devido a aprovação do DECRETO Nº 10.426, DE 16 DE JULHO DE 2020. Foi necessário também alterar a minuta padrão de TED e de Plano de Trabalho	
Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / INSA	Concluído	30-set-20	9-out-20		5-out-20	5-out-20		100		
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	30-set-20	9-out-20		7-out-20	7-out-20		100		
Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros		CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	9-out-20	16-out-20	R$75.397,01	14-out-20	19-fev-21	R$75.397,01	100	Em 14/10/2020 foi feita a primeira descentralização de crédito 2020NC000002 no valor de R$ 75.397,01. O recurso foi transferido para o INSA no mês de outubro/2020, porém, devido aos trâmites documentais para contratar a fundação de apoio, não houve tempo hábil para o valor da primeira parcela do TED ser empenhado e, no final do mês de dezembro, o recurso foi devolvido para a SUDENE. Em 19/02/2021, por solicitação do INSA foi realizada nova descentralização financeira conforme Doc SIAFI conforme Doc SEI 0224589, pasta VII do Proc 59336.001084/2020-10.	
Meta 1: Realização de um diagnóstico sobre os sistemas de produção em propriedades localizadas na bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu nas cidades de Cajazeirinhas, Coremas, Paulista, Pombal e São Bento, no Estado da Paraíba, Jardim de Piranhas, Jucurut	Produto:diagnóstico sobre os sistemas de produção	INSA	Atrasado	16-out-20	12-ago-21	R$26.570,08	19-fev-21			78	Cada etapa da meta, quando finalizada equivale a 20%. 5 etapas x 20 = 100% Etapa 1.1. – está sendo feito o levantamento bibliográfico = 10% realizada; Etapa 1.2. Todos os atores (produtores, secretários e secretárias municipais e técnicos já foram mobilizados) – 20% realizado Etapa 1.3. Já foram realizadas as entrevistas dos municípios de Cajazeirinhas, Paulista, Pombal, São Bento e Coremas, no Estado da Paraíba, Jardim de Piranhas, Jucurutu e Itajá no Estado do Rio Grande do Norte, totalizando 200 entrevistas, representando 100% das entrevistas. Etapa 1.4. Já foram sistematizados em planilha do Microsoft Excel, 200 formulários das 200 entrevistas que serão realizadas nos municípios abrangidos pelo projeto. Cada questionário com 80 respostas dos produtores – 100% realizada; Etapa 1.5. Esta etapa foi iniciada após o término de todas as entrevistas e sistematização dos dados em planilha – 8% realizada; No total já foram realizados 78% desta Meta 1.	

Meta 2: Avaliação dos aspectos zootécnicos e tecnológicos da produção de leite das propriedades rurais da bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu	Produto: Avaliação dos aspectos zootécnicos e tecnológicos da produção de leite	INSA	Atrasado	15-mar-21	8-jun-22	R$12.687,37	19-fev-21			39	A Etapa 2.1.1. equivale a 33% da meta. Nesta etapa, a sistematização e análise dos dados dos indicadores já está em fase final portanto, considera-se executada; A Etapa 2.1.2. equivale a 34% da meta. Já foram visitados 20 das 100 propriedades rurais para coleta de dados zootécnicos, representando 6,8% de execução; A Etapa 2.1.3. representa 33% da meta. Esta etapa ainda será realizada. Portanto, no total, já foram realizados 39,2% da Meta 2.	
Meta 3: Avaliação da composição químico bromatológica das dietas que são utilizadas nos períodos seco e chuvoso para os animais em produção em pelo menos 100 propriedades rurais estudadas	Produto: Avaliação da composição químico bromatológica das dietas	INSA	Em Andamento	14-jan-21	5-nov-22	R$22.720,81	19-fev-21			37	A Etapa 3.1. já foi concluída e equivale a 10% da meta; A Etapa 3.2. equivale a 30% da meta. Nesta etapa já foram visitadas 51 das 200 previstas, o que e representa 7,65 do valor da etapa; A Etapa 3.3. equivale a 50% da Meta. Nesta etapa já se iniciaram a determinações químico-bromatológicas de 128 amostras, o que representa 16% do valor da etapa. A Etapa 3.4. representa 10% da meta. desta etapa já foram realizadas 2%. No total, a Meta 3, já foi realizada 36,65%.	
Meta 4: Avaliação os aspectos de gestão das propriedades estudadas em função do tipo de sistema de produção adotado	Produto: Avaliação os aspectos de gestão das propriedades estudadas	INSA	Atrasado	13-fev-21	9-mai-22	R$6.300,13	19-fev-21			14	A Etapa 4.1 foi subdividida para melhor dimensionamento, passando a ser ter as seguintes descrições e resultados: a) Etapa 4.1.1., referente à seleção das propriedades já foi concluída e representa 10% Meta 4; b) A Etapa 4.1.2. foi iniciada, recentemente, para o levantamento dos dados econômicos das propriedades a partir do diagnóstico, o que representa o valor de 1% de realização; c) A Etapa 4.1.3. equivale a 48% da Meta. Esta etapa foi iniciada e já foram realizados três registros da movimentação financeira das 48 propriedades selecionadas, o que equivale a 3% de execução. d) As etapas 4.14 e 4.1.5 ainda serão realizadas. No total, já foram realizados 14% da Meta 4.	
Meta 5: Avaliação da qualidade físico química, microbiológica e perfil de ácidos graxos do leite produzido nas propriedades estudadas	Produto: Avaliação da qualidade físico química, microbiológica e perfil de ácidos graxos	INSA	Atrasado	14-jan-21	15-abr-22	R$75.004,62	19-fev-21			10	Nesta Meta 5, as etapas de seleção (5.1.) e elaboração do cronograma (5.2) já foram realizadas e representam a 2,5% da meta cada uma. Já foi realizado o treinamento da equipe que fará as coletas de leite A Etapa 5.3. equivale a 30% da Meta 5. Já foram realizadas 8 visitas das 200 previstas, o que representa 1,2%. A Etapa 5.4. equivale a 30% da Meta 5. Já foram realizadas 8 coletas das 200 previstas, o que representa 1,2%. A Etapa 5.5. equivale a 30% da Meta 5. As análises para a determinação do perfil de ácidos graxos do leite ainda será iniciada; A Etapa 5.6 representa 5% da Meta 5. Ainda não houve atividade nesta etapa. Considera-se que Meta 5 está em foi iniciada e já foram realizadas 7,4% do total.	
Meta 6: Capacitação de produtores, técnicos e estudantes sobre a produção e o estoque de forragens para a melhoria do manejo alimentar de bovinos leiteiros	Produto: Capacitação de produtores, técnicos e estudantes	INSA	Atrasado	13-jul-21	9-mai-22	R$22.530,00				0	A iniciar de acordo com o cronograma proposto. As reuniões da equipe, para o planejamento das atividades desta meta, já se iniciaram	
Meta 7: Realização de dois eventos sobre a melhoria dos sistemas de produção de leite na região da bacia do rio Piranhas-Açu	Produto: Dois eventos sobre a melhoria dos sistemas de produção de leite na região da bacia do rio Piranhas-Açu	INSA	Em Andamento	6-out-21	4-jan-23	R$23.726,04	6-out-21			2	A iniciar de acordo com o cronograma proposto. Porém, a equipe técnica do projeto também passou a considerar que visitas de comitivas, reuniões, apresentação do projeto em eventos e outras ocorrências, também serão computadas na Meta 7, como eventos complementares. Espera-se que ocorram em torno de 10 eventos dessa natureza, o que equivale a 10% da Meta. Entre os anos de 2021 e 2022 ocorreram os seguintes eventos complementares: a) Apresentação do projeto no Agrinordeste/2021, no Centro de Convenções, em Olinda-PE; b) Visita das comitivas da SUDENE e do INSA ao produtor de leite Anderson Augusto Fernando Brito, participante do projeto, no município de Jardim de Piranhas – RN. Estes dois eventos representam 2% dos 10% estabelecidos para os eventos complementares.	
Meta 8: Publicação de pelo menos três artigos científicos; três documentos técnicos (boletim, cartilha ou comunicado técnico) e 2 vídeos orientadores com informações sobre o manejo dos animais, manejo das pastagens e sobre os sistemas de produção mais ade	Produto: Três artigos científicos	INSA	Atrasado	13-jun-21	3-fev-23	R$4.500,00				0	A iniciar de acordo com a sistematização, análise e interpretação dos dados obtidos no desenvolvimento do projeto.	
Meta 9: Seleção da equipe de bolsistas para participar do estudo e realização, em conjunto com a equipe técnica responsável, do diagnóstico e das atividades do projeto	Produto: Seleção de equipe	INSA	Concluído	15-dez-20	14-jan-21	R$75.000,00	5-mar-21	28-abr-21		100	Bolsistas selecionados: a) Lucas Assis Lourenço e Thamires Queiroga dos Santos – Bolsa Longa duração no país BLD-IT - Iniciação Tecnológica, com vigência de 01/05/2021 a 01/08/2023, por meio do Edital n° 005/2021 - Processo Seletivo Simplificado – SEI INSA (6713726) b) Wendel Pires Carneiro - Bolsa Longa duração no país/BLD-DT- Desenvolvimento Tecnológico, com de vigência de 01/05/2021 a 01/08/2023, por meio do Edital n° 009/2021 - SEI INSA (6999729)	
Meta 10: Elaboração de relatórios de acompanhamento trimestrais e relatório final.	Produto: Relatórios	INSA	Atrasado	14-jan-21	8-jun-22		19-fev-21			32	Já foram enviados para a SUDENE, o Primeiro e Segundo Relatório Trimestral referentes ao período de janeiro a junho/2021; o Terceiro Relatório Trimestral, referente ao período de Julho a Setembro/2021; e o Quarto Relatório Trimestral, referente a novembro/2021 a março/2022, o que equivale a 32% de execução da Meta 10.	
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	1-jan-21	30-jan-21		25-mar-21	25-mai-21		100	O INSA encaminhou o 1o Relatório Técnico Parcial em 25/03/2021. Este foi analisado e aprovado em 25/05/2021, data da assinatura no SEI, pelo Parecer Técnico 28/2021.	
Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	1-fev-21	28-fev-21	R$139.342,00	19-ago-21	23-set-21	R$143.114,00	100	As datas do realizado foram corrigidas conforme registros no SEI. O valor liberado correto, também foi corrigido (R$ 143.114,97)	
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	1-jan-22	30-jan-22		1-set-21	2-set-21		100	O INSA encaminhou o 2o Relatório Técnico Parcial em 01/09/2021. De acordo com os registros do Processo 59336.001084/2020-10, a data de conclusão 02/09/22 se deve à antecipação de relatórios preliminares que geraram uma análise que, ao ser oficializado pelo INSA, o técnico da Sudene já dispunha de uma análise praticamente concluída.	
Liberação da terceira parcela de recursos	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Atrasado	1-fev-22	28-fev-22	R$129.142,00				0		

Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	INSA	A Iniciar	3-fev-23	4-abr-23					0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	A Iniciar	5-abr-23	4-jun-23					0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	A Iniciar	5-jun-23	4-ago-23					0		
Resumo Projeto			Atrasado									
						R$612.920,06			**R$218.511,01**	**52,69565217**		

CGEP 2020003 TED INSA Palma

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Recebimento e análise técnica da Proposta da Instituição Parceira	Recebimento da proposta e análise das mesmas de acordo com os critérios definidos no Programa do Siconv e elaboração de pareceres técnicos. A dependender da necessidade, solicitam-se complementações da proposta.	CGEP	Concluído	21-mai-20	11-ago-20		21-mai-20	11-ago-20		100		
Analise jurídica	Análise e parecer juridico	PROCURADORIA	Concluído	11-ago-20	27-ago-20		11-ago-20	27-ago-20		100		
Elaboração da minuta do TED	Elaboração do minuta do TED	COCIC	Concluído	28-ago-20	29-set-20		28-ago-20	29-set-20		100	A minuta do TED precisou ser alterada devido a aprovação do DECRETO Nº 10.426, DE 16 DE JULHO DE 2020. Foi necessário também alterar a minuta padrão de TED e de Plano de Trabalho	
Assinatura do TED	Assinatura do TED	GABINETE / INSA	Concluído	30-set-20	9-out-20		5-out-20	5-out-20		100		
Publicação do TED	Publicação do TED no site da Sudene	GABINETE/ASCOM	Concluído	30-set-20	9-out-20		7-out-20	7-out-20		100		
Liberação da primeira parcela de recursos	Liberação da 1ª parcela de recursos financeiros	CGDS / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	9-out-20	16-out-20	R$211.365,09	8-out-20	14-out-20	R$211.365,09	100	O Orçamentário foi disponibilizado em 14/10/2020; o Financeiro foi solicitado em 29/01/21	
Meta 1: Caracterização de 142 acessos de Opuntia spp. do banco de germoplasma do INSA, com base em características morfoagronômicas e bromotalógicas e disponibiizá-los ao programas de melhoramento genético.	Produto: 142 acessos de Opuntia spp. caracterizados	INSA	Concluído	16-out-20	12-ago-21	R$13.600,00	11-fev-21	31-mar-21		100		
Meta 2: Avaliação da diversidade genética entre e dentro de espécies de Opuntias do banco de germoplasma do INSA, com base em marcador molecular e indicar pelos menos 10 potenciais genitores para o programa de hibridação.	Produto: 10 genitores identificados para usar em programa de hibridação	INSA	Em Andamento	16-out-20	8-jul-22	R$8.500,00	11-fev-21			45		
Meta 3: Determinação do nível de ploidia de 142 acessos do banco de germoplasma por meio de citometria de fluxo e/ou contagem do número de cromossomos.	Produto: 142 acessos caracterizados quanto ao nível de ploidia	INSA	Atrasado	16-out-20	9-jan-22	R$15.000,00	11-fev-21	1-dez-21		100		
Meta 4: Caracterização bioquímica dos perfis enzimáticos e compostos de interesse em cladódios, frutas e sementes de 142 acessos de palma forrageira, visando uma possível utilização futura na indústria	Produto: 142 acessos caracterizados bioqumicamente para seleção dos que apresentam potencial de uso na industria	INSA	Atrasado	16-out-20	9-jan-22	R$28.400,00	1-fev-21			15		
Meta 5: Selecionar de 10 matrizes de palma forrageira mais produtivas e resistentes a Cochonilha-do-carmim e de escama e promover sua autofecundação.	Produto: 10 matrizes selecionadas para a realização de autofecundação	INSA	Atrasado	10-nov-21	8-jul-22	R$15.000,00				0		
Meta 6: Selecionar 10 matrizes promissoras de palma forrageira voltada para a qualidade fisico-química de fruto (coloração mais avermelhada) e que sejam resistentes a doenças e promover sua autofecundação para produção de linhagens S1.	Produto: Linhagens S1 produzidas	INSA	Em Andamento	14-jan-21	8-jul-22	R$10.000,00	1-fev-22			8		
Meta 7: Avaliar 400 linhagens S1 quanto e selecionar as mais produtivas e resistentes as principais pragas e doenças.	Produto: Seleção de linhagens dentro de S1 produtivas e resistentes a pragas e doenças	INSA	Em Andamento	11-set-21	1-out-23	R$25.000,00	1-jan-22			10		
Meta 8: Desenvolver 20 clones inter- e intraespecíficos mais produtivos de palma forrageira para ampliar a base genética do programa de melhoramento da cultura.	Produto: 0 clones clones inter- e intraespecíficos desenvolvidos	INSA	Em Andamento	8-jul-22	1-out-23	R$35.000,00	1-jan-22			10		
Meta 9: Induzir 20 linhagens haplóides por meios biotecnologicos usando cultura de micrósporo (androgenese) e óvulos não-fertilizados (ginogenese).	Produto: 20 linhagens haploides induzidas	INSA	Em Andamento	13-fev-21	7-ago-22	R$10.000,00	1-set-21			25		
Meta 10: Produzir 20 linhagens poliploides a partir de plantas diplóides por meios biotecnológicos (cultivo in vitro) usando agentes anti-mitóticos (colchicina, orizalina e trifluralina).	Produto: 20 linhagens poliploides produzidas	INSA	Em Andamento	13-fev-21	7-ago-22	R$13.000,00	1-jun-21			50		
Meta 11: Reduzir o tempo de juvenilidade pelo menos 20% das plântulas derivadas de cruzamentos inter- e intraespecíficos por meio de enxertia.	Produto: Pelo menos 20% de plantas apresentando tempo reduzido de juvenilidade	INSA	Atrasado	14-mai-21	10-nov-21	R$6.611,83	1-set-21			20		
Meta 12: Avaliar todos os clones e progênies S1 selecionados em diferentes condições ambientais e no Estado da Paraíba.	Produto: Campos instalados com clones e progenies S1 em diferentes condições ambientais no Estado da Paraíba	INSA	Em Andamento	14-abr-21	1-out-23	R$7.600,00	1-jun-21			25		
Meta 13: Realizar pelo menos 03 ações de desenvolvimento de produtos e mercado (dia de campo) da palma forrageira com diversas finalidades: forragem, frutifera, salada, medicinal e ornamental.	Produto: Dias de campo realizado	INSA	Atrasado	11-out-21	1-out-23	R$6.000,00				0		
Meta 14: Formação de recursos humanos em fitomelhoramento, 01 Mestrando e 01 Doutorando, do Programa de Pós-graduação em Agronomia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Paraíba.	Produto: Uma Tese e uma Dissertação realizada e artigos publicados para o subprojeto como um todo	INSA	Em Andamento	16-out-20	1-out-23		11-fev-21			60		
Meta 1: Determinação do nível de infestação da Cochonilha-de-escama	Produto: Nível de infestação da Cochonilha-de-escama determinado nos municipios e propriedades selecionadas para o estudo	INSA	Em Andamento	16-out-20	3-jun-23	R$15.000,00	1-fev-21			55		
Meta 2: Biologia de Diaspis echinocacti criada em diferentes variedades de palma forrageira	Produto: Parâmetros biológicos determinados	INSA	Em Andamento	15-mar-21	4-mai-23	R$25.000,00	1-abr-21			50		
Meta 3: Seleção de pelo menos um material resistente à Cochonilha-de-escama	Produto:Material selecionado com resistência a Cochonilha-de-escama	INSA	Em Andamento	13-jul-21	4-jan-23	R$35.850,24	1-set-21			20		
Meta 4: Avaliação da eficiência de óleos vegetais sobre a Cochonilha-de-escama e seletividade à joaninha	Produto: Óleo vegetais selecionados	INSA	Em Andamento	13-jul-21	4-abr-23	R$15.000,00	1-set-21			4		
Meta 5: Técnica para criação da joaninha para controle biológico da Cochonilha-de-escama	Produto: Técnica desenvolvida	INSA	Em Andamento	9-mai-22	3-jul-23	R$25.000,00	1-mai-21			20		
Meta 6: Uso do consórcio da palma com sorgo forrageiro	Produto: Campos implantados	INSA	Atrasado	14-jan-21	3-fev-23	R$27.000,00				0		
Meta 7: Uso de indutor de resistência na palma forrageira	Produto: Indutor de resistência aplicado e artigos publicados para o subprojeto como um todo	INSA	Em Andamento	14-abr-21	1-out-23	R$25.000,02	1-out-21			20		

Meta 1: Identificar todos os organismos fitopatogênicos associados à cultura da palma nas propriedades amostradas e confirmar sua patogenicidade	Produto: Organismos fitopatogênicos identificados e caracterizados	INSA	Concluído	16-out-20	10-nov-21	R$31.153,40	11-fev-21	1-mar-22		100		
Meta 2: Realizar em três anos, estudo epidemiológico para as principais doenças encontradas em associação com a palma forrageira	Produto: Unidades experimentais instaladas e nivel de severidade das doenças determinados	INSA	Em Andamento	13-jun-21	5-dez-22	R$41.240,00	15-ago-21			50		
Meta 3: Identificar, ao menos, dois extratos vegetais eficientes no controle de fungos fitopatogênicos da palma forrageira	Produto: Óleos vegetais com efeito fungicida identificados	INSA	Em Andamento	6-out-22	4-abr-23	R$21.946,00	11-fev-21			35		
Meta 4: Determinar pelo menos um antagonista capaz de controlar patógenos em palma forrageira	Produto:Experimento instalado e antagonista identificado	INSA	Em Andamento	5-nov-22	4-mai-23	R$9.333,60	1-dez-21			25		
Meta 5: Identificar ao menos um genótipo de palma forrageira com resistência a nematoides	Produto: Genótipo de palma identificado com resistência a nematóide	INSA	Em Andamento	5-nov-22	2-ago-23	R$14.614,00	15-ago-21			42		
Meta 6: Transferir conhecimentos através da publicação de ao menos dois artigos cientificos, um manual de identificação dos principais agentes etiológicos de doenças em palma forrageira e um relatório a cada ano do projeto	Produto: Artigos e manuais publicados para o subprojeto como um todo	INSA	Em Andamento	13-jun-21	1-out-23		30-set-21			30		
1ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	1-jan-21	30-jan-21		1-abr-21	14-abr-21		100	O INSA encaminhou o 1o Relatório Técnico Parcial em 14/04/2021. Este foi analisado e aprovado em 23/06/2021, pelo Parecer Técnico 160.	
Liberação da segunda parcela de recursos	Liberação da 2ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Concluído	1-fev-21	28-fev-21	R$139.342,00	1-dez-21	10-dez-21	R$139.342,00	100		
2ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 1ª parcela	INSA/CGEP	Concluído	1-jan-22	30-jan-22		27-jul-21	18-out-21		100	O 2º Relatório Técnico Parcial foi enviado em 27/07/2021	
Liberação da terceira parcela de recursos	Liberação da 3ª parcela de recursos financeiros	CGEP / DPLAN / CGAF /DAD / GABINETE	Atrasado	1-fev-22	28-fev-22	R$129.142,00				0		
3ª Prestação de contas parcial	Envio e análise dos relatórios de execução parcial referente à 3ª parcela	INSA/CGEP	A Iniciar	1-jan-23	30-jan-23					0		
Prestação de contas final	Envio da prestação de contas final pela unidade descentralizada	INSA	A Iniciar	1-out-23	30-nov-23					0		
Elaboração de Relatório Final	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução física	CGEP	A Iniciar	1-dez-23	30-jan-24					0		
Análise da prestação de contas financeiras	Análise da prestação de contas do ponto de vista de execução financeira	COCIC	A Iniciar	31-jan-24	31-mar-24					0		
Resumo Projeto			Atrasado									
						R$959.698,18			**R$350.707,09**	**44,36585366**		

CGEP 2020002- IDEB

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Definição de indicadores	Discussão para definição de indicadores	Glória Sistelos	Concluído	1-jan-20	28-fev-20		1-jan-20	28-fev-20		100		
Levantamento de dados	Levantamento de dados municipais por Estado	Glória Sistelos, Gabriela Isabel	Concluído	1-jan-20	30-out-20		1-jan-20	13-out-20		100	Em virtude da divulgação do resltado do IDEB 2019 em 15/09/20, sentiu-se a necessidade de incluir os novos dados no levantamento	
Validação dos dados	Verificar a consistência dos dados	Glória Sistelos	Concluído	1-jan-20	30-out-20		1-jan-20	13-out-20		100		
Relatório parcial	Consolidar resultados parciais	Joyce, Gabriela Isabel	Concluído	1-jan-20	30-out-20		1-jan-20	4-set-20		100	Relatório parcial com dados até 2017. Será atualizado com dados IDEB 2019	
Elaboração de índice	Elaboração de índice sintético de descumprimento da meta IDEB	Glória Sistelos, Gabriela Isabel	Concluído	2-mar-20	30-nov-20		24-fev-20	13-out-20		100		
Elaboração do ranking IDEB	Elaboração de ranking da diferença entre o IDEB Alcançado e a meta IDEB projetada	Glória Sistelos, Gabriela Isabel	Concluído	2-mar-20	30-nov-20		24-fev-20	13-out-20		100		
Elaboração de gráficos	Elaboração de gráficos do IDEB realizado vs IDEB projetado	Gabriela Isabel, Joyce	Concluído	2-mar-20	30-nov-20		24-fev-20	30-jan-21		100	Solicitação de postergação do prazo devido à priorização do processo 59336.000790/2020-36 (Estudo de mercado do Covid-19), do processo 59336.000658/2020-24 (Avaliação dos Incentivos Fiscais) e do processo 59336.001165/2020-10 (avaliação do FNE). Novo prazo acordado: 25/10/2020	
Elaboração dos Mapas	Elaboração de mapas com o índice de descumprimento do IDEB	Robson Brandão	Concluído	2-mar-20	30-nov-20		13-out-20	28-out-20		100	Os mapas foram resultados do IDEB 2019	
Validação dos resultados	Consolidar rotinas de verificação e correção de erros	Gabriela Isabel, Joyce	Concluído	1-abr-20	30-nov-20		28-out-20	30-jan-21		100		
Relatório parcial	Consolidar resultados parciais	Joyce, Gabriela Isabel	Concluído	1-abr-20	30-dez-20		24-fev-20	30-jan-21		100	Falta incluir os dados do IDEB 2019	
Revisão do Relatório Parcial	Revisar Relatório Parcial	Glória Sistelos	Concluído	4-set-20	30-jan-21		4-set-20	30-jan-21		100	Foi sentida a necessidade de se realizar uma revisão do Relatório Parcial entregue em 04/09/2020, razão pela qual foi incluída esta atividade no PO	
Revisão Bibliográfica	Levantamento de Políticas Públicas de Educação relacionadas ao cumprimento do IDEB	Joyce	Concluído	13-jul-20	30-jan-21		13-jul-20	30-jan-21		100		
Análise Qualitativa	Análise qualitativa da relação entre os índices construídos e as políticas encontradas	Joyce	Concluído	1-ago-20	30-jan-21		1-ago-20	30-jan-21		100		
Relatório parcial	Consolidar resultados parciais	Gabriela Isabel e Joyce	Concluído	1-ago-20	30-jan-21		1-ago-20	30-jan-21		100		
Consolidação do Relatório final	Consolidação dos Relatórios Parciais	Glória Sistelos, Gabriela Isabel, Joyce	Concluído	1-fev-21	31-mar-22		13-jul-20	30-mar-22		100	Em 30 de março foi entregue à Coordenação a versão para revisão (SEI 0341723, 0341724 e 0341735).	
Revisão do Relatório final	Revisão do Relatório Final	Glória Sistelos	Concluído	31-mar-22	30-abr-22		31-mar-22	14-abr-22		100	Em 11/04/2022 foi finalizada a revisão pela Coordenação e entregue aos técnicos responsáveis para ajustes (SEI 0341737, 0341740 e 0341745). Em 14/04/2022, foram atendidas pela equipe técnica as sugestões e concluído o produto. (SEI 0343315, 0343317), com encaminhamento a partir do Despacho CGEP 0343319. O Produto foi encaminhado	
Resumo Projeto			Concluído									
						R$0,00			**R$0,00**	**100**		

CGEP 2019002 Colheita Palma

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Reuniões internas para alinhamento do tema	Reuniões entre técnicos e gestores da Sudene para realizar discussões sobre a demanda pela colheita mecanizada de palma e definir as estratégias para resolução desse gargalo	CGEP / CGDS	Concluído	1-mar-19	31-mar-19		1-mar-19	31-mar-19		100		
1ª Reunião de Articulação Sudene / Cimatec-BA	Reunião entre equipe técnica Sudene e SENAI/CIMATEC-BA, para apresentação de proposta de projeto para construção de protótipo de máquina colheitadeira de palma	Ademir Vilaça	Concluído	15-abr-19	15-abr-19		15-abr-19	15-abr-19		100	Primeiro contato feito entre Sudene e SENAI/CIMATEC-BA para formatação de um projeto para a máquina colheitadeira de palma	
2ª Reunião de Articulação - Sudene / Cimatec-BA	Reunião entre equipe técnica Sudene e SENAI/CIMATEC-BA para apresentação de projeto com orçamento	Aildo Sabino / Robson Brandão	Concluído	15-ago-19	15-ago-19		15-ago-19	15-ago-19		100	Apresentação de proposta de colheitadeira de palma feita pelo Cimatec-BA (Sr. Diogo Poltronieri)	Levantamento de potenciais fabricantes para a máquina, além de possíveis patrocinadores (Embrapii)

Reunião de articulação entre Sudene e Embrapii	Reunião entre equipe técnica Sudene e Embrapii (Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial)	Aildo Sabino / Robson Brandão	Concluído	16-out-19	16-out-19		16-out-19	16-out-19		100	Articulação entre Sudene e Embrapii, que poderá participar como copatrocinadora do projeto da máquina	Verificação junto à Procuradoria da Sudene quanto ao instrumento adequado para arranjo institucional entre Sudene e Embrapii
Levantamento de outros possíveis parceiros institucionais	Realização de buscas por outros parceiros institucionais ligados à mecanização agrícola interessados em fomentar o projeto da máquina	Aildo / Joyce / Marcelo Saiki	Concluído	16-out-19	1-nov-19		16-out-19	1-nov-19		100	Realizados contatos com ABIMAQ, SESI/CNI, INSA, UFPE, EMBRAPA	
Levantamento de indústrias com potencial de fabricar a máquina	Busca e seleção de empresas privadas do setor de mecanização agrícola com potencial para fabricação da colheitadeira de palma	Joyce / Aildo	Concluído	1-nov-19	30-nov-19		1-nov-19	30-nov-21		100		
Elaboração de Nota Técnica para Superintendente da Sudene	Nota técnica com as justificativas para realização de evento na sede da Sudene, voltado para apresentar proposta de projeto de fabricação da colheitadeira para empresários com potencial de fabricação da máquina	Marcelo Saiki / Aildo	Concluído	1-nov-19	5-nov-19		1-nov-19	5-nov-19		100		
Programação do evento e elaboração de lista de convidados	Definição de data prevista para o evento, programação de apresentações, elaboração de lista de convidados	Aildo / Joyce / Marcelo Saiki	Concluído	1-nov-19	30-nov-19		1-nov-19	30-dez-19		100	A lista de convidados foi elaborada com base em contatos feitos com Abimaq e em pesquisas realizadas pela equipe tênica da CGEP	
Elaboração de Convite	Elaboração de arte do convite para o evento TechPalma	ASCOM	Concluído	6-nov-19	30-nov-19		6-nov-19	18-dez-19		100		
Envio dos Convites	Envio dos convites para a lista de potenciais participantes do evento	CGEP / GABINETE	Concluído	23-dez-19	30-dez-19		23-dez-19	23-dez-19		100		
Confirmação dos participantes	Entrar em contato com os convidados para confirmar sua presença	CGEP	Concluído	22-jan-20	29-jan-20		6-jan-20	31-jan-20		100		
Realização do Evento (TECHPALMA)	Realização do evento Techpalma, na sede da Sudene	CGEP / ASCOM	Concluído	5-fev-20	5-fev-20		5-fev-20	5-fev-20		100		
Relatório final do Evento	Elaboração de relatório sobre o evento Techpalma e dos encaminhamentos	Aildo / Joyce / Marcelo Saiki	Concluído	6-fev-20	12-fev-20		6-fev-20	12-fev-20		100		
Formalização de Projeto para construção da máquina	A depender das tratativas entre os partícipes, a Sudene poderá ser copatrocinadora do projeto ou realizará o acompanhamento do seu desenvolvimento junto aos atores envolvidos	CGEP	Concluído	1-mar-20	1-mai-20		1-mar-20	23-ago-20		100	Durante o evento TechPalma foi idetificado a necessidade de um segundo momento para aprofundar as tratativas entre o cimatec e as Empresas. Assim, foi agendado um workshop para os dia 01 e 02 de abril de 2020, na sede do Cimatec em Salvador-BA. Por conta da pandemia, não foi possível a realização deste Workshop na sede do Cimatec. Ele foi realizado por videoconferência em 23/08/2020. Percebeu-se que não havia a necessidade de a Sudene financianciar o projeto. Por isto, a etapa de formalização foi dada como concçuída, uma vez que as empresas estão desenvolvendo a colheidora com meios próprios. De forma complementar, a Sudene juntamente com o INSA elaboraram um documento com as referencias culturais para o desenvolvimento da colhedora;	
Acompanhamento da execução do projeto	Acompanhamento do desenvolvimento por parte das empresas interessadas	CGEP	Em Andamento	1-mai-20	31-dez-22		23-ago-20			65	e a Laboremos; Já tivemos reuniões com as duas empresas. Ficou acertado com a Casale a realização de reuniões trimestrais de acompanhamento. Estamos formatando um projeto com o INSA para a avaliação do impacto da colheita mecanizada na cultura da palma. A Casale deverá lancar o equipamento ainda em 2021;PO reprogramado para 2021;Houve duas reuniões com a empresa Laboremos, em 01/06/21 e 08/06/21, nas quais a empresa apresentou o andamento do desenolvimento da plataforma de testes. A próxima etapa consistirá na apresentação de um protótipo e a busca por possíveis parcerias. A Coordenação da COTI não avançou com as tratativas para formatar um projeto com o INSA para a avaliação do impacto da colheita mecanizada na cultura da palma devido à falta de recursos; A Laboremos divulgou vídeo institucional com os textes do prototipo da colheitadeira; A Sudene participou do Palma Tech, oganizado pela Epamig, no sia 22 /09/21; A Casale pretente concluir o projeto do protótipo e construção de modelos para teste e validação de sistemas funcionais do equipamento em 2021; Será realizado o 10º Congresso Internacional de Palma e Cochonilha, no período de 28 a 31 de março de 2022, em João Pessoa (PB), por meio da parceria entre Faepa/PB, Sociedade Internacional de Ciência Hortícola (ISHS) e Rede de Cooperação Técnica Internacional sobre a Palma da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO-ICARDA), oportunidade na qual as empresas irão apresertar as evoluções do desenvolvimento da Colheitadeira.o X CONGRESSO INTERNACIONAL DA PALMA E COCHONILHA, foi adiado e ocorrera emJoão Pessoa, Paraíba, Brasil, de 26 a 29 de setembro de 2022; foi realizado um teste na Fazenda Carnauba,	
Avaliação dos resultados do projeto	Balanço das atividades desenvolvidas no projeto e avaliação do resultado final (produto)	CGEP	A Iniciar	3-out-22	30-mar-23					0	PO reprogramado pois esta etapa depende do desenvolvimento do projeto pelas empresas, que só será concluído no 2o semestre 2021	
Elaboração de Relatório Final	Elaboração de relatório final a ser apresentado à Diretoria Colegiada da Sudene	CGEP	A Iniciar	30-mar-23	28-abr-23					0		
Divulgação dos resultados do projeto para Diretoria Colegiada	Apresentação dos resultados do projeto à Diretoria Colegiada da Sudene, para posterior deliberação	CGEP	A Iniciar	28-abr-23	29-mai-23					0		
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$0,00			**R$0,00**	**81,38888889**		

CGEP 2018001- Agro Familiar

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Seleção de proposta	Seleção de proposta para a Ação 214S - Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas	CGEP/SUDENE	Concluído	13-jun-18	29-jun-18		13-jun-18	6-jul-18		100		
Disponibilização do Programa no SICONV	Lançamento do Programa Fortalecimento da Agroindústria e atividades complementares - Código SICONV Nº 5320320180019	CGEP/SUDENE	Concluído	8-jun-18	15-jun-18		8-jun-18	15-jun-18		100		
Análise de propostas	Análise de propostas, com possíveis indicações de ajustes.	CGEP/SUDENE	Concluído	18-jun-18	22-jun-18		18-jun-18	6-jul-18		100	Apenas uma proposta foi encaminhada à Sudene	
Aprovação dos Ajustes/Complementação	Análise dos ajustes/complementação	CGEP/SUDENE	Concluído	26-jun-18	28-jun-18		25-jun-18	6-jul-18		100		
Seleção da proposta	Seleção da proposta mais adequada ao programa	CGEP/SUDENE	Concluído	28-jun-18	29-jun-18		28-jun-18	6-jul-18		100		
Aprovação da Diretoria Colegiada	Aprovação da Diretoria Colegiada	CGEP/SUDENE	Concluído	2-jul-18	2-jul-18		11-jul-18	11-jul-18		100	Proposta aprovada na 309ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da SUDENE, realizada em 11/07/2018. (Etapa antecipada por se tratar de aprovação da seleção de proposta e não quanto ao mérito do plano de trabalho)	
Análise do Plano de trabalho	Análise do projeto para verificação de sua aderência à legislação vigente, com possibilidade de solicitação de ajustes.	CGEP/SUDENE	Concluído	2-jul-18	4-jul-18		6-jul-18	7-dez-18		100	Parecer técnico nº 8 (sei 0031601) e Parecer Técnico nº 80 (sei 0037665)	

Análise do Termo de Referência	Análise técnica referente à: documento apresentado que envolve aquisição de bens ou prestação de serviços, que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado da região onde será executado o objeto, a definição dos métodos e o prazo de execução do objeto	CGEP/SUDENE	Concluído	2-jul-18	19-dez-18		2-jul-18	20-dez-18		100	Parecer Técnico nº 53/2018 (sei 0033947) e Parecer Técnico 108 (sei 0044316)	
Envio à CCONT para formalização do convênio	Procedimentos iniciais para a formalização do convênio	CGEP/SUDENE	Concluído	6-ago-18	6-ago-18		11-dez-18	11-dez-18		100	Encaminhado à COCIC em 11/12/2018. O processo andará em paralelo com as duas coordenações - CGEP/COCIC.	
Envio para apreciação da Procuradoria	Apreciação da Procuradoria	PF /COCIC	Concluído	19-dez-18	26-dez-18		26-dez-18	26-dez-18		100		
Esclarecimentos sobre relatório Jurídico		CGEP /COCIC	Concluído	26-dez-18	26-dez-18		27-dez-18	27-dez-18		100	Parecer Técnico nº 135 (0047530)	
Formalização do convênio	Assinatura dos responsáveis legais	CGEP/SUDENE	Concluído	31-dez-18	31-dez-18		28-dez-18	31-dez-18		100	CONVENIO SEI nº 0049175	
Envio para procedimentos para a publicação do convênio.	Publicação do convênio no DOU	CGEP/SUDENE	Concluído	31-dez-18	31-dez-18		11-jan-19	11-jan-19		100	Publicação no DOU 11/01/2019	
Licitação		UEFS	Cancelado	1-jan-19	1-abr-19		19-set-19			50	A Universidade iniciou vários processos para dispensa de licitação de todos os itens. Uma vez que estes processos foram sendo incluídos no Siconv de setembro de 2019 até o mês de abril de 2020 e a liberação dos recursos é prevista pra ser efetuada em parcela única, a análise realizada a partir de maio rejeitou todos os processos por entender que o critério da contemporaneidade restou prejudicado. A UEFS reiniciou os procedimentos para tais procesos, não os concluindo até 30 de setembro de 2020. Em 29/10/2020, convenente solicitou prorrogação do prazo de vigência do convênio para até 31/12/2022,a qual foi analisada e tecnicamente aceita, uma vez que não havia motivos técnicos para negar o pedido. O Termo Aditivo foi assinado em 23/12/2020. A nova vigência é 31/12/2022	Acompanhamentos realizados (23/01/2019, 18/03/2019, 05/04/2019; 22/05/2019, 06/06/2019)
Aceite do processo licitatório		CGEP E COCIC	Cancelado	1-abr-19	16-abr-19					0	Equipe técnica da CGEP aguarda término dos novos processos licitatórios para finalizar as análises e proceder ao aceite, se for o caso.	
Procedimentos para a liberação da 1ª parcela.	Liberação da primeira parcela (está em análise a possibilidade de parcela única ou duas parcelas)	CGEP/SUDENE	Cancelado	16-abr-19	21-abr-19	R$106.536,26				0	A liberação depende da finalização e aceite do processo licitatório. Foram realizadas consultas à PF/Sudene e à COCIC/CGEP a respeito da possibilidade de interrupção do Convênio pela não execução financeira. Em termos legais, não há razão para extinção do convênio. No entanto, a COCF alertou que os recursos, inscritos em Restos a Pagar não liquidados de 2018, serão cancelados caso não sejam liberados até dezembro de 2021.	
Meta 1 _ Realizar análises microbiológicas de 100 produtos alimentícios da agroindústria familiar		UEFS	Cancelado	1-abr-19	30-jan-20					0	As datas das metas estão estimadas, poderá sofrer alteração a partir da data de formalização.	
Etapa 1.1 _Aquisição de equipamentos e serviços de manutenção corretiva dos equipamentos.		UEFS	Cancelado	26-abr-19	26-abr-19					0		
Etapa 1.2_ Aquisição dos meios de cultura e Realização das análises microbiológicas de acordo com a categoria de alimentos para os microorganismos específicados na legislação.		UEFS	Cancelado	24-ago-19	30-jan-20					0		
Meta 2_ Realizar análises físico-químicas de 50 produtos alimentícios da agroindústria familiar		UEFS	Cancelado	26-abr-19	30-jan-20					0		
Etapa 2.1. Aquisição de equipamentos e serviços de manutenção corretiva dos equipamento		UEFS	Cancelado	26-abr-19	26-abr-19					0		
Etapa 2.2.Aquisição dos reagentes e realização das análises físico químicas necessária para verificar adequação aos PIQ (Padrão de Identidade e Qualidade) e obtenção da composição centesimal dos produtos e adequação/elaboração do valor nutricional do rótu		UEFS	Cancelado	24-ago-19	30-jan-20					0		
1ª Prestação de contas parcial	Análise e emissão de Parecer Técnico sobre relatório de execução parcial	CGEP/SUDENE	Cancelado	14-fev-20	29-fev-20					0		
Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	1ª Visita técnica de acompanhamento	CGEP/SUDENE	Cancelado			R$1.062,00				0	As datas da visita técnica serão acordadas entre as partes. O valor correspondente à essa meta é referente às diárias necessárias para a equipe técnica : 2 servidores x 3 diárias x R$ 177,00	
Procedimentos para liberação da 2ª parcela	Liberação da segunda parcela	CGEP/SUDENE	Cancelado	29-fev-20	15-mar-20	R$90.385,54				0		
Meta 3_ Realizar 15 cursos de capacitação em Boas Práticas de Manipulação.		UEFS	Cancelado	15-mar-20	30-out-20					0		
Visita técnica de acompanhamento e emissão de relatório	2ª Visita técnica de acompanhamento	CGEP/SUDENE	Cancelado			R$1.416,00				0	As datas da visita técnica serão acordadas entre as partes a partir da assinatura do termo de convênio. O valor correspondente à essa meta é referente às diárias necessárias para a equipe técnica : 2 servidores x 4 diárias x R$ 177,00	
2ª Prestação de contas parcial	Análise e emissão de Parecer Técnico sobre relatório de execução parcial	CGEP/SUDENE	Cancelado	30-out-20	30-nov-20					0		
Prestação de Contas Final		UEFS	Cancelado	30-nov-20	29-jan-21					0		
Análise da prestação de contas, sob o aspecto físico, e emissão de laudo.	Procedimento de análise dos elementos que comprovam, sob os aspectos técnicos, a execução integral do objeto e o alcance dos resultados previstos nos instrumentos	CGEP/SUDENE	Cancelado	29-jan-21	29-jan-22					0	O parecer financeiro será emitido pela unidade de gestão de convênios.	
Resumo Projeto			Cancelado									
						R$199.399,80			**R$0,00**	**45**		

CGDF - Projetos

CGDF2022024 Serra do Mel V

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	3-dez-21	3-jan-22		3-dez-21	27-dez-21	R$154.579.299,45			
Análise do Projeto		CGDF	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R$154.579.299,45					Status do Projeto	
						R$154.579.299,45			**R$154.579.299,45**	**#DIV/0!**		

CGDF2022023 São Joaquim

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	3-dez-21	3-jan-22	R$194.155.160,07	3-dez-21	27-dez-21				
Análise do Projeto		CGDF	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R$194.155.160,07					Status do Projeto	
						R$388.310.320,14			**R$0,00**	**#DIV/0!**		

CGDF2022022 São Conrado V

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	3-dez-21	3-jan-22	R$64.264.358,99	3-dez-21	27-dez-21				
Análise do Projeto		CGDF	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R$64.264.358,99					Status do Projeto	
						R$128.528.717,98			**R$0,00**	**#DIV/0!**		

CGDF2022021 São Conrado IV

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	3-dez-21	3-jan-22	R$64.264.358,99	3-dez-21	27-dez-21				
Análise do Projeto		CGDF	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R$64.264.358,99					Status do Projeto	
						R$128.528.717,98			**R$0,00**	**#DIV/0!**		

CGDF2022020 São Conrado III

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	3-dez-21	3-jan-22	R$56.688.231,42	3-dez-21	27-dez-21				
Análise do Projeto		CGDF	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R$56.688.231,42					Status do Projeto	
						R$113.376.462,84			**R$0,00**	**#DIV/0!**		

CGDF2022019 São Conrado II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	3-dez-21	3-jan-22	R$56.688.231,42	3-dez-21	27-dez-21				
Análise do Projeto		CGDF	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R$56.688.231,42					Status do Projeto	
						R$113.376.462,84			**R$0,00**	**#DIV/0!**		

CGDF2022018 São Conrado I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	3-dez-21	3-jan-22		3-dez-21	27-dez-21	R$64.264.358,99			
Análise do Projeto		CGDF	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R$64.264.358,99					Status do Projeto	
						R$64.264.358,99			**R$64.264.358,99**	**#DIV/0!**		

CGDF2022017 Santa Justina

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	Previsão Início	3-jan-22	R$194.174.850,13	3-dez-21	27-dez-21				
Análise do Projeto		CGDF	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R$194.174.850,13					Status do Projeto	
						R$388.349.700,26			**R$0,00**	**#DIV/0!**		

CGDF2022016 Bom Lugar VI

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	3-dez-21	3-jan-22	R$89.140.156,80	3-dez-21	27-dez-21				
Análise do Projeto		CGDF	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R$89.140.156,80					Status do Projeto	
						R$178.280.313,60			**R$0,00**	**#DIV/0!**		

CGDF2022015 Bom Lugar V

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	3-dez-21	3-jan-22	R$89.140.156,80	3-dez-21	27-dez-21				
Análise do Projeto		CGDF	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R$89.140.156,80					Status do Projeto	
						R$178.280.313,60			**R$0,00**	**#DIV/0!**		

CGDF2022014 - Bom Lugar IV

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	3-dez-21	3-jan-22	R$89.140.156,80	3-dez-21	27-dez-21				
Análise do Projeto		CGDF	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R$89.140.156,80					Status do Projeto	
						R$178.280.313,60			**R$0,00**	**#DIV/0!**		

CGDF2022013 Serra Seridó IX

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	3-dez-21	3-jan-22	R$62.086.000,00	3-dez-21	27-dez-21				
Análise do Projeto		CGDF	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R$62.086.000,00					Status do Projeto	
						R$124.172.000,00			**R$0,00**	**#DIV/0!**		

CGDF2022012 Serra seridó VII

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	3-dez-21	3-jan-22	R$55.187.000,00	3-dez-21	27-dez-21				
Análise do Projeto		CGDF	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R$55.187.000,00					Status do Projeto	
						R$110.374.000,00			**R$0,00**	**#DIV/0!**		

CGDF2022011 Serra seridó VI

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	3-dez-21	3-jan-22	R$55.187.000,00	3-dez-21	27-dez-21				
Análise do Projeto		CGDF	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R$55.187.000,00					Status do Projeto	
						R$110.374.000,00			**R$0,00**	**#DIV/0!**		

CGDF2022010 Serra seridó IV

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	3-dez-21	3-jan-22	R$61.160.000,00	3-dez-21	27-dez-21				
Análise do Projeto		CGDF	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R$61.160.000,00					Status do Projeto	
						R$122.320.000,00			**R$0,00**	**#DIV/0!**		

CGDF2022009 Serra seridó III

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	3-dez-21	3-jan-22	R$55.187.000,00	3-dez-21	27-dez-21				
Análise do Projeto		CGDF	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R$55.187.000,00					Status do Projeto	
						R$110.374.000,00			**R$0,00**	**#DIV/0!**		

CGDF2022008 Serra seridó II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Aprovação da Consulta Prévia		DC/SUDENE	Concluído	3-dez-21	3-jan-22	R$20.979.000,00	3-dez-21	27-dez-21				
Análise do Projeto		CGDF	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Deliberação do financiamento pela DC/Sudene		DC/SUDENE	A Iniciar	24-set-22	24-out-22							
Contratação do Agente Operador		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Contratação Agente Operador e Empresa		SUDENE/BANCO	A Iniciar									
Liberação		CGDF	A Iniciar									
Certificado de Conclusão do Empreendimento		BANCO	A Iniciar									
Resumo Projeto			Em Andamento			R$20.979.000,00					Status do Projeto	
						R$41.958.000,00			**R$0,00**	**#DIV/0!**		

CGDF 20220007 - MEZ 2

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta Prévia		Ademir Vilaça	Concluído	1-set-21	1-out-21		1-set-21	24-set-21		100	Consulta Prévia Aprovada - Resolução da Diretoria Colegiada nº 630/2021	
Análise do Projeto		BB	Concluído	23-dez-21	22-mai-22		13-out-21	28-dez-21		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	28-dez-21	27-jan-22		28-dez-21	19-jan-22		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 685/2022	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	24-jan-22	25-mar-22		24-jan-22	25-mar-22		95		
Contrtratação Banco/Empresa		BB/EMPRESA	Concluído	25-mar-22	30-abr-22		25-mar-22	2-jun-22			Banco informou prorrogação de 60 dias para contratação	
Liberação 1		SUDENE/BB	Atrasado	1-mai-22	1-mai-22	R$3.450.691,00						
Liberação 2		SUDENE/BB	Atrasado	1-jun-22	1-jun-22	R$1.403.137,00						
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	1-set-22	1-set-22	R$8.692.442,00						
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar	1-dez-22	1-dez-22	R$10.727.624,00						
Liberação 5		SUDENE/BB	A Iniciar	1-mar-23	1-mar-23	R$1.868.657,00						
Liberação 6		SUDENE/BB	A Iniciar	1-jun-23	1-jun-23	R$1.792.449,00						
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar								RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto			Atrasado									
						R$27.935.000,00			**R$0,00**	**98,75**		

CGDF 2022006 - Programação FNE - 2022

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Programas de financiamento	Envio, para análise, de proposta dos programas de financiamento.	BNB	Concluído	30-set-21	30-set-21	R$0,00	30-set-21	30-set-21				
Análise sobre as propostas de programas e plano de aplicação	Análise e articulação com o BNB e MDR sobre as propostas de programas e plano de aplicação do FNE.	CONF/CGDF, MDR e BNB	Concluído	13-out-21	29-nov-21	R$0,00	13-out-21	29-nov-21				
Plano de aplicação	Envio, para análise, de proposta de aplicação dos recursos relativa aos programas de financiamento.	BNB	Concluído	29-out-21	29-out-21	R$0,00	29-out-21	29-out-21				
Parecer Técnico Conjunto sobre a Programação FNE	Emissão de Parecer Técnico Conjunto para subsidiar proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene sobre a aprovação da Programação FNE, contemplando as propostas de programas e plano de aplicação.	CONF/CGDF/DFIN e MDR	Concluído	1-nov-21	29-nov-21	R$0,00	11-jan-21	29-nov-21				
Voto Diretoria Colegiada	Elaboração de Voto Diretoria Colegiada com objeto de aprovação do Parecer Técnico Conjunto que recomenda ao Condel quanto à aprovação da Programação FNE.	DFIN	Concluído	23-nov-21	25-nov-21	R$0,00	23-nov-21	25-nov-21				
Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada	Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada.	DC/SUDENE	Concluído	30-nov-21	30-nov-21	R$0,00	30-nov-21	30-nov-21				
Proposição ao Condel	Elaboração de Proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene quanto à aprovação da Programação FNE.	CGGI	Concluído	29-nov-21	29-nov-21	R$0,00	29-nov-21	29-nov-21				
Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	CGDF/DFIN	Concluído	2-dez-21	9-dez-21	R$0,00	2-dez-21	9-dez-21				
Resolução Condel	Elaboração de Resolução do Conselho Deliberativo da Sudene quanto à aprovação da Programação FNE.	CGGI	Concluído	29-nov-21	29-nov-21	R$0,00	29-nov-21	29-nov-21				
Apreciação e deliberação pelo Condel	Apreciação e deliberação pelo Condel.	CONDEL/SUDENE	Concluído	13-dez-21	13-dez-21	R$0,00	13-dez-21	13-dez-21				
Programação FNE ajustada conforme aprovado pelo Condel	O Banco Administrador deverá apresentar a Programação Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo ajustada, conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo.	BNB	Concluído	10-fev-22	10-fev-22	R$0,00	10-fev-22	10-fev-22				
Reprogramação	O Banco Administrador deverá apresentar a Programação Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo com as informações orçamentárias atualizadas, conforme dados do fechamento do respectivo exercício anterior.	BNB	Concluído	30-mar-22	30-mar-22	R$0,00	30-mar-22	30-mar-22				

Reprogramação	Revisão e atualização dos valores previstos para aplicação, considerando as contratações realizadas até 31 de agosto.	BNB	A Iniciar	30-set-22	30-set-22	R$0,00						
Resumo Projeto			Em Andamento								Status do Projeto	
						R$0,00			**R$0,00**	**#DIV/0!**		

CGDF 2022005 - Contrapartidas Sociais

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Minutas de Medidas Provisórias	Elaboração de minutas de medidas provisórias com fins de incluir a matéria na MP nº 2.156-5/2001 e na Lei nº 7.827/1989, junto à exposição de motivos.	CONF/CGDF	Concluído	23-fev-22	14-mar-22	R$0,00	23-fev-22	11-mar-22				
Consulta à Procuradoria	Análise de conformidade jurídica do pleito	PF/SUDENE	Concluído	15-mar-22	29-mar-22	R$0,00	11-mar-22	23-mar-22				
Análise e Ajustes da Minuta	Em caso de necessidade, ajustar minutas as indicações do Parecer da Procuradoria	CONF/CGDF	Concluído	30-mar-22	6-abr-22	R$0,00	24-mar-22	29-mar-22				
Conformidade	Conformidade documental dos atos de Gestão	CGGI	Concluído	6-abr-22	12-abr-22	R$0,00	6-abr-22	23-mai-22				
Envio de proposta ao MDR	Envio de proposta ao MDR, via Ofício.	GAB	Concluído	11-abr-22	11-abr-22	R$0,00	26-mai-22	26-mai-22				
Resumo Projeto			Concluído								Status do Projeto	
						R$0,00			**R$0,00**	**#DIV/0!**		

CGDF 2022004 - Taxa efetiva de juros dos Fundos de Desenvolvimento (TFD)

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Articulação entre as superintendências de desenvolvimento	Articulação entre as superintendências de desenvolvimento para a elaboração de proposta para metodologia de cálculo de encargos financeiros na modalida pré-fixada a incidir sobre os financiamentos de operações de crédito com recursos do Fundos de Desenvolvimento (TFD-pré).	CGDF	Concluído	14-mar-22	21-mar-22	R$0,00	14-mar-22	22-mar-22				
Proposta para TFD-pré	Elaboração de proposta para TFD-pré, com exposição de motivos	CGDF	Cancelado	23-mar-22	24-abr-22	R$0,00	23-mar-22					
Consulta à Procuradoria	Análise de conformidade jurídica	PF/SUDENE	Cancelado	25-abr-22	10-mai-22	R$0,00						
Análise e Ajustes da Minuta	Em caso de necessidade, ajustar minutas as indicações do Parecer da Procuradoria	CGDF	Cancelado	11-mai-22	18-mai-22	R$0,00						
Conformidade	Conformidade documental dos atos de Gestão	CGGI	Cancelado	19-mai-22	25-mai-22	R$0,00						
Apreciação pela Diretoria Colegiada	Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada.	DC/SUDENE	Cancelado	26-mai-22	3-jun-22	R$0,00						
Envio de proposta ao MDR	Envio de proposta ao MDR, via Ofício.	DFIN	Cancelado	3-jun-22	8-jun-22	R$0,00						
Resumo Projeto			Cancelado								As análises técnicas prévias indicaram que pré-fixar a TFD à deixaria menos competitiva,	
						R$0,00			**R$0,00**	**#DIV/0!**		

CGDF 2022003 - Relatório de Resultados e Impactos do FNE - 2021

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Estrutura do relatório circunstanciado FNE	Articulação com o MDR para contribuições para a Minuta de Ofício a ser enviada ao BNB referente a estrutura do Relatório Circunstanciado sobre as Atividades Desenvolvidas e os Resultados Obtidos pelo FNE.	CONF/CGDF/DFIN e MDR	Concluído	5-jan-22	14-jan-22	R$0,00	5-jan-22	14-jan-22				
Ofício MDR	Envio de ofício ao BNB referente ao Relatório Circunstanciado sobre as Atividades Desenvolvidas e os Resultados Obtidos pelo FNE	MDR	Concluído	17-jan-22	17-jan-22	R$0,00	17-jan-22	17-jan-22				
Relatório de Resultados e Impactos FNE	Recebimnento Relatório Circunstanciado sob o título de Relatório de Resultados e Impactos (RRI) FNE.	BNB	Concluído	29-abr-22	6-mai-22	R$0,00	29-abr-22	29-abr-22				
Parecer Técnico Conjunto sobre RRI FNE	Articulação SUDENE, MDR e BNB. Emissão de Parecer Técnico Conjunto para subsidiar proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene sobre a aprovação do Relatório de Resultados e Impactos FNE.	CGDF/DFIN, CGEP/DPLAN e MDR	Concluído	6-mai-22	10-jun-22	R$0,00	3-mai-22	18-jun-22				
Apreciação do Parecer Técnico pelas coordenações gerais e diretorias	Análise e elaboração de Voto à Diretoria Colegiada da Sudene	CGDF/DFIN e CGEP/DPLAN	Atrasado	13-jun-22	20-jun-22	R$0,00	18-jun-22					
Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada	Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada.	DFIN ou DPLAN	Atrasado	21-jun-22	30-jun-22	R$0,00						
Proposição ao Condel	Elaboração de Proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene sobre a aprovação do Relatório de Resultados e Impactos FNE.	CGGI	A Iniciar	1-jul-22	8-jul-22	R$0,00						
Reunião Comitê técnico do Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	CGDF/DFIN	A Iniciar	4-ago-22	4-ago-22	R$0,00						
Resolução Condel	Elaboração de Resolução do Conselho Deliberativo da Sudene sobre a aprovação do Relatório de Resultados e Impactos FNE.	CGGI	A Iniciar	5-ago-22	10-ago-22	R$0,00						
Reunião do CONDEL/SUDENE	Apreciação e deliberação pelo Condel.	CONDEL/SUDENE	A Iniciar	11-ago-22	11-ago-22	R$0,00						
Acompanhamento das recomendações expedidas no âmbito da avaliação dos Relatórios de Resultados e Impactos do FNE, exercício 2021	Acompanhamento das recomendações expedidas no âmbito da avaliação dos Relatórios de Resultados e Impactos do FNE, exercício 2021.	CONF/CGDF/DFIN	A Iniciar	12-ago-22	5-dez-22	R$0,00						
Resumo Projeto			Atrasado								Status do Projeto	
						R$0,00			**R$0,00**	**#DIV/0!**		

CGDF 2022002 - Programação FNE - 2023

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Programas de financiamento	Recebimento das propostas de alteração dos Programas de Financiamento. Articulação técnica entre MDR, SUDENE e BNB. Análise técnica das propostas.	CONF/CGDF, MDR e BNB	A Iniciar	30-set-22	28-out-22	R$0,00						
Plano de aplicação	Recebimento do plano de aplicação. Articulação técnica MDR, SUDENE e BNB.	CONF/CGDF, MDR e BNB	A Iniciar	30-out-22	4-nov-22	R$0,00						
Parecer Técnico Conjunto sobre a Programação FNE	Emissão de Parecer Técnico Conjunto pela equipe técnica. Apreciação da CGDF. Apreciação da DFIN.	CONF/CGDF/DFIN, MDR	A Iniciar	1-nov-22	9-nov-22	R$0,00						
Apreciação do Parecer Técnico pela Coordenação Geral e Diretoria	Análise, ajustes e preparação de voto à Diretoria Colegiada	CGDF/DFIN	A Iniciar	10-nov-22	14-nov-22	R$0,00						
Apreciação pela Diretoria Colegiada	Apreciação do Voto pela Diretoria Colegiada.	DC/SUDENE	A Iniciar	15-nov-22	18-nov-22	R$0,00						
Proposição ao Condel	Elaboração de Proposição ao Conselho Deliberativo da Sudene quanto à aprovação da Programação FNE.	CGGI	A Iniciar	22-nov-22	25-nov-22	R$0,00						
Reunião Comitê técnico do Condel	Apresentação da proposição ao Comitê técnico do Condel.	CGDF/DFIN	A Iniciar	28-nov-22	28-nov-22	R$0,00						
Resolução Condel	Elaboração de Resolução do Conselho Deliberativo da Sudene quanto à aprovação da Programação FNE.	CGGI	A Iniciar	29-nov-22	2-dez-22	R$0,00						

Reunião do CONDEL/SUDENE	Apreciação e deliberação pelo Condel.	CONDEL/SUDENE	A Iniciar	5-dez-22	5-dez-22	R$0,00						
Programação FNE ajustada conforme aprovado pelo Condel	O Banco Administrador deverá apresentar a Programação Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo ajustada, conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo.	BNB	A Iniciar	10-fev-23	10-fev-23	R$0,00						
Reprogramação	O Banco Administrador deverá apresentar a Programação Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo com as informações orçamentárias atualizadas, conforme dados do fechamento do respectivo exercício anterior.	BNB	A Iniciar	30-mar-23	30-mar-23	R$0,00						
Reprogramação	Revisão e atualização dos valores previstos para aplicação, considerando as contratações realizadas até 31 de agosto.	BNB	A Iniciar	30-set-23	30-set-23	R$0,00						
Resumo Projeto			A Iniciar								Status do Projeto	
						R$0,00			**R$0,00**	**#DIV/0!**		

CGDF 2022001 - FDNE LIASA

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta Prévia		Anita Riquelme	Concluído	26-ago-21	25-set-21		26-ago-21	24-set-21		100	Consulta Prévia Aprovada - Resolução da Diretoria Colegiada nº 629/2021	
Análise do Projeto		BDMG	Concluído	23-dez-21	22-mai-22		23-dez-21	18-fev-22		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	18-fev-22	20-mar-22		18-fev-22	25-fev-22		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 691/2022	
Contratação do banco operador		SUDENE/BDMG	Concluído	4-mar-22	3-mai-22		4-mar-22	17-mar-22		50		
Contratação Banco/Empresa		BDMG/EMPRESA	Concluído	18-mar-22	18-abr-22		18-mar-22	18-mar-22				
Liberação 1		SUDENE/BDMG	Atrasado	1-mai-22	1-mai-22	R$48.000.000,00	24-jun-22					
Liberação 2		SUDENE/BDMG	A Iniciar	1-fev-23	1-fev-23	R$24.000.000,00						
Liberação 3		SUDENE/BDMG	A Iniciar	1-fev-24	1-fev-24	R$23.890.000,00						
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BDMG	A Iniciar								RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto			Atrasado			R$95.890.000,00			R$0,00		Status do Projeto	
						R$191.780.000,00			**R$0,00**	**87,5**		

CGDF 2021015 Assuruá III

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Gabriela Lins	Concluído	9-dez-20	8-jan-21		9-dez-20	7-jan-21		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	6-jul-21	3-dez-21		6-jul-21	1-dez-21		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	4-dez-21	3-jan-22		4-dez-21	22-dez-21		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	4-jan-22	5-mar-22		22-dez-21	27-dez-21		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Atrasado	1-jun-22	1-jul-22	R$13.682.253,05				0		
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	1-dez-22	31-dez-22	R$21.485.985,41				0		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	1-jun-23	1-jul-23	R$96.836.792,83				0		
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar	1-dez-23	31-dez-23	R$2.800.455,43				0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Atrasado									
						R$134.805.486,72			**R$0,00**	**44,44444444**		

CGDF 2021014 Assuruá II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Gabriela Lins	Concluído	9-dez-20	8-jan-21		9-dez-20	7-jan-21		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	6-jul-21	3-dez-21		6-jul-21	1-dez-21		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	4-dez-21	3-jan-22		4-dez-21	22-dez-21		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	4-jan-22	5-mar-22		22-dez-21	27-dez-21		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Atrasado	1-jun-22	1-jul-22	R$14.916.428,49				0		
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	1-dez-22	31-dez-22	R$21.634.580,46				0		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	1-jun-23	1-jul-23	R$90.753.756,72				0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Atrasado									
						R$127.304.765,67			**R$0,00**	**50**		

CGDF 2021013 Assuruá I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Gabriela Lins	Concluído	9-dez-20	8-jan-21		9-dez-20	7-jan-21		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	6-jul-21	3-dez-21		6-jul-21	1-dez-21		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	4-dez-21	3-jan-22		4-dez-21	22-dez-21		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	4-jan-22	5-mar-22		22-dez-21	27-dez-21		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Atrasado	1-jun-22	1-jul-22	R$15.280.590,06				0		
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	1-dez-22	31-dez-22	R$32.762.657,47				0		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	1-jun-23	1-jul-23	R$88.656.757,44				0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Atrasado									
						R$136.700.004,97			**R$0,00**	**50**		

CGDF 2021012 Milagres V

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Ademir Vlaça	Concluído	2-fev-21	4-mar-21		2-fev-21	25-fev-21		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	20-ago-21	17-jan-22		20-ago-21	21-set-21		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21-set-21	21-out-21		21-set-21	19-out-21		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19-out-21	18-dez-21		19-out-21	19-nov-21		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	A Iniciar	1-out-22	31-out-22	R$11.614,14				0	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	1-jan-23	31-jan-23	R$4.447,08				0		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	1-abr-23	30-abr-23	R$34.077,60				0		
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar	1-jul-23	31-jul-23	R$20.070,36				0		
Liberação 5		SUDENE/BB	A Iniciar	1-out-23	31-out-23	R$5.930,82						
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$76.140,00			**R$0,00**	**44,44444444**		

CGDF 2021011 Milagres IV

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Ademir Vlaça	Concluído	2-fev-21	4-mar-21		2-fev-21	25-fev-21		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	20-ago-21	17-jan-22		20-ago-21	21-set-21		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21-set-21	21-out-21		21-set-21	19-out-21		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19-out-21	18-dez-21		19-out-21	19-nov-21		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	A Iniciar	1-out-22	31-out-22	R$18.066,44				0	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	1-jan-23	31-jan-23	R$6.917,68				0		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	1-abr-23	30-abr-23	R$53.009,60				0		
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar	1-jul-23	31-jul-23	R$31.220,56				0		
Liberação 5		SUDENE/BB	A Iniciar	1-out-23	31-out-23	R$9.225,72						
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$118.440,00			**R$0,00**	**44,44444444**		

CGDF 2021010 Milagres III

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Ademir Vlaça	Concluído	2-fev-21	4-mar-21		2-fev-21	25-fev-21		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	20-ago-21	17-jan-22		20-ago-21	21-set-21		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21-set-21	21-out-21		21-set-21	19-out-21		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19-out-21	18-dez-21		19-out-21	19-nov-21		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	A Iniciar	1-out-22	31-out-22	R$11.614,14				0	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	1-jan-23	31-jan-23	R$4.447,08				0		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	1-abr-23	30-abr-23	R$34.077,60				0		
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar	1-jul-23	31-jul-23	R$20.070,36				0		
Liberação 5		SUDENE/BB	A Iniciar	1-out-23	31-out-23	R$5.930,82						
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$76.140,00			**R$0,00**	**44,44444444**		

CGDF 2021009 Milagres II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Ademir Vlaça	Concluído	2-fev-21	4-mar-21		2-fev-21	25-fev-21		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	20-ago-21	17-jan-22		20-ago-21	21-set-21		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21-set-21	21-out-21		21-set-21	19-out-21		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19-out-21	18-dez-21		19-out-21	19-nov-21		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	A Iniciar	1-out-22	31-out-22	R$11.614,14				0	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	1-jan-23	31-jan-23	R$4.447,08				0		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	1-abr-23	30-abr-23	R$34.077,60				0		
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar	1-jul-23	31-jul-23	R$20.070,36				0		
Liberação 5		SUDENE/BB	A Iniciar	1-out-23	31-out-23	R$5.930,82						
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$76.140,00			**R$0,00**	**44,44444444**		

CGDF 2021008 Milagres I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Ademir Vlaça	Concluído	2-fev-21	4-mar-21		2-fev-21	25-fev-21		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	20-ago-21	17-jan-22		20-ago-21	21-set-21		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21-set-21	21-out-21		21-set-21	19-out-21		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19-out-21	18-dez-21		19-out-21	19-nov-21		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	A Iniciar	1-out-22	31-out-22	R$11.614,14				0	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	1-jan-23	31-jan-23	R$4.447,08				0		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	1-abr-23	30-abr-23	R$34.077,60				0		
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar	1-jul-23	31-jul-23	R$20.070,36				0		
Liberação 5		SUDENE/BB	A Iniciar	1-out-23	31-out-23	R$5.930,82						
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$76.140,00			**R$0,00**	**44,44444444**		

CGDF 2021007 Parnaíba II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Teles	Concluído	29-dez-20	28-jan-21		29-dez-20	28-jan-21		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	20-ago-21	17-jan-22		20-ago-21	8-nov-21		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	18-jan-22	17-fev-22		9-nov-21	26-nov-21		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	4-mar-21	3-mai-21		4-mar-21	31-mai-21		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	A Iniciar	1-out-22	31-dez-22	R$109.298.073,20				0		
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	1-out-23	31-dez-23	R$164.881.889,00				0		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar							0		
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar							0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0	RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$274.179.962,20			**R$0,00**	**44,44444444**		

CGDF 2021006 Catanduba II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Teles	Concluído	4-dez-20	3-jan-21		4-dez-20	21-dez-20		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	23-jul-21	20-dez-21		23-jul-21	23-nov-21		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21-dez-21	20-jan-22		24-nov-21	16-dez-21		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	20-jan-22	21-mar-22		2-dez-21	17-dez-21		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	A Iniciar	1-out-22	31-dez-22	R$1.127.760,36				0		
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	1-out-23	31-dez-23	R$12.705.920,00				0		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	1-out-24	31-jan-24	R$127.008.130,00				0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0	RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$140.841.810,36			**R$0,00**	**50**		

CGDF 2021005 Catanduba I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Teles	Concluído	4-dez-20	3-jan-21		4-dez-20	21-dez-20		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	23-jul-21	20-dez-21		23-jul-21	23-nov-21		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	21-dez-21	20-jan-22		24-nov-21	16-dez-21		100		
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	4-mar-21	3-mai-21		16-dez-21	27-dez-21		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	A Iniciar	1-out-22	31-dez-22	R$1.127.760,36				0		
Liberação 2		SUDENE/BB	A Iniciar	1-out-23	31-dez-23	R$12.705.920,00				0		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	1-out-24	31-dez-24	R$127.008.130,00				0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0	RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$140.841.810,36			**R$0,00**	**50**		

CGDF 2021004 Borborema

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita de Cassia	Concluído	25-nov-20	25-dez-20		25-nov-20	23-dez-20		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	17-mai-21	14-out-21		17-mai-21	5-ago-21		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	14-out-21	13-nov-21		5-ago-21	2-set-21		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	2-set-21	1-nov-21		2-set-21	8-set-21		100	A minuta de contrato foi enviado ao banco para validação e assinatura	
Liberação 1		SUDENE/BB	Atrasado	15-nov-21	15-dez-21	R$60.000.000,00	8-abr-22			0	Empresa não solicitou ao BB liberação de recursos	Foi solicitado ao BB as causas do atraso da execução financeira do projeto.
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Atrasado									
						R$60.000.000,00			**R$0,00**	**66,66666667**		

CGDF 2021003 Canudos III

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Gabriela Lins	Concluído	24-ago-20	23-set-20		24-ago-20	23-set-20		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	4-fev-21	4-jul-21		4-fev-21	8-fev-21		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	8-fev-21	10-mar-21		8-fev-21	25-fev-21		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	4-mar-21	3-mai-21		4-mar-21	31-mai-21		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	1-abr-21	1-mai-21	R$36.829.244,50	16-jul-21	3-ago-21	R$28.947.510,76	100		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	1-jul-21	31-jul-21	R$128.804.144,44	4-nov-21	12-nov-21	R$15.092.448,98	100		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	1-jan-22	31-jan-22	R$17.728.549,22	15-out-21	11-nov-21	R$19.120.976,86	100		
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído				10-dez-21	23-dez-21	R$29.933.005,47	100		
Liberação 5		SUDENE/BB	Concluído				26-jan-22	5-mar-22	R$28.495.798,45	100		
Liberação 6		SUDENE/BB	Em Andamento				16-mar-22		R$23.230.286,24	80	Foi solicitada previsão de desembolso para o valor restante	
Liberação 7		SUDENE/BB	A Iniciar							0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0	RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$183.361.938,16			**R$144.820.026,76**	**81,66666667**		

CGDF 2021002 - Canudos II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	24-ago-20	23-set-20		24-ago-20	23-set-20		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	3-fev-21	3-jul-21		3-fev-21	8-fev-21		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	8-fev-21	10-mar-21		8-fev-21	3-mar-21		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	4-mar-21	3-mai-21		4-mar-21	31-mai-21		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	1-abr-21	1-mai-21	R$36.829.244,50	16-jul-21	3-ago-21	R$35.444.673,28	100		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	1-jul-21	31-jul-21	R$128.804.144,44	4-nov-21	12-nov-21	R$36.136.600,99	100		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	1-jan-22	31-jan-22	R$17.728.549,22	1-dez-21	23-dez-21	R$16.468.567,32	100		
Liberação 4		SUDENE/BB	A Iniciar							0	A empresa ainda não solicitou a liberção do recurso.	
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$183.361.938,16			**R$88.049.841,59**	**77,77777778**		

CGDF 2021001 Ap rec FNE 2021

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Envio dos dados das contratações no exercício até março/2021	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	Concluído	1-abr-21	25-abr-21		1-abr-21	26-abr-21		100	Os dados foram enviados com informações incompletas	
Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a março de 2021.	CONF/CGDF/DFIN	Concluído	26-abr-21	6-mai-21		26-abr-21	7-jun-21		100	Tendo em vista o atraso por parte do BNB para enviar os dados refentes às contratações, o relatório de análise teve seu prazo estendido, bem como a aprovação pela DC	
Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	Concluído	7-mai-21	7-mai-21		2-jul-21	15-jul-21		100		
Envio dos dados das contratações no exercício até junho/2021	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	Concluído	1-jun-21	25-jun-21		1-jun-21	29-jul-21		100	Tendo em vista o atraso por parte do BNB para enviar os dados refentes às contratações, o relatório de análise teve seu prazo estendido, bem como a aprovação pela DC	
Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a junho de 2021.	CONF/CGDF/DFIN	Concluído	26-jun-21	6-jul-21		29-jul-21	27-ago-21		100		
Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	Concluído	7-jul-21	7-jul-21		31-ago-21	2-set-21		100		
Envio dos dados das contratações no exercício até setembro/2021	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	Concluído	1-out-21	25-out-21		1-out-21	22-out-21		100		
Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a setembro de 2021.	CONF/CGDF/DFIN	Concluído	26-out-21	5-nov-21		22-out-21	3-dez-21		100		
Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	Concluído	6-nov-21	6-nov-21		22-dez-21	22-dez-21		100		
Envio dos dados das contratações no exercício até dezembro/2021	O BNB deve enviar trimestralmente, via servidor FTP, os dados das contratações com recursos do FNE no exercício.	BNB	Concluído	1-jan-22	25-jan-22		10-fev-22	10-fev-22		100		
Análise dos dados e elaboração do Relatório	Processar os dados e elaborar Relatório compreendendo o período de janeiro a dezembro de 2021.	CONF/CGDF/DFIN	Concluído	26-jan-22	5-fev-22		11-fev-22	5-mar-22		100		
Apreciação do Relatório pela Diretoria Colegiada	O Relatório deve ser pautado na reunião da Diretoria Colegiada para apreciação e decisão quanto à sua aprovação.	Diretoria Colegiada da Sudene	Concluído	6-fev-22			5-abr-22	5-abr-22		0	Os dados foram enviados pelo BNB com atraso	
Resumo Projeto			Concluído									
						R$0,00			**R$0,00**	**91,66666667**		

CGDF 2020007 Vila AL II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	29-nov-19	29-dez-19		29-nov-19	26-dez-19		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	22-mai-20	19-out-20		22-mai-20	15-out-20		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	15-out-20	14-nov-20		15-out-20	11-dez-20		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 542/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	17-nov-20	16-jan-21		17-nov-20	7-dez-20		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	19-mar-21	18-abr-21	R$15.891.285,35	19-mar-21	5-abr-21	R$15.891.285,35	100		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	1-mai-21	31-mai-21	R$23.937.650,00	2-jul-21	19-jul-21	R$26.437.744,05	100		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	1-out-21	31-out-21	R$15.957.953,87	29-out-21	12-nov-21	R$10.687.741,05	100	A empresa solicitou alteração do Quadro de Usos e Fontes, totalizando investimento de RS 55.786.889,22	
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	1-dez-21	31-out-22	R$2.770.118,77	15-mar-22	5-abr-22	R$2.770.118,77	80		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0	RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$58.557.007,99			**R$55.786.889,22**	**86,66666667**		

CGDF 2020006 Vila ES II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	29-nov-19	29-dez-19		29-nov-19	20-dez-19		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	22-mai-20	19-out-20		22-mai-20	15-out-20		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	19-out-20	18-nov-20		19-out-20	17-nov-20		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 541/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	17-nov-20	16-jan-21		17-nov-20	7-dez-20		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	19-mar-21	18-abr-21	R$19.807.254,22	19-mar-21	6-abr-21	R$19.807.254,22	100		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	1-mai-21	31-mai-21	R$43.167.800,00	2-jul-21	19-jul-21	R$47.021.856,73	100		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	1-out-21	31-out-21	R$27.883.346,34	29-out-21	12-nov-21	R$19.923.445,78	100	A empresa solicitou alteração do Quadro de Usos e Fontes, totalizando investimento de R$ 90.858.400,56	
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	1-dez-21	31-out-22	R$4.105.843,83	15-mar-22	5-abr-22	R$4.105.843,83	80		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0	RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$94.964.244,39			**R$90.858.400,56**	**86,66666667**		

CGDF 2020005 Vila ES I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Diego Veras	Concluído	29-nov-19	29-dez-19		29-nov-19	29-dez-19		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	22-mai-20	19-out-20		22-mai-20	19-out-20		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	19-out-20	18-nov-20		19-out-20	17-nov-20		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 540/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	17-nov-20	16-jan-21		17-nov-20	7-dez-20		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	19-mar-21	18-abr-21	R$70.157.041,59	19-mar-21	6-abr-21	R$70.157.041,59	100		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	1-mai-21	31-mai-21	R$25.425.490,00	2-jul-21	19-jul-21	R$19.746.649,89	100		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	1-out-21	31-out-21	R$7.877.105,81	29-out-21	12-nov-21	R$9.328.702,82	100	A empresa solicitou alteração do Quadro de Usos e Fontes que diminuiu a participação total para R$ 103.459.637,40	
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	1-dez-21	31-out-22	R$4.227.243,10	15-mar-22	5-abr-22	R$4.227.243,10	80		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Em Andamento									

						R$107.686.880,50			**R$103.459.637,40**	**86,66666667**		

CGDF 2020004 Boqueirão II

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	11-dez-19	10-jan-20		11-dez-19	26-dez-19		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	22-mai-20	19-out-20		22-mai-20	18-set-20		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	19-set-20	19-out-20		19-set-20	19-out-20		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 576/2020.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19-out-20	18-dez-20		19-out-20	4-dez-20		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	1-jan-21	2-mar-21	R$32.968.329,00	23-dez-21	3-jan-22	R$32.968.329,00	100	As 3 primeiras liberações foram aglutinadas em um único pedido, de R$ 32.968.329,74, valor superior aos R$ 32.687.000,00 previstos para as 3primeiras parcelas	
Liberação 4		SUDENE/BB	Atrasado	19-abr-22	31-mai-22	R$7.918.595,00	19-abr-22			0		
Liberação 5		SUDENE/BB	A Iniciar	10-out-22	10-out-22	R$61.425.076,00				0		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0	RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto			Atrasado									
						R$102.312.000,00			**R$32.968.329,00**	**62,5**		

CGDF 2020003 Boqueirão I

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	11-dez-19	10-jan-20		11-dez-19	26-dez-19		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	22-mai-20	19-out-20		22-mai-20	18-set-20		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	19-set-20	19-out-20		19-set-20	19-out-20		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 576/2020.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	19-out-20	18-dez-20		19-out-20	4-dez-20		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	1-jan-21	2-mar-21	R$41.435.881,00	23-dez-21	3-jan-22	R$41.435.881,68	100	As 4 primeiras liberações no cronograma foram consolidadas em apenas 1 pedido, que somou R$ 41.435.881,68, inferior ao montante previsto de R$ 43.911.000.00	
Liberação 2		SUDENE/BB	Atrasado	19-abr-22	31-mai-21	R$7.517.274,00	19-abr-22			100		
Liberação 3		SUDENE/BB	A Iniciar	10-out-22	10-nov-22	R$64.725.845,00				100		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0	RESOLUÇÃO DC/SUDENE Nº 621: Art. 13. O CCE deverá ser emitido pelo agente operador no prazo de até 120 (cento e vinte) dias a contar da data do reembolso da 1ª (primeira) parcela do financiamento ou da liberação da última parcela de recursos do FDNE, o que ocorrer por último.	
Resumo Projeto			Atrasado									
						R$113.679.000,00			**R$41.435.881,68**	**87,5**		

CGDF 2020002 -Ventos S. Fern

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Anita Riquelme	Concluído	11-dez-19	10-jan-20		11-dez-19	27-dez-20		100		
Análise de Projeto		BB	Concluído	26-mai-20	23-out-20		26-mai-20	13-ago-20		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	13-ago-20	12-set-20		13-ago-20	11-set-20		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 545/2019.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BB	Concluído	11-set-20	10-nov-20		11-set-20	22-set-20		100		
Liberação 1		SUDENE/BB	Concluído	27-out-20	26-nov-20	R$105.116.695,74	27-out-20	12-nov-20	R$105.116.695,74	100		
Liberação 2		SUDENE/BB	Concluído	13-nov-20	13-dez-20	R$37.312.882,51	13-nov-20	26-nov-20	R$37.312.882,51	100		
Liberação 3		SUDENE/BB	Concluído	3-dez-20	2-jan-21	R$44.547.574,61	3-dez-20	28-dez-20	R$44.547.574,61	100		
Liberação 4		SUDENE/BB	Concluído	22-jan-21	21-fev-21	R$21.149.995,99	22-jan-21	5-fev-21	R$21.149.995,99	100		
Liberação 5		SUDENE/BB	Concluído	11-fev-21	13-mar-21	R$5.497.253,53	11-fev-21	26-fev-21	R$5.497.253,53	100		
Liberação 6		SUDENE/BB	Concluído	30-abr-21	30-mai-21	R$15.048.036,82	30-abr-21	20-mai-21	R$15.048.036,82	100		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$228.672.439,20			**R$228.672.439,20**	**90,90909091**		

CGDF 2014001 BRK

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta prévia		Mauro Póvoas (SUDENE/DGFI)	Concluído	3-mai-13	31-mai-13		3-mai-13	3-jun-13		100		
Análise de Projeto		CEF	Concluído	3-jun-13	31-out-13		19-ago-13	18-fev-14		100		
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	18-fev-14	20-mar-14		20-fev-14	21-fev-14		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 183/2014.	
Contratação do banco operador		SUDENE/CEF	Concluído	21-fev-14	22-abr-14		21-fev-14	22-ago-14		100		
Liberação 1		SUDENE/CEF	Concluído	1-jan-14	31-jan-14	R$70.152.822,60	10-dez-14	26-dez-14	R$70.152.822,60	100		
Liberação 2		SUDENE/CEF	Concluído	1-jun-14	1-jul-14	R$108.469.901,94	1-set-15	30-set-15	R$108.469.901,94	100		
Liberação 3		SUDENE/CEF	Concluído	1-dez-15	31-dez-15	R$59.034.909,19	10-dez-15	25-jan-16	R$59.034.909,19	100		
Liberação 4		SUDENE/CEF	Concluído	1-fev-16	2-mar-16	R$8.848.709,00	19-abr-16	19-mai-16	R$8.848.709,00	100		
Liberação 5		SUDENE/CEF	Concluído	1-dez-16	31-dez-16	R$77.004.546,60	5-dez-16	29-dez-17	R$77.004.546,60	100		
Liberação 6		SUDENE/CEF	Concluído	15-dez-20	14-jan-21	R$5.675.760,33	8-jul-21	22-set-21	R$74.497.533,01	100		
Liberação 7		SUDENE/CEF	Concluído	1-mai-21	31-mai-21	R$86.395.912,86	19-nov-21	23-dez-21	R$15.002.994,00	100		
Liberação 8		SUDENE/CEF	A Iniciar	30-jul-22	30-ago-22					0	Recurso não solicitado sem previsão definida por parte do Banco	
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BB	A Iniciar							0	A Diretoria Colegiada da Sudene editou a Resolução 326/2018, de 17/12/2018, alterando modelo, procedimentos e prazos para a emissão dos certificados pelos agentes operadores.	
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$415.582.562,52			**R$413.011.416,34**	**84,61538462**		

CGDF 2011003 Mar e Terra

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Carta-consulta		Casimiro/Norberto	Concluído	13-jul-11	11-set-11		13-jul-11	28-jul-11		100		
Pré-análise		Mauro	Concluído	11-nov-11	10-jan-12		11-nov-11	22-dez-11		100		

Análise de Projeto		BNB/A definir	Concluído	29-dez-11	10-fev-13		29-dez-11	27-jan-12		100	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 462/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
Análise de Projeto - novos prazos		BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	Concluído	24-dez-12	23-mai-13		24-dez-12	8-mai-13		100	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	8-mai-13	7-jun-13		8-mai-13	22-mai-13		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 152/2013.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BNB	Concluído	22-mai-13	31-mai-13		22-mai-13	24-mai-13		100		
Liberação1		SUDENE/BNB	Concluído	1-fev-14	3-mar-14	R$46.786.085,39	1-fev-14	3-mar-14	R$46.786.085,39	100		
Liberação 2		SUDENE/BNB	Concluído	1-abr-14	1-mai-14	R$3.213.914,61	12-jan-16	15-fev-16	R$3.213.914,61	100		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BNB	Em Andamento				30-mar-22			0	Iniciado novo contato com o BNB para emissão do CCE	
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$50.000.000,00			**R$50.000.000,00**	**88,88888889**		

CGDF 2011002 Bela Vista

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Carta-consulta		Casimiro/Norberto (sudene/dgfi)	Concluído	13-jul-11	11-set-11		13-jul-11	28-jul-11		100		
Pré-análise		Casimiro (SUDENE/DGFI)	Concluído	11-nov-11	10-jan-12		11-nov-11	19-dez-11		100		
Análise de Projeto		BNB (a definir)	Concluído	29-dez-11	10-fev-13		29-dez-11	20-jan-12		100	Projeto encaminhado ao BNB para análise por meio do Ofício nº 461/2011, de 29/12/2011. Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
Análise de Projeto - novos prazos		BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	Concluído	24-dez-12	24-mar-13		24-dez-12	25-mar-13		100	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	25-mar-13	24-abr-13		25-mar-13	22-mai-13		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 154/2013.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BNB	Concluído	22-mai-13	31-mai-13		22-mai-13	24-mai-13		100		
Liberação 1		SUDENE/BNB	Concluído	1-jan-14	31-jan-14	R$53.635.943,87	1-jan-14	24-jan-14	R$53.635.943,87	100		
Liberação 2		SUDENE/BNB	Concluído	1-mai-14	31-mai-14	R$1.264.056,13	12-jan-16	15-fev-16	R$1.264.056,13	100		
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BNB	Em Andamento	17-dez-18			30-mar-22			0	Iniciado novo contato com o BNB para emissão do CCE	
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$54.900.000,00			**R$54.900.000,00**	**88,88888889**		

CGDF 2011001 Embuaca

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Carta-consulta		Casimiro/Norberto (SUDENE/DGFI)	Concluído	13-jul-11	11-set-11		13-jul-11	28-jul-11		100		
Pré-análise		Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	Concluído	11-nov-11	10-jan-12		11-nov-11	22-dez-11		100		
Análise de Projeto		BNB/A definir	Concluído	29-dez-11	10-fev-13		29-dez-11	19-jan-12		100	Empresa solicitou prazo adicional de 60 dias para atender exigências da análise.	Portaria MI nº 363A, de 26.06.2012 - Prazos de análise sobrestados.
Análise de Projeto - novos prazos		BNB-Equipe:Daniel/Marluio/Emiliano	Concluído	24-dez-12	24-mar-13		24-dez-12	25-mar-13		100	Com a publicação da Resolução CMN nº 4.171/2012, em 24.12.2012, no DOU, foi reiniciada a contagem de prazo para conclusão desta etapa.	
Aprovação do Financiamento FDNE pela Diretoria Colegiada		SUDENE	Concluído	25-mar-13	24-abr-13		25-mar-13	22-mai-13		100	Projeto Aprovado - Resolução da Diretoria Colegiada nº 151/2013.	
Contratação do banco operador		SUDENE/BNB	Concluído	22-mai-13	31-mai-13		22-mai-13	24-mai-13		100		
Liberação 1		SUDENE/BNB	Concluído	18-fev-14	20-mar-14	R$42.723.785,57	18-fev-14	12-mar-14	R$42.723.785,57	100		
Liberação 2		SUDENE/BNB	Concluído	1-jul-14	31-jul-14	R$16.976.214,43	26-dez-14	2-fev-15	R$16.976.214,43	100	Liberações concluidas.	
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BNB	Em Andamento				30-mar-22			0	Iniciado novo contato com o BNB para emissão do CCE	
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$59.700.000,00			**R$59.700.000,00**	**88,88888889**		

CGDF 2008002 Candeias

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Carta-consulta		Norberto Scopel (SUDENE/DGFI)	Concluído	24-jul-08	23-ago-08		24-jul-08	25-ago-08		100	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
Pré-análise		Mauro Povoas (SUDENE/DGFI)	Concluído	6-jan-09	6-fev-09		10-set-08	15-out-08		100	O prazo de pré-análise na SUDENE antes de set/09 era de 30 dias e depois de set/09 passou a ser de 60 dias	
Análise de Projeto		Francisco (CENAP/BNB)	Concluído	15-out-08	12-fev-09		15-out-08	1-ago-11		100	O projeto permaneceu em análise no Banco do Nordeste por 45 meses	
Aprovação do projeto (O valor do projeto é de R$ 591.065.604,06 e a participação do FDNE é de R$ 61.728.156,00)		Diretoria Colegiada da SUDENE	Concluído	1-ago-11	31-ago-11		1-ago-11	15-ago-11		100	Resolução SUDENE n. 87/2011.	Ofício nº 669/2012/DFIN-SUDENE, de 07/05/12, solicitando providências do BNB junto à Empresa para liberação dos recursos. Aguardando retorno.
Liberação (parcela única)		SUDENE/DGFI e DGE/CGO/MI	Concluído	21-mar-12	20-abr-12	R$61.728.156,00	21-mar-12	1-jun-12	R$61.728.156,00	100	Liberação concluída. Ofício ANGPF-2012/575-16, de 31.05.2012 (BNB), comunica à SUDENE que foram atendidas condições para liberação dos recursos. Ordem Bancária nº 2012OB00001, de 01/06/2012.	
Emissão de Certificado de Empreend. Implantado		BNB	Concluído	17-dez-18	15-fev-19		30-mar-22	30-mar-22		0	O BNB emitiu CCE com erro na legislação do Fundo, se referindo ao decreto 7838 ao invés do 6952. Foi solicitada alteração em março de 2020, mas o banco não enviou o documento.	
Resumo Projeto			Concluído									
						R$61.728.156,00			**R$61.728.156,00**	**83,33333333**		

CGDF 2008001 Transnordestina

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Carta-consulta		Villeneuve (SUDENE/DFIN)	Concluído	8-ago-08	7-set-08		8-ago-08	8-set-08		100	O valor não foi informado tendo em vista que é uma carta de intenções de enquadramento nas análises de investimentos do FDNE.	
Pré-análise		Villeneuve e Cassimiro (SUDENE/DFIN)	Concluído	23-set-08	23-out-08		23-set-08	9-out-08		100	A análise na SUDENE,antes de set/09 (30 dias) e depois de set/09 (60 dias).	
Análise de Projeto		José Leorne (CENOP/BNB)	Concluído	9-out-08	6-fev-09		9-out-08	28-out-08		100	A análise é feita no Banco do Nordeste do Brasil.	

Aprovação do projeto no montante de R$ 89.294.135,70 e participação do FDNE de R$ 53.576.481,00)		Diretoria Colegiada da SUDENE	Concluído	29-out-08	28-nov-08		29-out-08	24-nov-08		100	Resolução Diretoria Colegiada SUDENE nº 24/2008.	
Liberação 1		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	12-jan-10	11-fev-10	R$336.647.184,00	12-jan-10	12-jan-10	R$336.647.184,00	100	Referente ao Módulo 1 (parcela 1 - pós configuração modular - Resolução da Diretoria Colegiada nº 28, de 16/12/2009).	
Liberação 2		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	29-nov-10	29-dez-10	R$350.270.386,00	29-nov-10	29-nov-10	R$350.270.386,00	100	Referente ao Módulo 2 (parcela 1 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
Liberação 3		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	1-dez-10	31-dez-10	R$338.035.512,00	1-dez-10	2-dez-10	R$338.035.512,00	100	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38/2010, de 28/10/2010). Liberação inferior à prevista no cronograma.	
Liberação 4		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	27-set-11	27-out-11	R$468.293.037,00	27-set-11	6-out-11	R$468.293.037,00	100	Referente ao Módulo 1 (parcela 2 - pós adequação técnica aprovada pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 38, de 28/10/2010).	
Liberação 5		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	29-ago-12	28-set-12	R$121.859.549,00	29-ago-12	20-set-12	R$121.859.549,00	100	Liberações concluídas para o Módulo I. Liberação parcial para o Módulo II. Módulo III sem liberação. (Vide obs4).	Liberação parcial, proporcional às comprovações. A previsão inicial era de liberar R$ 176,9 milhões. Cronograma reformulado.
Desmodularização do projeto		Norberto Scopel (SUDENE/DFIN)	Concluído	1-set-12	1-out-12	R$0,00	1-set-12	21-set-12		100	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 21.09.12, aprovou a desmodularização do projeto.	
Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	6-fev-13	8-mar-13	R$0,00	6-fev-13	27-fev-12		100	Diretoria Colegiada da SUDENE, em reunião de 27.02.13, aprovou a adequação do cronograma de desembolso do projeto.	
Liberação 6		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	1-fev-13	3-mar-13	R$650.000.000,00	1-fev-13	24-jun-13	R$650.000.000,00	100	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2013/147, de 17.05.2013) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	A SUDENE apontou impropriedades no Relatório do BNB, que foram sanadas por meio do Ofício DIRET-2013/152, de 22.05.2013.
Adequação do projeto com Aporte Adicional de Recursos		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	15-out-12	13-abr-13	R$0,00	15-out-12	3-jul-14		100	Aditado no valor de R$1.204.091.700,00(resolução nº 190/2014).	
Liberação 7		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Concluído	1-nov-13	1-dez-13	R$800.000.000,00	23-jul-14	11-ago-14	R$800.000.000,00	100	BNB apresentou o Relatório de Desempenho do Empreendimento e a proposta de liberação de recursos (Ofício DIRET-2014/146, de 21.06.2014) com base no novo cronograma de desembolso aprovado pela SUDENE.	
Liberação 8		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Parado	1-nov-14	1-dez-14	R$500.000.000,00				0	Liberações suspensas por determinação do TCU (Ácordão 67/2017).	
Liberação 9		SUDENE/DFIN E CENOP/BNB	Parado	1-mai-15	31-mai-15	R$311.386.032,00				0	Liberações suspensas por determinação do TCU (Ácordão 67/2017).	
Emissão do Certificado de Empreend. Implantado		BNB	A Iniciar							0		
Resumo Projeto			Parado									
						R$3.876.491.700,00			**R$3.065.105.668,00**	**82,35294118**		

Código	Número do Processo SEI	Empresa	Valor do Investimento	Data de Distribuição do Pleito	Pré Análise: Status	Análise Técnica: Status	Encaminhamento para DC: Status	Data de Conclusão do Processo	Status	Observações/Problemas
CGIF2022001	59336.001125/2022-21	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	R$ 6.250.000,00	11/03/22	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	
CGIF2022002	59336.000719/2022-15	MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA LTDA.	R$ 194.349,00	21/02/22	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022003	59336.000823/2022-18	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	R$ 49.358.242,00	03/03/22	Concluído	Concluído	Concluído	18/04/22	Concluído	
CGIF2022004	59336.000868/2022-84	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	R$ 106.964.068,80	04/03/22	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022005	59336.001158/2022-71	OWENS-ILLINOIS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 41.955.529,12	10/03/22	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022006	59336.001158/2022-71	SULOG - SUAPE LOGISTICA S/A	R$ 27.000.000,00	15/12/21	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	
CGIF2022007	59336.000509/2022-27	MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A	R$ 2.328.314,37	11/03/22	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022008	59336.000100/2022-19	PERNAMBUCO QUIMICA S A	R$ 4.000.000,00	11/03/22	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022009	59336.000458/2022-33	POLIMIX CONCRETO LTDA	R$ 4.169.646,61	11/03/22	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022010	59336.000833/2022-45	LUZ BELA INDUSTRIA DE VELAS LTDA	R$ 84.726,00	14/03/22	Concluído	Concluído	Concluído	18/04/22	Concluído	
CGIF2022011	59336.001071/2022-02	BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	R$ 3.299.665,67	14/03/22	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022012	59336.001115/2022-96	MEGAFERRO COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	R$ 1.437.000,00	14/03/22	Em Andamento	Em Andamento	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022013	59336.000929/2022-11	INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO GUARANI LTDA	R$ 2.319.019,00	14/03/22	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Em Andamento	
CGIF2022014	59336.000882/2022-88	FERTILIZANTES TOCANTINS S.A	R$ 6.277.232,00	14/03/22	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022015	59336.000654/2022-16	GRI TOWER BRASIL ESTRUTURAS METALICAS S/A	R$ 32.936.452,58	22/12/21	Concluído	Concluído	Concluído	18/04/22	Concluído	
CGIF2022016	59336.000270/2022-95	MOINHO NORDESTE DE VITORIA DA CONQUISTA LTDA	R$ 3.000.000,00	04/01/22	Concluído	Concluído	Em Andamento		Em Andamento	empresa não encaminhou documentação para continuação do exame
CGIF2022017	59336.000566/2022-14	PRIME AGROINDUSTRIAL LTDA	R$ 200.000,00	12/01/22	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	empresa não encaminhou documentação para continuação do exame
CGIF2022018	59336.000574/2022-52	LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.	R$ 15.886.301,76	24/01/22	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	empresa não encaminhou documentação para continuação do exame
CGIF2022019	59336.001047/2022-65	NUTRANE NUTRICAO ANIMAL LTDA	R$ 350.000,00	27/01/22	Concluído	Concluído	Em Andamento		Em Andamento	empresa não encaminhou documentação para continuação do exame
CGIF2022020	59336.000820/2022-76	SP ACOS BRASIL LTDA	R$ 810.411,10	17/01/22	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	empresa não encaminhou documentação para continuação do exame
CGIF2022021	59336.001182/2022-19	GRI CORTE E BISELADO BRASIL S/A	R$ 8.197.053,90	01/02/22	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	empresa não encaminhou documentação para continuação do exame
CGIF2022023	59336.001172/2022-75	SPRINT TECNOLOGIA DA INFORMACAO E ASSESSORIA EM ERP LTDA.		15/02/22	Concluído	Concluído	Concluído	18/04/22	Concluído	
CGIF2022024	59336.001147/2022-91	JANAUBA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S.A	R$ 978.196.950,10	15/02/22	Concluído	Concluído	Concluído	18/04/22	Concluído	
CGIF2022025	59336.000730/2022-85	INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES GOLFINHO LTDA	R$ 4.385.447,37	17/02/22	Concluído	Em Andamento	A Iniciar		Em Andamento	empresa não encaminhou documentação para continuação do exame
CGIF2022026	59336001059/2022-90	IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A.	R$ 33.422.750,59	22/02/22	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	empresa não encaminhou documentação para continuação do exame
CGIF2022027	59336.001184/2022-08	DASA- DESTILARIA DE ALCOOL SERRA DOS AIMORES S/A	R$ 6.785.675,62	22/02/22	Concluído	Concluído	Concluído	18/04/22	Concluído	
CGIF2022028	59336.000308/2022-20	MORQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 428.671,93	24/02/22	Concluído	Concluído	Concluído	29/03/22	Concluído	
CGIF2022029	59336.001076/2022-27	OASIS ALIMENTOS LTDA	R$ 15.242.656,14	24/02/22	Concluído	Concluído	Concluído	18/04/22	Concluído	
CGIF2022030	59336.000553/2022-37	ARTHUR AZEVEDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	R$ 442.979,84	24/02/22	Concluído	Concluído	Concluído	28/04/22	Concluído	empresa não encaminhou documentação para continuação do exame
CGIF2022031	59336.001126/2022-76	AGUA MARINHA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R$ 4.189.913,00	24/02/22	Concluído	Em Andamento	A Iniciar		Em Andamento	empresa não encaminhou documentação para continuação do exame
CGIF2022032	59336.001016/2022-12	ASTRAL-INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES E MASSAS ESPECIAIS LTDA.	R$ 3.000.000,00	04/03/22	Concluído	Concluído	Concluído	18/04/22	Concluído	
CGIF2022033	59336.001062/2022-11	GAAS SERVICOS E SOLUCOES LTDA	R$ 1.500.000,00	04/03/22	Concluído	Em Andamento	A Iniciar		Em Andamento	empresa não encaminhou documentação para continuação do exame
CGIF2022034	59336.000733/2022-19	KNAUF DO BRASIL LTDA	R$ 75.052.619,12	07/03/22	Concluído	Em Andamento	A Iniciar		Em Andamento	empresa não encaminhou documentação para continuação do exame
CGIF2022035	59336.000836/2022-89	ECOFOR AMBIENTAL S/A	R$ 22.129.496,33	09/03/22	Concluído	Concluído	Concluído	18/04/22	Concluído	
CGIF2022036	59336.000157/2022-18	SAO FRANCISCO ENERGIA S.A.		15/03/22	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022037	59336.000638/2022-15	REFINARIA DE MATARIPE S.A.		17/03/22	Concluído	Concluído	Concluído	18/04/22	Concluído	
CGIF2022038	59336.001109/2022-39	I.V.L. INDUSTRIAS VIEIRA LTDA		21/03/22	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	

Código	Número do Processo SEI	Empresa	Valor do Investimento	Data de Distribuição do Pleito	Pré Análise: Status	Análise Técnica: Status	Encaminhamento para DC: Status	Data de Conclusão do Processo	Status	Observações/Problemas
CGIF2022039	59336.000063/2022-31	PLASTMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	R$ 128.168,96	19/05/22	Em Andamento	Em Andamento	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022040	59336.001025/2022-03	BARBOSA, BARBOSA E CIA LTDA	R$ 458.748,77	23/03/22	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022041	59336.000734/2022-63	PARK HOTEL E ADMINISTRACAO LTDA		23/03/22	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022042	59336.000696/2022-49	DURLICOUROS IND E COM DE COUROS, EXP E IMPORTAC...	R$ 20.000.000,00	23/03/22	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	
CGIF2022043	59336.001150/2022-13	CMP DE FARIAS LTDA	R$ 272.558,83	24/03/22	Concluído	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022044	59336.000027/2022-77	BETANIA LACTEOS S.A.		20/12/21	Concluído	Em Andamento	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022045	59336.000629/2022-24	TECON SALVADOR S/A	R$ 947.226.992,40	19/12/21	Concluído	Concluído	Concluído	18/04/22	Concluído	
CGIF2022046	59336.000293/2022-08	PROTEINORTE ALIMENTOS SA	R$ 21.264.823,20	29/12/21	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	
CGIF2022048	59336.000884/2022-77	RDX INDUSTRIA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	R$ 690.000,00	14/03/22	Concluído	Concluído	Concluído	18/04/22	Concluído	
CGIF2022049	59336.001124/2022-87	SAO FRANCISCO ENERGIA S.A.		15/03/22	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022050	59336.004128/2021-36	SAO FRANCISCO ENERGIA S.A.		15/03/22	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022051	59336.000722/2022-39	POLIMIX CONCRETO LTDA	R$ 208.651.895,80	15/03/22	Concluído	Concluído	Concluído	18/04/22	Concluído	
CGIF2022052	59336.000707/2022-91	ARA TEXTIL LTDA	R$ 347.200,00	07/03/22	Concluído	Concluído	Concluído	29/03/22	Concluído	
CGIF2022053	59336.001079/2022-61	CLARO S.A.	R$ 96.489.757,99	09/02/22	Concluído	Concluído	Concluído	29/03/22	Concluído	
CGIF2022054	59336.000711/2022-59	ESTEL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	R$ 1.485.287,31	18/01/22	Concluído	Concluído	Concluído	29/03/22	Concluído	
CGIF2022055	59336.000578/2022-31	JRS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS LTDA	R$ 3.257.003,78	29/12/21	Concluído	Concluído	Concluído	29/03/22	Concluído	
CGIF2022056	59336.000484/2022-61	LIFERAY LATIN AMERICA LTDA.	R$ 9.616.435,89	17/12/21	Concluído	Concluído	Concluído	29/03/22	Concluído	
CGIF2022057	59336.001148/2022-36	MESSER GASES LTDA.	R$ 5.634.850,44	16/03/22	Concluído	Concluído	Concluído	29/03/22	Concluído	
CGIF2022059	59336.000899/2022-35	ALTENBURG NORDESTE LTDA		07/03/22	Concluído	Concluído	Concluído	29/03/22	Concluído	
CGIF2022060	59336.001170/2022-86	ANTTUNINA POUSADA SPA LTDA	R$ 10.745.010,76	18/01/22	Concluído	Concluído	Concluído	29/03/22	Concluído	
CGIF2022061	59336.000601/2022-97	CLARO S.A.	R$ 18.758.104,08	03/03/22	Concluído	Concluído	Concluído	29/03/22	Concluído	
CGIF2022062	59336.000768/2022-58	CMPQ IGARASSU INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ...	R$ 5.184.568,00	28/02/22	Concluído	Concluído	Concluído	29/03/22	Concluído	
CGIF2022063	59336.000715/2022-37	EVC INDUSTRIAL LTDA	R$ 1.593.251,43	10/01/22	Concluído	Concluído	Concluído	29/03/22	Concluído	
CGIF2022064	59336.000943/2022-15	INTERCEMENT BRASIL S.A.		01/02/22	Concluído	Concluído	Concluído	29/03/22	Concluído	
CGIF2022065	59336.000736/2022-52	LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.	R$ 38.364.830,00	24/01/22	Concluído	Concluído	Concluído	29/03/22	Concluído	
CGIF2022066	59336.000540/2022-68	LATICINIOS VIDA COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI	R$ 3.000.000,00	28/01/22	Concluído	Concluído	Concluído	29/03/22	Concluído	
CGIF2022067	59336.000800/2022-03	LINHAS DE TRANSMISSAO DE MONTES CLAROS S.A.	R$ 297.024.503,80	31/01/22	Concluído	Concluído	Concluído	29/03/22	Concluído	
CGIF2022068	59336.001067/2022-36	MINERACAO VALE VERDE DO BRASIL LTDA.	R$ 429.792.000,00	15/12/21	Concluído	Concluído	Concluído	29/03/22	Concluído	
CGIF2022069	59336.001187/2022-33	PONTES & LANDIM HOTELARIA E ALUGUEIS LTDA	R$ 7.229.503,96	17/01/22	Concluído	Concluído	Concluído	29/03/22	Concluído	
CGIF2022070	59336.000615/2022-19	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	R$ 932.481,00	23/02/22	Concluído	Concluído	Concluído	29/03/22	Concluído	
CGIF2022071	59336.001139/2022-45	TRANSMISSORA SERTANEJA DE ELETRICIDADE S.A.	R$ 219.294.920,40	21/03/22	Em Andamento		A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022072	59336.000986/2022-92	IMPLASVERDE INDUSTRIA DE PLASTICOS BAIXAVERDE LTDA	R$ 6.950.000,00	21/03/22	Concluído		Em Andamento		Em Andamento	
CGIF2022073	59336.000319/2022-18	FRIGORIFICO LESTE LTDA	R$ 18.748.800,96	24/03/22	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	
CGIF2022074	59336.003917/2021-50	LABOREMUS IND E COM DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	R$ 1.481.040,74	24/03/22	Concluído	Em Andamento	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022075	59336.001038/2022-74	A2 INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	R$ 1.402.163,60	15/03/22	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	
CGIF2022076	59336.000166/2022-09	ALBERTO SA INDUSTRIA E COMERCIO	R$ 1.500.000,00	13/04/22	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022077	59336.001020/2022-72	ARTHUR AZEVEDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L...	R$ 442.979,84	08/04/22	Concluído	Concluído	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022078	59336.000565/2022-61	BELGO BEKAERT ARAMES LTDA	R$ 3.224.160,00	14/04/22	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	
CGIF2022079	59336.000229/2022-19	BENTONIT UNIAO NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 340.833,07	29/03/22	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022080	59336.000867/2022-30	BEZERRA INDUSTRIA DE ACO E SERVICOS LTDA	R$ 1.126.713,00	14/04/22	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022081	59336.001154/2022-93	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.	R$ 207.193.228,80	08/04/22	Concluído	Em Andamento	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022082	59336.000834/2022-90	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.		20/04/22	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022083	59336.000617/2022-08	CHEMTRADE BRASIL LTDA	R$ 7.902.072,42	05/04/22	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	
CGIF2022084	59336.000828/2022-32	CIA DE GAS DO CEARA CEGAS	R$ 1.410.742,00	11/04/22	Concluído	Concluído	Em Andamento		Em Andamento	
CGIF2022085	59336.004152/2021-75	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO N...	R$ 106.964.068,76	27/04/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022086	59336.000673/2022-34	COMVAP ACUCAR E ALCOOL LTDA	R$ 67.341.606,05	10/05/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022087	59336.000691/2022-16	CONCESSIONARIA ESTRADA DO FEIJAO SPE S/A	R$ 123.546,89	12/05/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022088	59336.001140/2022-70	CONVERT INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R$ 500.000,00	22/04/22	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022089	59336.000941/2022-18	COSTANOX ACOS INOXIDAVEIS EIRELI	R$ 813.234,15	11/04/22	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	
CGIF2022090	59336.001112/2022-52	COTESI DO BRASIL - COMERCIO, INDUSTRIA DE FIOS ...		09/05/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022091	59336.003997/2021-43	DAKOTA CALCADOS S/A	R$ 17.725.265,00	05/05/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022092	59336.000533/2022-66	DIVISAGLASS LTDA		19/05/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022093	59336.000226/2022-85	EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO PORTUARIA -...	R$ 371.897.435,70	11/04/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022094	59336.000688/2022-01	EMPRESA SUDESTE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.	R$ 549.992.000,00	22/04/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022095	59336.000623/2022-57	ENGPLAST LTDA	R$ 150.000,00	29/03/22	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	
CGIF2022096	59336.000657/2022-41	FERTIAL-FERTILIZANTES DE ALAGOAS LTDA	R$ 808.000,00	22/04/22	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	
CGIF2022097	59336.000421/2022-13	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	R$ 609.301,54	22/04/22	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	
CGIF2022098	59336.000636/2022-26	FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA		20/05/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022099	59336.001128/2022-65	FRIBARREIRAS AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS EIRELI	R$ 3.000.000,00	29/03/22	Concluído	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022100	59336.000869/2022-29	GREEN PCR FLAKE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC...	R$ 3.000.000,00	28/04/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	

Código	Número do Processo SEI	Empresa	Valor do Investimento	Data de Distribuição do Pleito	Pré Análise: Status	Análise Técnica: Status	Encaminhamento para DC: Status	Data de Conclusão do Processo	Status	Observações/Problemas
CGIF2022101	59336.001051/2022-23	GRENDENE S A	R$ 187.566.268,00	29/03/22	Concluído	Em Andamento	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022102	59336.000749/2022-21	I.V.L. INDUSTRIAS VIEIRA LTDA	R$ 10.000.000,00	06/05/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022103	59336.000783/2022-04	IBAE - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS ESPECI...	R$ 17.565.155,04	28/03/22	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022104	59336.001143/2022-11	IBAE - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS ESPECI...	R$ 17.565.155,04	19/04/22	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	
CGIF2022105	59336.000298/2022-22	ICONE MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPORTACA...	R$ 329.505,29	24/02/22	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	
CGIF2022106	59336.001055/2022-10	INDUSTRIA ALIMENTICIA TRES DE MAIO SA		20/05/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022107	59336.000856/2022-50	INDUSTRIA E COMERCIO DE SABAO GUARANI LTD		14/03/22	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	
CGIF2022108	59336.003857/2021-75	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MARATA LTDA.	R$ 5.000.000,00	22/04/22	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022109	59336.001183/2022-55	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MARATA LTDA.	R$ 5.000.000,00	06/05/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022110	59336.004024/2021-21	INDUSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA	R$ 2.960.791,00	19/04/22	Concluído	Concluído	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022111	59336.000459/2022-88	INDUSTRIAS REUNIDAS CORINGA LTDA		24/05/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022112	59336.000776/2022-02	INDUSTRIAS REUNIDAS HELIO ARRUDA COELHO LTDA	R$ 2.300.000,00	13/05/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022113	59336.000914/2022-45	INFAN INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	R$ 4.560.077,28	19/04/22	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022114	59336.000794/2022-86	IPVC INDUSTRIA DE PAPELAO LTDA	R$ 1.488.458,43	04/05/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022115	59336.000648/2022-51	J MACEDO S/A		20/05/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022116	59336.000739/2022-96	J. R. COMERCIO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA	R$ 4.744.135,28	13/05/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022117	59336.000827/2022-98	JAV INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	R$ 20.000.000,00	28/04/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022118	59336.003950/2021-80	JAV INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		19/05/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022119	59336.000740/2022-11	JOSE GONCALVES DANTAS EIRELI	R$ 3.022.023,85	11/05/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022120	59336.000741/2022-65	LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A.	R$ 123.416.181,00	18/04/22	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	
CGIF2022121	59336.000311/2022-43	LATICINIO SERTAO JUCURUTU EIRELI	R$ 4.500.000,00	25/04/22	Concluído	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022122	59336.000961/2022-99	LATICINIO SERTAO JUCURUTU EIRELI		19/05/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022123	59336.000960/2022-44	LAURA MILENA BARBOSA PATRIOTA LTDA	R$ 7.761.130,00	19/04/22	Concluído	Em Andamento	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022124	59336.000959/2022-10	LS HOTEL EIRELI	R$ 4.000.000,00	11/04/22	Concluído	Em Andamento	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022125	59336.001122/2022-98	LUMINAE S.A.	R$ 5.376.338,84	16/05/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022126	59336.001163/2022-84	MANTIQUEIRA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.	R$ 391.026.448,60	28/03/22	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	
CGIF2022127	59336.001136/2022-10	MAR - MARACANAU RECICLAGEM DE SUBPRODUTOS LTDA	R$ 2.183.727,72	07/04/22	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022128	59336.001199/2022-68	MAR - MARACANAU RECICLAGEM DE SUBPRODUTOS LTDA	R$ 2.183.727,72	13/05/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022129	59336.001210/2022-90	MARSOL HOTEIS E TURISMO S/A	R$ 45.180,00	14/04/22	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	
CGIF2022130	59336.001227/2022-47	MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLAS...	R$ 243.000,00	12/05/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022131	59336.001225/2022-58	MINAS MINERACAO LTDA	R$ 6.267.328,72	01/04/22	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022132	59336.001229/2022-36	MOINHO TABAJARA LTDA	R$ 1.400.000,00	05/05/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022133	59336.001238/2022-27	MORAIS DE CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU...	R$ 700.000,00	08/04/22	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022134	59336.001275/2022-35	MULTIPLAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	R$ 315.000,00	14/04/22	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022135	59336.001294/2022-61	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R$ 154.433,07	09/02/22	Concluído	Em Andamento	A Iniciar		Em Andamento	documentação encaminhada
CGIF2022136	59336.001296/2022-51	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	R$ 154.433,07	19/04/22	Concluído	Em Andamento	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022137	59336.001310/2022-16	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOG...	R$ 285.299,72	11/04/22	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022138	59336.001312/2022-13	NEOVERO SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOG...	R$ 285.299,72	13/05/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022139	59336.001320/2022-51	NOGUEIRA DE LIMA E FILHOS LTDA	R$ 609.693,49	19/04/22	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022140	59336.001321/2022-04	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	R$ 7.062.984,45	22/04/22	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	
CGIF2022141	59336.001333/2022-21	PARK HOTEL E ADMINISTRACAO LTDA		28/04/22	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	
CGIF2022142	59336.001340/2022-22	PERNAMBUCO QUIMICA S A	R$ 4.000.000,00	28/04/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022143	59336.001359/2022-79	PLASTMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	R$ 128.168,96	15/05/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022144	59336.001360/2022-01	POLIMIX CONCRETO LTDA	R$ 4.820.076,67	31/03/22	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	
CGIF2022145	59336.001375/2022-61	POLIMIX CONCRETO LTDA	R$ 32.378.931,31	13/04/22	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	
CGIF2022146	59336.001386/2022-41	PRITAM FRUT EXPORTACAO LTDA	R$ 7.000.000,00	11/04/22	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022147	59336.001396/2022-87	PROXXIMA TELECOMUNICACOES LTDA	R$ 9.635.668,41	07/04/22	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022148	59336.001405/2022-30	R DOIS INJETADOS NORDESTE LTDA	R$ 2.951.458,00	06/05/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022149	59336.001406/2022-84	RUPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R$ 28.944.933,57	19/04/22	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022150	59336.001407/2022-29	SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A		18/05/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022151	59336.001420/2022-88	SAGA MEDICAO S/A		31/03/22	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	
CGIF2022152	59336.001421/2022-22	SANNY CONFECCOES FEMININAS SA	R$ 102.565,01	10/05/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022153	59336.001424/2022-66	SF RANCHARIA LTDA.	R$ 14.584.510,00	07/04/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022154	59336.001548/2022-41	SF RANCHARIA LTDA.	R$ 14.584.510,00	03/05/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022155	59336.001514/2022-57	SF RANCHARIA LTDA.		20/05/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022156	59336.001469/2022-31	SWEET FRUITS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS PARA...		23/05/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022157	59336.001487/2022-12	THOR GRANITOS E MARMORES LTDA		04/04/22	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	
CGIF2022158	59336.001496/2022-11	THOR GRANITOS E MARMORES LTDA		04/04/22	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	
CGIF2022159	59336.001497/2022-58	THOR GRANITOS E MARMORES LTDA		04/04/22	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	

Código	Número do Processo SEI	Empresa	Valor do Investimento	Data de Distribuição do Pleito	Pré Análise: Status	Análise Técnica: Status	Encaminhamento para DC: Status	Data de Conclusão do Processo	Status	Observações/Problemas
CGIF2022160	59336.001510/2022-79	TOMBADOR IRON MINERACAO LTDA	R$ 31.035.329,28	20/12/21	Concluído	Concluído	Concluído	26/05/22	Concluído	
CGIF2022161	59336.001511/2022-13	TORMAQ RACOES LTDA	R$ 834.638,92	29/04/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022162	59336.001512/2022-68	TRANSMISSORA SERTANEJA DE ELETRICIDADE S.A.	R$ 219.294.920,40	18/04/22	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	
CGIF2022163	59336.001513/2022-11	UPPER DOG COMERCIAL LTDA	R$ 8.301.743,39	04/05/22	A Iniciar	A Iniciar	A Iniciar		Em Andamento	

CGGP - Projetos

CGGP2022006 - Programa QVT

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Pesquisa	Pesquisa na internet Programas de Qualidade de Vida no Trabalho realizados nas Instituições Públicas Federais	DIDAS/CGGP	Concluído	2022-05-23	2022-05-30	0	2022-05-23	2022-05-30	0	100		
Anamnese/Levantamnto interno	Realizar levantamento das principais necessidades existentes entre os servidores da Sudene	DIDAS/CGGP	Em Andamento	2022-06-20	2022-08-29	0	2022-06-20					
Indentificar às ações	Indificar quais às ações mais adequadas para atender as necessidades identificadas no levantamento interno	DIDAS/CGGP	A Iniciar	2022-08-30	2022-09-30	0						
Elaborar o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	Elaborar o documento técnico com a descrição da proposta do Programa de Qualiade de Vida no Trbalho	DIDAS/CGGP	A Iniciar	2022-10-03	2022-10-31	0						
Encaminhamento para Aprovação	Encaminhamento do Projeto para Diretoria de Administração para providências e aprovação	DIDAS/CGGP	A Iniciar	2022-11-03	2022-11-10	0						
Resumo Projeto			Em Andamento									
						0			**0**	**100**		

CGGP2022005 - Balcão de Talentos

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Identificar os Responsáveis do Projeto	Identificação das áreas responsáveis pelo Projeto	GABINETE / DAD	Concluído	2022-01-29	2022-03-02	0	2022-01-29	2022-03-02	0	100		
Aplicar o questionário de seleção	Identificação dos talentos nas áreas	COMISSÃO DE SELEÇÃO (ASCOM / CGGP / Diretoria)	Concluído	2022-03-01	2022-03-07	0	2022-03-01	2022-03-07	0	100		
Apresentar a proposta de data e roteiro da atividade comemorativa dos aniversariantes do meses de fevereiro e março	Apresentação de proposta pela Comissão de Seleção / Representante da Diretoria Indicada	COMISSÃO DE SELEÇÃO	Concluído	2022-03-08	2022-03-16	0	2022-03-08	2022-03-16	0	100	Apresentação do roteiro para aprovação do General Araújo Lima na reunião estratégica do dia 16/03/2022	
Divulgar nas redes sociais o evento de comemoração dos aniversariantes e apresentar o balcão de talentos	Divulgação nas redes sociais o evento de comemoração dos aniversariantes e apresentação do balcão de talentos	ASCOM	Concluído	2022-03-23	2022-03-30	0	2022-03-23	2022-03-28	0	100		
Ensaio	Ensaio geral da apresentação do balcão de talentos	COMISSÃO DE CERIMONIAL (ASCOM / CGGP / Diretoria)	Concluído	2022-03-25	2022-03-25	0	2022-03-25	2022-03-25	0	100		
Planejar Aniversariantes dos Mês de abril e apresentar a Diretoria responsável do balcão de talentos	Comemoração dos Aniversariantes do Mês de abril e apresentação do balcão de talentos	COMISSÃO DE CERIMONIAL (ASCOM / CGGP / Diretoria)	Concluído	2022-04-04	2022-04-08	0	2022-04-04	2022-04-08	0	100		
Aplicar o questionário de seleção	Identificação dos talentos nas áreas	COMISSÃO DE SELEÇÃO (ASCOM / CGGP / Diretoria)	Concluído	2022-04-04	2022-04-08	0	2022-04-04	2022-04-08	0	100		
Apresentar a proposta de data e roteiro da atividade comemorativa dos aniversariantes do mês de abril	Apresentação de proposta pela Comissão de Seleção / Representante da Diretoria Indicada	COMISSÃO DE SELEÇÃO	Concluído	2022-04-11	2022-04-15	0	2022-04-04	2022-04-08	0	100		
Divulgar nas redes sociais o evento de comemoração dos aniversariantes e apresentar o balcão de talentos	Divulgação nas redes sociais o evento de comemoração dos aniversariantes e apresentação do balcão de talentos	ASCOM	Cancelado	2022-04-18	2022-04-22	0					Evento de abril será realizado em conjunto com aniversariantes de maio	
Ensaiar a apresentação do balcão de talentos mês de abril	Ensaio geral da apresentação do balcão de talentos	COMISSÃO DE CERIMONIAL (ASCOM / CGGP / Diretoria)	Concluído	2022-04-25	2022-04-29	0	2022-04-25	2022-04-29	0	100		
Planejar Aniversariantes dos Mês de Maio e apresentar a Diretoria responsável do balcão de talentos	Comemoração dos Aniversariantes do Mês e apresentação do balcão de talentos	COMISSÃO DE CERIMONIAL (ASCOM / CGGP / Diretoria)	Concluído	2022-05-02	2022-05-06	0	2022-04-25	2022-04-26	0	100		
Aplicar o questionário de seleção	Identificação dos talentos nas áreas	COMISSÃO DE SELEÇÃO (ASCOM / CGGP / Diretoria)	Concluído	2022-05-09	2022-05-13	0	2022-04-26	2022-04-26	0	100		
Apresentar a proposta de data e roteiro da atividade comemorativa dos aniversariantes do mês de maio	Apresentação de proposta pela Comissão de Seleção / Representante da Diretoria Indicada	COMISSÃO DE SELEÇÃO	Concluído	2022-05-16	2022-05-20	0	2022-05-16	2022-05-18	0	100		
Divulgar nas redes sociais o evento de comemoração dos aniversariantes e apresentar o balcão de talentos	Divulgação nas redes sociais o evento de comemoração dos aniversariantes e apresentação do balcão de talentos	ASCOM	Concluído	2022-05-23	2022-05-27	0	2022-05-23	2022-05-27	0	100		
Ensaiar a apresentação do balcão de talentos mês de maio	Ensaio geral da apresentação do balcão de talentos	COMISSÃO DE CERIMONIAL (ASCOM / CGGP / Diretoria)	Concluído	2022-05-23	2022-05-27	0	2022-05-23	2022-05-27	0	100		
Planejar os Aniversariantes do Mês de junho e apresentar o balcão de talentos	Comemoração dos Aniversariantes do Mês e apresentação do balcão de talentos	COMISSÃO DE CERIMONIAL (ASCOM / CGGP / Diretoria)	Concluído	2022-06-01	2022-06-03	0	2022-06-01	2022-06-03	0	100		
Aplicar o questionário de seleção	Identificação dos talentos nas áreas	COMISSÃO DE SELEÇÃO (ASCOM / CGGP / Diretoria)	Concluído	2022-06-06	2022-06-10	0	2022-06-06	2022-06-10	0	100		
Apresentar a proposta de data e roteiro da atividade comemorativa dos aniversariantes do mês de junho	Apresentação de proposta pela Comissão de Seleção / Representante da Diretoria Indicada	COMISSÃO DE SELEÇÃO	Concluído	2022-06-13	2022-06-17	0	2022-06-13	2022-06-17	0	100		
Divulgar nas redes sociais o evento de comemoração dos aniversariantes e apresentar o balcão de talentos	Divulgação nas redes sociais o evento de comemoração dos aniversariantes e apresentação do balcão de talentos	ASCOM	Concluído	2022-06-20	2022-06-24	0	2022-06-20	2022-06-24	0	100		
Ensaiar a apresentação do balcão de talentos mês de junho	Ensaio geral da apresentação do balcão de talentos	COMISSÃO DE CERIMONIAL (ASCOM / CGGP / Diretoria)	Concluído	2022-06-27	2022-06-28	0	2022-06-27	2022-06-28	0	100		
Comemorar os Aniversariantes do Mês junho e apresentar o balcão de talentos	Comemoração dos Aniversariantes do Mês e apresentação do balcão de talentos	COMISSÃO DE CERIMONIAL (ASCOM / CGGP / Diretoria)	A Iniciar	2022-07-06	2022-07-06	0						
Resumo Projeto			Em Andamento									
						0			**0**	**100**		

CGGP2022004 - Contratação Médico

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Pesquisa de Mercado - Fase 1	Pesquisa de Mercado Oficial de Preço	CGGP	Concluído	2022-02-14	2022-02-17	0	2022-02-14	2022-02-17	0	100		
Pesquisa de Mercado - Fase 2	Pesquisa de valores de proposta de profissionais médicos	CGGP/DIDAS	Concluído	2022-02-16	2022-03-11	0	2022-02-16	2022-03-11	0	100		

Instrução do processo e Elaboração do Projeto Básico	Anexos e documentos para instrução processual, elaboração de minuta de portaria para planejamento, contratação, acompanhamento e fiscalização e Elaboração do Projeto Básico	DIDAS	Concluído	2022-02-21	2022-03-14	0	2022-02-21	2022-03-14	0	100		
Encaminhamos a CGGP	Despacho DIDAS e encaminhamento processo para apreciação da Coordenadora Geral de Gestão de Pessoas	DIDAS	Concluído	2022-03-14	2022-03-14	0	2022-03-14	2022-03-14	0	100		
Análise CGGP e DAD	Apreciação e aprovação do processo pela CGGP e DAD	CGGP/DAD	Concluído	2022-03-14	2022-03-14	0	2022-03-14	2022-03-14	0	100		
Análise da Autoridade Máxima	Análise do processo, aprovação para Contratação da autoridade Máxima e assinatura de portaria para planejamento, contratação, acompanhamento e fiscalização	GAB	Concluído	2022-03-16	2022-03-16	0	2022-03-16	2022-03-16	0	100	Publicação da Portaria nº 12 - 17 /03/2022	
Encaminhamento de Processo a CGAF	Encaminhamento a CGAF para providências quanto à contratação pessoa física para prestação de serviços médicos, na área generalista, para prestação de serviço específico em período	CGGP/DIDAS	Concluído	2022-03-16	2022-03-16	0	2022-03-17	2022-03-17	0	100		
Providências quanto à contratação	Providências CGAF quanto à contratação pessoa física para prestação de serviços médicos, na área generalista, para prestação de serviço específico em período	CGLF	Concluído	2022-03-16	2022-06-23	0	2022-03-16	2022-06-23	0	100		
Divulgação dos dias e horários do atendimento médico	Preparar a Arte de divulgação e compartilhar com os servidores	CGGP/ASCOM	Em Andamento	2022-06-27	2022-07-01	0	2022-06-24		0	50		
Início de Atendimento aos servidores	Início de Atendimento aos servidores, atividades de fiscalização de contrato e pagamentos mensais - Execução e Fiscalização do Contrato	Serviço Médico / CGAF (pagamentos)	A Iniciar	2022-07-04	2023-04-28	45000						
Resumo Projeto			Em Andamento									
						45000			**0**	**94,44444444**		

CGGP2022003 - Coral

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Pesquisa de Mercado	Pesquisa de valores de proposta de profissionais	DAD/CGGP/DIDAS	Concluído	2022-02-15	2022-03-02	0	2022-02-15	2022-03-02	0	100	Processo devolvido para esclarecimentos	Agendada reunião
Instrução do processo e Elaboração do Projeto Básico	Anexos e documentos para instrução processual e elaboração do Projeto Básico	CGGP/DIDAS	Concluído	2022-03-02	2022-03-02	0	2022-03-02	2022-03-02	0	100		
Encaminhamos a DAD	encaminhamento processo para apreciação daDiretoria de Administração	DIDAS	Concluído	2022-03-23	2022-03-23	0	2022-03-23	2022-03-23	0	100		
Análise DAD	Apreciação e aprovação do processo pela DAD	DAD	Concluído	2022-03-25	2022-03-25	0	2022-03-25	2022-03-25	0	100		
Análise da Autoridade Máxima	Análise do processo, aprovação para Contratação da autoridade Máxima e assinatura de portaria para planejamento, contratação, acompanhamento e fiscalização	GAB	Concluído	2022-03-25	2022-06-22	0	2022-03-25	2022-06-28	0	100	Repactuação de datas	
Exposição de Motivos	Justificativa da contratação para autorização da Autoridade máxima	CGGP/DIDAS	Concluído	2022-06-20	2022-06-21	0	2022-06-20	2022-06-23	0	100		
Encaminhamento de Processo a CGAF	Encaminhamento a CGAF para providências quanto à contratação	CGGP/DIDAS	Concluído	2022-06-30	2022-06-30	0	2022-06-29	2022-06-29	0	100		
Providências quanto à contratação	Providências CGAF quanto à contratação	CGAF / COCF / COLIC	Em Andamento	2022-06-30	2022-07-07	0	2022-06-29					
Divulgação do Projeto para os servidores	Preparar a Arte de divulgação e compartilhar com os servidores	DIDAS/ASCOM	A Iniciar	2022-07-08	2022-07-13	0						
Execução do Projeto Coral	Ensaios e Apresentações - Execução e Fiscalização do Contrato	DIDAS / CGAF (pagamentos)	A Iniciar	2022-07-14	2023-05-14	14500						
Resumo Projeto			Em Andamento									
						14500			**0**	**100**		

CGGP2022002 - Psicoterapia

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
E-mail solicitando abertura de Processo para contratação de Psicólogo	Enviar e-mail ao Diretor de Administração solicitando abertura de Processo	CGGP/DIDAS	Concluído	2022-03-24	2022-03-24	0	2022-03-24	2022-03-24	0	100		
Pesquisa de Mercado	Pesquisa de valores de proposta de profissionais no mercado.	CGGP/DIDAS	Concluído	2022-02-15	2022-02-22	0	2022-02-15	2022-02-22	0	100		
Instrução do processo e Elaboração do Projeto Básico	Anexos e documentos para instrução processual, e Elaboração do Projeto Básico	CGGP/DIDAS	Concluído	2022-03-24	2022-03-28	0	2022-03-24	2022-03-28	0	100		
Encaminhamos a DAD	Despacho CGGP e encaminhamento processo para apreciação da DAD	CGGP/DIDAS	Concluído	2022-03-28	2022-03-29	0	2022-03-30	2022-03-30	0	100		
Análise DAD	Apreciação e aprovação do processo pela DAD	DAD	Concluído	2022-03-29	2022-03-31	0	2022-03-30	2022-03-30	0	100		
Análise da Autoridade Máxima	Análise do processo, aprovação para Contratação da autoridade Máxima e assinatura de portaria para planejamento, contratação, acompanhamento e fiscalização	GAB	Em Andamento	2022-03-30	2022-07-04	0	2022-03-30		0		Processo devolvido para esclarecimentos	Agendada reunião
Exposição de Motivos	Justificativa da contratação para autorização da Autoridade máxima	CGGP/DIDAS	Concluído	2022-06-20	2022-06-21	0	2022-06-20	2022-06-24	0	100		
Elaboração de Portaria	Elaboração de minuta de portaria para acompanhamento e fiscalização e assinatura de Portaria pela autoridade máxima.	CGGP/DIDAS	A Iniciar	2022-07-04	2022-07-05	0					Repactuação de datas	
Encaminhamento de Processo a CGAF	Encaminhamento a CGAF para providências quanto à contratação	CGGP/DIDAS	A Iniciar	2022-07-05	2022-07-05	0						
Providências quanto à contratação	Providências CGAF quanto à contratação	CGAF / COCF / COLIC	A Iniciar	2022-07-05	2022-07-12	0						
Divulgação dos dias e horários do atendimento.	Preparar a Arte de divulgação e compartilhar com os servidores	DIDAS/ASCOM	A Iniciar	2022-07-13	2022-07-15	0						
Início de Atendimento aos servidores	Início de Atendimento aos servidores, atividades de fiscalização de contrato e pagamentos mensais - Execução e Fiscalização do Contrato	Serviço Médico / CGAF (pagamentos)	A Iniciar	2022-07-18	2023-05-18	21600						
Resumo Projeto			Em Andamento									
						21600			**0**	**100**		

CGGP2022001 - PDP 2022

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento de necessidades de desenvolvimento	Unidades Admnistrativas apresentam as necessidades de desenvolvimento para o exercício	Unidades Administrativas (Gestores e Servidores)	Concluído	2021-09-06	2021-09-23	0	2021-09-06	2021-09-23	0	100	Datas conforme execução	
Elaboração do PDP	Consolidação das necessidades e lançamentos no Portal SIPEC	CGGP	Concluído	2021-09-07	2021-09-29	0	2021-09-24	2021-09-29	0	100	Datas conforme execução	
Aprovação e envio do PDP	Aprovação e envio do PDP ao órgão central do SIPEC pela autoridade máxima do órgão	Superintendência	Concluído	2021-09-29	2021-09-30	0	2021-09-29	2021-09-30	0	100	Datas conforme execução	
Devolutiva do Órgão Central	Órgão Central analisa e envia Manifestação Técnica (MT) do PDP	Órgão Central SIPEC	Concluído	2021-09-30	2021-11-30	0	2021-09-30	2021-11-30	0	100	Datas conforme execução	

Acolhimento da Manisfestação Técnica	A autoridade máxima do órgão acolhe ou não as sugestões de ações de desenvolvimento contidas na Manifestação Técnica.	Superintendência	Concluído	2022-02-17	2022-02-17	0	2022-02-17	2022-02-17	0	100	Datas conforme execução	
Execução do PDP	Execução de capacitações conforme registros de necessidades de desenvolvimento no PDP	CGGP, Unidades Demandantes, Instituições Promotoras	Em Andamento	2022-01-02	2022-12-31	200000	2022-01-02		11934	14	Valor Previsto: apenas previsão de custos com inscrições. Não estão sendo considerados gastos de diárias e passagens (Orientação do Orgão Central no prenchimento do PDP no Portal SIPEC).	
Primeiro Ciclo de Revisão	Se necessário ajustar ou atualizar necessidades de desenvolvimento para execução em 2022. A revisão é enviada pela Sudene até 07/03/2022 e passa por análise e devolutiva do órgão central até 06/04/2022	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	Cancelado	2022-02-18	2022-04-06	0			0	100	PODE OU NÃO OCORRER REVISÃO - NÃO HOUVE SOLICITAÇÃO DE REVISÃO NO PERÍODO. O instrumento de revisão deve ser tratado como medida de exceção. DATA PARA ENVIO DA REVISÃO AO ÓRGÃO CENTRAL: 07/03/2022 (Prazo SUDENE) RESPOSTA PELO ÓRGÃO CENTRAL ATÉ: 06/04/2022	
Segundo Ciclo de Revisão	Se necessário ajustar ou atualizar necessidades de desenvolvimento para execução em 2022. A revisão é enviada pela Sudene até 07/06/2022 e passa por análise e devolutiva do órgão central até 07/07/2022.	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	Em Andamento	2022-04-07	2022-07-07	0	2022-04-07		0	80	PODE OU NÃO OCORRER REVISÃO. O instrumento de revisão deve ser tratado como medida de exceção. DATA PARA ENVIO DA REVISÃO AO ÓRGÃO CENTRAL: 07/06/2022 (Prazo SUDENE) RESPOSTA PELO ÓRGÃO CENTRAL ATÉ: 07/07/2022	
Terceiro Ciclo de Revisão	Se necessário ajustar ou atualizar necessidades de desenvolvimento para execução em 2022. A revisão é enviada pela Sudene até 08/09/2022 e passa por análise e devolutiva do órgão central até 10/10/2022	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	A Iniciar	2022-07-08	2022-10-10	0					PODE OU NÃO OCORRER REVISÃO. O instrumento de revisão deve ser tratado como medida de exceção. DATA PARA ENVIO DA REVISÃO AO ÓRGÃO CENTRAL: 08/09/2022 (Prazo SUDENE) RESPOSTA PELO ÓRGÃO CENTRAL ATÉ: 10/10/2022	
Quarto Ciclo de Revisão	Se necessário ajustar ou atualizar necessidades de desenvolvimento para execução em 2022. A revisão é enviada pela Sudene até 07/12/2022 e passa por análise e devolutiva do órgão central até 19/12/2022.	Unidades Administrativas, CGGP, Superintendência e Órgão Central	A Iniciar	2022-10-11	2022-12-19	0					PODE OU NÃO OCORRER REVISÃO. O instrumento de revisão deve ser tratado como medida de exceção. DATA PARA ENVIO DA REVISÃO AO ÓRGÃO CENTRAL: 07/12/2022 (Prazo SUDENE) RESPOSTA PELO ÓRGÃO CENTRAL ATÉ: 19/12/2022	
Elaboração e Envio do Relatório de Execução do PDP	Consolidação da execução do PDP (servidores capacitados, ações executadas e necessidades atendidas, avaliação de eventos e fornecedores, análise de atendimento de necessidade, investimentos) em Relatório no Portal SIPEC e envio ao Órgão Central	CGGP	A Iniciar	2023-01-02	2023-01-31	0						
Resumo Projeto			Em Andamento									
						200000			**11934**	**86,75**		

CGGP 2021001 - Consolidação do Levantamento da Força de Trabalho

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento da força de trabalho quantitativo e qualitativo	Levantamento do quantitativo da força de trabalho junto às unidades administrativas	Unidades administrativas	Concluído	2022-04-01	2022-05-31		2022-04-01	2022-05-31	0	100	Iniciar esta etapa após conclusão do Plano de Trabalho do Dimensionamento da Força	
Consolidação do Levantamento da força de trabalho	Consolidação das respostas da força de trabalho - quantitativo e qualitativo	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	Em Andamento	2022-06-01	2022-09-30		2022-04-01			0	Iniciar esta etapa após o levantamento da força de trabalho quantitativo e qualitativo. Necessidade de capacitação da equipe do projeto	
Análise do Resultado do Levantamento - proposta de ação	Análise do Resultado do Levantamento - proposta de abertura de concurso publico de cargo efetivo e/ou edital de movimentação da força de trabalho	Unidades administrativas e CGGP	A Iniciar	2022-10-01	2022-12-31					0	Necessidade de capacitação da equipe do projeto	
Plano de Ação para Apresentação do Resultado do Documento Técnico à Alta Administração	Elaboração e Apresentação do Plano de Ação para Apresentação do Resultado do Documento Técnico à Alta Administração	Unidades administrativas e CGGP	A Iniciar	2023-01-01	2023-06-30					0	Necessidade de capacitação da equipe do projeto	
Elaboração de Projeto de Processo Seletivo	Do Resultado do Levantamento elaboração do processo de seleção de pessoas por meio de edital de movimentação da força de trabalho	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	A Iniciar	2023-07-01	2023-12-31					0	Etapa inclui apreciação do Projeto pela Procuradoria Federal e aprovação da Diretoria Colegiada. Necessidade de capacitação da equipe do projeto	
Elaboração de Projeto de Processo Seletivo	Do Resultado do Levantamento elaboração do processo de seleção de pessoas por meio concurso público de cargo efetivo	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	A Iniciar	2024-01-01	2024-04-30					0	Etapa inclui apreciação do Projeto pela Procuradoria Federal e aprovação da Diretoria Colegiada. Necessidade de capacitação da equipe do projeto	
Envio do Projeto de Processo Seletivo	Envio do Projeto de Processo de seleção de pessoas por meio de concurso público de cargo efetivo para apreciação e aprovação dos órgãos setorial (MDR) e central (ME)	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	A Iniciar	2024-05-01	2024-12-31					0	Etapa inclui apreciação do Projeto pela Procuradoria Federal e aprovação da Diretoria Colegiada	
Resumo Projeto			Em Andamento									
						0			**0**	**14,28571429**		

CGGP2018001 Força de Trabalho

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Capacitação sobre Força de Trabalho	Capacitar a unidade da CGGP sobre o tema (Carla - Márcia - Marlene)	CGGP	Concluído	2018-03-01	2018-12-31		2018-03-01	2018-08-17		100		
Elaboração do Projeto para Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho	Elaboração do projeto para definição, objetivos, etapas e implementação do dimensionamento da Força de Trabalho visando a contratação de facilitador	Carla Paes, Márcia Melo, Marlene Franklin	Concluído	2018-07-30	2019-02-28		2018-07-30	2019-05-17		100	Enviado Ofício nº 147/2018/SUDENE, datado de 17 de maio de 2018 ao MP pedindo acesso à metodologia do dimensionamento da força de trabalho no SPF, com a resposta por meio do Ofício nº 85618/2018-MP, de 26 de setembro de 2018. Participação em evento no MP sobre Movimentação e dimensionamento da força de trabalho em 29/11/2018. Datas repactuadas devido a agenda do facilitador para iniciar o projeto em 2018.	
Dimensionamento Quantitativo da Força de Trabalho	Levantamento dos quantitativos para elaboração de relatórios quatitativos e estudos de dimensionamento. Atualização do Lotacionograma das Unidades	CGGP, Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas e Facilitadores	Concluído	2019-03-01	2019-08-31		2018-07-19	2019-08-31		100	Etapa concluída, sem a realização de oficinas internas. Não estando previstos outros gastos com este PO.	
Dimensionamento Qualitativo da Força de Trabalho	Levantamento dos qualitativos para elaboração de relatórios qualitativos e estudos de dimensionamento. Atualização do Lotacionograma das Unidades	CGGP	Concluído	2019-03-01	2021-08-31		2020-04-05	2021-08-31		100	Realização de reuniões técnicas da CGGP no período para definição de dados e deliberação do estudo técnico.	

Apresentação do Resultado	Apresentação do Resultado do Documento Técnico do Dimensionamento da Força de TrabalhO Relatório do Dimensionamento da Força de Trabalho para recomposição do Quadro de Pessoal Permanente da Sudene foi concluído no início de Fevereiro porem necessita ser revisado e apresentado a Diretoria Colegiada para aprovação a Diretoria ao à Diretoria Colegiada para aprovação	CGGP	Concluído	2021-09-01	2022-05-18		2021-09-01	2022-05-18		100	O percentual do Plano Operativo Dimensionamento da Força de Trabalho foi atingido de 90% no total, medição em 31/12/2021, pelos seguintes motivos. Na etapa 5 (Apresentação do Resultado do Documento Técnico do Dimensionamento da Força de Trabalho à Diretoria Colegiada para aprovação), tendo em vista que a consolidação das respostas/informações das unidades administrativas, colacionadas no processo SEI Nº 59336.000882/2021-05, o documento técnico exigiu grande esforço e tempo da equipe envolvida, 2 servidores. O Relatório com o Resultado do Documento Técnico foi concluído em 31/12/2021, porém os 10% estão atribuídos a apresentação do 2022mesmo à validação da Diretoria Colegiada.	Enviado OFÍCIO Nº 1812/2021/CGGP/DAD/SUDENE, DE 03 de setembro de 2021 aos Gestores da Unidade da Sudene, com a finalidade de atualização do Lotacionograma para compor o Planejamento das Ações do Dimensionamento da Força de Trabalho da Sudene, com a juntada das respostas no processo SEI Nº 59336.000882/2021-05. Considerando a transição de Titularidade da Superintendência, a apresentação do Resultado do Documento da Diretoria Colegiada será agendado para apresentação no 1º trimestre de 2022. Trabalho Concluso aguardando apresentação do resultado e do plano de ação ao Superintendente, para posterior apresentação e deliberação final da Diretoria Colegiada, a apresentação do Resultado do Documento da Diretoria Colegiada será agendado para apresentação no 1º trimestre de 2022.
Definição de ações e Implantação do Plano de Ação do Planejamento da Força de Trabalho	Plano de ação do Planejamento da Força de Trabalho com definição e implantação das principais ações para fortalecimento e melhor adequação da força de trabalho	CGGP e Unidades Administrativas	Concluído	2021-11-01	2022-05-18		2021-11-01	2022-05-18		100	O percentual do Plano Operativo Dimensionamento da Força de Trabalho foi atingido de 90% no total, medição em 31/12/2021, pelos seguintes motivos. A Etapa 6 - Plano de Ação do Planejamento da Força de Trabalho foi iniciado em 01/12/2021, e está com 50% do trabalho em andamento, não sendo ainda finalizado para apresentação, cuja proposta é o mesmo ser apresentado junto com o Relatório do Documento Técnico para apreciação da Diretoria Colegiada validar. Os 50% posteriores seriam a apresentação aos Gestores do Resultado do Documento Técnico e do Plano de Ação do Planejamento da Força de Trabalho. Por não ter sido possível apresentar a Colegiada o Relatório revisado solicitamos repactuação da	ASolicitação de agendamento gendada reunião
Resumo Projeto			Concluído								O Relatório e as propostas de ações foram apresentadas em Diretoria Colegiada dia 18 de maio de 2022	Solicitação repactuamento
						0			**0**	**100**		

CGTI - Projetos

CGTI2022005 - PDA 2022-24

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Términ	Valor Previsto	Inicio	ata de Conclusã	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta pública acerca das bases de dados daSudene		OUV	Concluído	2021-05-25	2021-06-04	0	2021-05-25	2021-06-04	0	100		
Consolidação do inventário, considerando o inventário doPDA S		CGGI	Concluído	2022-01-17	2022-01-21	0	2022-01-17	2022-01-21	0	100		
Priorização das bases de dados		da Sudene com bases de d	Concluído	2022-01-24	2022-02-04	0	2022-01-24	2022-02-04	0	100		
Elaboração do PDA/Sudene 2022-2024		CGGI	Concluído	2022-01-01	2022-02-11	0	2022-01-17	2022-02-10	0	100		
Envio do PDA para apreciação do CGD		CGGI	Concluído	2022-02-14	2022-02-14	0	2022-02-18	2022-02-18	0	100		
Aprovação do PDA/Sudene 2022-2024		itê de Governança Digital (	Concluído	2022-02-10	2022-02-28	0	2022-02-28	2022-04-12	0	100	Aprovado na reunião do Comitê de Governança Digital	
Publicação do PDA/Sudene 2022-2024		ASCOM	Concluído	2022-02-28	2022-02-28	0	2022-04-13	2022-04-13	0	100	Plano aprovado em 12/04/2022. Aguardando ASCOM publicar no site	
Capacitação dos responsáveis pelos dados selecionados		CGGP	Em Andamento	2022-03-01	2024-03-31	0	2022-04-12				aprovado. Área responsável deverá iniciar os trabalhos, atentando-se ao	
Publicação e mantenção das bases de dados da Sudene		eis por bases de dados aba	Em Andamento	2022-03-01	2024-03-31	0	2022-04-12				aprovado. Área responsável deverá iniciar os trabalhos, atentando-se ao	
Monitoramento e Controle da execução do PDA		idade de Monitoramento e	Em Andamento	2022-03-01	2024-03-31	0	2022-04-12				Plano aprovado em 12/04. Em monitoramento	
Abertura da base de dados das diretrizes e prioridades do FNE		CGCP e CGTI	A Iniciar	2022-09-30	2022-09-30	0						
Publicação de matéria informando a disponibilização da base d		ASCOM	A Iniciar	2022-10-31	2022-10-31	0						
Elaboração do relatório de execução do PDA		idade de Monitoramento e	A Iniciar	2023-01-01	2023-03-01	0						
Publicação do relatório de execução do PDA		ASCOM	A Iniciar	2023-03-01	2023-03-01	0						
Abertura da base de dados dos planos subregionais		CGCP e CGTI	A Iniciar	2023-03-31	2023-03-31	0						
Publicação de matéria informando a disponibilização da base d		ASCOM	A Iniciar	2023-04-30	2023-04-30	0						
Abertura da base de dados do RAINT		AUD e CGTI	A Iniciar	2023-09-30	2023-09-30	0						
Publicação de matéria informando a disponibilização da base d		ASCOM	A Iniciar	2023-10-31	2023-10-31	0						
Abertura da base de dados dos TEDs		CGDS e CGTI	A Iniciar	2024-02-29	2024-02-29	0						
Publicação de matéria informando a disponibilização da base d		ASCOM	A Iniciar	2024-03-31	2024-03-31	0						
Elaboração do relatório final de execução do PDA		idade de Monitoramento e	A Iniciar	2024-01-01	2024-02-01	0						
Publicação do relatório final de execução do PDA		ASCOM	A Iniciar	2024-02-01	2024-02-01	0						
Resumo Projeto			Em Andamento									
				1-05-25 até 202	**1-06-04 até 202**	**0**	**1-05-25 até 202**	**1-06-04 até 202**	**0**	**100**		

CGTI2022002 SIGMapas

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Términ	Valor Previsto	Inicio	ata de Conclusã	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Reunir com os interessados	Planejar	CGTI/CGEP	Concluído				2021-12-27	2022-01-07				
Analisar as alternativas disponíveis no mercado	Planejar	CGTI/CGEP	Concluído				2022-01-07	2022-01-21				
Apresentar as alternativas escolhidas	Planejar	CGTI/CGEP	Concluído				2022-01-21	2022-02-11				
Criar protótipo (validar alternativa)	Fazer	CGTI/CGEP	Concluído				2022-01-21	2022-03-11				
Contratatar a solução escolhida	Fazer	CGTI/CGEP	Concluído		2022-03-25	49073,84	2022-01-31	2022-03-16	49073,84			
Treinar técnicos e dar suporte	Fazer	CGTI/CGEP	Concluído	2022-03-21	2022-04-08		2022-03-19	2022-04-08				
Incluir Mapas	Fazer	CGTI/CGEP	Concluído		2022-04-01		2022-03-11	2022-03-28				
Verificar c/ interessados pontos de melhoria	Monitorar	CGTI/CGEP	Concluído	2022-04-01	2022-04-15		2022-03-28	2022-04-18				
Realizar as melhorias (a ser definido)	Melhorar	CGTI/CGEP	Concluído	2022-04-01	2022-04-15		2022-03-28	2022-04-18				
Resumo Projeto			Concluído									
				2-03-21 até 202	**2-03-25 até 202**	**49073,84**	**1-12-27 até 202**	**2-01-07 até 202**	**49073,84**	**#DIV/0!**		

CGTI2022003 Agenda Compartilhada

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Términ	Valor Previsto	Inicio	ata de Conclusã	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Reunir com os interessados	Planejar	CGTI	Concluído				2021-11-22	2021-11-26				
Analisar as alternativas disponíveis no mercado	Planejar	CGTI	Concluído				2021-11-22	2021-11-26				
Apresentar as alternativas escolhidas	Planejar	CGTI	Concluído				2021-11-22	2021-11-26				
Criar protótipo (validar alternativa)	Fazer	CGTI	Concluído				2021-11-22	2021-12-17				
Treinar técnicos e dar suporte	Fazer	CGTI	Concluído				2021-11-29	2021-12-17				
Verificar c/ interessados pontos de melhoria	Monitorar	CGTI	Concluído				2021-12-17	2022-01-21				
Realizar as melhorias	Melhorar	CGTI	Concluído		2022-06-30	5000	2022-01-21	2022-06-30			Nova versão da agenda compartilhada.	
Resumo Projeto			Concluído									
					2022-06-30	**5000**	**1-11-22 até 202**	**1-11-26 até 202**	**0**	**#DIV/0!**		

CGTI2022004 Videoconferência

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Términ	Valor Previsto	Inicio	ata de Conclusã	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Reunir com os interessados	Planejar	CGTI	Concluído				2021-12-27	2021-12-31				
Analisar as alternativas disponíveis no mercado (hardware + so	Planejar	CGTI	Concluído				2022-01-03	2022-02-18				
Apresentar as alternativas escolhidas	Planejar	CGTI	Concluído				2022-02-18	2022-03-04				
Contratar solução de software (Zoom)	Fazer	CGTI	Concluído		2022-04-01	35000	2022-03-04	2022-04-01	29000			
Contratar solução de hardware (Câmera + Microfone)	Fazer	CGTI	Concluído		2022-06-30	15000	2022-03-11	2022-06-30	12840		Contratações realizadas.	
Treinar técnicos e dar suporte	Fazer	CGTI	Concluído	2022-05-15	2022-06-30		2022-05-14	2022-06-30			Técnicos e servidores treinados.	
Verificar c/ interessados pontos de melhoria	Melhorar	CGTI	Concluído	2022-06-01	2022-06-30		2022-05-31	2022-06-30			Solução validada.	
Realizar as melhorias	Melhorar	CGTI	Concluído	2022-06-01	2022-06-30		2022-05-31	2022-06-30			Ajustes realizados.	
Resumo Projeto			Concluído									
				2-05-15 até 202	**2-04-01 até 202**	**50000**	**1-12-27 até 202**	**1-12-31 até 202**	**41840**	**#DIV/0!**		

CGLF - Projetos

CGLF 2022010 - Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2023 - Quantitativo - Despesa

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Fase I - PLOA 2023	Levantamento, análise e registro no SIOP	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	1-jul-22	15-jul-22						Prazo final estabelecido pela Portaria SOF/ME nº 3.587, de 20 de abril de 2022 (SEI 0353237), alterando a PORTARIA SOF/SETO/ME nº 2.929, de 4 de abril de 2022. Prazo para envio ao MDR pode ser diferente de 06/07.	
Fase II - PLOA 2023	Levantamento, análise e registro no SIOP	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	8-ago-22	12-ago-22						Prazo final estabelecido pela Portaria SOF/ME nº 3.587, de 20 de abril de 2022 (SEI 0353237), alterando a PORTARIA SOF/SETO/ME nº 2.929, de 4 de abril de 2022. Prazo para envio ao MDR pode ser diferente de 12/08.	
Informações Complementares - PLOA 2023	Levantamento, análise e registro no SIOP	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	8-ago-22	31-ago-22						Prazo final estabelecido pela Portaria SOF/ME nº 3.587, de 20 de abril de 2022 (SEI 0353237), alterando a PORTARIA SOF/SETO/ME nº 2.929, de 4 de abril de 2022. Prazo para envio ao MDR pode ser diferente de 31/08.	
Resumo Projeto			A Iniciar									
						R$0,00			**R$0,00**	**#DIV/0!**		

CGLF 2022009 - Elaboração do Plano de Contratações 2023

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura do processo	Abertura do processo e encaminhamento à CGAF para providências quanto a divulgação na Instituição	COLIC/CGAF	Concluído	11-mar-22	15-mar-22	R$0,00	11-mar-22	14-mar-22				'-
Divulgação do PCA 2023 na Sudene	Informar e conscientizar as áreas requisitantes da necessidade e importância de elaboração do PCA	ASCOM	Concluído	15-mar-22	18-mar-22	R$0,00	14-mar-22	16-mar-22				
Formalização das Demandas	Área requisitante evidencia e detalha a necessidade de contratação de bens, serviços e obras, no sistema PGC	Áreas Requisitantes	Concluído	14-mar-22	1-abr-22	R$0,00	14-mar-22	1-abr-22				'-
Consolidão das Demandas	Consolidação de todas as necessidades da Superintendência e encaminhamento para aprovação da Autoridade Comptente.	COLIC	Concluído	1-abr-22	30-abr-22	R$0,00	1-abr-22	30-abr-22				'-
Aprovação do PCA	Autoridade competente aprovará as contratações do plano de contratações anual por meio do PGC que será disponibilizado automaticamente no Portal Nacional de Contratações Públicas;.	Superintendência	Concluído	1-mai-22	14-mai-22	R$0,00	15-abr-22	12-mai-22				'-
1ª Revisão e Alteração do PCA	Adequação à proposta orçamentária	Áreas Requisitantes	A Iniciar	15-set-22	15-nov-22	R$0,00						'-
2ª Revisão e Alteração do PCA	Adequação do plano de contratações anual ao orçamento aprovado para aquele exercício.	Áreas Requisitantes	A Iniciar	1-jan-23	30-abr-23	R$0,00					Depende da data de sanção da LOA 2023	'-
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$0,00			**R$0,00**	**#DIV/0!**		

CGLF 2022008 - Reforma das Instalações da Sudene

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Execução do 10º e 11º andares	Adequação de toda infraestura e instalações dos pavimentos para o novo leiaute	Comissão de Fiscalização da Reforma	Concluído	21-fev-22	18-mar-22	R$77.771,69	21-fev-22	21-mar-22	R$77.022,21	99	'-	'-
Execução do 7º e 9º andares	Adequação de toda infraestura e instalações dos pavimentos para o novo leiaute	Comissão de Fiscalização da Reforma	Concluído	21-mar-22	18-abr-22	R$77.771,69	21-mar-22			0		
Resumo Projeto			Concluído									
						R$155.543,38			**R$77.022,21**	**49,5**		

CGLF 2022007 - Digitalização do acervo da Sudene

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Planejamento da Contratação	Elaboração de ETP, Análise e Gestão de Risco, Pesquisa de Preço, Termo de Referência/Projeto Básico	COSEG	Concluído	25-set-20	28-set-20	R$0,00	25-set-20	28-set-20	R$0,00	100	Marco de término: entrega do Termo de Referência/Projeto Básico	
Licitação (fase interna e externa)	Elaboração de Edital e realização de Pregão Eletrônico	COLIC/COSEG	Concluído	1-fev-20	3-fev-20	R$0,00	1-fev-20	3-fev-20	R$0,00	100	Marco de término: Termo de Homologação do Pregão Eletrônico	
Contratação	Disponibilidade Orçamentária/Empreinho, assinatura do contrato e publicação do Extrato de Contrato	COCF/COLIC	Concluído	1-mar-21	31-mar-21	R$0,00	1-mar-21	31-mar-21	R$0,00	100	Marco de término: Assinatura do Contrato	
Elaboração do Código de Classificação de Documentos da Tabela de Temporalidade e Destinação	Elaboração do Código de Classificação de Documentos - CCD e da Tabela de Temporalidade e Destinação - TTD de todo o acervo da Sudene (documentos de atividades-meio e atividades fim)	COSEG/Comissão de Fiscalização	Concluído	19-abr-21	31-mar-23	R$40.999,99	19-abr-21	26-ago-21	R$40.999,99	100	Marco de término: Entrega do item	
Pactuação do 1º Termo Aditivo	Procedimentos para realização de aditivo contratual (acréscimo de quantitativos)	COSEG/COLIC	Concluído	18-jan-22	18-mai-22	R$0,00	18-jan-22	12-mai-22	R$0,00		Marco de término: Assinatura do Termo de Adivo	
Avaliação de documentos e classificação	Avaliação de documentos e classificação, de acordo com o CCD e a TTD a serem elaborados	COSEG/Comissão de Fiscalização	Em Andamento	19-abr-21	31-mar-23	R$334,00	19-abr-21		R$57,40	17,18	Marco de término: Entrega do item	
Preparação documental e higienização básica	Preparação documental e higienização básica	COSEG/Comissão de Fiscalização	Em Andamento	19-abr-21	31-mar-23	R$2.385,00	1-ago-21		R$637,50	26,72	Marco de término: Entrega do item	
Digitalização de documentos, com certificação digital	Digitalização de documentos, com certificação digital (ICP-Brasil) e reconhecimento óptico de caracteres (OCR) em formato PDF/A e PNG	COSEG/Comissão de Fiscalização	Em Andamento	19-abr-21	31-mar-23	R$56.880,20	1-ago-21		R$35.750,65	62,85	Marco de término: Entrega do item	
Cadastramento dos metadados e indexação	Cadastramento dos metadados e indexação dos documentos digitalizados	COSEG/Comissão de Fiscalização	Em Andamento	19-abr-21	31-mar-23	R$4.676,00	1-ago-21		R$28,70	0,61	Marco de término: Entrega do item	
Acondicionamento e organização dos documentos físico	Acondicionamento e organização dos documentos físicos que foram digitalizados, com fornecimento de caixas-box padrão para os documentos de guarda permanente	COSEG/Comissão de Fiscalização	Em Andamento	19-abr-21	31-mar-23	R$3.339,00	1-ago-21		R$892,50	26,72	Marco de término: Entrega do item	
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$108.614,19			**R$78.366,74**	**59,34222222**		

CGLF 2022006 - Restos a Pagar (RP)

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Informação as áreas acerca dos Restos a Pagar passíveis de cancelamento	Orientação sobre os Restos a Pagar com possibilidade de cancelamento no exercício	COCF	Concluído	1-abr-22	31-mai-22	R$0,00	17-mar-22	23-mar-22				
Verificação do Bloqueio das notas de empenho do ano de 2020	O sistema SIAFI fará o bloqueio automaticamente dos empenhos do exercício de 2020. A COCF irá realizar a devida verificação.	COCF	Em Andamento	30-jun-22	1-jul-22	R$0,00	30-jun-22				Bloqueio por processo automático.	

Desbloqueio das notas de empenhos do exercício de 2020	A COCF mediante solicitação e justificativa da área e demais responsáveis fará o desbloqueio via sistema SIAFI. Os que não forem solicitados serão automaticamente cancelados em 31/12/2022.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	1-jul-22	31-dez-22	R$0,00						
Acompanhamento de Restos a Pagar a Liquidar - 2019	Acompanhamento dos restos a pagar a liquidar do exercício de 2019. Os que não forem solicitados, pela área e demais reponsáveis, liquidação e/ou pagamento/liberação serão automaticamente cancelados em 31/12/2022.	COCF e Unidades Responsáveis	Em Andamento	3-jan-22	31-dez-22	R$0,00	3-jan-22					
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$0,00			**R$0,00**	**#DIV/0!**		

CGLF 2022005 - Levantamentos e Solicitações Financeiras (Emendas Impositivas)

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Abril	Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior.	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	7-mar-22	5-abr-22		7-mar-22	5-abr-22				
Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Maio	Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior.	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	6-abr-22	5-mai-22		6-abr-22	5-mai-22				
Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Junho	Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior.	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	6-mai-22	3-jun-22		6-mai-22	3-jun-22				
Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Julho	Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior.	COCF e Unidades Responsáveis	Em Andamento	6-jun-22	5-jul-22		6-jun-22					
Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Agosto	Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	6-jul-22	5-ago-22							
Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Setembro	Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	8-ago-22	5-set-22							
Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Outubro	Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	6-set-22	5-out-22							
Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Novembro	Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	6-out-22	4-nov-22							
Solicitação - Emendas Impositivas - Mês de Dezembro	Levantamento das emendas impositivas aptas, autorizadas e recebidas na COCF para liberação e inserção em formulário para envio até o dia 05 de cada mês ou dia útil anterior.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	7-nov-22	5-dez-22							
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$0,00			**R$0,00**	**#DIV/0!**		

CGLF 2022004 - Levantamentos e Solicitações Financeiras (Despesas Discricionárias)

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Solicitação para a 12ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	11-mar-22	17-mar-22		11-mar-22	17-mar-22				
Solicitação para a 13ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	18-mar-22	24-mar-22		18-mar-22	24-mar-22				
Solicitação para a 14ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	25-mar-22	31-mar-22		25-mar-22	31-mar-22				
Solicitação para a 15ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	1-abr-22	7-abr-22		1-abr-22	7-abr-22				
Solicitação para a 16ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	8-abr-22	14-abr-22		8-abr-22	14-abr-22				
Solicitação para a 17ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	15-abr-22	21-abr-22		18-abr-22	20-abr-22				
Solicitação para a 18ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	22-abr-22	28-abr-22		25-abr-22	28-abr-22				
Solicitação para a 19ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	29-abr-22	5-mai-22		29-abr-22	5-mai-22				
Solicitação para a 20ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	6-mai-22	12-mai-22		6-mai-22	12-mai-22				
Solicitação para a 21ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	13-mai-22	19-mai-22		13-mai-22	19-mai-22				
Solicitação para a 22ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	20-mai-22	26-mai-22		20-mai-22	26-mai-22				
Solicitação para a 23ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	27-mai-22	2-jun-22		27-mai-22	2-jun-22				
Solicitação para a 24ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	3-jun-22	9-jun-22		3-jun-22	9-jun-22				
Solicitação para a 25ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	10-jun-22	16-jun-22		10-jun-22	15-jun-22				
Solicitação para a 26ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	17-jun-22	27-jun-22		17-jun-22	27-jun-22				
Solicitação para a 27ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	17-jun-22	27-jun-22		17-jun-22	27-jun-22				
Solicitação para a 28ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	1-jul-22	7-jul-22							
Solicitação para a 29ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	8-jul-22	14-jul-22							
Solicitação para a 30ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	15-jul-22	21-jul-22							

Solicitação para a 31ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	16-jul-22	28-jul-22							
Solicitação para a 32ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	29-jul-22	4-ago-22							
Solicitação para a 33ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	5-ago-22	11-ago-22							
Solicitação para a 34ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	12-ago-22	18-ago-22							
Solicitação para a 35ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	19-ago-22	25-ago-22							
Solicitação para a 36ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	26-ago-22	1-set-22							
Solicitação para a 37ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	2-set-22	8-set-22							
Solicitação para a 38ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	9-set-22	15-set-22							
Solicitação para a 39ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	16-set-22	22-set-22							
Solicitação para a 40ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	23-set-22	29-set-22							
Solicitação para a 41ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	30-set-22	6-out-22							
Solicitação para a 42ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	7-out-22	13-out-22							
Solicitação para a 43ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	14-out-22	20-out-22							
Solicitação para a 44ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	21-out-22	27-out-22							
Solicitação para a 45ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	28-out-22	3-nov-22							
Solicitação para a 46ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	4-nov-22	10-nov-22							
Solicitação para a 47ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	11-nov-22	17-nov-22							
Solicitação para a 48ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	18-nov-22	24-nov-22							
Solicitação para a 49ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	25-nov-22	1-dez-22							
Solicitação para a 50ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	2-dez-22	8-dez-22							
Solicitação para a 51ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	9-dez-22	15-dez-22							
Solicitação para a 52ª Semana 2022 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	16-dez-22	22-dez-22							
Solicitação para a 1ª Semana 2023 - Despesas Discricionárias	Levantamento e envio das despesas discricionárias para autorização semanal.	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	23-dez-22	29-dez-22							
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$0,00			**R$0,00**	**#DIV/0!**		

CGLF 2022003 - Alterações Orçamentárias

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Informações às áreas acerca do Calendário	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF	Concluído	1-fev-22	31-mar-22	R$0,00	23-fev-22	23-fev-22	R$0,00	100		
Primeira Janela Resultado Primário 1 (Despesas Financeiras e Obrigatórias) - Março	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	1-mar-22	3-mar-22	R$0,00	1-mar-22	3-mar-22	R$0,00	100		
Resultado Primário 2 (Despesas Discricionárias) - Abril	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	1-abr-22	6-abr-22		1-abr-22	6-abr-22				
Resultado Primário 7 (Emendas de Bancada Estadual - Impositivas) - Abril - Portaria	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	1-abr-22	6-abr-22		1-abr-22	6-abr-22				
RP 0 (Despesas Financeiras), FDNE e Pessoal e 1 (Despesas Primárias Obrigatórias), Pessoal - Maio	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	1-mai-22	4-mai-22		2-mai-22	4-mai-22				
Resultado Primário 2 (Despesas Discricionárias) - Junho	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	1-jun-22	8-jun-22		1-jun-22	8-jun-22				
RP 7 (Emendas de Bancada Estadual - Impositivas) - Junho	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	1-jun-22	8-jun-22		1-jun-22	8-jun-22				
RP 0 (Despesas Financeiras), FDNE e Pessoal e 1 (Despesas Primárias Obrigatórias), Pessoal - Setembro	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	1-set-22	4-set-22							
RP 7 (Emendas de Bancada Estadual - Impositivas) - Setembro (Até 07/09 por Portaria / Até 08/09 por Projeto de Lei)	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	1-set-22	8-set-22							
Resultado Primário 2 (Despesas Discricionárias) - Setembro	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	23-set-22	27-set-22							
RP 0 (Despesas Financeiras), FDNE e Pessoal e 1 (Despesas Primárias Obrigatórias), Pessoal - Novembro - Portaria	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	1-nov-22	3-nov-22							
RP 7 (Emendas de Bancada Estadual - Impositivas) - Novembro - Portaria	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	1-nov-22	8-out-22							
Resultado Primário 2 (Despesas Discricionárias) - Dezembro - Portaria	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	1-dez-22	7-dez-22							
RP 0 (Despesas Financeiras), FDNE e Pessoal e 1 (Despesas Primárias Obrigatórias), Pessoal - Novembro (somente para as alterações previstas nos incisos I, alíneas "a", "b" e "e", e II do caput do art. 4º da LOA-2022) - Portaria	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	10-dez-22	14-dez-22							
Acompanhamento das Alterações Orçamentárias	Abertura e envio de crédito para suplementar orçamento 2022	COCF e Unidades Responsáveis	Em Andamento	4-mar-22	31-dez-22		4-mar-22					
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$0,00			**R$0,00**	**100**		

CGLF 2022002 - Acompanhamento das Receitas (FDNE e SUDENE)

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Informação do calendário anual da estimativa de receita a áreas responsáveis	Envio para as áreas das datas para reestimativa das receitas 2022	COCF	Concluído	3-jan-22	31-jan-22		14-jan-22	14-jan-22				
Reestimativa das Receitas - Primeiro Bimestre	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	15-fev-22	25-fev-22		15-fev-22	25-fev-22				
Reestimativa das Receitas - Segundo Bimestre	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	14-abr-22	29-abr-22		14-abr-22	29-abr-22				
Reestimativa das Receitas - Terceiro Bimestre	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE	COCF e Unidades Responsáveis	Em Andamento	24-jun-22	1-jul-22		24-jun-22					
Reestimativa das Receitas - Quarto Bimestre	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	16-ago-22	26-ago-22							
Reestimativa das Receitas - Quinto Bimestre	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	17-out-22	28-out-22							
Acompanhamento Anual das Receitas	Acompanhamento das Receitas inseridas via SIOP	COCF	Em Andamento	3-jan-22	31-dez-22		3-jan-22					
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$0,00			R$0,00	#DIV/0!		

CGLF 2022001 - Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2023 - Quantitativo - Receita

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Informação do calendário anual da estimativa de receita a áreas responsáveis	Envio para as áreas das datas a receita do PLOA 2023	COCF	Concluído	3-jan-22	31-jan-22		14-jan-22	14-jan-22				
Primeira previsão da receita - PLOA 2023	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE para o PLOA 2023	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	15-mar-22	25-mar-22		15-mar-22	25-mar-22				
Segunda previsão da receita - PLOA 2023	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE para o PLOA 2023	COCF e Unidades Responsáveis	Concluído	15-mai-22	27-mai-22		15-mai-22	27-mai-22				
Revisão da receita - PLOA 2023	Levantamento, análise e inserção das receitas do FDNE e da SUDENE para o PLOA 2023	COCF e Unidades Responsáveis	A Iniciar	11-jul-22	18-jul-22							
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$0,00			R$0,00	#DIV/0!		

Novo grupo

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas

GAB - Projetos

GAB_Projeto Condel

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Prazo	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Planejamento do calendário anual de reuniões		Sudene	Concluído	2-jan-22	28-fev-22		27-dez-21	5-jan-22		100		
Relatório da Secretaria Executiva do Condel	Solicitação das informações às unidades e elaboração do relatório	Carla	Concluído	9-fev-22	26-mar-22		25-mar-22			100		
Verificação de mandatos dos conselheiros		Ascom	Concluído	9-fev-22	9-fev-22					100		
Solicitação, recepção e organização das pautas e documentos técnicos para o Condel		CGGI	Concluído	9-fev-22	14-fev-22					100		
Verificação das propostas de pauta quanto à legislação de atos inferiores, AIR, colegiados entre outros		CGGI	Concluído	14-fev-22	19-fev-22					100		
Definir datas do Comitê Técnico e do Condel em conjunto com MDR		GAB	Concluído	19-fev-22	24-fev-22					100		
Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução		CGGI	Concluído	19-fev-22	24-fev-22					100		
Análise jurídica		PF-Sudene	Concluído	24-fev-22	11-mar-22					100		
Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução		CGGI e Unidades Técnicas	Concluído	11-mar-22	14-mar-22					100		
Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução à Diretoria Colegiada		CGGI	Concluído	14-mar-22	16-mar-22					100		
Aprovação das Minutas de Proposição e de Resolução		Diretoria Colegiada	Concluído	16-mar-22	16-mar-22					100		
Assinatura das Minutas de Proposição		Superintendente	Concluído	17-mar-22	17-mar-22					100		
Atualização e consolidação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Comitê Técnico		CGGI	Concluído	18-mar-22	18-mar-22					100		
Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para o Comitê Técnico no site da Sudene		Ascom	Concluído	19-mar-22	19-mar-22					100		
Produção Executiva para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC	Anita/ Flávia + CGTI	Concluído	20-mar-22	20-mar-22					100		
Convite para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Elaboração minuta de Convite	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	21-mar-22	21-mar-22		13-mar-22			100		
Confirmações de presença para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	21-mar-22	21-mar-22		14-mar-22			100		
Elaboração lista de confirmações de presença da reunião do Comitê Técnico do Condel	Anotar o nome e dados do conselheiro que virá ao evento	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	22-mar-22	22-mar-22		15-mar-22			100		
Elaboração de lista de presença da reunião do Comitê Técnico do Condel	Anotar o nome e dados do conselheiro presente no evento	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	22-mar-22	23-mar-22		16-mar-22			100		
Reunião do Comitê Técnico do Condel	Reunião dos Conselheiros ou Técnicos	Ascom	Concluído	24-mar-22	24-mar-22		17-mar-22			100		
Elaboração da Ata da reunião do Comitê Técnico do Condel		Ascom	Concluído	24-mar-22	26-mar-22					100		
Solicitação e articulação com membros que participaram do Comitê Técnico para assinatura da Ata		CGGI/GAB	Concluído	26-mar-22	31-mar-22					100		
Atualização da página sobre reunião do Comitê Técnico no site da Sudene		Ascom	Concluído	24-mar-22	26-mar-22					100		
Recepção, análise do mérito e organização de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Concluído	24-mar-22	26-mar-22					100		
Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Concluído	24-mar-22	26-mar-22					100		
Análise jurídica de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		PF-Sudene	Concluído	24-mar-22	26-mar-22					100		
Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI e Unidades Técnicas	Concluído	26-mar-22	26-mar-22					100		
Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução à Diretoria Colegiada de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Concluído	26-mar-22	26-mar-22					100		
Aprovação das Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		Diretoria Colegiada	Concluído	26-mar-22	26-mar-22					100		
Assinatura das Proposições para o Condel		Superintendente	Concluído	26-mar-22	26-mar-22					100		
Atualização e consolidação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Condel		CGGI	Cancelado	26-mar-22	26-mar-22							
Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Condel no site da Sudene		Ascom	Cancelado	26-mar-22	26-mar-22							
Produção Executiva para a reunião do Condel	Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC	Anita/ Flávia + CGTI	Cancelado	26-mar-22	31-mar-22		26-mar-22					
Convite para a reunião do Condel		MDR	Cancelado	27-mar-22	27-mar-22		27-mar-22					
Confirmações de presença para a reunião do Condel	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	28-mar-22	28-mar-22							
Reunião do Condel	Renião dos Conselheiros do Condel da Sudene	Conselheiros do Condel e convidados	Cancelado	31-mar-22	31-mar-22	25000						
Degravação da Ata da reunião do Condel		Empresa de eventos	Cancelado	1-abr-22	6-abr-22							
Elaboração da Ata da reunião do Condel		Ascom	Cancelado	1-abr-22	11-abr-22							
Encaminhamento das Resoluções aprovadas na reunião para assinatura		CGGI/GAB	Concluído	1-abr-22	4-abr-22							
Assinatura e Publicação das Resoluções do Condel		MDR	Concluído	1-abr-22	16-abr-22							
Solicitação e articulação com membros que participaram do Condel para assinatura da Ata		CGGI/GAB	Concluído	11-abr-22	21-abr-22							
Divulgação dos documentos decorrentes da reunião do Condel no site da Sudene		Ascom	Concluído	17-abr-22	22-abr-22							
Relatório da Secretaria Executiva do Condel	Solicitação das informações às unidades e elaboração do relatório	Carla	Cancelado	11-mai-22	25-jun-22							
Verificação de mandatos dos conselheiros		Ascom	Cancelado	11-mai-22	11-mai-22							
Solicitação, recepção e organização das pautas e documentos técnicos para o Condel		CGGI	Cancelado	11-mai-22	16-mai-22							
Verificação das propostas de pauta quanto à legislação de atos inferiores, AIR, colegiados entre outros		CGGI	Cancelado	16-mai-22	21-mai-22							
Definir datas do Comitê Técnico e do Condel em conjunto com MDR		GAB	Cancelado	21-mai-22	26-mai-22							
Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução		CGGI	Cancelado	21-mai-22	26-mai-22							
Análise jurídica		PF-Sudene	Cancelado	26-mai-22	10-jun-22							
Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução		CGGI e Unidades Técnicas	Cancelado	10-jun-22	13-jun-22							

Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução à Diretoria Colegiada		CGGI	Cancelado	13-jun-22	15-jun-22							
Aprovação das Minutas de Proposição e de Resolução		Diretoria Colegiada	Cancelado	15-jun-22	15-jun-22							
Assinatura das Minutas de Proposição		Superintendente	Cancelado	16-jun-22	16-jun-22							
Atualização e consolidação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Comitê Técnico		CGGI	Cancelado	17-jun-22	17-jun-22							
Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para o Comitê Técnico no site da Sudene		Ascom	Cancelado	18-jun-22	18-jun-22							
Produção Executiva para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC	Anita/ Flávia + CGTI	Cancelado	19-jun-22	19-jun-22							
Convite para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Elaboração minuta de Convite	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	20-jun-22	20-jun-22							
Confirmações de presença para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	20-jun-22	20-jun-22							
Elaboração lista de confirmações de presença da reunião do Comitê Técnico do Condel	Anotar o nome e dados do conselheiro que virá ao evento	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	21-jun-22	21-jun-22							
Elaboração de lista de presença da reunião do Comitê Técnico do Condel	Anotar o nome e dados do conselheiro presente no evento	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	21-jun-22	22-jun-22							
Reunião do Comitê Técnico do Condel	Reunião dos Conselheiros ou Técnicos	Ascom	Cancelado	23-jun-22	23-jun-22							
Elaboração da Ata da reunião do Comitê Técnico do Condel		Ascom	Cancelado	23-jun-22	25-jun-22							
Solicitação e articulação com membros que participaram do Comitê Técnico para assinatura da Ata		CGGI/GAB	Cancelado	25-jun-22	30-jun-22							
Atualização da página sobre reunião do Comitê Técnico no site da Sudene		Ascom	Cancelado	23-jun-22	25-jun-22							
Recepção, análise do mérito e organização de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Cancelado	23-jun-22	25-jun-22							
Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Cancelado	23-jun-22	25-jun-22							
Análise jurídica de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		PF-Sudene	Cancelado	23-jun-22	25-jun-22							
Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI e Unidades Técnicas	Cancelado	25-jun-22	25-jun-22							
Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução à Diretoria Colegiada de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	Cancelado	25-jun-22	25-jun-22							
Aprovação das Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		Diretoria Colegiada	Cancelado	25-jun-22	25-jun-22							
Assinatura das Proposições para o Condel		Superintendente	Cancelado	25-jun-22	25-jun-22							
Atualização e consolidação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Condel		CGGI	Cancelado	25-jun-22	25-jun-22							
Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Condel no site da Sudene		Ascom	Cancelado	25-jun-22	25-jun-22							
Produção Executiva para a reunião do Condel	Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC	Anita/ Flávia + CGTI	Cancelado	25-jun-22	30-jun-22							
Convite para a reunião do Condel		MDR	Cancelado	26-jun-22	26-jun-22							
Confirmações de presença para a reunião do Condel	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	27-jun-22	27-jun-22							
Reunião do Condel	Renião dos Conselheiros do Condel da Sudene	Conselheiros do Condel e convidados	Cancelado	30-jun-22	30-jun-22	25000						
Degravação da Ata da reunião do Condel		Empresa de eventos	Cancelado	1-jul-22	6-jul-22							
Elaboração da Ata da reunião do Condel		Ascom	Cancelado	1-jul-22	11-jul-22							
Encaminhamento das Resoluções aprovadas na reunião para assinatura		CGGI/GAB	Cancelado	1-jul-22	4-jul-22							
Assinatura e Publicação das Resoluções do Condel		MDR	Cancelado	1-jul-22	16-jul-22							
Solicitação e articulação com membros que participaram do Condel para assinatura da Ata		CGGI/GAB	Cancelado	11-jul-22	21-jul-22							
Divulgação dos documentos decorrentes da reunião do Condel no site da Sudene		Ascom	Cancelado	17-jul-22	22-jul-22							
Relatório da Secretaria Executiva do Condel	Solicitação das informações às unidades e elaboração do relatório	Carla	A Iniciar	2-jul-22	6-ago-22							
Verificação de mandatos dos conselheiros		Ascom	A Iniciar	3-jul-22	2-jul-22							
Solicitação, recepção e organização das pautas e documentos técnicos para o Condel		CGGI	Concluído	2-jul-22	4-jul-22		8-jun-22	15-jun-22				
Verificação das propostas de pauta quanto à legislação de atos inferiores, AIR, colegiados entre outros		CGGI	A Iniciar	4-jul-22	9-jul-22							
Definir datas do Comitê Técnico e do Condel em conjunto com MDR		GAB	A Iniciar	9-jul-22	14-jul-22							
Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução		CGGI	A Iniciar	9-jul-22	14-jul-22							
Análise jurídica		PF-Sudene	A Iniciar	14-jul-22	24-jul-22							
Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução		CGGI e Unidades Técnicas	A Iniciar	24-jul-22	25-jul-22							
Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução à Diretoria Colegiada		CGGI	A Iniciar	25-jul-22	27-jul-22							
Aprovação das Minutas de Proposição e de Resolução		Diretoria Colegiada	A Iniciar	27-jul-22	27-jul-22							
Assinatura das Minutas de Proposição		Superintendente	A Iniciar	28-jul-22	28-jul-22							
Atualização e consolidação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Comitê Técnico		CGGI	A Iniciar	29-jul-22	29-jul-22							
Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para o Comitê Técnico no site da Sudene		Ascom	A Iniciar	30-jul-22	30-jul-22							
Produção Executiva para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC	Anita/ Flávia + CGTI	A Iniciar	31-jul-22	31-jul-22							
Convite para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Elaboração minuta de Convite	David Batista/ Flávia Torres	A Iniciar	1-ago-22	1-ago-22							
Confirmações de presença para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone	David Batista/ Flávia Torres	A Iniciar	1-ago-22	1-ago-22							
Elaboração lista de confirmações de presença da reunião do Comitê Técnico do Condel	Anotar o nome e dados do conselheiro que virá ao evento	David Batista/ Flávia Torres	A Iniciar	2-ago-22	2-ago-22							
Elaboração de lista de presença da reunião do Comitê Técnico do Condel	Anotar o nome e dados do conselheiro presente no evento	David Batista/ Flávia Torres	A Iniciar	2-ago-22	3-ago-22							
Reunião do Comitê Técnico do Condel	Reunião dos Conselheiros ou Técnicos	Ascom	A Iniciar	4-ago-22	4-ago-22							

Elaboração da Ata da reunião do Comitê Técnico do Condel		Ascom	A Iniciar	4-ago-22	6-ago-22							
Solicitação e articulação com membros que participaram do Comitê Técnico para assinatura da Ata		CGGI/GAB	A Iniciar	6-ago-22	11-ago-22							
Atualização da página sobre reunião do Comitê Técnico no site da Sudene		Ascom	A Iniciar	4-ago-22	6-ago-22							
Recepção, análise do mérito e organização de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	A Iniciar	4-ago-22	6-ago-22							
Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	A Iniciar	4-ago-22	6-ago-22							
Análise jurídica de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		PF-Sudene	A Iniciar	4-ago-22	6-ago-22							
Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI e Unidades Técnicas	A Iniciar	6-ago-22	6-ago-22							
Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução à Diretoria Colegiada de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	A Iniciar	6-ago-22	6-ago-22							
Aprovação das Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		Diretoria Colegiada	A Iniciar	6-ago-22	6-ago-22							
Assinatura das Proposições para o Condel		Superintendente	A Iniciar	6-ago-22	6-ago-22							
Atualização e consolidação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Condel		CGGI	A Iniciar	6-ago-22	6-ago-22							
Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Condel no site da Sudene		Ascom	A Iniciar	6-ago-22	6-ago-22							
Produção Executiva para a reunião do Condel	Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC	Anita/ Flávia + CGTI	A Iniciar	6-ago-22	11-ago-22							
Convite para a reunião do Condel		MDR	A Iniciar	7-ago-22	7-ago-22							
Confirmações de presença para a reunião do Condel	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone	David Batista/ Flávia Torres	A Iniciar	8-ago-22	8-ago-22							
Reunião do Condel	Renião dos Conselheiros do Condel da Sudene	Conselheiros do Condel e convidados	A Iniciar	11-ago-22	11-ago-22	25000						
Degravação da Ata da reunião do Condel		Empresa de eventos	A Iniciar	12-ago-22	17-ago-22							
Elaboração da Ata da reunião do Condel		Ascom	A Iniciar	12-ago-22	22-ago-22							
Encaminhamento das Resoluções aprovadas na reunião para assinatura		CGGI/GAB	A Iniciar	12-ago-22	15-ago-22							
Assinatura e Publicação das Resoluções do Condel		MDR	A Iniciar	12-ago-22	27-ago-22							
Solicitação e articulação com membros que participaram do Condel para assinatura da Ata		CGGI/GAB	A Iniciar	22-ago-22	1-set-22							
Divulgação dos documentos decorrentes da reunião do Condel no site da Sudene		Ascom	A Iniciar	28-ago-22	2-set-22							
Relatório da Secretaria Executiva do Condel	Solicitação das informações às unidades e elaboração do relatório	Carla	A Iniciar	16-out-22	30-nov-22							
Verificação de mandatos dos conselheiros		Ascom	A Iniciar	16-out-22	16-out-22							
Solicitação, recepção e organização das pautas e documentos técnicos para o Condel		CGGI	A Iniciar	16-out-22	21-out-22							
Verificação das propostas de pauta quanto à legislação de atos inferiores, AIR, colegiados entre outros		CGGI	A Iniciar	21-out-22	26-out-22							
Definir datas do Comitê Técnico e do Condel em conjunto com MDR		GAB	A Iniciar	26-out-22	31-out-22							
Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução		CGGI	A Iniciar	26-out-22	31-out-22							
Análise jurídica		PF-Sudene	A Iniciar	31-out-22	15-nov-22							
Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução		CGGI e Unidades Técnicas	A Iniciar	15-nov-22	18-nov-22							
Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução à Diretoria Colegiada		CGGI	A Iniciar	18-nov-22	20-nov-22							
Aprovação das Minutas de Proposição e de Resolução		Diretoria Colegiada	A Iniciar	20-nov-22	20-nov-22							
Assinatura das Minutas de Proposição		Superintendente	A Iniciar	21-nov-22	21-nov-22							
Atualização e consolidação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Comitê Técnico		CGGI	A Iniciar	22-nov-22	22-nov-22							
Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para o Comitê Técnico no site da Sudene		Ascom	A Iniciar	23-nov-22	23-nov-22							
Produção Executiva para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC	Anita/ Flávia + CGTI	A Iniciar	24-nov-22	24-nov-22							
Convite para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Elaboração minuta de Convite	David Batista/ Flávia Torres	A Iniciar	25-nov-22	25-nov-22							
Confirmações de presença para a reunião do Comitê Técnico do Condel	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone	David Batista/ Flávia Torres	A Iniciar	25-nov-22	25-nov-22							
Elaboração lista de confirmações de presença da reunião do Comitê Técnico do Condel	Anotar o nome e dados do conselheiro que virá ao evento	David Batista/ Flávia Torres	A Iniciar	26-nov-22	26-nov-22							
Elaboração de lista de presença da reunião do Comitê Técnico do Condel	Anotar o nome e dados do conselheiro presente no evento	David Batista/ Flávia Torres	A Iniciar	26-nov-22	27-nov-22							
Reunião do Comitê Técnico do Condel	Reunião dos Conselheiros ou Técnicos	Ascom	A Iniciar	28-nov-22	28-nov-22							
Elaboração da Ata da reunião do Comitê Técnico do Condel		Ascom	A Iniciar	28-nov-22	30-nov-22							
Solicitação e articulação com membros que participaram do Comitê Técnico para assinatura da Ata		CGGI/GAB	A Iniciar	30-nov-22	5-dez-22							
Atualização da página sobre reunião do Comitê Técnico no site da Sudene		Ascom	A Iniciar	28-nov-22	30-nov-22							
Recepção, análise do mérito e organização de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	A Iniciar	28-nov-22	30-nov-22							
Elaboração de Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	A Iniciar	28-nov-22	30-nov-22							
Análise jurídica de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		PF-Sudene	A Iniciar	28-nov-22	30-nov-22							
Ajustes nas Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI e Unidades Técnicas	A Iniciar	30-nov-22	30-nov-22							

Apresentação das Minutas de Proposição e de Resolução à Diretoria Colegiada de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		CGGI	A Iniciar	30-nov-22	30-nov-22							
Aprovação das Minutas de Proposição e de Resolução de pautas encaminhadas pelos Conselheiros no Comitê Técnico		Diretoria Colegiada	A Iniciar	30-nov-22	30-nov-22							
Assinatura das Proposições para o Condel		Superintendente	A Iniciar	30-nov-22	30-nov-22							
Atualização e consolidação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Condel		CGGI	A Iniciar	30-nov-22	30-nov-22							
Divulgação da pauta e dos documentos técnicos para a reunião do Condel no site da Sudene		Ascom	A Iniciar	30-nov-22	30-nov-22							
Produção Executiva para a reunião do Condel	Planejamento e organização do evento + Apoio de TIC	Anita/ Flávia + CGTI	A Iniciar	30-nov-22	5-dez-22							
Convite para a reunião do Condel		MDR	A Iniciar	1-dez-22	1-dez-22							
Confirmações de presença para a reunião do Condel	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone	David Batista/ Flávia Torres	A Iniciar	2-dez-22	2-dez-22							
Reunião do Condel	Renião dos Conselheiros do Condel da Sudene	Conselheiros do Condel e convidados	A Iniciar	5-dez-22	5-dez-22	25000						
Degravação da Ata da reunião do Condel		Empresa de eventos	A Iniciar	6-dez-22	11-dez-22							
Elaboração da Ata da reunião do Condel		Ascom	A Iniciar	6-dez-22	16-dez-22							
Encaminhamento das Resoluções aprovadas na reunião para assinatura		CGGI/GAB	A Iniciar	6-dez-22	9-dez-22							
Assinatura e Publicação das Resoluções do Condel		MDR	A Iniciar	6-dez-22	21-dez-22							
Solicitação e articulação com membros que participaram do Condel para assinatura da Ata		CGGI/GAB	A Iniciar	16-dez-22	26-dez-22							
Divulgação dos documentos decorrentes da reunião do Condel no site da Sudene		Ascom	A Iniciar	22-dez-22	27-dez-22							
Resumo Projeto			Em Andamento									
						100000			**0**	**100**		

ASCOM2022001 - Condel

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Prazo	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Produção Executiva	Planejamento e organização do Evento	Anita/ Flávia	Concluído	13-mar-22	13-mar-22		13-mar-22					
Convite Comitê Técnico Condel	Elaboração minuta de Convite.	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	14-mar-22	14-mar-22		14-mar-22					
Confirmações de Presença Comitê Técnico Condel.	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone.	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	15-mar-22	15-mar-22		15-mar-22					
Elaboração Lista de Confirmações de Presença.	Anotar o nome e dados do conselheiro que virá ao evento	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	16-mar-22	16-mar-22		16-mar-22					
Elaboração de lista de Presença no evento.	Anotar o nome e dados do conselheiro presente no evento	David Batista/ Flávia Torres	Concluído	17-mar-22	17-mar-22		17-mar-22					
Reunião do Comitê Técnico	Reunião dos Conselheiros ou Técnicos	Ascom	Concluído	24-mar-22	24-mar-22		24-mar-22					
Relatório da secretaria executiva	Elaboração do relatório	Carla	Em Andamento	25-mar-22	25-mar-22		25-mar-22					
Produção Executiva	Planejamento e organização do Evento	Anita/ Flávia	Cancelado	26-mar-22	26-mar-22		26-mar-22					
Convite para o CONDEL	Elaboração minuta de Convite.	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	27-mar-22	27-mar-22		27-mar-22					
Confirmações de Presença Condel.	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone.	David Batista/ Flávia Torres	Cancelado	28-mar-22	28-mar-22							
Condel	Renião dos Conselheiros do Condel da Sudene		Cancelado	31-mar-22	31-mar-22	25000						
Produção Executiva	Planejamento e organização do Evento	Anita/ Flávia	Atrasado	17-jun-22	17-jun-22							
Convite Comitê Técnico Condel	Elaboração minuta de Convite.	David Batista/ Flávia Torres	Atrasado	18-jun-22	18-jun-22							
Confirmações de Presença Comitê Técnico Condel.	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone.	David Batista/ Flávia Torres	Atrasado	19-jun-22	19-jun-22							
Elaboração Lista de Confirmações de Presença.	Anotar o nome e dados do conselheiro que virá ao evento	David Batista/ Flávia Torres	Atrasado	20-jun-22	20-jun-22							
Elaboração de lista de Presença no evento.	Anotar o nome e dados do conselheiro presente no evento	David Batista/ Flávia Torres	Atrasado	21-jun-22	21-jun-22							
Reunião do Comitê Técnico	Reunião dos Conselheiros ou Técnicos	Ascom	A Iniciar	23-jun-22	23-jun-22							
Relatório da secretaria executiva	Elaboração do relatório	Carla	A Iniciar	24-jun-22	24-jun-22							
Produção Executiva	Planejamento e organização do Evento	Anita/ Flávia	A Iniciar	25-jun-22	25-jun-22							
Convite para o CONDEL	Elaboração minuta de Convite.	David Batista/ Flávia Torres	A Iniciar	26-jun-22	26-jun-22							
Confirmações de Presença Condel.	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone.	David Batista/ Flávia Torres	A Iniciar	27-jun-22	28-jun-22							
Condel	Renião dos Conselheiros do Condel da Sudene	Ascom	A Iniciar	30-jun-22	30-jun-22	25000						
Produção Executiva	Planejamento e organização do Evento	Anita/ Flávia	A Iniciar	30-jul-22	30-jul-22							
Convite Comitê Técnico Condel	Elaboração minuta de Convite.	David Batista/ Flávia Torres	A Iniciar	31-jul-22	31-jul-22							
Confirmações de Presença Comitê Técnico Condel.	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone.	David Batista/ Flávia Torres	A Iniciar	1-ago-22	1-ago-22							
Elaboração Lista de Confirmações de Presença.	Anotar o nome e dados do conselheiro que virá ao evento	David Batista/ Flávia Torres	A Iniciar	2-ago-22	2-ago-22							
Elaboração de lista de Presença no evento.	Anotar o nome e dados do conselheiro presente no evento	David Batista/ Flávia Torres	A Iniciar	3-ago-22	3-ago-22							
Reunião do Comitê Técnico	Reunião dos Conselheiros ou Técnicos	Ascom	A Iniciar	4-ago-22	4-ago-22							
Relatório da secretaria executiva	Elaboração do relatório	Carla	A Iniciar	5-ago-22	5-ago-22							
Produção Executiva	Planejamento e organização do Evento	Anita/ Flávia	A Iniciar	6-ago-22	6-ago-22							
Convite para o CONDEL	Elaboração minuta de Convite.	David Batista/ Flávia Torres	A Iniciar	7-ago-22	7-ago-22							
Confirmações de Presença Condel.	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone.	David Batista/ Flávia Torres	A Iniciar	8-ago-22	8-ago-22							
Condel	Renião dos Conselheiros do Condel da Sudene	Ascom	A Iniciar	11-ago-22	11-ago-22	25000						
Produção Executiva	Planejamento e organização do Evento	David Batista/ Flávia Torres	A Iniciar	23-nov-22	23-nov-22							
Convite Comitê Técnico Condel	Elaboração minuta de Convite.	David Batista/ Flávia Torres	A Iniciar	24-nov-22	24-nov-22							
Confirmações de Presença Comitê Técnico Condel.	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone.	David Batista/ Flávia Torres	A Iniciar	25-nov-22	25-nov-22							
Elaboração Lista de Confirmações de Presença.	Anotar o nome e dados do conselheiro que virá ao evento	David Batista/ Flávia Torres	A Iniciar	26-nov-22	26-nov-22							
Elaboração de lista de Presença no evento.	Anotar o nome e dados do conselheiro presente no evento	David Batista/ Flávia Torres	A Iniciar	27-nov-22	27-nov-22							
Reunião do Comitê Técnico	Reunião dos Conselheiros ou Técnicos	Ascom	A Iniciar	28-nov-22	28-nov-22							
Relatório da secretaria executiva	Elaboração do relatório	Anita/ Flávia	A Iniciar	29-nov-22	29-nov-22							
Produção Executiva	Planejamento e organização do Evento	Anita/ Flávia	A Iniciar	30-nov-22	30-nov-22							
Convite para o CONDEL	Elaboração minuta de Convite.	David Batista/ Flávia Torres	A Iniciar	1-dez-22	1-dez-22							

Confirmações de Presença Condel.	Contactar Conselheiros (titular ou Suplente) via telefone.	David Batista/ Flávia Torres	A Iniciar	2-dez-22	2-dez-22							
Condel	Renião dos Conselheiros do Condel da Sudene	Ascom	A Iniciar	5-dez-22	5-dez-22	25000						
Resumo Projeto			Atrasado								Status do Projeto	
						100000			**0**	**#DIV/0!**		

CGGI - Projetos

Adicionar descrição do quadro

CGGI2022013 - Elaboração do Proposta Orçamentária - fase qualitativa

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Indicação de 02 (dois) pontos focais para tratar da fase qualitativa da elaboração da PLOA junto ao MDR		CGGI	Concluído	25-abr-22	26-abr-22	R$0,00	19-abr-22	19-abr-22			Rafael indicou, por e-mail, os servidores José Maurício e Renan como pontos focais para o processo de elaboração da PLOA 2023.	
Análise do Cadastro de Ações Orçamentárias		Todas as Unidades com Ações Finalísticas	Concluído	26-abr-22	11-mai-22	R$0,00	29-abr-22	13-mai-22				
Proposta de alteração da classificação da ação		Todas as Unidades com Ações Finalísticas	Concluído	26-abr-22	11-mai-22	R$0,00	29-abr-22	13-mai-22				
Proposta de inclusão, exclusão ou alteração das ações orçamentárias e dos Projetos de Investimentos de Grande Vulto		Todas as Unidades com Ações Finalísticas	Concluído	9-mai-22	13-mai-22	R$0,00	29-abr-22	13-mai-22				
Consolidação das propostas de inclusão, exclusão ou alteração das ações orçamentárias e dos projetos de investimento de grande vulto.		CGGI	Concluído	11-mai-22	13-mai-22	R$0,00	13-mai-22	13-mai-22				
Resumo Projeto			Concluído									
						R$0,00			**R$0,00**	**#DIV/0!**		

CGGI2022012 - TransformaGov

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Atualizar e validar as informações do Painel Raio-X		CGAF	Concluído		31-out-21			30-out-21				
Aderir à Rede TransformaGov no estado de Pernambuco		CGGI	Concluído		28-fev-21			28-fev-21				
Revisar a Cadeia de Valor integrada com seus principais elementos		CGGI	Concluído		31-mar-22			16-dez-21				
Realinhar o Planejamento Estratégico Institucional ao PRDNE		CGGI	Concluído		28-fev-22			16-dez-21				
Instituir Comissão Permanente de Avaliação de Documentos (CPAD)		CGAF	Concluído		28-fev-21			28-fev-21				
Realizar levantamento dos conjuntos documentais, incluindo sem tratamento, com identificação de volume (em metros lineares) e dos locais de armazenamento		CGAF	Concluído		31-ago-21			31-ago-21				
Implantar o módulo estatístico do SEI para acompanhamento remoto do órgão central		CGTI	Concluído		30-nov-20			30-nov-20				
Incentivar a adoção do módulo Central de Mensagens como ferramenta para utilização junto aos servidores da entidade		CGGP	Concluído		31-out-20			30-out-20				
Incentivar cadastro dos servidores no Banco de Talentos e implementar o uso do Painel Banco de Talentos pela área de Gestão de Pessoas Banco de		CGGP	Concluído		30-nov-20			30-nov-20				
Recadastrar no módulo AJ do SIGEPE as ações judiciais que estiverem sendo pagas via sistema SICAJ		CGGP	Concluído		31-jan-21			31-jan-21				
Estabelecer os perfis profissionais desejáveis para todos os cargos em comissão do grupo DAS ou FCPE da estrutura (níveis 5 a 6)		CGGP	Concluído		31-jan-22			31-jan-22				
Elaborar plano de trabalho para migração dos serviços de concessão e manutenção de aposentadorias e pensões para o Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos – DECIPEX		CGGP	Concluído		28-fev-21			28-fev-21				
Implantação do Programa de Gestão, nos moldes da IN 65, de 30/07/2020, do Ministério da Economia		CGGP	Concluído		30-nov-20			30-nov-21				
Implantar o Sistema de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União (SPIUNet)		CGAF	Concluído		30-set-20			30-set-20				
Cadastrar as informações de locação de imóveis no Sistema de Gerenciamento de Imóveis de Uso Especial da União (SPIUNet) imóveis		CGAF	Concluído		28-fev-21			28-fev-21				
Realizar diagnóstico da ocupação predial, considerando os parâmetros definidos pela SPU		CGAF	Concluído		30-mar-21			30-mar-21				
Definir, em parceria com a SPU e SEGES, estratégia de racionalização de ocupação predial		CGAF	Concluído		30-out-21			30-out-21				
Aderir à Rede +Brasil		CGDS	Concluído		30-jun-21			30-jun-21				
Capacitar os agentes públicos no aplicativo Fiscalização Mais Brasil		CGDS	Concluído		31-mar-21			31-mar-21				
Capacitar os servidores que trabalham com as transferências de recursos da União		CGDS	Concluído		30-abr-22			30-abr-22				
Aderir à análise automatizada de Prestação de Contas		CGDS	Concluído		30-out-21			30-out-21				
Capacitar e promover a adesão ao Modelo de Excelência em Gestão (MEG-Tr)		CGGI/ CGDS	Concluído		30-out-21			30-out-21				

Implantar o Barramento de serviços do Processo Eletrônico Nacional (PEN)		CGTI	Cancelado		30-abr-22						Considerando que o TRF4 não nos concedeu acesso ao código-fonte do SEI atualizado, estamos avaliando a possibilidade de integrar o SEI da Sudene ao SEI do MDR. No entanto, mesmo após diversas tentativas de contato por telefone com o sr. Romeu, diretor de administração do MDR, ainda não obtivemos sucesso neste contato, e portanto, não conseguimos avançar neste ponto. Rafael conversou com o Luciano (ME) e acertou-se que seria cancelado o item.	
Adotar o Protocolo Digital do Governo Federal (utilizando a solução gov.br)		CGTI	Concluído		31-mar-22			31-mar-22			Mesmo com as limitações da nossa atual versão do SEI, conseguimos implantar o Protocolo Digital, que está integrado ao SEI da Sudene e disponível no link abaixo: https://www.gov.br/pt-br/servicos/protocolo-da-superintendencia-do-desenvolvimento-do-nordeste No entanto, os responsáveis pelo Protocolo da Sudene ainda não estão utilizando o serviço. O servidor Diego Véras, indicado responsável pela área de negócios do Protocolo, está ciente da necessidade de orientar a equipe do Protocolo, mas como ele está sobrecarregado com a reforma do prédio da Sudene, ainda não foi possível repassar as informações para a equipe de servidores do Protocolo.	
Elaborar o Plano de Gestão de Documentos e Arquivos, conforme Política de Gestão de Documentos e Arquivos da Administração Pública Federal		CGAF	Atrasado		30-jun-22						A política de gestão de documentos e arquivos será instituída a partir da publicação do decreto, mas ainda está em fase de consolidação. A previsão é que seja normatizada em breve. O Arquivo Nacional também está trabalhando no desenvolvimento de cursos Ead e programas de capacitação para que todos os órgãos da administração pública federal elaborem os seus planos de gestão de documentos e arquivos. A partir da instituição da política, os órgãos terão o prazo de 12 meses para elaborarem os seus respectivos planos.	
Elaborar e aprovar junto ao Arquivo Nacional o código de classificação e tabela de temporalidade e destinação dos documentos relativos às atividades-fim do órgão ou entidade, conforme o Decreto nº 10.148/2019		CGAF	Atrasado		30-jun-22		1-out-21				Em curso.	
Aplicar o código de classificação e a tabela de temporalidade e destinação dos documentos relativos à atividade-meio do Poder Executivo Federal, conforme Portaria Arquivo Nacional, nº 47/2020		CGAF	Em Andamento		31-dez-22		1-out-21				A aplicação do código de classificação e da tabela de temporalidade está sendo feita em etapas e por coordenação. No momento está sendo aplicado nos documentos da CGGP. A aplicação do código de classificação e tabela de temporalidade relativos à atividade-meio teve que ser interrompida por conta da necessidade de desocupar o 8º andar. Sendo assim, a aplicação do código realiza-se no arquivo da CGIF, que são documentos referentes à atividade-fim. Em tempo, informo que a aplicação do código e tabela de temporalidade na documentação da CGGP está concluída.	
Proceder a eliminação dos documentos que cumpriram a respectiva temporalidade, conforme o Decreto nº 10.148/2019 e as orientações do Arquivo Nacional		CGAF	A Iniciar		30-set-22						Conforme o OFÍCIO CIRCULAR nº 01/2022/GABIN/AN, a eliminação de documentos públicos está suspensa até nova decisão judicial.	
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$0,00			**R$0,00**	**#DIV/0!**		

CGGI2022011 - Adesão ao MEG-Tr

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento da legislação e benchmarking relacionados ao MEG-TR no Governo Federal		CGGI	Concluído	20-ago-21	8-set-21	R$0,00	20-ago-21	8-set-21	R$0,00	100		
Elaboração de proposta de composição do Comitê de Aplicação do MEG-TR		CGGI	Concluído	20-ago-21	8-set-21	R$0,00	20-ago-21	8-set-21	R$0,00	100		
Elaboração de documento contendo análise técnica		CGGI	Concluído	20-ago-21	8-set-21	R$0,00	20-ago-21	8-set-21	R$0,00	100		
Análise jurídica do ato normativo que instituirá o Comitê de Aplicação		PF-SUDENE	Concluído	9-set-21	23-set-21	R$0,00	9-set-21	23-set-21	R$0,00	100		
Complementação da análise técnica		CGGI	Concluído	24-set-21	28-set-21	R$0,00	24-set-21	28-set-21	R$0,00	100		
Instituição Comitê de Aplicação para implementação do MEG-Tr		GAB	Concluído	20-out-21	20-out-21	R$0,00	20-out-21	20-out-21	R$0,00	100		
Adesão ao MEG-TR		Presidente do Comitê de Aplicação	Concluído			R$0,00			R$0,00	100	Falta a data da efetiva adesão ao MEG-Tr	
Participação dos integrantes do Comitê de Aplicação em capacitação do MEG-TR		Comitê de Aplicação	Em Andamento	1-out-21	30-set-22	R$0,00	1-out-21					
Início do primeiro ciclo de avaliação e aplicação de instrumento de melhoria de gestão (IMG-TR)		Comitê de Aplicação	Em Andamento	1-out-21	30-set-22	R$0,00	1-out-21					
Realização de 02 (duas) reuniões do Comitê de Aplicação para avaliação da gestão e aplicação do Instrumento de Melhoria de Gestão das Transferências da União - IMG-Tr		Presidente do Comitê de Aplicação	Em Andamento	1-out-21	30-set-22	R$0,00	1-out-21					
Criação e execução de atividades, por subgrupos do Comitê de Aplicação, para aplicação das "alíneas" dos Fundamentos do MEG-Tr para o IMG-Tr escolhido		Pesidente e Membros do Comitê de Aplicação	Em Andamento	1-out-21	30-set-22	R$0,00	1-out-21					
Validação, registro e emissão de documentos no Sistema do Modelo de Excelência em Gestão (SMEG) sobre a avaliação realizada		Presidente do Comitê de Aplicação	Em Andamento	1-out-21	30-set-22	R$0,00	1-out-21					
Encaminhamento do Relatório de Melhoria da Gestão para validação da Coordenação da Rede +Brasil, contendo o Plano de Melhoria da Gestão-PMG e o Nível de Maturidade da Gestão		Presidente do Comitê de Aplicação	Em Andamento	1-out-21	30-set-22	R$0,00	1-out-21					
Apresentação do relatório da aplicação do IMG-Tr e certificação obtida pela Sudene ao Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CGRC		Presidente do Comitê de Aplicação	Em Andamento	1-out-21	30-set-22	R$0,00	1-out-21					
Implementação de ações de melhoria estabelecidas no Plano de Melhoria da Gestão		Unidades avaliadas no IMG-TR	Em Andamento	1-out-21	30-set-22	R$0,00	1-out-21					
Início do novo ciclo de avaliação e aplicação de instrumento de melhoria de gestão (IMG-TR)		Comitê de Aplicação	A Iniciar	1-out-22	30-set-23	R$0,00						

Realização de 02 (duas) reuniões do Comitê de Aplicação para avaliação da gestão e aplicação do Instrumento de Melhoria de Gestão das Transferências da União - IMG-Tr		Presidente do Comitê de Aplicação	A Iniciar	1-out-22	30-set-23	R$0,00						
Criação e execução de atividades, por subgrupos do Comitê de Aplicação, para aplicação das "alíneas" dos Fundamentos do MEG-Tr para o IMG-Tr escolhido		Pesidente e Membros do Comitê de Aplicação	A Iniciar	1-out-22	30-set-23	R$0,00						
Encaminhamento do Relatório de Melhoria da Gestão para validação da Coordenação da Rede +Brasil, contendo o Plano de Melhoria da Gestão-PMG e o Nível de Maturidade da Gestão		Presidente do Comitê de Aplicação	A Iniciar	1-out-22	30-set-23	R$0,00						
Validação, registro e emissão de documentos no Sistema do Modelo de Excelência em Gestão (SMEG) sobre a avaliação realizada		Presidente do Comitê de Aplicação	A Iniciar	1-out-22	30-set-23	R$0,00						
Apresentação do relatório da aplicação do IMG-Tr e certificação obtida pela Sudene ao Comitê de Governança, Gestão de Riscos e Controles Internos - CGRC		Presidente do Comitê de Aplicação	A Iniciar	1-out-22	30-set-23	R$0,00						
Implementação de ações de melhoria estabelecidas no Plano de Melhoria da Gestão		Unidades avaliadas no IMG-TR	A Iniciar	1-out-22	30-set-23	R$0,00						
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$0,00			**R$0,00**	**100**		

CGGI2022010 - Elaboração da Política de Gestão de Riscos

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento da legislação e benchmarking relacionados a Política de Gestão de Riscos (PGR) no Governo Federal		CGGI	Concluído	6-mai-21	6-nov-21	R$0,00	9-jul-21	30-ago-21	R$0,00	100		
Elaboração de proposta de PGR		CGGI	Concluído	6-mai-21	6-nov-21	R$0,00	9-jul-21	30-ago-21	R$0,00	100		
Validação técnica da PGR		CGGI	Concluído	6-mai-21	6-nov-21	R$0,00	9-jul-21	30-ago-21	R$0,00	100		
Elaboração de nota técnica		CGGI	Concluído	6-mai-21	6-nov-21	R$0,00	9-jul-21	30-ago-21	R$0,00	100		
Revisão da proposta de PGR e da nota técnica para alinhamento com novo Plano Estratégico Institucional (PEI)		CGGI	Concluído	17-dez-21	7-jan-22	R$0,00	17-dez-21	31-mar-22	R$0,00	100		
Análise jurídica do ato normativo que instituirá a PGR		PF-SUDENE	Concluído	31-mar-22	14-abr-22	R$0,00	8-abr-22	19-abr-22	R$0,00	100		
Inclusão da proposta de PGR na pauta de reunião do CGRC		CGGI	Concluído	14-abr-22	20-abr-22	R$0,00	11-abr-22	11-abr-22	R$0,00	100		
Deliberação sobre a PGR		CGRC	Concluído	20-abr-22	20-abr-22	R$0,00	20-abr-22	20-abr-22	R$0,00	100		
Ajustes na PGR		CGGI	Concluído	20-abr-22	22-abr-22	R$0,00	20-abr-22	20-abr-22	R$0,00	100		
Publicação da PGR		CGGI e ASCOM	Concluído	22-abr-22	22-abr-22	R$0,00	20-abr-22	20-abr-22	R$0,00	100	Falta a superintendente assinar a Resolução CGRC/Sudene nº 01/2022	
Benchmarking de metodologias de Gestão de Riscos no Governo Federal		CGGI	Concluído	25-abr-22	22-mai-22	R$0,00	11-abr-22	20-mai-22	R$0,00		Na atual proposta de PGR, prazo é de 180 dias após a aprovação/publicação da PGR	
Elaboração de proposta de Metodologia de Gestão de Riscos (MGR)		CGGI	Concluído	2-mai-22	20-jun-22	R$0,00	9-mai-22	17-jun-22				
Validação técnica da MGR		CGGI	Em Andamento	3-mai-22	4-jul-22	R$0,00	20-jun-22					
Inclusão da proposta de MGR na pauta de reunião do CGRC		CGGI	A Iniciar	4-jul-22	11-jul-22	R$0,00						
Deliberação sobre a MGR		CGRC	A Iniciar	11-jul-22	11-jul-22	R$0,00					Data prevista para reunião do CGRC	
Ajustes na MGR		CGGI	A Iniciar	11-jul-22	15-jul-22	R$0,00						
Publicação da MGR		CGGI e ASCOM	A Iniciar	15-jul-22	15-jul-22	R$0,00						
Apresentação institucional sobre PGR e MGR		CGGI	A Iniciar	18-jul-22	29-jul-22	R$0,00						
Implementação da gestão de riscos na Sudene		Todas as unidades	A Iniciar	18-jul-22	18-jul-24	R$0,00					Previsto na atual proposta de PGR prazo de até 24 meses para um ciclo de avaliação de riscos.	
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$0,00			**R$0,00**	**100**		

CGGI2022009 - Programa de Gestão

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Normatização interna		CGGP	Concluído	31-jul-20	5-nov-21	R$0,00	31-jul-20	5-nov-21	R$0,00	100	Portaria nº 122/2020	
Orientações às Unidades Administrativas da Sudene acerca dos procedimentos de adesão ao Programa de Gestão		CGGP e CGGI	Concluído	5-nov-21	31-dez-21	R$0,00	5-nov-21	31-dez-21	R$0,00	100		
Alteração da norma interna		CGGI	Concluído	5-jan-21	19-jan-21	R$0,00	5-jan-21	19-jan-21	R$0,00	100	Portaria nº 142/2020	
Orientações às Unidades Administrativas da Sudene acerca dos procedimentos de adesão ao Programa de Gestão conforme nova Portaria		CGGP e CGGI	Em Andamento	19-jan-21	31-dez-22	R$0,00	19-jan-21		R$0,00		Atividade rotinera que será realizada ao longo de todo o Programa de Gestão	
Elaboração de Relatório de acompanhamento do PGD		CGGP e CGGI	A Iniciar	1-dez-22	31-dez-22	R$0,00			R$0,00			
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$0,00			**R$0,00**	**100**		

CGGI2022008 - Monitoramento do Desempenho Institucional

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
1º ciclo de Monitoramento		CGGI	Concluído	1-jan-22	31-mar-22	R$0,00	1-jan-22	31-mar-22	R$0,00	100		
Relatório do 1º ciclo de Monitoramento		CGGI	Concluído	1-abr-22	19-abr-22	R$0,00	1-abr-22	11-abr-22	R$0,00	100		
Deliberação sobre o Relatório do 1º ciclo de Monitoramento		CGRC	Concluído	20-abr-22	20-abr-22	R$0,00	20-abr-22	19-abr-22	R$0,00	100		
Publicação do Relatório do 1º ciclo de Monitoramento no site da Sudene		ASCOM	Concluído	20-abr-22	27-abr-22	R$0,00	25-abr-22	28-abr-22	R$0,00	100		
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário		Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	Concluído	20-abr-22	30-abr-22	R$0,00	3-mar-22	18-abr-22	R$0,00	100	Para revisão das metas, deve ser apresentada proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene.	
2º ciclo de Monitoramento		CGGI	Concluído	1-abr-22	30-jun-22	R$0,00	1-abr-22	30-jun-22				
Relatório do 2º ciclo de Monitoramento		CGGI	A Iniciar	1-jul-22	15-jul-22							

Deliberação sobre o Relatório do 2º ciclo de Monitoramento		CGRC	A Iniciar	15-jul-22	16-jul-22							
Publicação do Relatório do 2º ciclo de Monitoramento no site da Sudene		ASCOM	A Iniciar	16-jul-22	16-jul-22							
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário		Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	A Iniciar	1-jul-22	30-jul-22						Para revisão das metas, deve ser apresentada proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene.	
3º ciclo de Monitoramento		CGGI	A Iniciar	1-jul-22	30-set-22							
Relatório do 3º ciclo de Monitoramento		CGGI	A Iniciar	3-out-22	17-out-22							
Deliberação sobre o Relatório do 3º ciclo de Monitoramento		CGRC	A Iniciar	17-out-22	17-out-22							
Publicação do Relatório do 3º ciclo de Monitoramento no site da Sudene		ASCOM	A Iniciar	17-out-22	17-out-22							
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário		Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	A Iniciar	1-out-22	30-out-22						Para revisão das metas, deve ser apresentada proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene.	
Levantamento dos projetos estratégicos para comporem as metas intermediárias e globais do 14º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 11º ciclo da GDACE (Plano de Ação da Sudene)		Unidades Administrativas	A Iniciar	1-ago-22	17-ago-22							
Consolidação dos projetos estratégicos para comporem as metas intermediárias e globais do 14º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 11º ciclo da GDACE (Plano de Ação da Sudene)		CGGI	A Iniciar	17-ago-22	22-ago-22							
Aprovação do Plano de Ação da Sudene e, consequentemente, das metas intermediárias e globais do 14º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 11º ciclo da GDACE		Diretoria Colegiada	A Iniciar	22-ago-22	26-ago-22							
Elaboração de Minuta de Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGI	A Iniciar	26-ago-22	31-ago-22							
Análise jurídica		PF-Sudene	A Iniciar	31-ago-22	14-set-22							
Ajustes na Minuta de Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGI	A Iniciar	14-set-22	16-set-22							
Aprovação da Minuta de Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		Diretoria Colegiada	A Iniciar	19-set-22	21-set-22							
Assinatura da Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		Superintendente	A Iniciar	19-set-22	21-set-22							
Publicação da Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGP	A Iniciar	21-set-22	21-set-22							
Publicação da Portaria para estabelecimento das metas de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		ASCOM	A Iniciar	21-set-22	21-set-22							
Apuração das metas intermediárias e globais do 13º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 10º ciclo da GDACE		Unidades Administrativas Responsáveis por projetos estratégicos	A Iniciar	1-out-22	10-out-22							
Consolidação das metas intermediárias e globais do 13º ciclo de avaliação da GDPGPE e o 10º ciclo da GDACE		CGGI	A Iniciar	1-out-22	10-out-22							
Elaboração de Minuta de Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGI	A Iniciar	10-out-22	14-out-22							
Análise jurídica		PF-Sudene	A Iniciar	14-out-22	26-out-22							
Ajustes na Minuta de Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		CGGI	A Iniciar	26-out-22	28-out-22							
Aprovação da Minuta de Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		Diretoria Colegiada	A Iniciar	28-out-22	31-out-22							
Assinatura da Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE		Superintendente	A Iniciar	28-out-22	31-out-22							
Publicação da Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE no Boletim de Pessoal		CGGP	A Iniciar	31-out-22	31-out-22							
Publicação da Portaria para apuração do resultado da avaliação de desempenho institucional para fins de concessão da CGPGPE e da CDACE no site da Sudene		ASCOM	A Iniciar	31-out-22	31-out-22							
4º ciclo de Monitoramento		CGGI	A Iniciar	1-out-22	31-dez-22							
Relatório do 4º ciclo de Monitoramento		CGGI	A Iniciar	2-jan-23	15-jan-23							
Deliberação sobre o Relatório do 4º ciclo de Monitoramento		CGRC	A Iniciar	16-jan-23	16-jan-23							
Publicação do Relatório do 4º ciclo de Monitoramento no site da Sudene		ASCOM	A Iniciar	16-jan-23	16-jan-23							
Revisão das metas intermediárias ou globais, se necessário		Unidades Administrativas, CGGI, PF-SUDENE, Diretoria Colegiada, Superintendente, CGGP e ASCOM	A Iniciar	2-jan-23	31-jan-23						Para revisão das metas, deve ser apresentada proposta fundamentada pela Unidade Administrativa Responsável e devem ser seguidos os mesmos procedimentos do estabelecimento das metas, a partir da Elaboração da Minuta de Portaria até a publicação da Portaria no Boletim de Pessoal e no site da Sudene.	
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$0,00			**R$0,00**	**100**		
CGGI2022007 - Melhoria de Processos Críticos												

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento dos processos da Sudene		CGGI	Concluído	1-abr-22	30-abr-22	R$0,00	18-mar-22	22-mar-22	R$0,00	100		
Definição de critérios para estabelecer a criticidade dos processos		CGGI	Concluído	1-abr-22	30-abr-22	R$0,00	21-mar-22	21-mar-22	R$0,00	100		
Classificação dos processos quanto à sua criticidade		CGGI	Concluído	30-abr-22	15-abr-22	R$0,00	21-mar-22	5-abr-22	R$0,00	100		
Deliberação quanto às metodologias utilizadas		CGRC	Concluído	20-abr-22	20-abr-22	R$0,00	20-abr-22	20-abr-22	R$0,00	100		
Realização de reuniões com as áreas diretamente envolvidas no processo a ser melhorado	Contratações	CE, CGGI e Unidade Responsável pelo Projeto	Concluído	25-abr-22	15-jun-22	R$0,00	12-abr-22	15-jun-22	R$0,00		A partir desta atividade, as atividades se repetempara cada processo a ser melhorado/mapeado.	
Levantamento da legislação relacionada ao processo, das entradas, fornecedores, recursos necessários, atividades, responsáveis, saídas, consumidores, resultados esperados, gargalos, riscos e oportunidades de melhoria	Contratações	CE, CGGI e Unidade Responsável pelo Projeto	Concluído	25-abr-22	15-jun-22	R$0,00	12-abr-22	15-jun-22	R$0,00			
Representação gráfica do processo	Contratações	CE	Em Andamento	15-jun-22	8-jul-22	R$0,00	15-jun-22					
Validação da representação gráfica do processo mapeado	Contratações	CE, CGGI e Unidade Responsável pelo Projeto	A Iniciar	11-jul-22	22-jul-22	R$0,00						
Transformação do processo	Contratações	CE	A Iniciar	11-jul-22	12-ago-22							
Validação da representação gráfica do processo transformado	Contratações	CE, CGGI e Unidade Responsável pelo Projeto	A Iniciar	15-ago-22	26-ago-22	R$0,00						
Normatização interna do processo, se for o caso	Contratações	CE, CGGI e Unidade Responsável pelo Projeto	A Iniciar	29-ago-22	28-out-22	R$0,00						
Implementação do processo transformado	Contratações	CE, CGGI e Unidade Responsável pelo Projeto	A Iniciar	31-out-22	30-nov-22							
Realização de reuniões com as áreas diretamente envolvidas no processo a ser melhorado	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Projeto	Concluído	2-mai-22	15-jun-22	R$0,00	2-mai-22	27-mai-22	R$0,00		A partir desta atividade, as atividades se repetempara cada processo a ser melhorado/mapeado.	
Levantamento da legislação relacionada ao processo, das entradas, fornecedores, recursos necessários, atividades, responsáveis, saídas, consumidores, resultados esperados, gargalos, riscos e oportunidades de melhoria	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Projeto	Concluído	2-mai-22	15-jun-22	R$0,00	2-mai-22	27-mai-22	R$0,00			
Representação gráfica do processo (mapeamento e transformação)	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Projeto	Em Andamento	9-mai-22	1-jul-22	R$0,00	9-mai-22					
Validação da representação gráfica do processo	TCE	CPTCE e AUD	A Iniciar	1-jul-22	8-jul-22	R$0,00						
Normatização interna do processo, se for o caso	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Projeto	A Iniciar	11-jul-22	15-ago-22	R$0,00						
Implementaçao do processo transformado	TCE	CGGI e Unidade Responsável pelo Projeto	A Iniciar	18-jul-22	12-ago-22	R$0,00						
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$0,00			**R$0,00**	**100**		

CGGI2022006 - Revisão do Planejamento Estratégico da Sudene

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Revisão da Missão, da Visão e dos Valores Institucionais		CGGI	Concluído	25-nov-19	27-dez-20	R$10.800,00	25-nov-19	27-dez-20	R$6.000,00	100	Relatório Planejamento Estratégico (SEI 0214188)	
Análise ambiental (análise SWOT)		CGGI	Concluído	27-dez-20	10-mar-21	R$4.800,00	27-dez-20	10-mar-21	R$4.800,00	100	Devolutiva Análise Ambiental (SEI 0256809)	
Elaboração da Cadeia de Valor Integrada		CGGI	Concluído	1-fev-21	8-set-21	R$0,00	1-fev-21	8-set-21	R$0,00	100	Proposta Cadeia de Valor (0268502)	
Definição dos objetivos estratégicos e elaboração do Mapa Estratégico (BSC adaptado)		CGGI	Concluído	27-abr-21	10-set-21	R$6.300,00	27-abr-21	10-set-21	R$6.300,00	100	Mapa Estratégico 1º Desenho (0273232)	
Elaboração do Painel de Indicadores e Metas		CGGI	Concluído	7-jun-21	14-dez-21	R$0,00	7-jun-21	14-dez-21	R$0,00	100	Planilha Indicadores Estratégicos (0306031)	
Aprovação do Plano Estratégico Institucional no CGRC		CGGI	Concluído	1-dez-21	31-dez-21	R$0,00	1-dez-21	16-dez-21	R$0,00	100	Ata 2ª reunião do Comitê de Governança, Riscos e Controle (SEI 0312845)	
Elaboração do portfólio de projetos estratégicos		CGGI	Concluído	20-abr-22	4-jun-22	R$0,00	20-abr-22				Nota Técnica 168 (0358652) encaminhada ao CGRC	
Elaboração do Sumário executivo do Plano Estratégico Institucional (PEI)		CGGI	Concluído	8-mar-22	15-jun-22	R$0,00	8-mar-22	22-jun-22		80		
Aprovação do CGRC		CGRC	A Iniciar	11-jul-22	11-jul-22	R$0,00						
Divulgação no site da Sudene		ASCOM	A Iniciar	12-jul-22	12-jul-22	R$0,00						
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$21.900,00			**R$17.100,00**	**97,14285714**		

CGGI2022005 - PDA 2022-2024

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Consulta pública acerca das bases de dados da Sudene		OUV	Concluído	25-mai-21	4-jun-21	R$0,00	25-mai-21	4-jun-21	R$0,00	100		
Consolidação do inventário, considerando o inventário do PDA Sudene 2020-2022 e as contribuições recebidas na consulta pública		CGGI	Concluído	17-jan-22	21-jan-22	R$0,00	17-jan-22	21-jan-22	R$0,00	100		
Priorização das bases de dados		Todas as Unidades da Sudene com bases de dados inventariadas	Concluído	24-jan-22	4-fev-22	R$0,00	24-jan-22	4-fev-22	R$0,00	100		
Elaboração do PDA/Sudene 2022-2024		CGGI	Concluído	1-jan-22	11-fev-22	R$0,00	17-jan-22	10-fev-22	R$0,00	100		
Envio do PDA para apreciação do CGD		CGGI	Concluído	14-fev-22	14-fev-22	R$0,00	18-fev-22	18-fev-22	R$0,00	100		
Aprovação do PDA/Sudene 2022-2024		Comitê de Governança Digital (CGD)	Concluído	10-fev-22	28-fev-22	R$0,00	28-fev-22	12-abr-22	R$0,00	100	Aprovado na reunião do Comitê de Governança Digital	
Publicação do PDA/Sudene 2022-2024		ASCOM	Concluído	28-fev-22	28-fev-22	R$0,00	13-abr-22	13-abr-22	R$0,00	100	Plano aprovado em 12/04/2022. Aguardando ASCOM publicar no site	
Capacitação dos responsáveis pelos dados selecionados		CGGP	Cancelado	1-mar-22	31-mar-24	R$0,00	12-abr-22				Plano aprovado. Área responsável deverá iniciar os trabalhos, atentando-se ao prazo	

Publicação e mantenção das bases de dados da Sudene		CGTI e demais unidades responsáveis por bases de dados abertas ou programadas para abertura	Cancelado	1-mar-22	31-mar-24	R$0,00	12-abr-22				Plano aprovado. Área responsável deverá iniciar os trabalhos, atentando-se ao prazo	
Monitoramento e Controle da execução do PDA		Autoridade de Monitoramento e CGGI	Cancelado	1-mar-22	31-mar-24	R$0,00	12-abr-22				Plano aprovado em 12/04. Em monitoramento pela CGGI, Secretária-Executiva do Comitê de Governança Digital	
Abertura da base de dados das diretrizes e prioridades do FNE		CGCP e CGTI	Cancelado	30-set-22	30-set-22	R$0,00						
Publicação de matéria informando a disponibilização da base de dados das diretrizes e prioridades do FNE		ASCOM	Cancelado	31-out-22	31-out-22	R$0,00						
Elaboração do relatório de execução do PDA		Autoridade de Monitoramento e CGGI	Cancelado	1-jan-23	1-mar-23	R$0,00						
Publicação do relatório de execução do PDA		ASCOM	Cancelado	1-mar-23	1-mar-23	R$0,00						
Abertura da base de dados dos planos subregionais		CGCP e CGTI	Cancelado	31-mar-23	31-mar-23	R$0,00						
Publicação de matéria informando a disponibilização da base de dados dos planos subregionais		ASCOM	Cancelado	30-abr-23	30-abr-23	R$0,00						
Abertura da base de dados do RAINT		AUD e CGTI	Cancelado	30-set-23	30-set-23	R$0,00						
Publicação de matéria informando a disponibilização da base de dados do RAINT		ASCOM	Cancelado	31-out-23	31-out-23	R$0,00						
Abertura da base de dados dos TEDs		CGDS e CGTI	Cancelado	29-fev-24	29-fev-24	R$0,00						
Publicação de matéria informando a disponibilização da base de dados dos TEDs		ASCOM	Cancelado	31-mar-24	31-mar-24	R$0,00						
Elaboração do relatório final de execução do PDA		Autoridade de Monitoramento e CGGI	Cancelado	1-jan-24	1-fev-24	R$0,00						
Publicação do relatório final de execução do PDA		ASCOM	Cancelado	1-fev-24	1-fev-24	R$0,00						
Resumo Projeto			Cancelado								Projeto transferido para a CGGI, Secretária-Executiva do Comitê de Governança Digital.	
						R$0,00			**R$0,00**	**100**		

CGGI2022004 - PDA 2020-2022

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Identificação dos pontos focais		CGTI	Concluído	1-ago-19	31-ago-19	R$0,00	1-ago-19	31-ago-19	R$0,00	100		
Reunião de apresentação e divulgação das orientações		CGTI e DAD	Concluído	1-ago-19	31-ago-19	R$0,00	1-ago-19	31-ago-19	R$0,00	100		
Planejamento da coleta, seleção e sistematização dos dados candidatos à abertura		CGGI	Concluído	1-set-19	30-set-19	R$0,00	1-set-19	30-set-19	R$0,00	100		
Inventário de dados da Sudnee		Todas Unidades da Sudene	Concluído	1-set-19	30-set-19	R$0,00	1-set-19	30-set-19	R$0,00	100		
Elaboração do Plano de Dados Abertos da Sudene 2020-2022		CGTI, CGGI, OUV e Autoridade de Monitoramento	Concluído	17-jul-19	4-dez-19	R$0,00	2-ago-19	17-mar-20	R$0,00	100		
Pesquisa de satisfação 2019		OUV	Concluído	1-jan-19	31-dez-19	R$0,00	1-jan-19	31-dez-19	R$0,00	100		
Elaboração de Relatório de Pesquisa de satisfação 2019		OUV	Concluído	31-dez-19	31-dez-19	R$0,00	1-jan-20	31-jan-20	R$0,00	100		
Publicação do relatório de satisfação do usuário 2019		ASCOM	Concluído	31-dez-19	31-dez-19	R$0,00	31-jan-20	31-jan-20	R$0,00	100		
Pesquisa de satisfação 2020		OUV	Concluído	1-jan-20	31-dez-20	R$0,00	1-dez-21	29-jan-22	R$0,00	100		
Elaboração de Relatório de Pesquisa de satisfação 2020		OUV	Concluído	31-dez-20	31-dez-20	R$0,00	29-jan-22	6-abr-22	R$0,00	100	https://www.gov.br/sudene/pt-br/centrais-de-conteudo/sudenepesquisadesatisfacao2021.pdf	
Publicação do relatório de satisfação do usuário 2020		ASCOM	Concluído	31-dez-20	31-dez-20	R$0,00	6-abr-22	6-abr-22	R$0,00	100	https://www.gov.br/sudene/pt-br/centrais-de-conteudo/sudenepesquisadesatisfacao2021.pdf	
Curadoria dos dados		Unidades responsáveis por dados a serem abertos	Concluído	1-mar-20	31-mar-22	R$0,00	1-mar-20	31-mar-22	R$0,00	100		
Abertura da base de dados do FNE		CGDF e CGTI	Concluído	30-jun-20	30-jun-20	R$0,00	13-fev-22	13-fev-22	R$0,00	100		
Publicação de matéria informando a disponibilização da base de dados do FNE		ASCOM	Concluído	30-jun-20	30-jun-20	R$0,00	14-fev-22	4-abr-22	R$0,00	100		
Pesquisa de satisfação 2021		OUV	Concluído	1-jan-21	31-dez-21	R$0,00	1-dez-21	29-jan-22	R$0,00	100		
Elaboração de Relatório de Pesquisa de satisfação 2021		OUV	Concluído	31-dez-21	31-dez-21	R$0,00	29-jan-22	6-abr-22	R$0,00	100	https://www.gov.br/sudene/pt-br/centrais-de-conteudo/sudenepesquisadesatisfacao2021.pdf	
Publicação do relatório de satisfação do usuário 2021		ASCOM	Concluído	31-dez-21	31-dez-21	R$0,00	6-abr-22	6-abr-22	R$0,00	100	https://www.gov.br/sudene/pt-br/centrais-de-conteudo/sudenepesquisadesatisfacao2021.pdf	
Abertura da base de dados de satisfação do usuário		OUV e CGTI	Concluído	30-jun-21	30-jun-21	R$0,00	13-fev-22	13-fev-22	R$0,00	100		
Publicação de matéria informando a disponibilização da base de dados de satisfação do usuário		ASCOM	Concluído	30-jun-21	30-jun-21	R$0,00	14-fev-22	4-abr-22	R$0,00	100		
Consulta pública para priorização das bases a serem abertas		OUV	Concluído	1-jan-21	30-jun-21	R$0,00	13-mai-21	22-jun-21	R$0,00	100		
Elaboralação de relatório de priorização das bases de dados a serem abertas		CGGI	Concluído	30-jun-21	30-jun-21	R$0,00	22-jun-21	22-jun-21	R$0,00	100		
Publicação do relatório de priorização das bases de dados a serem abertas		ASCOM	Concluído	30-jun-21	30-jun-21	R$0,00	22-jun-21	22-jun-21	R$0,00	100		
Relatório de Acompanhamento do PDA/Sudene 2020-2022		CGGI	Concluído	1-jan-21	31-dez-21	R$0,00	19-mar-21	24-dez-21	R$0,00	100		
Aprovação do Relatório de Acompanhamento do PDA/Sudene 2020-2022		Diretoria Colegiada	Concluído	31-dez-21	31-dez-21	R$0,00	29-dez-21	29-dez-21	R$0,00	100		
Publicação do relatório de acompanhamento do PDA		ASCOM	Concluído	31-dez-21	31-dez-21	R$0,00	6-jan-22	6-jan-22	R$0,00	100		
Resumo Projeto			Concluído									
						R$0,00			**R$0,00**	**100**		

CGGI2022003 - Atos Inferiores a Decreto

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Normatização interna da matéria		CGGI	Concluído	28-nov-19	30-nov-20	R$0,00	3-dez-19	9-nov-20	R$0,00	100		
Envio dados à SEME etapa I		CGGI	Concluído	23-nov-20	4-dez-20	R$0,00	30-nov-20	30-nov-20	R$0,00	100		
Consolidação etapa II		CGGI	Concluído	30-nov-20	26-fev-21	R$0,00	2-fev-21	25-fev-21	R$0,00	100		
Envio dados à SEME etapa II		CGGI	Concluído	22-fev-21	5-mar-21	R$0,00	1-mar-21	1-mar-21	R$0,00	100		
Consolidação etapa III		CGGI	Concluído	26-fev-21	31-mai-21	R$0,00	12-abr-21	31-mai-21	R$0,00	100		
Envio dados à SEME etapa III		CGGI	Concluído	24-mai-21	4-jun-21	R$0,00	2-jun-21	2-jun-21	R$0,00	100		

Consolidação etapa I		CGGI	Concluído	9-nov-20	30-nov-20	R$0,00	19-nov-20	30-nov-20	R$0,00	100		
Consolidação etapa IV		CGGI	Concluído	31-mar-21	31-ago-21	R$0,00	30-jun-21	18-ago-21	R$0,00	100		
Envio dados à SEME etapa IV		CGGI	Concluído	23-ago-21	3-set-21	R$0,00	31-ago-21	31-ago-21	R$0,00	100		
Consolidação etapa V		CGGI	Concluído	31-ago-21	31-mar-22	R$0,00	4-out-21	31-mar-22	R$0,00	100		
Envio dados à SEME etapa V		CGGI	Concluído	1-abr-22	8-abr-22	R$0,00	4-abr-22	4-abr-22	R$0,00	100		
Consolidação atos que necessitam de análise mais profunda		CGGI	Em Andamento	1-abr-22	1-ago-22	R$0,00	7-fev-22		R$0,00			
Envio dados à SEME etapa extra		CGGI	A Iniciar	1-ago-22	5-ago-22	R$0,00			R$0,00		Datas ainda não foram divulgadas pela SEME	
Edição de ato com relação de normas vigentes		Superintendente	A Iniciar	1-ago-22	1-set-22	R$0,00						
Divulgação de todos os atos, nos termos do art. 16 do Decreto nº 10.139/2019		ASCOM	A Iniciar	1-abr-22	1-ago-22	R$0,00						
Subitems	**Owner**	**Status**	**Date**	**Item ID (auto generated)**								
				###########								
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$0,00			**R$0,00**	**100**		

CGGI2022001 - Implantação do Sistema de Gestão de Projetos

Name	Descrição	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Início	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Analálise das alternativas disponíveis no mercado		CGTI	Concluído	27-dez-21	31-dez-21	R$0,00	27-dez-21	31-dez-21	R$0,00	100		
Apresentação das alternativas para escolha		CGTI	Concluído	3-jan-22	7-jan-22	R$0,00	3-jan-22	7-jan-22	R$0,00	100		
Criação de protótipo		CGTI/CGGI	Concluído	3-jan-22	7-jan-22	R$0,00	3-jan-22	7-jan-22	R$0,00	100		
Contratação do Monday.com		Camila	Concluído	10-jan-22	31-jan-22	R$25.773,00	10-jan-22	10-fev-22	R$24.380,00	100		
Elaboração Manual do SigSudene		Mauricio	Concluído	1-fev-22	17-fev-22	R$0,00	1-fev-22	17-fev-22	R$0,00	100		
Planejamento do treinamento		Maurício e Camila	Concluído	15-fev-22	18-fev-22	R$0,00	15-fev-22	18-fev-22	R$0,00	100		
Oficina do SIGSudene		Mauricio	Concluído	18-fev-22	18-fev-22	R$0,00	18-fev-22	18-fev-22	R$0,00	100		
Inserção de dados no Sistema		Mauricio e Camila	Concluído	16-fev-22	22-fev-22	R$0,00	16-fev-22	28-fev-22	R$0,00	100		
Consultorias às Unidades		Maurício e Camila	Concluído	21-fev-22	15-mar-22	R$0,00	21-fev-22	15-mar-22	R$0,00	100	Consultorias iniciais foram feitas com foco na disponibilização de dados em 16/03.	
Levantamento de dados para Relatório de Monitoramento 1º Ciclo		Maurício e Camila	Concluído	1-abr-22	7-abr-22	R$0,00	1-abr-22	4-abr-22	R$0,00	100	Foram exportadas as planilhas em 31/03/2022, às 20h45. E os anexos foram concluídos em 04/04/2022.	
Análise das Melhorias do Sistema		Camila	Concluído	5-abr-22	8-abr-22	R$0,00	4-abr-22	8-abr-22	R$0,00	100	Necessidade de normatização do processo de inserção, alteração e monitoramento dos projetos no Sistema SIGSudene	
Implementação de Melhorias		Maurício	Concluído	12-abr-22	15-abr-22	R$0,00	9-abr-22	18-abr-22	R$0,00	100	Foi elaborado novo quadro, para monitoramento de projetos da CGDS/CODEM.	
Levantamento de dados para Relatório de Monitoramento 2º Ciclo		Maurício e Camila	A Iniciar	1-jul-22	7-jul-22	R$0,00						
Análise das Melhorias do Sistema		Camila	Em Andamento	6-jul-22	12-jul-22	R$0,00	25-abr-22				Elaboração de novo painel de monitoramento, com foco nos atrasados.	
Implementação de Melhorias		Maurício	Em Andamento	12-jul-22	15-jul-22	R$0,00	25-abr-22					
Levantamento de dados para Relatório de Monitoramento 3º Ciclo		Maurício e Camila	A Iniciar	3-out-22	7-out-22	R$0,00						
Criar automações de prazo para todas as unidades		Maurício	Concluído	8-mar-22	19-mar-22	R$0,00	15-mar-22	16-mar-22	R$0,00	100		
Levantamento de dados para Relatório de Monitoramento 4º Ciclo		Maurício e Camila	A Iniciar	3-jan-23	10-jan-23	R$0,00						
Resumo Projeto			Em Andamento									
						R$25.773,00			**R$24.380,00**	**100**		

ASCOM - Projetos

ASCOM2022002 - Plano de Comunicação

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Reunião para definir o Plano de Comunicação	Definir o plano de comunicação da Sudene	Agnelo e Anita	Em Andamento	5-jan-22	1-dez-22		5-jan-22					
Criação da Política de Comunicação da Sudene	Regulamentar as diretrizes e ações de comunicação social da Sudene.	Agnelo e Anita	Em Andamento	16-mar-22	30-jun-22		16-mar-22					
Construção da plataforma de marca da Sudene	construir a plataforma de marca da Sudene.	Agnelo e Anita	Em Andamento	11-abr-22	30-set-22		2-mai-22					
Adoção da prática de inbound marketing para a Sudene e criação de propostas de marketing de conteúdo	orientar as ações de marketing da Sudene sob a ótica do Inbound marketing;	Agnelo e Anita	Em Andamento	2-mai-22	31-out-22		1-fev-22					
Produção do Manual do Conselheiro do Condel Sudene	Apresentar, de forma simples, a dinâmica de funcionamento do Condel; fortalecer o marketing institucional	Agnelo e Anita	Atrasado	4-abr-22	16-ago-22							
Hub digital de projetos	potencializar a divulgação dos projetos da Sudene	Agnelo e Anita	Em Andamento	2-jan-22	31-dez-22		2-jan-22					
Reformulação de conteúdo dos instrumentos de ação da Sudene no site institucional	Deixar o conteúdo com linguagem mais simples e atrativa; potencializar o site como melhor referência de conteúdo para estes serviços	Agnelo e Anita	Em Andamento	9-mai-22	31-dez-22							
Criação de vídeo com os destaques da semana da Sudene	potencializar a percepção de valor agregado pelo público às ações da Sudene;	Agnelo e Anita	Em Andamento	7-fev-22	31-dez-22		7-fev-22					
Webinar Sudene	Consolidar a Sudene como referência técnica de conteúdo associado ao desenvolvimento regional;	Agnelo e Anita	Em Andamento	24-mar-22	31-dez-22		10-jun-22					
Série de entrevistas perfis	Estimular nos servidores os sentimentos de coletividade (trabalho em equipe) e pertencimento positivo (orgulho) à instituição;	Agnelo e Anita	Em Andamento	31-mar-22	31-dez-22		25-fev-22					
Boletim semanal "Antene-se"	potencializar o conhecimento pelos servidores sobre as ações de cada unidade da Sudene.	Agnelo e Anita	Em Andamento	4-jul-22	31-dez-22		23-mai-22					
Grupo de whatsApp para notícias internas	facilitar o acesso a notícias de interesse pelos servidores da Sudene.	Agnelo e Anita	Em Andamento	15-ago-22	31-dez-22		12-abr-22					
Criação de banco de imagens e banco de vídeos oficiais da Sudene para profissionais de imprensa	munir a imprensa de material jornalístico (fotos e vídeos) atualizado;	Agnelo e Anita	Em Andamento	16-mar-22	31-dez-22		16-mar-22					
Novo monitor de notícias	acelerar a produção do clipping de notícias diário produzido pela Ascom;	Agnelo e Anita	Concluído	11-abr-22	26-ago-22		11-abr-22					
Encontro do superintendente com rede de jornalistas da Sudene	Prospectar publicações na mídia em geral; fortalecer a percepção de valor da Sudene pelos jornalistas	Agnelo e Anita	Em Andamento	21-fev-22	30-jun-22		21-fev-22					
Criação de briefing de atendimento publicitário	Melhorar a documentação de pedidos de trabalho solicitados à Ascom	Agnelo e Anita	Concluído	1-mar-22	31-mar-22		1-mar-22					
Criação de briefing para organização de eventos	Elaborar a documentação do processo de ciração de peças de comunicação da Sudene	Agnelo e Anita	Em Andamento	18-abr-22	27-mai-22		10-jun-22					
Cartilha de orientação para uso de serviços do contrato de eventos	instruir as unidades da Sudene sobre cláusulas que regem a contratação dos serviços de organização de eventos;	Agnelo e Anita	Atrasado	18-abr-22	27-mai-22		25-mai-22					
Resumo Projeto			Atrasado								Status do Projeto	
						R$0,00			**R$0,00**	**#DIV/0!**		

OUV - Projetos

OUV 2022004 - Pesquisa Satisfação Interna 2022

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento de informações através de questionário		OUV	Concluído	28-mar-22	30-abr-22	0	28-mar-22	30-abr-22		Baixa adesão dos servidores.	Incentivo das chefias imediatas para que os servidores respondam à pesquisa.
Tabular resultados/Emitir Relatório		OUV	Concluído	1-mai-22	7-mai-22	0	1-mai-22	7-mai-22			
Diagramação		CGTI	Concluído	8-mai-22	14-mai-22	0	8-mai-22	14-mai-22			
Confecção da capa		ASCOM	Concluído	15-mai-22	21-mai-22	0	15-mai-22	16-mai-22			
Apresentação na Reunião Estratégica		OUV	Concluído	22-mai-22	28-mai-22	0	17-mai-22	26-mai-22			
Aprovação pela Diretoria Colegiada		DC	Concluído	29-mai-22	4-jun-22	0	26-mai-22	23-jun-22			
Resumo Projeto			Concluído								
						0			**0**		

OUV 2022003 - Pesquisa de Satisfação Externa 2021

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento das Informações		OUV	Concluído	17-dez-21	29-jan-22	0	17-dez-21	29-jan-22			
Redigir Relatório		OUV	Concluído	1-fev-22	28-fev-22	0	1-fev-22	28-fev-22			
Confecção da Capa		ASCOM	Concluído	3-mar-22	4-mar-22	0	3-mar-22	4-mar-22			
Apresentação na Reunião Estratégica		OUV	Concluído	9-mar-22	9-mar-22	0	9-mar-22	9-mar-22			
Aprovação pela Diretoria Colegiada		DC	Concluído	21-mar-22	25-mar-22	0	29-mar-22	29-mar-22			
Resumo Projeto			Concluído								
						0			**0**		

OUV 2022002 - Relatório de Ouvidoria da Sudene 2021

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento de informações no Fala.BR		OUV	Concluído	21-mar-22	31-mar-22	0	21-mar-22	31-mai-22			
Redigir Relatório		OUV	Concluído	4-abr-22	15-abr-22	0	4-abr-22	15-abr-22			
Diagramação		CGTI	Concluído	16-abr-22	30-abr-22	0	16-abr-22	30-abr-22			
Aprovação pela Diretoria Colegiada		DC	Concluído	2-mai-22	6-mai-22	0	2-mai-22	26-mai-22			
Resumo Projeto			Concluído								
						0			**0**		

OUV 2022001 - Relatório de Ouvidoria do FNE 2021

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Levantamento de informações no Fala.BR		OUV	Concluído	25-abr-22	29-abr-22	0	25-abr-22	29-abr-22			
Redigir Relatório		OUV	Concluído	2-mai-22	13-mai-22	0	2-mai-22	13-mai-22			
Diagramação		CGTI	Concluído	16-mai-22	20-mai-22	0	16-mai-22	16-mai-22			
Aprovação pela Diretoria Colegiada		DC	Concluído	23-mai-22	27-mai-22	0	17-mai-22	26-mai-22			
Resumo Projeto			Concluído								
						0			**0**		

TCE (passivo extinta Sudene)

Processos listados no Acórdão nº 1556/2018 TCU-Plenário

TCE do Acórdão TCU nº 1556-2018

Processo Convênio	Processo Sudene (59335)	Convênio	Convenente	Dispensa de Instauração TCE	Análise de Pressupostos	Elaboração de Demonstrativos de Débito	Notificação dos responsáveis	Análise das Manifestações de Defesa	Emissão do Relatório	Status	Previsão Início	Previsão Término	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
59313.000005/2000-60	Processo nº 59335.000049/2010-11	Convênio 400444	Associação dos Engenheiros de Pesca de Pernambuco - AEP/PE	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento	3-jun-22	1-dez-22	50	Relatório em Elaboração	
03057.000017/1996-61	Processo nº 59335.000187/2010-92	Convênio 317590	Governo de Alagoas	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento	3-jun-22	1-dez-22	35	Relatório em Elaboração	
03045.000101/1999-01	Processo nº 59335.000050/2010-38	Convênio 384829	Prefeitura de Campina Grande/PB	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento	3-jun-22	1-dez-22	35	Relatório em Elaboração	
59313.000131/2000-14	Processo nº 59335.000062/2010-62	Convênio 407063	Prefeitura de Buenos Aires/PE	Sim	Em Andamento	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22			Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE
03045.000049/1999-84	Processo nº 59335.000412/2009-57	Convênio 383780	Prefeitura de Tianguá/CE	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22			Carregar no e-TCE
03055.000093/1998-96	Processo nº 59335.000419/2009-79	Convênio 368683	Governo de Alagoas	Sim	Em Andamento	Concluído	Concluído	A Iniciar	Em Andamento	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22	20		Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE
03055.000082/1998-78	Processo nº 59335.000421/2009-48	Convênio 368442	Prefeitura de Croatá/CE	Sim	Em Andamento	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22			Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE
03055.000024/1998-71	Processo nº 59335.000426/2009-71	Convênio 348990	Governo de Alagoas	Sim	Em Andamento	Atrasado	Atrasado	A Iniciar	A Iniciar	Atrasado	7-jun-22	1-dez-22			pendência quanto a análise da prestação de contas enviada pelo convenente, após abertura do processo de TCE
03045.000098/1999-90	Processo nº 59335.000710/2010-80	Convênio 384179	Governo do Piauí	Sim	Em Andamento	Atrasado	Atrasado	A Iniciar	A Iniciar	Atrasado	7-jun-22	1-dez-22			Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE
59313.000085/2000-53	Processo nº 59333.000071/2005-14	Convênio 407141	CEFET RN	Sim	Em Andamento	Atrasado	Atrasado	A Iniciar	A Iniciar	Atrasado	7-jun-22	1-dez-22			Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE
03057.000033/1997-06	Processo nº 59335.000040/2012-64	Convênio 337714	CEFET MA	Sim	Concluído	Atrasado	Atrasado	A Iniciar	A Iniciar	Atrasado	1-set-22	28-fev-23		Ausência de pressupostos válidos para instauração de TCE	Devolver à Unidade Técnica para quantificação das metas não cumpridas
59313.000071/2000-30	Processo nº 59335.000091/2011-05	Convênio 406422	Associação Olindense Dom Vital de Ensino Superior - FOCCA	Sim	Em Andamento	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22			Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE
03054.000042/1997-64	Processo nº 59335.000153/2012-60	Convênio 338364	Governo de Alagoas	Sim	Em Andamento	Atrasado	Atrasado	A Iniciar	A Iniciar	Atrasado	7-jun-22	1-dez-22			Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE. Falta análise financeira
03057.000018/1996-23	Processo nº 59335.000208/2011-50	Convênio 317573	Governo do Ceará	Sim	Em Andamento	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22			Falta Análise dos pressupostos para instauração de TCE
59313.000076/2000-62	Processo nº 59335.000554/2009-14	Convênio 406121	Prefeitura de Boca da Mata/AL	Sim	Em Andamento	Atrasado	Atrasado	A Iniciar	A Iniciar	Atrasado	7-jun-22	1-dez-22			Sem análise financeira
03045.000054/1999-14	Processo nº 59335.000598/2009-44	Convênio 383527	Prefeitura de Gilbués/PI	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Concluído	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22		Relatório TCE 2018-008 emitido. Mas CGU devolveu pois não foi inserido no e-TCE	Já foi notificado.Falta carregar no e-TCE
03045.000085/1999-48	Processo nº 59335.000036/2008-10	Convênio 384007	Chã de Alegria/PE	Sim	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Concluído	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22	90	Relatório TCE 2021-006	Carregar no e-TCE
03045.000094/1999-39	Processo nº 59335.000114/2008-86	Convênio 384176	Governo de Sergipe	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	Concluído	Concluído	Em Andamento			100	Relatório TCE 2018-003	Não necessita Notificação. Comunicar MDR do acórdão TCU
03045.000095/1999-00	Processo nº 59335.000017/2011-99	Convênio 384001	Governo do Ceará	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	Concluído	Concluído	Em Andamento			100	Relatório TCE 2018-001	Não necessita Notificação. Comunicar MDR do acórdão TCU
03045.000097/1999-27	Processo nº 59335.000744/2010-75	Convênio 097/99	Governo do Ceará	Sim	Em Andamento	Concluído	Atrasado	A Iniciar	A Iniciar	Atrasado	3-jun-22	1-dez-22			Falta levantar os endereços dos notificados
03054.000023/1997-10	Processo nº 59335.000721/2010-60	Convênio 326980	ADM&TEC - Instituto de Administração e Tecnologia	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Concluído	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22	90	Relatório TCE 2019-009	Carregar no e-TCE
03054.000053/1997-81	Processo nº 59335.000098/2011-27	Convênio 339198	UNIECO - Centro de Estudos e Pesquisas Ambientais do Nordeste	Sim	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Concluído	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22	90	Relatório TCE 2019-010	Carregar no e-TCE
03055.000023/1998-17	Processo nº 59335.000152/2011-34	Convênio 348985	Governo de Alagoas	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Concluído	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22	90	Relatório TCE 2019-012	Carregar no e-TCE, voto 37: o que houve?
03055.000025/1998-34	Processo nº 59335.000184/2010-59	Convênio 348984	Governo de Alagoas	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Concluído	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22	90	Relatório TCE 2021-009	Carregar no e-TCE
03055.000039/1998-49	Processo nº 59335.000321/2008-31	Convênio 368485	Prefeitura de João Dourado/BA	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Concluído	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22	90	Relatório TCE 2018-004	Carregar no e-TCE
03055.000040/1998-28	Processo nº 59335.000168/2010-66	Convênio 348993	Governo de Alagoas	Sim	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento	4-jun-22	1-dez-22	100	Relatório TCE 2019-001 concluiu que não houve dano ao erário	Encaminhado para Diretoria Colegiada em 08/06/2022 (Proposta de Voto DC 53/2022)
03055.000056/1997-87	Processo nº 59333.000402/2006-16	Convênio 338794	Governo do Piauí	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Concluído	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22	90	Relatório TCE 2021-017	Carregar no e-TCE
03055.000057/1997-40	Processo nº 59335.000157/2012-48	Convênio 338464	Governo da Paraíba	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Concluído	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22	90	Relatório TCE 2019-014	Carregar no e-TCE
03055.000079/1998-63	Processo nº 59335.000087/2012-28	Convênio 368374	Prefeitura de Assaré - CE	Sim	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22	90	Relatório TCE 2018-009 Concluiu que não houve dano ao erário	Aguardar a Ata com o Voto DC 52/2022
03057.000002/1999-36	Processo nº 59335.000544/2009-89	Convênio SIAFI 371426	Fundação Quinteto Violado	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Concluído	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22	90	Relatório TCE 2021-013	Carregar no e-TCE
03057.000004/1997-08	Processo nº 59335.000060/2010-73	Convênio SIAFI 328386	Flexeiras/AL	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Concluído	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22	90	Relatório TCE 2021-008	Carregar no e-TCE
03057.000010/1997-01	Processo nº 59335.000717/2010-00	Convênio 013/97	Governo do Piauí	Sim	Em Andamento	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	A Iniciar	Em Andamento	19-mai-22	19-ago-22			
03057.000034/1997-61	Processo nº 59335.000206/2011-61	Convênio 337783	Escola Técnica Federal do Piauí	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Concluído	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22	90	Relatório TCE 2019-005	Carregar no e-TCE
03057.000045/1997-87	Processo nº 59335.000032/2010-56	Convênio DPS 038/97	Prefeitura de Morro Cabeça no Tempo/PI	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Concluído	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22	90	Relatório TCE 2021-003	Carregar no e-TCE
03057.000016/1998-60	Processo nº 59335.000394/2009-11	Convênio SIAFI 368482	Chã de Alegria/PE	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Concluído	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22	90	Relatório TCE 2021-005	Carregar no e-TCE
59313/000103/2000-05	Processo nº 59335.000550/2009-36	Convênio SIAFI 407080	Escada/PE	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Concluído	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22	90	Relatório TCE 2021-007	Minutas entregues. (não houve remessa ao Gabinete)

Processo Convênio	Processo Sudene (59335)	Convênio	Convenente	Dispensa de Instauração TCE	Análise de Pressupostos	Elaboração de Demonstrativos de Débito	Notificação dos responsáveis	Análise das Manifestações de Defesa	Emissão do Relatório	Status	Previsão Início	Previsão Término	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
59313.000006/2000-12	Processo nº 59335.000005/2012-45	Convênio SIAFI 406129	Centro Nordestino de Medicina Popular-CNMP	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Concluído	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22	90	Relatório TCE 2021-012	Carregar no e-TCE
59313.000015/2000-03	Processo nº 59335.000101/2010-21	Convênio 395799	Prefeitura de Porto de Pedras-AL	Sim	Concluído	Concluído	Concluído	A Iniciar	Concluído	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22	90	Relatório TCE 2018-007	Não há necessidade de notificar. Carregar no e-TCE
59313.000065/2000-82	Processo nº 59335.000063/2010-15	Convênio 406134	IDSTP - Instituto do Desenvolvimento Social e do Trabalho de PE	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Concluído	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22	90	Relatório TCE 2021-016	Carregar no e-TCE
59313.000067/2000-71	Processo nº 59335.000103/2011-00	Convênio 406420	Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Concluído	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22	90	Relatório TCE 2021-014	Carregar no e-TCE
59313.000075/2000-18	Processo nº 59335.000260/2012-98	Convênio 406421	FUBRAS - Fundação Franco-Brasileira de Pesquisa e Desenvolvimento	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Concluído	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22	90	Relatório TCE 2019-004	Carregar no e-TCE
59313.000084/2000-17	Processo nº 59335.000102/2011-57	Convênio CPE 084/00	Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Concluído	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22	90	Relatório TCE 2021-002	Carregar no e-TCE
59313.000095/2000-99	Processo nº 59335.000356/2009-08	Convênio SIAFI 406593	Autarquia Educacional do Araripe - AEDA	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Concluído	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22	90	Relatório TCE 2021-010	Carregar no e-TCE
59313.000098/2000-22	Processo nº 59335.000571/2009-51	Convênio SIAFI 407096	Autarquia Educacional do Araripe - AEDA	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Concluído	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22	90	Relatório TCE 2021-015	Carregar no e-TCE
59313.000107/2000-85	Processo nº 59335.000035/2011-70	Convênio DDS 107/00	Governo de Sergipe	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Concluído	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22	90	Relatório TCE 2021-001	Carregar no e-TCE
59313.000112/2000-98	Processo nº 59335.000209/2011-03	Convênio 406570	Governo de Alagoas	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Concluído	Em Andamento	7-jun-22		90	Relatório TCE 2019-006	Carregar no e-TCE
59313.000114/2000-87	Processo nº 59335.000720/2010-16	Convênio SIAFI 406373	Instituto de Pesquisas Sociais Aplicadas - IPSA	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Concluído	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22	100	Relatório TCE 2021-004	Carregar no e-TCE
59313.000118/2000-65	Processo nº 59335.000707/2010-67	Convênio 406604	Centro de Estudos e Pesquisas Josué de Castro	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Concluído	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22	90	Relatório TCE 2019-013	Carregar no e-TCE
59313.000123/2000-78	Processo nº 59335.000019/2011-88	Convênio 406567	Secretaria de Estado de Ação Social – SEAS/RN (atual SETHAS - Secretaria de Estado do Trabalho, Habitação e Assistência Social)	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Concluído	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22	90	Relatório TCE 2019-011	Carregar no e-TCE
59333.000146/2006-30	Processo nº 59335.000365/2011-66	Convênio SIAFI 580885	Cooperativa dos Artesãos em Couro de Ribeira de Cabaceiras LTDA - ARTEZA	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	A Iniciar	Concluído	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22	90	Relatório TCE 2021-011	Carregar no e-TCE
59335.000172/2010-24	Processo nº 59336.000406/2021-86	Convênio SIAFI 737121	Grupo Gestão Pesquisa, Planejamento e Organização Social	Sim	Concluído	Concluído	Em Andamento	Concluído	Concluído	Em Andamento	7-jun-22	1-dez-22	100	Relatório TCE 2021-018	Encaminhar para ENAC - Equipe Nacional de Cobranças - Diogo já foi acionado
													85,4054054		

TCE (nova Sudene)

Processos recebidos em função do Projeto Água para Todos

TCE nova Sudene						
Processo nº	**Instrumento**	**SIAFI**	**Convenente**	**Estado**	**Dispensa de Instauração TCE**	**Status**
59335.000379/2013-41	Termo de Compromisso 005/2013	677788	Prefeitura de Areia/PB	PB	Não	A Iniciar
59335.000381/2013-11	Termo de Compromisso 003/2013	677832	Prefeitura de Alcantil/PB	PB	Sim	A Iniciar
59335.000385/2013-07	Termo de Compromisso 139/2013	677574	Prefeitura de São José do Peixe/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000386/2013-43	Termo de Compromisso 037/2013	677563	Prefeitura de Picuí/PI	PI	Não	A Iniciar
59335.000387/2013-98	Termo de Compromisso 099/2013	677801	Prefeitura de Alagoinha do Piauí/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000389/2013-87	Termo de Compromisso 148/2013	677746	Prefeitura de Vila Nova do Piauí/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000390/2013-10	Termo de Compromisso 147/2013	677823	Prefeitura de Vera Mendes/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000391/2013-56	Termo de Compromisso 146/2013	677860	Prefeitura de Várzea Grande/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000392/2013-09	Termo de Compromisso 145/2013	677839	Prefeitura de Velança do Piauí/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000394/2013-90	Termo de Compromisso 143/2013	677736	Prefeitura de Simplício Mender/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000395/2013-34	Termo de Compromisso 142/2013	677818	Prefeitura de Simões/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000397/2013-23	Termo de Compromisso 059/2013	677768	refeitura de Santa Maria do Cambucá/P	PE	Não	A Iniciar
59335.000399/2013-12	Termo de Compromisso 058/2013	677855	Prefeitura de Orobó/PE	PE	Não	A Iniciar
59335.000401/2013-53	Termo de Compromisso 052/2013	677796	Prefeitura de Brejão/PE	PE	Não	A Iniciar
59335.000402/2013-06	Termo de Compromisso 054/2013	677787	Prefeitura de Capoeiras/PE	PE	Não	A Iniciar
59335.000403/2013-42	Termo de Compromisso 055/2013	677760	Prefeitura de Casinhas/PE	PE	Não	A Iniciar
59335.000404/2013-97	Termo de Compromisso 056/2013	677773	Prefeitura de Frei Miguelinho/PE	PE	Sim	A Iniciar
59335.000405/2013-31	Termo de Compromisso 045/2013	677783	Prefeitura de Santa Terezinha/PB	PB	Sim	A Iniciar
59335.000408/2013-75	Termo de Compromisso 048/2013	677791	Prefeitura de São José do Sabugi/PB	PB	Sim	A Iniciar
59335.000409/2013-10	Termo de Compromisso 049/2013	677822	Prefeitura de São José dos Ramos/PB	PB	Sim	A Iniciar
59335.000410/2013-44	Termo de Compromisso 050/2013	677824	Prefeitura de Sapé/PB	PB	Não	A Iniciar

Processo nº	Instrumento	SIAFI	Convenente	Estado	Dispensa de Instauração TCE	Status
59335.000411/2013-99	Termo de Compromisso 051/2013	677843	Prefeitura de Bom Jardim/PE	PE	Não	A Iniciar
59335.000412/2013-33	Termo de Compromisso 134/2013	677825	Prefeitura de Santo Inácio do Piauí/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000413/2013-88	Termo de Compromisso 135/2013	677734	Prefeitura de São Félix do Piauí/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000414/2013-22	Termo de Compromisso 136/2013	677792	Prefeitura de São Francisco do Piauí/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000415/2013-77	Termo de Compromisso 137/2013	677789	Prefeitura de São José da Canabrava/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000417/2013-66	Termo de Compromisso 140/2013	677737	Prefeitura de Luís do Piauí/PI	PI	Não	A Iniciar
59335.000418/2013-19	Termo de Compromisso 141/2013	677741	Prefeitura de São Miguel do Fidalgo/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000419/2013-55	Termo de Compromisso 124/2013	677830	Prefeitura de Paquetá/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000420/2013-80	Termo de Compromisso 125/2013	677831	Prefeitura de Patos do Piauí/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000421/2013-24	Termo de Compromisso 126/2013	677856	Prefeitura de Pimenteiras/PI	PI	Não	A Iniciar
59335.000422/2013-79	Termo de Compromisso 127/2013	677805	Prefeitura de Pio IX/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000425/2013-11	Termo de Compromisso 042/2013	677851	Prefeitura de Princesa Isabel/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000426/2013-57	Termo de Compromisso 043/2013	677809	Prefeitura de Queimadas/PB	PB	Não	A Iniciar
59335.000427/2013-00	Termo de Compromisso 044/2013	677753	Prefeitura de Rio Tinto/PB	PB	Não	A Iniciar
59335.000429/2013-91	Termo de Compromisso 035/2013	677817	Prefeitura de Pedra Larada/PB	PB	Sim	A Iniciar
59335.000430/2013-15	Termo de Compromisso 036/2013	677794	Prefeitura de Pedro Régis/PB	PB	Não	A Iniciar
59335.000431/2013-60	Termo de Compromisso 038/2013	677795	Prefeitura de Pilar/PB	PB	Não	A Iniciar
59335.000432/2013-12	Termo de Compromisso 128/2013	677811	Prefeitura de Prata do Piauí/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000433/2013-59	Termo de Compromisso 039/2013	677812	Prefeitura de Pilões/PB	PB	Não	A Iniciar
59335.000434/2013-01	Termo de Compromisso 030/2013	677816	Prefeitura de Matinhas/PB	PB	Sim	A Iniciar
59335.000435/2013-48	Termo de Compromisso 129/2013	677735	Prefeitura de Ribeira do Piauí	PI	Sim	A Iniciar
59335.000436/2013-92	Termo de Compromisso 031/2013	677770	Prefeitura de Mogueiro/PB	PB	Sim	A Iniciar
59335.000437/2013-37	Termo de Compromisso 032/2013	677837	Prefeitura de Monteiro/PB	PB	Não	A Iniciar
59335.000440/2013-51	Termo de Compromisso 026/2013	677739	Prefeitura de Lagoa de Dentro/PB	PB	Não	A Iniciar
59335.000441/2013-03	Termo de Compromisso 130/2013	677826	Prefeitura de Rio Grande do Piauí/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000443/2013-94	Termo de Compromisso 131/2013	677841	Prefeitura de Santa Rosa do Piauí/PI	PI	Sim	A Iniciar

Processo nº	Instrumento	SIAFI	Convenente	Estado	Dispensa de Instauração TCE	Status
59335.000445/2013-83	Termo de Compromisso 029/2013	677806	Prefeitura de Mataraca/PB	PB	Não	A Iniciar
59335.000448/2013-17	Termo de Compromisso 132/2013	677820	Prefeitura de Santana do Piauí/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000449/2013-61	Termo de Compromisso 133/2013	677847	Prefeitura de Santo Antônio de Lisboa/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000450/2013-96	Termo de Compromisso 122/2013	677842	Prefeitura de Novo Oriente do Piauí/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000451/2013-31	Termo de Compromisso 123/2013	677821	Prefeitura de Padre Marcos/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000453/2013-20	Termo de Compromisso 120/2013	677827	Prefeitura de Massapê do Piauí/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000454/2013-74	Termo de Compromisso 019/2013	677810	Prefeitura de Itaporanga/PB	PB	Sim	A Iniciar
59335.000455/2013-19	Termo de Compromisso 121/2013	677854	Prefeitura de Monsenhor Hipólito/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000456/2013-63	Termo de Compromisso 020/2013	677743	Prefeitura de Itapororoca/PB	PB	Não	A Iniciar
59335.000461/2013-76	Termo de Compromisso 015/2013	677834	Prefeitura de Frei Martinho/PB	PB	Não	A Iniciar
59335.000462/2013-11	Termo de Compromisso 113/2013	677752	Prefeitura de Francisco Macedo/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000463/2013-65	Termo de Compromisso 114/2013	677776	Prefeitura de Francisco Santos/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000464/2013-18	Termo de Compromisso 115/2013	677857	Prefeitura de Ipiranga do Piauí/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000465/2013-54	Termo de Compromisso 009/2013	677804	Prefeitura de Borborema/PB	PB	Não	A Iniciar
59335.000466/2013-07	Termo de Compromisso 010/2013	677808	Prefeitura de Cacimba de Dentro/PB	PB	Não	A Iniciar
59335.000467/2013-43	Termo de Compromisso 116/2013	677803	Prefeitura de Isaias Coelho/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000468/2013-98	Termo de Compromisso 011/2013	677782	Prefeitura de Cubati/PB	PB	Sim	A Iniciar
59335.000469/2013-32	Termo de Compromisso 012/2013	677784	Prefeitura de Capim/PB	PB	Sim	A Iniciar
59335.000471/2013-10	Termo de Compromisso 013/2013	677756	Prefeitura de Curral Velho/PB	PB	Não	A Iniciar
59335.000472/2013-56	Termo de Compromisso 014/2013	677845	Prefeitura de Cuitegi/PB	PB	Sim	A Iniciar
59335.000473/2013-09	Termo de Compromisso 118/2013	677819	Prefeitura de Jaicós/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000475/2013-90	Termo de Compromisso 119/2013	677836	Prefeitura de Lagoa do Sítio/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000477/2013-89	Termo de Compromisso 111/2013	677777	Prefeitura de Floresta do Piauí/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000478/2013-23	Termo de Compromisso 006/2013	677848	Prefeitura de Areial/PB	PB	Sim	A Iniciar
59335.000479/2013-78	Termo de Compromisso 101/2013	677798	Prefeitura de Aroazes/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000481/2013-47	Termo de Compromisso 109/2013	677749	Prefeitura de Caridade do Piauí/PI	PI	Não	A Iniciar

Processo nº	Instrumento	SIAFI	Convenente	Estado	Dispensa de Instauração TCE	Status
59335.000482/2013-91	Termo de Compromisso 112/2013	677751	Prefeitura de Francinópolis/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000483/2013-36	Termo de Compromisso 100/2013	677829	Prefeitura de Algrete/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000484/2013-81	Termo de Compromisso 102/2013	677799	Prefeitura de Aroeiras do Itaim/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000485/2013-25	Termo de Compromisso 103/2013	677745	Prefeitura de Belém do Piauí/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000488/2013-69	Termo de Compromisso 106/2013	677740	Prefeitura de Caldeirdão Grande/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000489/2013-11	Termo de Compromisso 107/2013	677769	Prefeitura de Campinas do Piauí/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000490/2013-38	Termo de Compromisso 108/2013	677761	Prefeitura de Campo Alegre do Fidalgo/P	PI	Sim	A Iniciar
59335.000514/2013-59	Termo de Compromisso 149/2013	677778	Prefeitura de João Costa/PI	PI	Sim	A Iniciar
59335.000561/2013-01	Termo de Compromisso 152/2013	677849	Prefeitura de Sertãozinho/PB	PB	Não	A Iniciar
59335.000562/2013-47	Termo de Compromisso 150/2013	677758	Prefeitura de Sossego/PB	PB	Não	

Câmaras Temáticas - Projetos

CT2022001 - Projeto de Desenvolvimento Federativo

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
1. Seleção das áreas de Interesse por Estado (vinculados aos polos em cada Estado)	Foram selecionados 11 Células de Desenvolvimento Federativo (1 para cada Estado da área de atuação da Sudene) com base nos critérios do Ranking IGM/CFA-SUDENE	Superintendente/ DPLAN	Concluído	1-fev-22	28-fev-22	0	1-fev-22	28-fev-22	0	100		
2. Constituição das Células de Desenvolvimento Federativo (CDFs)		Superintendente/ DPLAN	Concluído	30-mar-22	13-jun-22	0	30-mar-22	10-jun-22	0	90		
2.1 Formalização da adesão dos municípios ao Projeto de Desenvolvimento Federativo	Mobilização dos municípios para apresentação do PDF às Prefeituras selecionadas (reuniões, ligações, envio de ofícios, visitas técnicas), Elaboração de Peças de Comunicação (cartilhas, notícias, mídias sociais) Elaboração de Minutas dos Documentos de Formalização e Monitoramento das Assinaturas	Superintendente/ DPLAN	Concluído	30-mar-22	13-jun-22	0	30-mar-22	1-jul-22	0	70	A assinatura será realizada nos eventos de lançamento do Projeto.	
2.2 Elaboração de Diagnóstico Ágil das necessidades e potencialidades de cada CDF	Aplicação de questionário de diagnóstico aos municípios para identificação de desafios e necessidades de capacitação, Levantamento de dados secundários, dados primários e elaboração de Diagnósticos das CDFs	CGEP/CGCP	Concluído	5-abr-22	27-mai-22	0	5-abr-22	1-jun-22	0	100	Entrevistas concluídas com as prefeituras do PDF. Identificação do perfil municipal em andamento.	
3. Integração das ações da Rede de Atores para as CDF		DPLAN	Concluído	5-abr-22	13-jun-22	0	5-abr-22	1-jul-22	0	60	Esta etapa será finalizada junto com a etapa 3.3.2 (é necessário corrigir a data de conclusão).	
3.1 Articulação com os Atores parceiros e apresentação do Projeto	Realização de Reuniões técnicas de aproximação e da Reunião de Integração Sistêmica da Rede, elaboração de documentos de formalização e apreciação de planos de trabalho	CGCP	Concluído	5-abr-22	13-mai-22	0	5-abr-22	12-mai-22	0	80		
3.2 Formalização da adesão dos Atores ao Projeto de Desenvolvimento Federativo	Apreciação dos documentos de formalização pela Gestão e Monitoramento das assinaturas	CGCP	Concluído	6-mai-22	13-jun-22	0	3-mai-22	1-jul-22	0	50	Minutas de ACTs encaminhadas aos Parceiros. Estão em análise por parte dos parceiros para assinatura no evento de lançamento.	
3.3. Estabelecimento da Força Tarefa (FT) de apoio a cada CDF	Mapeamento das ações direcionadas ao PDF por cada Ator e Compatibilização das ações da rede de atores com as necessidades das CDF	DPLAN	Em Andamento	13-jun-22	15-jul-22	0	6-jun-22		0	20		
3.3.1. Elaboração dos Planos de ação	Validação da compatibilização com a Rede de Desenvolvimento Federativo, reuniões técnicas de alinhamento e entrevistas com os Gestores Municipais e elaboração do Plano de Ação preliminar	DPLAN	Em Andamento	13-jun-22	4-jul-22	0			0	0		
3.3.2 Reuniões de Alinhamento da Força-Tarefa (FT) de cada CDF composta pelos Atores mapeados e a CDF correspondente	Realização de oficinas de trabalho para estabelecimento de cronograma de ações e compromissos das FTs para Validação dos Planos de Ação	DPLAN	Em Andamento	4-jul-22	15-jul-22	0			0	0		
4. Eventos de lançamento do Projeto de Desenvolvimento Federativo nas CDFs	Realização dos Eventos de Lançamento; Feiras de Produtos; Workshops com apresentação dos integrantes.	Superintendente/ DPLAN	A Iniciar	18-jul-22	19-ago-22	0			0	0		
5. Ações de monitoramento da execução dos Planos de Ação e das Forças Tarefas	Realização de reuniões técnicas de acompanhamento das FT, visitas técnicas e ajustes nos Planos de Ação	DPLAN	A Iniciar	20-ago-22	30-dez-22	0			0	0		
Resumo Projeto			Em Andamento									
						0			**0**	**47,5**		

CT2022002 - Bioinsumos Edital

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
Abertura de processo, constituição de Equipe Técnica para construção de Edital para Chamada Pública	Constituição de Equipe Técnica DPLAN	DPLAN	Concluído		28-jan-22		12-jan-22	28-jan-22		100	Dúvidas relativas à forma de utilização dos recursos relativos ao 1,5%, Fundo de PD&I formado à partir dos recursos do FDNE	Nota técnica jurídica solicitada à Procuradoria da Sudene
Confecção do Edital de Chamamento Publico para Seleção de OSC	Confecção do Edital	CGDS e Equipe Técnica designada	Concluído		25-fev-22		29-jan-22	25-fev-22		100		
Aprovação do Edital	Aprovação do Edital	CGDS, DPLAN	Concluído		4-mar-22		3-mar-22	4-mar-22		100		
Publicação no site da Sudene	Publicação do Edital	GAB, ASCOM	Concluído		4-mar-22		3-mar-22	3-mar-22		100		
Edital Publicado, Acompanhamento do Edital, Recepção de Propostas na Plataforma +Brasil	Acompanhamento do Edital	CGDS e Equipe Técnica designada	Concluído		12-abr-22		3-mar-22	12-abr-22		100	Dúvidas de diversas Organizações da Sociedade Civil sobre o Edital	Respostas realizadas por e-mail, Nota técnica da Procuradoria Jurídica sobre dúvida do Edital
Análise das propostas cadastradas e enviadas através da Plataforma	Análise da propostas enviadas	CGDS e Equipe Técnica designada	Em Andamento		6-mai-23		13-abr-22			80		Constituição de Equipe técnica externa à Sudene e à CGDS para análise técnica das propostas enviadas, em acordo com o Edital 001
Seleção das OSCs para realização do Termo de Fomento	Seleção de OSC para Termos de Fomento	CGDS, DPLAN, GAB	Atrasado		30-mai-22							
Confecção do Termo de Fomento	Confecção do Termo de Fomento	DPLAN	Atrasado		30-jun-22							
Celebração do Termo de Fomento com as OSC selecionadas	Celebração do Termo de Fomento	DPLAN, GAB	A Iniciar		30-jul-22							
Encerramento do processo seletivo relativo do Edital 01/2022	Encerramento da seleção	CGDS, DPLAN	A Iniciar		15-ago-22							
Resumo Projeto			Atrasado									
						0			**0**	**96,66666667**		

CT2022003 - Delimitação do Semiárido - acompanhamento das argumentações técnicas

Name	Descrição das Atividades/ Etapas	Responsável	Status	Previsão Início	Previsão Término	Valor Previsto	Inicio	Data de Conclusão	Valor Realizado	Progresso	Observações/Problemas	Ações Corretivas
1.1 Resolução Condel nº 150 /2021.	Providências e publicação da Resolução Condel nº 150, de 13/12/2021, (DOU de 30/12/2021), aprovando a Proposição nº 151/2021 com o relatório sobre o resultado dos trabalhos da nova delimitação de 2021 e, de acordo com o art. 2º, abriu a possibilidade de apresentação de recursos até 28/02/2022, pelos estados que tiveram municípios excluídos dessa subregião e dá outras providências. (Proc. 59336.000463/2020-34)	ASCOM, GAB/Sudene e GAB/MDR	Concluído	16-dez-21	18-dez-21		25-nov-21	30-dez-21		100		
1.2 Resolução do Condel nº 155/2022.	Providências e publicação da Resolução ad referendum Condel nº 155, de 29/04/2022, (DOU 02/05/2022), estabelecendo novo prazo até 01/08/2022 para apresentação de argumentações técnicas e até 30/11/2022 para a elaboração de relatório conclusivo sobre a análise das argumentações técnicas apresentadas como irresignação à exclusão de municípios do semiárido conforme relatório de 2021, bem como, a criação de Comitê Técnico Provisório com prazo até 02/06/2022 para apresentação de indicações pelos Conselheiros do Condel. (Proc. 59336.000583/2022-43)	ASCOM, GAB/Sudene e GAB/MDR	Concluído	22-fev-22	31-mar-22		22-fev-22	2-mai-22		100		

2.1 Apresentação de recursos conforme Resolução Condel nº 150/2021	Prazo até 28/02/2022 para apresentação de recursos como irresignação à exclusão de municípios tratados pelo relatório da delimitação aprovado pela Resolução Condel nº 150/2021.	GAB/Sudene	Concluído	31-dez-21	28-fev-22		31-dez-21	28-fev-22		100	Durante o transcurso dos 60 dias contados da data da publicação da Resolução 150/2021 (DOU de 30/12/2021) até o término do prazo (28/02/2022), apenas o Governo do Estado de Minas Gerais na data de 25/02/2022 apresentou recurso, porém o Parecer Técnico Sudene 112 (SEI 0345281) negou provimento por falta de elementos técnicos suficientes (Proc. 59336.000592/2022-34).	
2.2 Análise da Sudene, conforme Resolução nº150	Análise dos recursos, a ser realizada por equipe da Sudene	Sudene	Concluído	31-dez-21	29-abr-22		31-dez-21	29-abr-22		100	Foram apresentadas informações/manifestações técnicas (Formulários de informações do desastre) pela Secretaria de Agricultura do Município de Palmerina/PE conforme e-mail de 07/03/2022 (Proc. 59336.000656/2022-05), e pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil do Estado de Alagoas, que encaminhou o ofício E:31/2022/CEDEC, de 04/03/2022,tendo como anexo o relatório da delimitação aprovado pela Sudene em 2021, não se constituindo uma manifestação técnica de refutação de resultado em que pese a intenção demonstrada pelo signatário. No mais, foram recebidos vários pedidos de reinserção de municípios ou acréscimo de prazo para apresentação de recurso.	
3.1 Apresentação de argumentações técnicas conforme Resolução Condel nº 155/2022	A Resolução Condel nº 155/2022 aprovou, por meio da Proposição nº 157/2022, a criação de comitê técnico para análise de argumentos técnicos apresentados com vistas a eventual revisão de decisão adotada pela Resolução Condel nº 150/2021 e estabeleceu o prazo até 01/08/2022 para apresentação de argumentações técvnicas interpostas em defesa da parmanência de municípios excluídos do semiárido.	Conselheiros do Condel	Em Andamento	2-mai-22	1-ago-22		2-mai-22			1	Em 02/05 foram iniciados os trabalhos para organização do processo. As argumentações técnicas sob a orientação da nova Resolução Condel nº 155/2022 ainda estão sendo aguardadas.	
3.2 Criação de Comitê Técnico Provisório para análise das argumentações técnicos	Publicada a Resolução nº 155 que aprovou a criação de comitê tecnico para análise de argumentos técnicos apresentados com vistas a eventual revisão de decisão adotada pela Resolução Condel nº 150/2021	GAB/Sudene	Concluído	2-mai-22	2-mai-22		2-mai-22	2-mai-22		100	Comitê criado pela resolução Condel nº 155, de 29/04/2022 (DOU 02/05/2022)	
3.3 1ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório	Realização da 1ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório, inclusive elaboração de ata.	Comitê Técnico Provisório	A Iniciar	9-ago-22	31-ago-22					0	Conforme Art. 2º § 3, da Resolução nº155: As reuniões ordinárias do Comitê Técnico Provisório deverão ocorrer mensalmente, em datas a serem estabelecidas pela Sudene.	
3.4 2ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório	Realização da 2ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório, inclusive elaboração de ata.	Comitê Técnico Provisório	A Iniciar	1-set-22	30-set-22					0	Conforme Art. 2º § 3, da Resolução nº155: As reuniões ordinárias do Comitê Técnico Provisório deverão ocorrer mensalmente, em datas a serem estabelecidas pela Sudene.	
3.5 3ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório	Realização da 3ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório, inclusive elaboração de ata.	Comitê Técnico Provisório	A Iniciar	3-out-22	31-out-22					0	Conforme Art. 2º § 3, da Resolução nº155: As reuniões ordinárias do Comitê Técnico Provisório deverão ocorrer mensalmente, em datas a serem estabelecidas pela Sudene.	
3.6 4ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório	Realização da 4ª Reunião ordinária do Comitê Técnico Provisório, inclusive elaboração de ata.	Comitê Técnico Provisório	A Iniciar	3-nov-22	29-nov-22					0	Conforme Art. 2º § 3, da Resolução nº155: As reuniões ordinárias do Comitê Técnico Provisório deverão ocorrer mensalmente, em datas a serem estabelecidas pela Sudene.	
3.7 Elaboração do Relatório Conclusivo	Elaboração do Relatório Conclusivo	Comitê Técnico Provisório	A Iniciar	9-ago-22	30-nov-22					0		
4.1 Apreciação do assunto pelo Comitê Técnico do Condel;	Apreciação do assunto pelo Comitê Técnico do Condel;	GAB/Sudene	A Iniciar	1-dez-22	15-dez-22					0		
4.2 Apreciação e deliberação pelo Condel	Apreciação e deliberação pelo Condel	Condel	A Iniciar	1-dez-22	15-dez-22					0		
4.3 Publicação da Resolução do Condel no DOU e envio de comunicação ao Senado, à Câmara dos Deputados, aos Governadores dos Estados e demais membros do Condel.	Publicação da Resolução aprovada pelo Condel	ASCOM e GAB/Sudene	A Iniciar	15-dez-22	20-dez-22					0		
4.4 Publicação dos resultados	Publicação dos resultados no site da Sudene via ASCOM.	ASCOM e GAB/Sudene	A Iniciar	15-dez-22	20-dez-22					0		
Resumo Projeto			Em Andamento									

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE
ORÇAMENTO 2022 - POSIÇÃO ATÉ 30/06/2022

ESPECIFICAÇÃO	LOA 2021 (a)	%	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS/CANCELAMENTOS/BLOQUEIOS (b)	ORÇAMENTO ATUALIZADO c = (a + b)	VALOR EMPENHADO/ DESCENTRALIZADO (d)	%	VALOR PAGO/REPASSADO (e)	SALDO ORÇAMENTÁRIO f = (c - d)
1) AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO - RP 2	**10.934.024,00**	**44,92**	**0,00**	**10.934.024,00**	**5.656.001,99**	**95,13**	**2.810.622,79**	**5.278.022,01**
Administração (Custeio Administrativo) - 2000/0001- PO 0000	10.537.799,00	43,29	0,00	10.537.799,00	5.540.181,09	93,18	2.721.855,89	4.997.617,91
Capacitação de Servidores - 2000/0001 - PO 0001	204.000,00	0,84	0,00	204.000,00	33.540,00	0,56	15.186,00	170.460,00
Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - 216H/0001	192.225,00	0,79	0,00	192.225,00	82.280,90	1,38	73.580,90	109.944,10
2) AÇÕES FINALÍSTICAS SUDENE - RP 2	**6.835.948,00**	**28,08**	**0,00**	**6.835.948,00**	**254.000,00**	**4,27**	**0,00**	**6.581.948,00**
Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - 8340/0001	***2.491.496,00***	***10,24***	***468.890,00***	**2.960.386,00**	***254.000,00***	**4,27**	***0,00***	***2.706.386,00***
Desenvolvimento da Rede Regional de Inovação - Despesas Diversas - 8340/0020 - PO 0000	1.000.000,00		468.890,00	1.468.890,00	254.000,00		0,00	1.214.890,00
Apoio a Estudos de Tecnologia e Inovação - 8340/0001 - PO 0001	1.491.496,00		0,00	1.491.496,00	0,00		0,00	1.491.496,00
Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial - 20WQ.0001	***2.344.452,00***	***9,63***	***-468.890,00***	***1.875.562,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**1.875.562,00**
Elaboração de Estudos e Planos de Desenvolvimento Regional e Territorial - 20WQ/0001 - PO 0004	500.000,00		0,00	500.000,00	0,00		0,00	500.000,00
Estudos Estratégicos - 20WQ/0001 - PO 0007	500.000,00		-468.890,00	31.110,00	0,00		0,00	31.110,00
Monitoramento e Avaliação de Instrumentos e Mecanismos de Desenvolvimento Regional - 20WQ/0001 - PO 0008	1.344.452,00		0,00	1.344.452,00	0,00		0,00	1.344.452,00
Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S/0001	***1.000.000,00***	***4,11***	***0,00***	***1.000.000,00***	***0,00***	**0,00**	***0,00***	***1.000.000,00***
Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - 214S/0001 - PO 0000	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00	0,00		0,00	1.000.000,00
Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade - 4640/0001	***500.000,00***	***2,05***	***0,00***	***500.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***500.000,00***
Capacitação de Recursos Humanos para a Competitividade - 4640/0001 - PO 0000	500.000,00		0,00	500.000,00	0,00		0,00	500.000,00
Fortalecimento das Administrações Locais - Região Nordeste - 8917/0001	***500.000,00***	***2,05***	***0,00***	***500.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***500.000,00***
Fortalecimento das Administrações Locais - Despesas Diversas - 8917/0001 - PO 0000	500.000,00		0,00	500.000,00	0,00		0,00	500.000,00
3) EMENDAS PARLAMENTARES - RP 7	**6.570.891,00**	**27,00**	**-4.386.891,00**	**2.184.000,00**	**35.842,00**	**0,60**	**35.842,00**	**2.148.158,00**
Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado	**6.570.891,00**	***27,00***	***-4.386.891,00***	***2.184.000,00***	***35.842,00***	**0,60**	***35.842,00***	***2.148.158,00***
Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - (PTRES 212048) - Aquisição de Máquina (RP 7)	4.386.891,00		-4.386.891,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Ação 00SX - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado - (PTRES 212049) - Aquisição de Máquina (RP 7)	2.184.000,00		0,00	2.184.000,00	35.842,00		35.842,00	2.148.158,00
TOTAL	**24.340.863,00**	**100,00**	**-4.386.891,00**	**19.953.972,00**	**5.945.843,99**	**100,00**	**2.846.464,79**	**14.008.128,01**

PO = Plano Orçamentário

Anexo IV - Indicadores do Planejamento Estratégico Institucional

#	Objetivo estratégico impactado	Nome do indicador	Meta 2022	Apuração 2º trimestre de 2022	Observações
1	**Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação**	Percentual de desembolso do 1,5% FDNE em relação ao valor planejado para o exercício	60%	0%	Informação referente ao período abr-jun/2022, No que tange aos ACTs com entidades de amparo à pesquisa, os editais foram lançados mas seguem agenda da FINEP, que prevê a chamada dos projetos Sudene a partir do início de 2023 com referência ao orçamento 2020 na forma de subvenção econômica. Quanto aos desembolsos referentes aos orçamentos de 2021 e 2022, os recursos serão aportados para os projetos de bioinsumos tão logo as propostas de projetos sejam selecionadas e os escolhidos venham a celebrar as avenças aprovadas pela Diretoria.
		Percentual de recursos do FNE para Inovação	2,14%	4,59%	-
		Percentual de recursos do FNE para empresas PMEs	53%	51,01%	-
2	**Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional**	Percentual de Contratação dos instrumentos conforme áreas prioritárias definidas pelo CONDEL (FDNE)	75,00%	100%	-
		Número de Planos de desenvolvimento territorial elaborados ou revisados	1	0	O Plano de Ação Estratégica para o desenvolvimento das Bacias Hidrográficas do Rio Parnaíba, São Francisco e área de influência do PISF e o Plano de Desenvolvimento de Maracanaú/CE estão em elaboração.
		Número de eventos para articulação de atores em torno da revisão e implementação do PRDNE realizados	2	1	Reunião organizada pelo MDR com as três Superintendências nos dias 21 e 22 de junho. Próxima reunião prevista para o dia 07 de julho às 15h.
		Número de parcerias estratégicas com órgãos/entidades	57	136	Foram articuladas: 1) 52 parcerias com as prefeituras do G52; 2) 18 parcerias com as seguintes instituições: BNB, CAIXA, SEBRAE, MAPA, MDR, ABDI, ONU HABITAT, INSA,

					MCOM, DNOCS, SEAF/SEGOV/PR, ENAP, PNUD, Consórcio Intermunicipal do Norte de Minas Gerais, CINEP, Prefeitura de Guarabira/PB, Prefeitura de Feira de Santana/BA, Prefeitura de Maracanaú/CE. 3) Parceria com 66 municípios que fazem parte do Projeto de Desenvolvimento Federativo.
3	**Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região**	Número de Avaliações realizadas no ano	11	4	-
		Média da avaliação de satisfação dos usuários da Sudene	100%	89,96%	A taxa de satisfação dos usuários foi calculada pela média da avaliação dos seguintes serviços: Dados Abertos, Convênios, FDNE e Incentivos Fiscais.
		Número de pesquisa de satisfação realizadas	2	2	No primeiro trimestre de 2022 foi realizada 1 (uma) pesquisa de satisfação relativa aos serviços prestados pela Sudene referente ao exercício de 2021.
4	**Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE**	Percentual das metas do PRDNE monitoradas	40%	0%	O Projeto de Lei nº 6163/2019, que tem por objetivo a instituição do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE), ainda não foi aprovado no Congresso Nacional, ficando o monitoramento das metas do PRDNE prejudicado. A base de cálculo será alterada para representar apenas as metas para as quais a Sudene execute diretamente ações, uma vez que não se pode exigir ação de outros entes/instituições sem o Plano convertido em lei.
		Número de consultas públicas realizadas com atores regionais para atualização do PRDNE	1	0	Haverá alteração do indicador para melhor representar as ações realizadas para atualização do PRDNE.
		Número de municípios-polo beneficiários dos projetos estratégicos alinhados com as diretrizes, programas e projetos do PRDNE	1	52	Os municípios integrantes do G52 estão sendo beneficiados por diversos projetos da Sudene em execução.
		Número de estudos e pesquisas realizados no ano	2	10	
5	**Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação**	Número de servidores municipais e estaduais capacitados em cursos voltados para melhoria da gestão pública	500	762	As capacitações em saúde digital foram iniciadas em dezembro/2021. No primeiro trimestre apresentou um número de 256 capacitados. No segundo trimestre, apresentou

					mais 506 capacitados, totalizando 762 capacitados.
		Número de projetos executados com recursos da Sudene para melhoria da gestão pública dos entes subnacionais	1	0	O projeto teve a sua execução iniciada em 2021, encontrando-se com um percentual de execução de, aproximadamente, 80%.
6	**Consolidar o Condel como órgão superior de articulação e decisões estratégicas**	Percentual de realização das reuniões do Condel programadas	50%	0%	Ainda não foi realizada reunião do Condel no exercício de 2022, apesar dos esforços da Sudene, porém ocorreu 1 reunião do Comitê Técnico em 24/03/2022, que decidiu por deliberar a pauta programada para a reunião do Condel de forma ad referendum.
		Quantidade de reuniões realizadas dos comitês vinculados ao Condel	1	1	Reunião do Comitê de Acompanhamento do FNE realizada em 02/02/2022.
		Percentual de participação dos membros nas reuniões do Condel	66,67%	0%	Ainda não foi realizada reunião do Condel no exercício de 2022, apesar dos esforços da Sudene, porém ocorreu 1 reunião do Comitê Técnico em 24/03/2022, que decidiu por deliberar a pauta programada para a reunião do Condel de forma ad referendum.
7	**Aprimorar a gestão de processos**	Taxa de Processos Críticos Mapeados	5,7%	0%	2 processos com mapeamentos em andamento, com previsão de conclusão no 3º e 4º trimestre de 2022.
		Tempo médio para contratação de operações com recursos do FDNE	352	180	-
		Tempo médio para conclusão dos processos de concessão de incentivos fiscais	57	67,5	
8	**Otimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais**	Índice Integrado de Governança e Gestão Pública	48%	-	Resultado do IGG TCU ainda não foi divulgado.
		Número de realização das reuniões estratégicas do Comitê de Governança, Riscos e Controles	4	1	3ª Reunião Ordinária do CGRC realizada em 20/04/2022.
9	**Monitorar índices socioeconômicos da região**	Percentual de indicadores monitorados	100%	100%	100% dos indicadores elencados, de responsabilidade da CGEP, estão sendo monitorados para a apuração dos valores atualizados.
10	**Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas**	Taxa de Execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas	Aumentar em 5% o resultado do ano anterior	19%	-

	alinhado às estratégias organizacionais	Percentual de servidores capacitados	Realizar 01 avaliação de lacunas de competência	-	Ações para realizar a avaliação de lacunas de competência previstas para iniciar.
		Taxa de Satisfação com as ações de desenvolvimento	90%	88%	-
11	**Promover a qualidade de vida no trabalho**	Taxa de execução do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	Elaborar 01 Programa de QVT	-	Ações para elaborar o programa de qualidade de vida no trabalho iniciado, encontrando-se com um percentual de execução de, aproximadamente, 20%.
		Índice de qualidade de vida no trabalho	Elaborar e executar 01 Pesquisa de QVT	-	Ações para elaborar e executar a pesquisa de qualidade de vida no trabalho estão previstas para iniciar.
		Índice de clima organizacional	Elaborar e executar 01 Pesquisa de Clima Organizacional	-	Ações para elaborar e executar a pesquisa de clima organizacional estão previstas para iniciar.
12	**Modernizar e integrar os sistemas de informação**	Percentual de soluções de TIC implantadas e/ou modernizadas.	80%	50%	Dos 12 (doze) projetos do PDTIC previstos para serem executados ainda em 2022, 6 (seis) soluções de TIC foram implantadas no acumulado dos dois primeiros trimestres.
13	**Otimizar a captação e a utilização de recursos orçamentários**	Taxa de Recursos Adicionais	10%	27%	-
		Taxa de Execução de Recursos Adicionais	100%	0%	-
14	**Aprimorar a gestão orçamentária, de forma integrada ao planejamento estratégico**	Taxa de Alocação do Orçamento Estratégico	50%	55,08%	-
		Taxa de Execução Orçamentária com Ações Estratégicas	100%	0%	-

Anexo V - Indicadores da Metodologia de Monitoramento e Controle da Programação

#	Objetivo estratégico impactado	Nome do indicador	Meta 2022	Apuração 2º trimestre de 2022	Observações
1	**Indicadores de Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)**	Capacidade de Análise de Consultas-Prévias do FDNE (CACP)	100%	100%	-
		Produtividade da Análise de Consultas Prévias do FDNE (PACP)	quanto maior, melhor	5,5 análises por técnico	-
		Inconsistência das Consultas Prévias Apresentadas ao FDNE (CCPA)	quanto menor, melhor	59%	-
		Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco do Nordeste do Brasil (TAP-BNB)	≤ 1	0	Não foram apresentados projetos ao BNB.
		Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco do Brasil (TAP-BB)	≤ 1	0,37	-
		Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pela Caixa Econômica Federal (TAP-CEF)	≤ 1	0	Não foram apresentados projetos à CEF.
		Tempo Médio de Análise de Projetos do FDNE pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (TAP-BDMG)	≤ 1	0	Não foram apresentados projetos ao BDMG.
		Inconsistências dos Projetos do FDNE Apresentados ao Banco do Nordeste do Brasil (IPA-BNB)	quanto menor, melhor	0%	Não foram apresentados projetos ao BNB.
		Inconsistências dos Projetos do FDNE Apresentados ao Banco do Brasil (IPA-BB)	quanto menor, melhor	0%	Não foram apresentadas inconsistências nos projetos apresentados ao BB.
		Inconsistências dos Projetos do FDNE Apresentados à Caixa Econômica Federal (IPA-CEF)	quanto menor, melhor	0%	Não foram apresentados projetos à CEF.
		Inconsistências dos Projetos do FDNE Apresentados ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (IPA-BDMG)	quanto menor, melhor	0%	Não foram apresentados projetos ao BDMG.
		Execução Orçamentária do FDNE (EORÇ-FDNE)	100%	0,43%	-
		Execução Financeira do FDNE (EFIN-FDNE)	100%	6,24%	Os recursos são empenhados pelo valor total do projeto, enquanto as liberações obedecem ao cronograma de execução, que normalmente se estende por mais de um exercício.

		Tempo Médio para Aprovação dos Projetos do FDNE pela Diretoria Colegiada após aprovação pelos Bancos Operadores (TDDC-FDNE)	< 1 (quanto menor, melhor)	0,67	-
		Tempo Médio decorrido entre o Protocolo da Consulta Prévia aprovada e a aprovação do financiamento do Projeto pela Diretoria Colegiada da SUDENE (TMCP-FDNE)	≤ 240 (quanto menor, melhor)	174,50	-
		Índice de Aprovação de Financiamentos do FDNE pela Diretoria Colegiada no Exercício (IAF-FDNE)	1 (quanto mais próximo de 1, melhor)	1	-
2	**Indicadores de Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros**	Tempo Médio de Espera para a realização da vistoria (TEDV–IF)	quanto menor, melhor	73,1 dias	O presente período de contou com vistorias remotas e presenciais. O prazo médio de 73,1 dias para a vistoria poderia ter sido menor, não fosse a demora de 32 dias, em média, para que as empresas encaminhassem os vídeos e a documentação solicitada. Mesmo assim, das 79 vistorias 17 foram feitas com prazo inferior a 30 dias.
		Grau de indeferimento de Pleitos de Incentivos Fiscais (IPIF_UF-IF)	quanto menor, melhor	0%	-
		Desempenho da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais (APIF-IF)	quanto maior, melhor	57,1%	No período, foram concluídas 121 análises de pleitos de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros.
		Tempo Médio de Espera para a conclusão da análise dos pleitos de incentivos fiscais (TMEA-IF)	quanto menor, melhor	74,1 dias	-
		Produtividade da Análise de Pleitos de Incentivos Fiscais no exercício (PAPI-IF)	quanto maior, melhor	8,6 análises por técnico	-
		Produtividade das Fiscalizações de Pleitos de Incentivos Fiscais (PFPI-IF)	quanto maior, melhor	11,3 vistorias por equipe	-
3	**Indicadores de Gestão de Convênios**	Capacidade de Análise de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (CAPC)	100%	100%	Os pleitos protocolados referem-se às propostas de convênios válidos, encaminhadas para análise técnica.
		Consistência dos Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação Apresentados no exercício (CPCA)	100%	0%	Houve protocolo e análise de todos os pleitos no período, todavia nenhum deles ainda não adquiriu condições para aprovação final.
		Grau de indeferimento de Pleitos de Convênios e Termos de Cooperação (IIC)	0%	50%	Houve protocolo e análise de pleitos no período, todavia quatro deles ainda não

					adquiriram condições para conclusão quanto à aprovação ou indeferimento, dispondo ainda seus proponentes de prazo para a complementação das propostas. Por outro lado, quatro pleitos indicados referem-se a propostas que não foram selecionadas no processo seletivo do Edital de Bioinsumos para dar continuidade ao processo de análise visando a formalização.
		Desempenho das Fiscalizações dos convênios e Termos de Cooperação (DFCON)	100%	84,3%	Foram realizadas 43 visitas de campo (fiscalizações). Das 51 visitas programadas, 08 não foram realizadas, em virtude da impossibilidade de compatibilização da agenda do técnico e disponibilidade do convenente, todavia já se encontram em programação específica.
		Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Convênios (TMTP) Conv	quanto menor, melhor	0	Não foi possível fazer essa aferição, uma vez que não houve pleitos aprovados.
		Tempo Médio de Tramitação dos Pleitos Ingressados no Exercício para fins de celebração de Termos de Cooperação (TMTP)	quanto menor, melhor	0	Entre os meses de janeiro a junho de 2022 não foram recebidos ou realizados pleitos de celebração de termos de cooperação.
4	**Indicadores de Gestão de Pessoas**	Grau de Capacitação de Servidores no Exercício (CSE)	100%	80%	De janeiro a junho de 2022, considerando as capacitações de curta duração concluídas e as pós graduações em andamento, foram capacitados 44 servidores diferentes.
		Desempenho da Capacitação no exercício (DCE)	100%	50%	Considerando os eventos de curta duração concluídos e os cursos de pós graduação em andamento, foram promovidos 52 eventos de capacitação.
		Nível de Investimento em Capacitação (NIC)	100%	7,6%	O valor informado refere-se aos valores gastos com inscrição e mensalidades. A maioria dos cursos promovidos até o momento foram realizados de maneira gratuita junto a Enap.
5	**Indicadores de Gestão da Comunicação Social e Marketing Institucional**	Acesso de usuários ao site da Sudene (AU - site)	-	8.980	Desde a migração para o portal Gov.br, foi percebido um novo comportamento do usuário, com menos acessos ao site institucional. Durante o ciclo, a equipe manteve o site como principal plataforma de detalhamento de conteúdo, priorizando a divulgação de links

				diretos para o portal, a exemplo do que era feito antes da adoção obrigatória do Gov.br. As análises sobre este novo perfil de interação com o site poderão ser feitas a partir dos índices dos próximos ciclos.
	Tempo de permanência no site da Sudene (TP – site)	-	1’44’’	-
	Taxa de rejeição ao site da Sudene (TR – site)	não apresentar aumento superior a 10% na taxa de rejeição aferida no ciclo anterior	68,89%	Ligeiro crescimento, mas dentro da margem tolerável.
	Curtidas na página da Sudene no Facebook (FbL – RS)	aumento de 3% na quantidade de curtidas na página da Sudene no Facebook	2.859	Houve discreto crescimento. A unidade está analisando a estratégia de divulgação de conteúdo no espaço de modo a retomar o crescimento, mesmo diante de um novo padrão de consumo de informação do usuário, com preferência para o Instagram.
	Seguidores do Twitter da Sudene (TWT – RS)	aumento de 4% no número de seguidores no Twitter da Sudene	1.323	Resultados esperados, comprovando tendência global de predileção dos usuários pelo Instagram em detrimento de outras redes sociais.
	Seguidores no Instagram da Sudene	aumento de 3% no número de seguidores no Instagram da Sudene	3.335	Resultados positivos, evidenciando tendência global de aumento de engajamento no Instagram.
	Matérias publicadas (MP - JOR)	30 matérias por ciclo	57	-
	Sugestões de pauta enviadas à imprensa (IMP - JOR)	12 sugestões de pauta por ciclo	21	-
	Peças audiovisuais (A&V - JOR)	10 produções em áudio ou vídeo	37	-
	Jobs de publicidade e design (JOBS)	-	142	Produção acima da média.

Anexo VI - Acompanhamento da série histórica dos Indicadores da Metodologia de Monitoramento e Controle da Programação

Gestão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE)

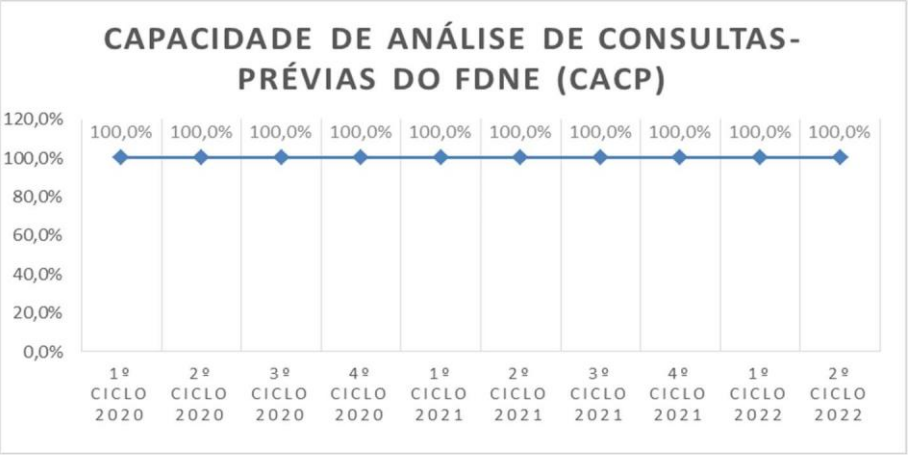

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

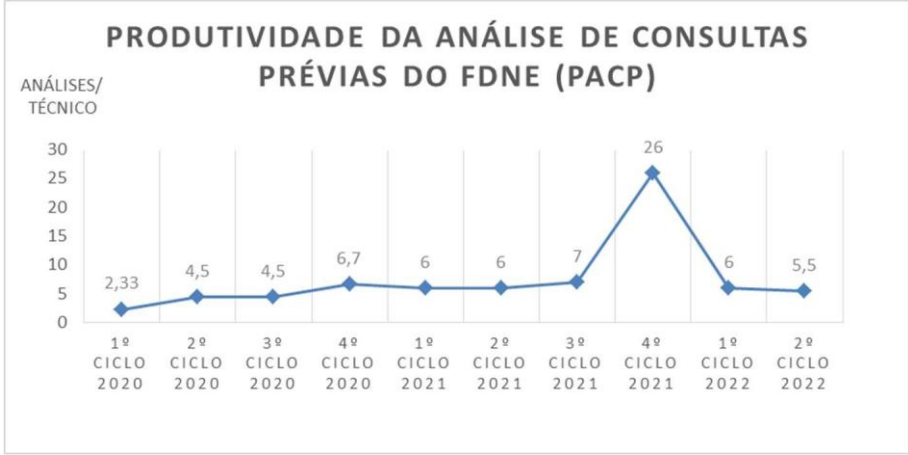

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

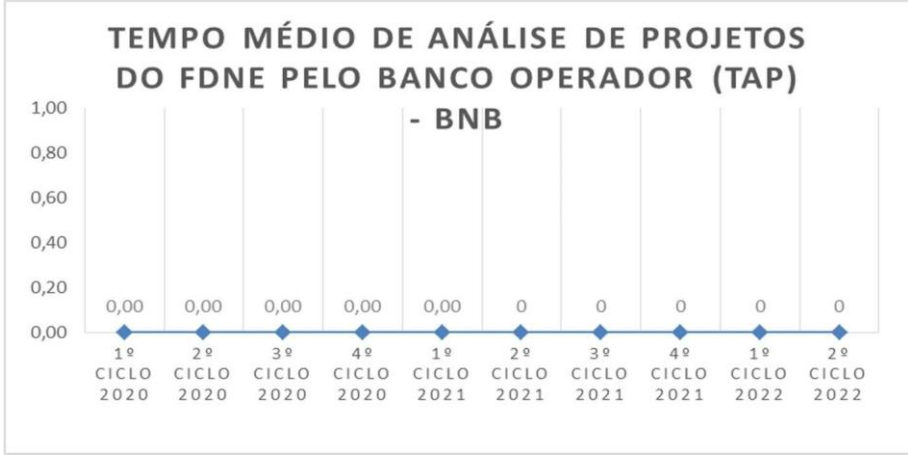

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

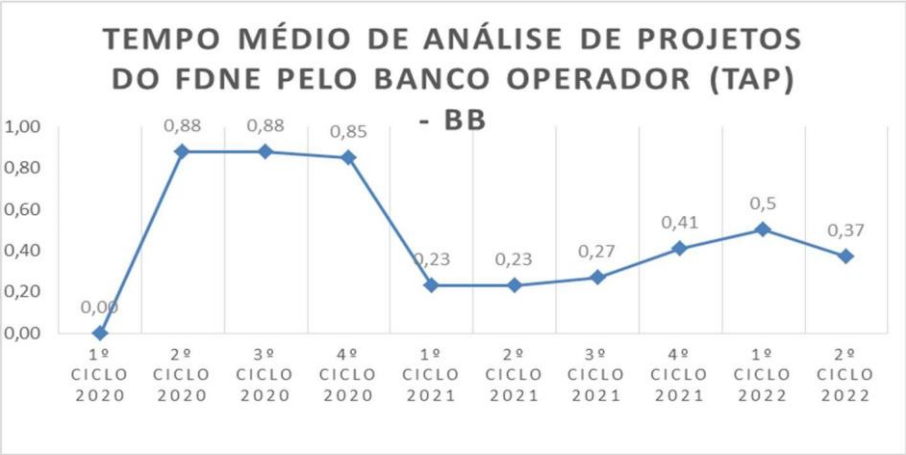

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

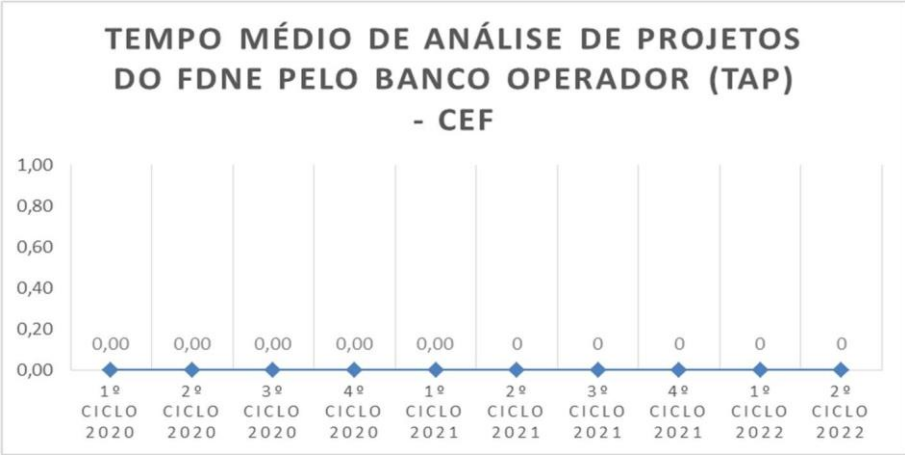

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

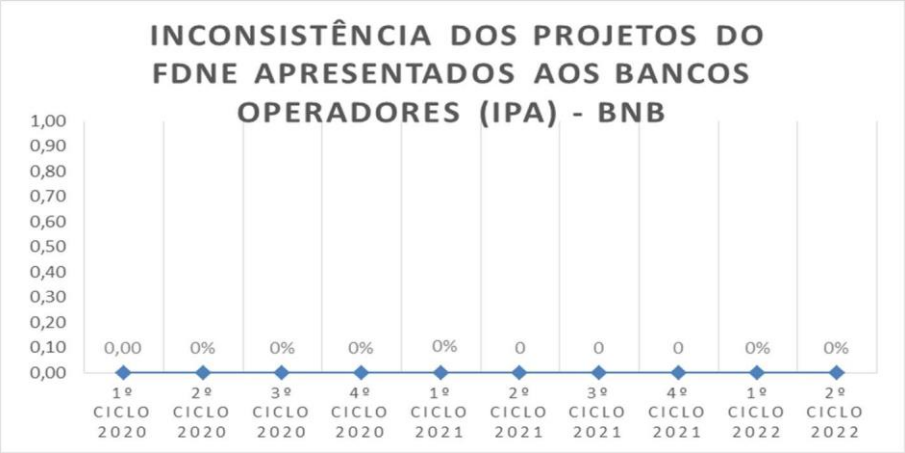

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

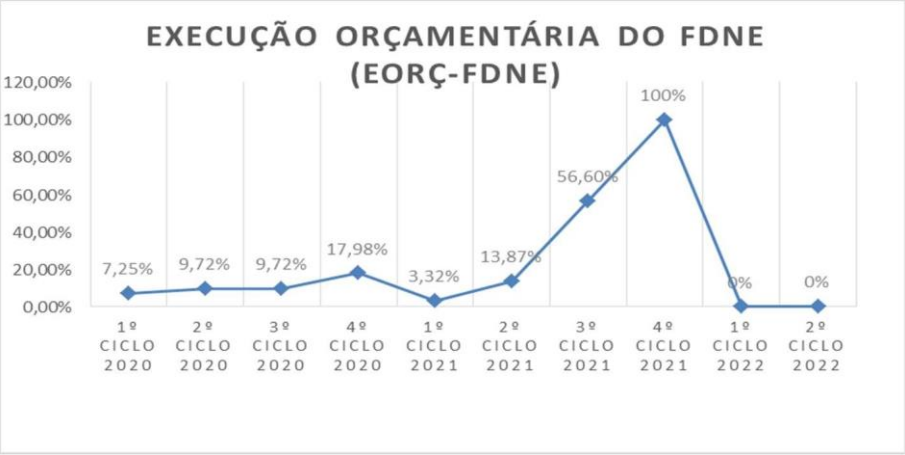

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

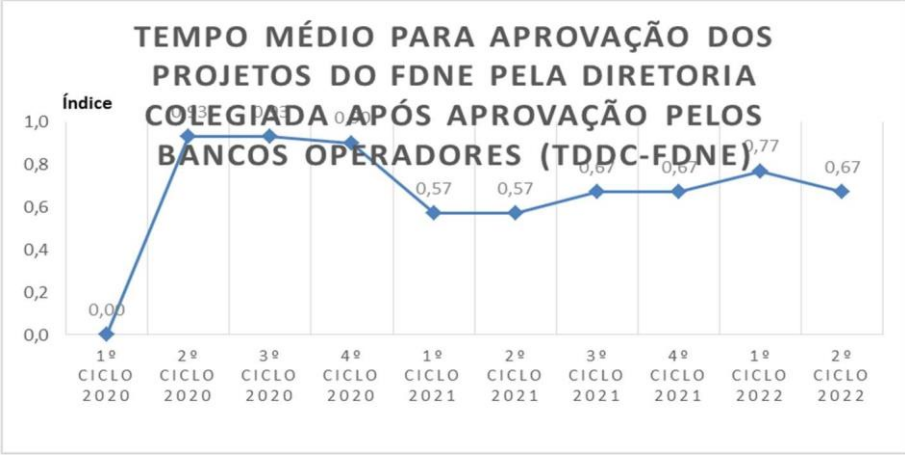

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

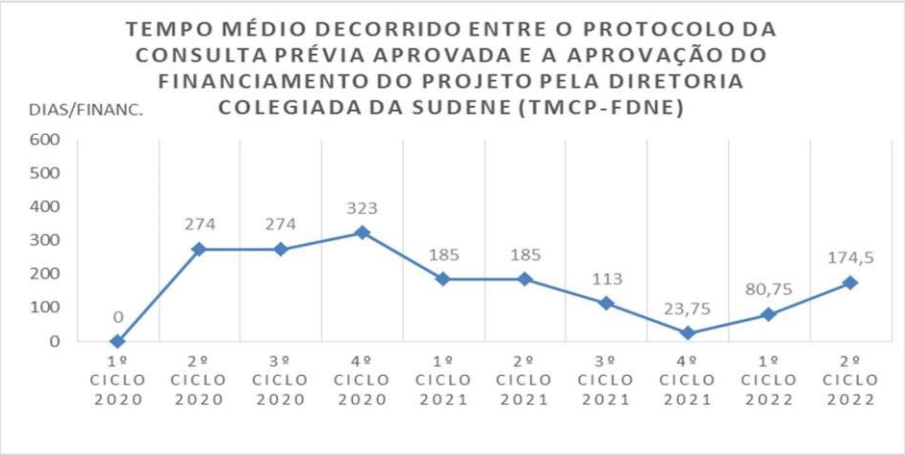

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

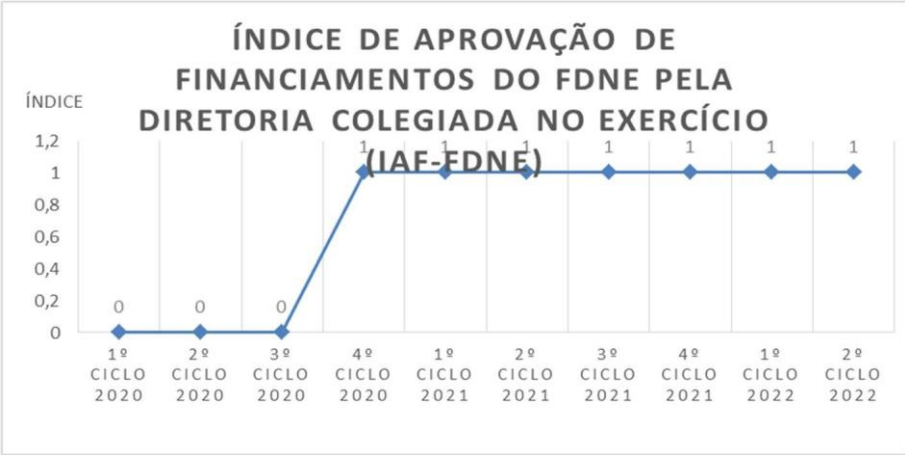

Fonte: Coordenação-Geral de Fundos de Desenvolvimento e Financiamento

Gestão de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

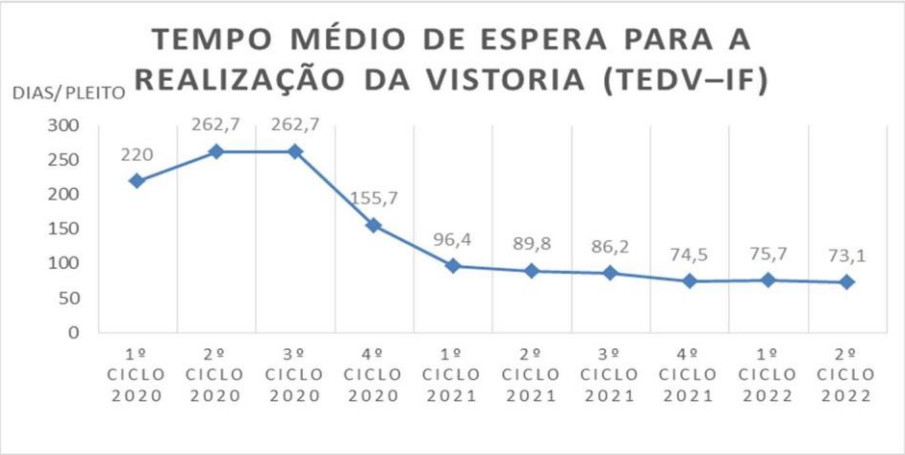

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

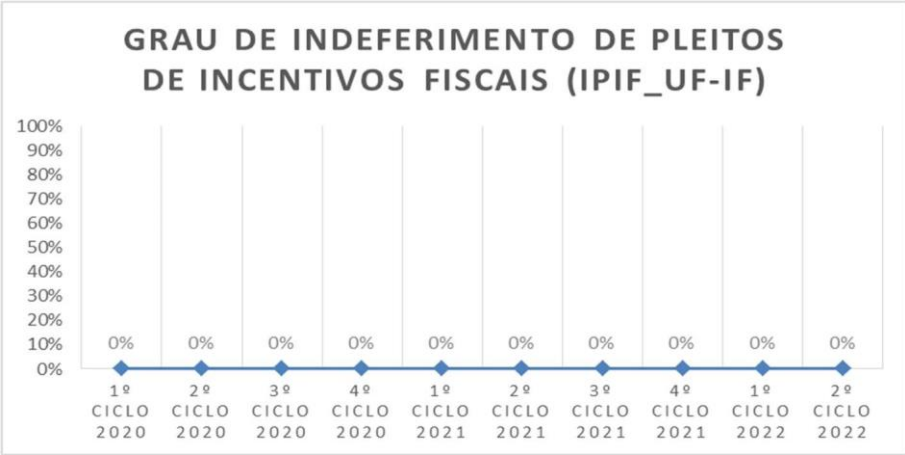

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

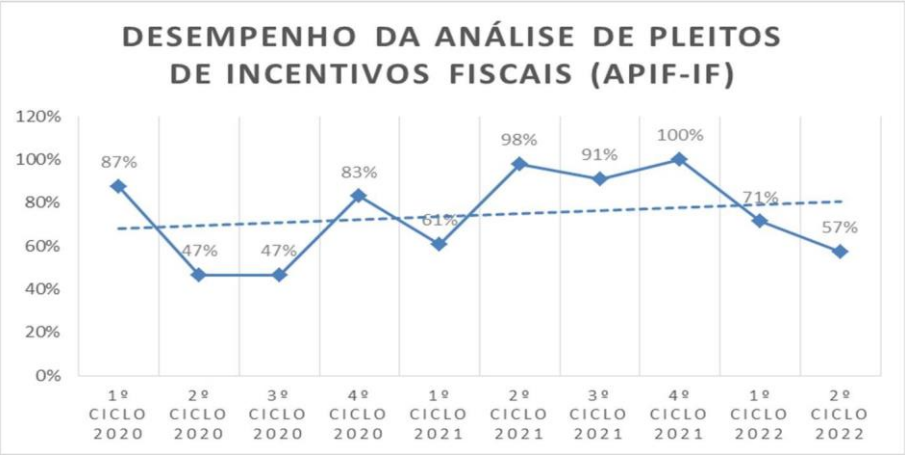

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

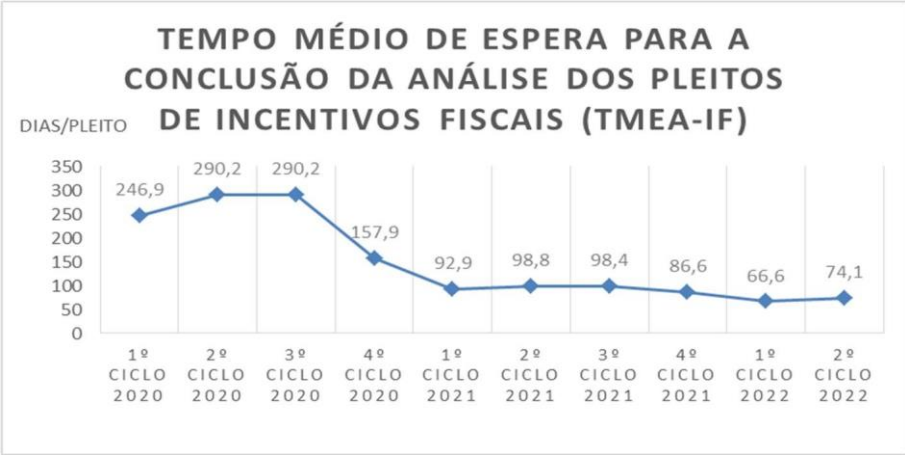

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Fonte: Coordenação-Geral de Incentivos e Benefícios Fiscais e Financeiros

Gestão de Convênios

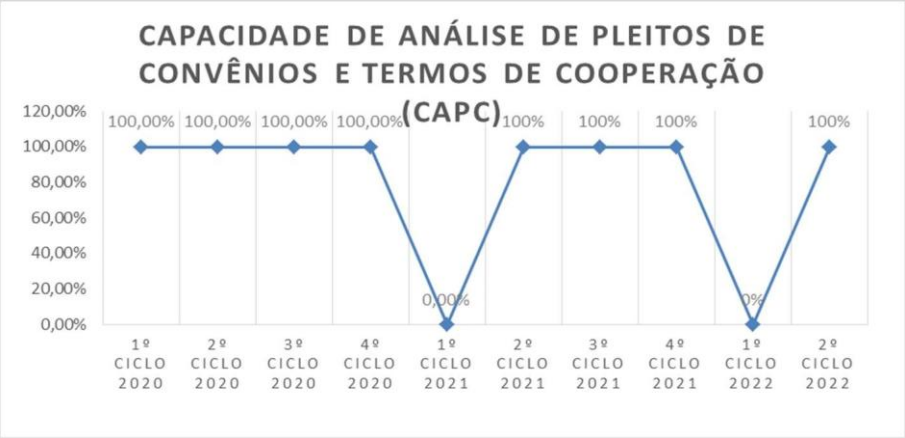

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

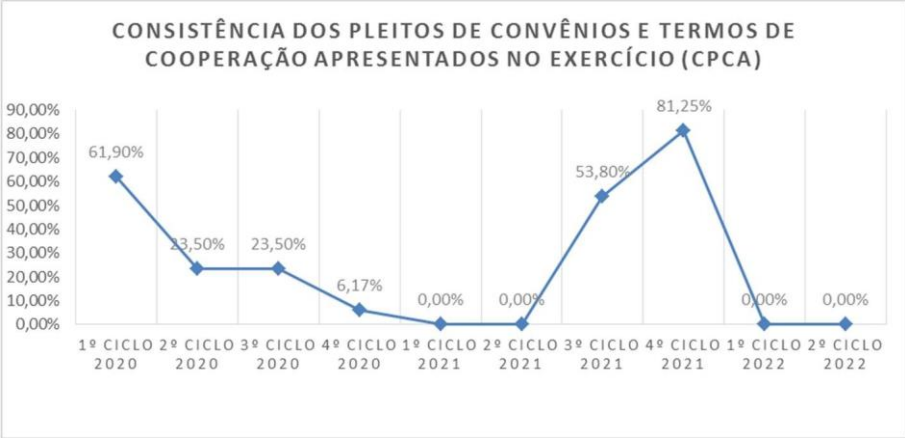

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

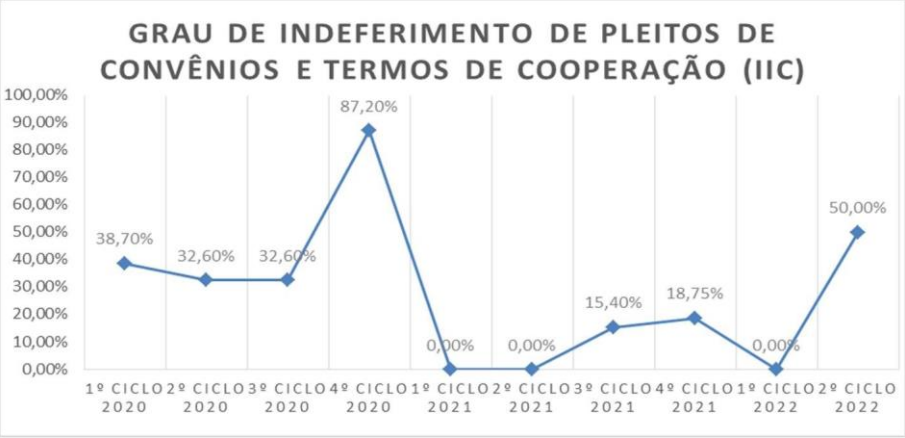

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Notas:

(1) O cálculo se aplica apenas a pleitos analisados e protocolados que foram rejeitados no período.

(2) A antítese (diferença entre o resultado encontrado e 100%) corresponde à taxa de sucesso, mas também poderá representar o grau de conhecimento, dentro do espaço de atuação da SUDENE, sobre a sistemática de convênios ou Termos de Cooperação por parte dos pleiteantes.

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Notas:

(1) É considerado o tempo da data de entrada do pleito no protocolo da Sudene (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).

(2) A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício, não considerando os pleitos rejeitados no período.

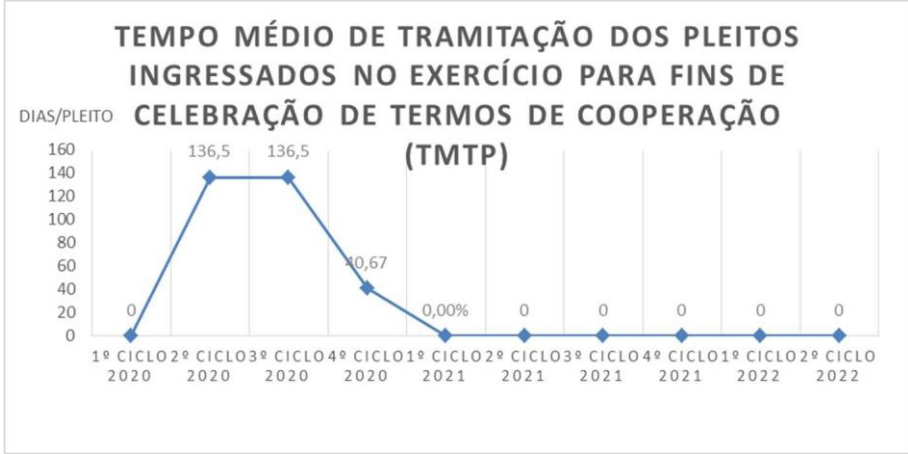

Fonte: Coordenação-Geral de Promoção do Desenvolvimento Sustentável

Notas:

(1) É considerado o tempo da data de entrada do pleito no protocolo da Sudene (em condições de conformidade) até sua celebração (assinatura pelas partes).

(2) A medição se aplica apenas aos pleitos ingressados no exercício, não considerando os pleitos rejeitados no período.

Gestão de Pessoas

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: os dados iniciam são acumulados ao longo dos trimestres do mesmo exercício e são reiniciados a cada exercício.

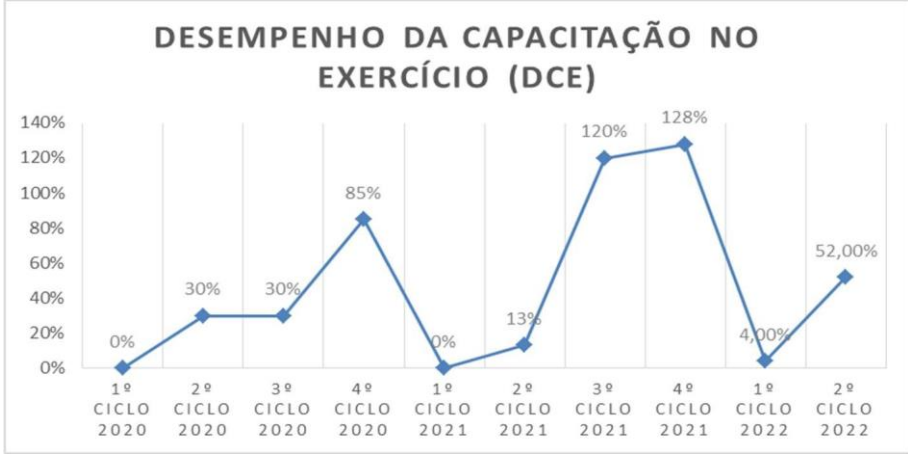

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: os dados iniciam são acumulados ao longo dos trimestres do mesmo exercício e são reiniciados a cada exercício.

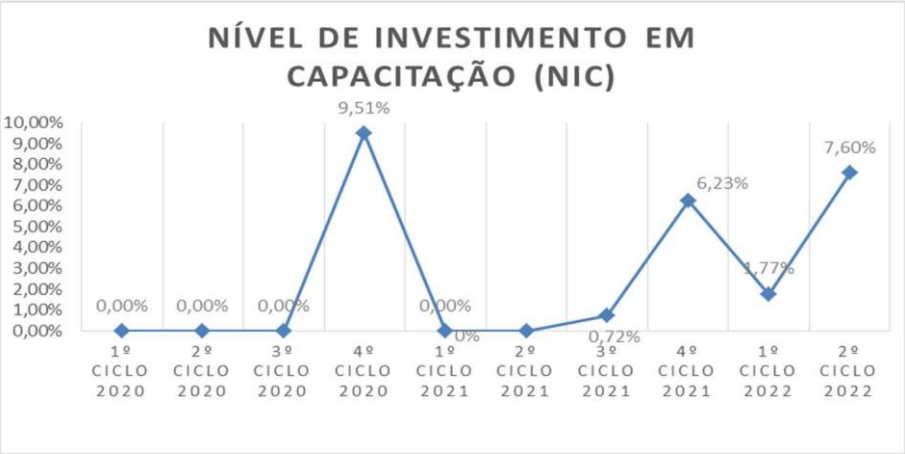

Fonte: Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas

Nota: os dados iniciam são acumulados ao longo dos trimestres do mesmo exercício e são reiniciados a cada exercício.

Gestão da Comunicação Social e Marketing Institucional

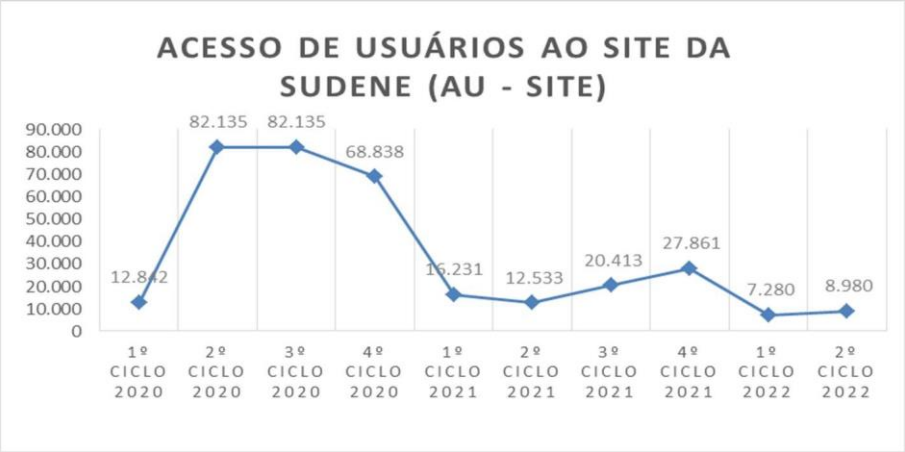

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

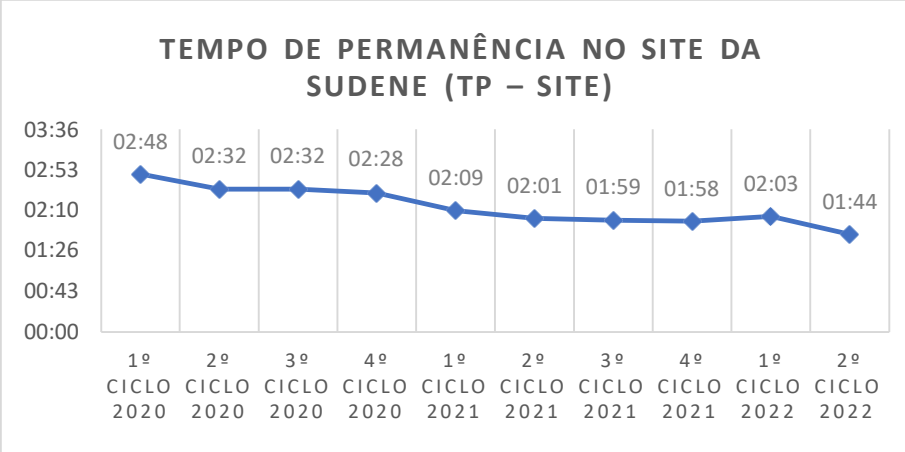

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

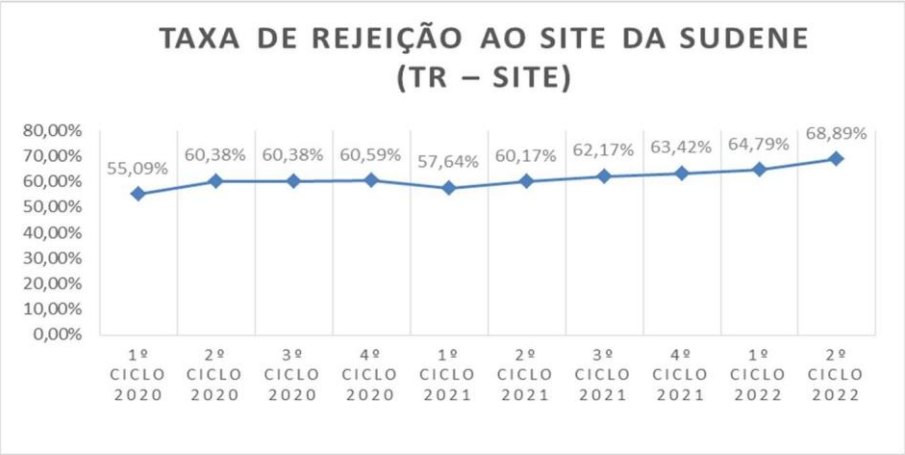

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional
Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

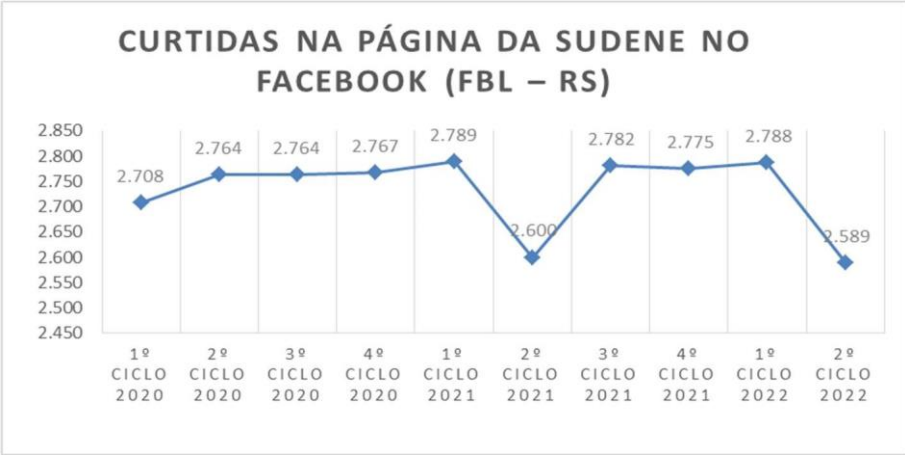

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional
Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

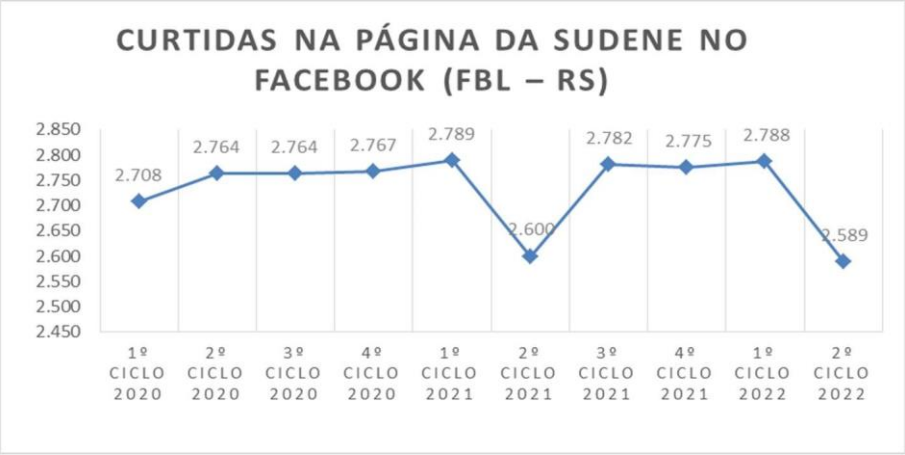

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional
Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

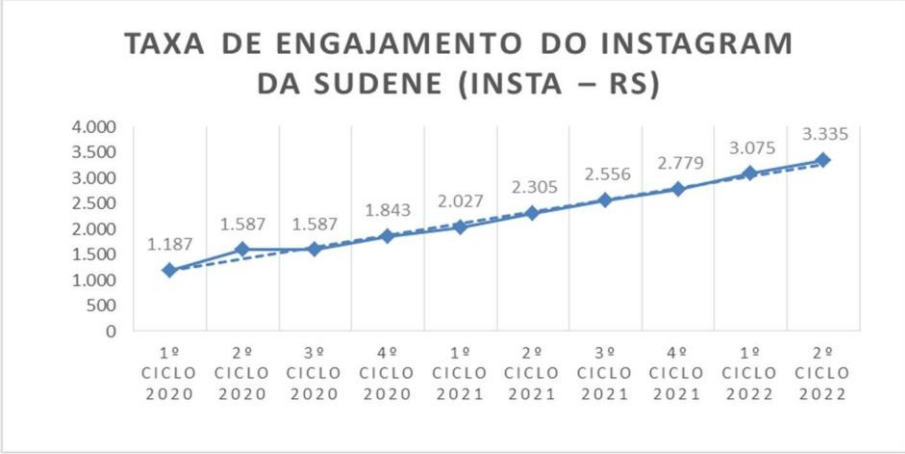

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional
Nota: A linha de tendência mostra o comportamento esperado para os próximos ciclos.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

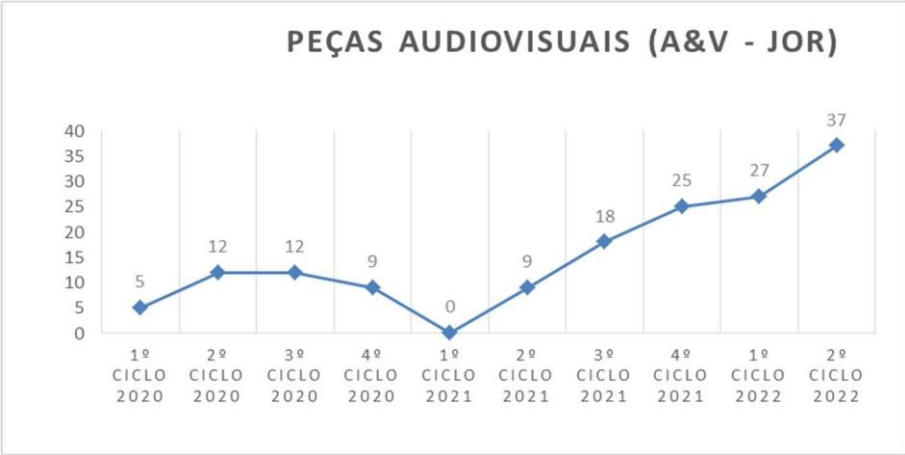

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

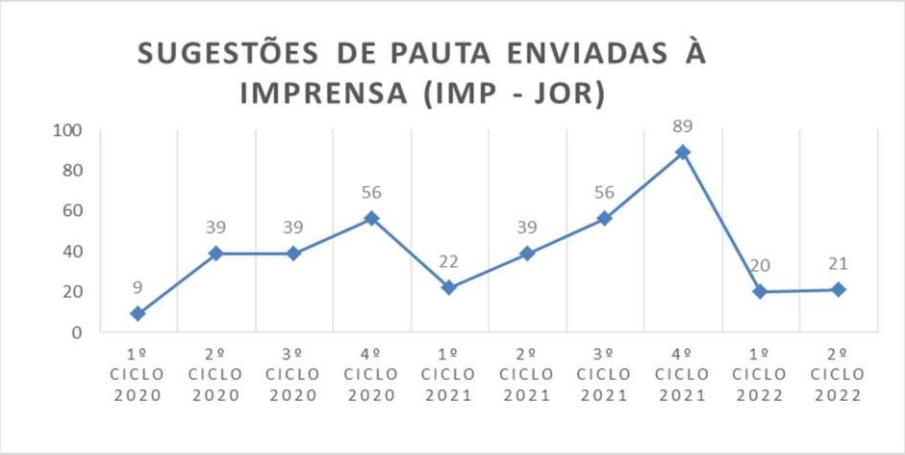

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Fonte: Assessoria de Comunicação Social e Marketing Institucional

Anexo VII – Resultado parcial das metas de desempenho institucional
(período de 1º de outubro de 2021 a 30 de junho de 2022)

#	Perspectiva Estratégica da Sudene	Objetivo Estratégico da Sudene	Unidade de Medida	Meta Física (Prevista)	Percentual Atingido	Desempenho Institucional Atingido (pontos)	Identificação do Projeto	Unidade Responsável
1	1. Resultados para a sociedade.	2. Planejar e Fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional.	Nota Técnica	1 (100%)	100%	80	Projeto: Revisão do Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste PRDNE PO CGCP/2020001 Obs: Meta será repactuada.	CGCP/DPLAN
2	1. Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Parecer Técnico	5 (100%)	100% (5 Pareceres)	80	Elaboração de um Estudo de Complexidade Econômica, um Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio São Francisco e área de influência do Projeto de Integração do São Francisco (PISF) e elaboração de um Plano de Ação Estratégica para a bacia hidrográfica do Rio Parnaíba. PO CGCP 2021006.	CGCP/DPLAN CGEP/DPLAN
3	1. Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Parecer Técnico	8 (100%)	75% (6 pareceres)	60	Projeto: Fortalecer uma rede policêntrica de 52 cidades polo das regiões intermediárias da área de atuação da Sudene de forma a contribuir para implementar o Plano Regional do Desenvolvimento do Nordeste (PRDNE). PO CGCP 2022003.	CGCP/DPLAN
4	1. Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Parecer Técnico	1 (100%)	100%	80	Projeto: Propor as Diretrizes e Prioridades para aplicação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE) para 2022. PO CGCP 2022002.	CGCP/DPLAN CGDF/DFIN
5	1. Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Percentual do Projeto	50%	100%	80	Projeto: Atualizar a delimitação do Semiárido. PO CGEP/2021001.	CGEP/DPLAN

6	1. Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Parecer Técnico	1 (100%)	0%	0	Projeto: Propor as Diretrizes e Prioridades para aplicação dos recursos do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE) para 2023. PO CGCP 2022001.	CGCP/DPLAN CGDF/DFIN
7	1. Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Acordo de Cooperação Técnica (ACT) celebrado	6	133% (8 Acordos)	80	Apoio a Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. PO CGEP 2021002.	CGEP/DPLAN
8	1. Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades para a promoção do desenvolvimento regional	Celebração efetivada	1	100%	80	Avaliação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE. Meta institucional - Celebração de Avença para contratação da avaliação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE. PO CGEP 2020008.	CGEP/DPLAN
9	1. Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Percentual do Projeto	100%	20%	16	Projeto: Análise de propostas de instrumentos de transferências voluntárias por meio de Emendas Parlamentares para investimentos na área de atuação da Sudene. PO CGDS 2022002.	CGDS/DPLAN
10	1. Resultados para a Sociedade	2. Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Evento/ Webinário	4	100% (4 Webinares realizados)	80	Realização de eventos de articulação de parceiros e difusão tecnológica: webinários abordando temáticas trabalhadas pela CGDS/DPLAN. PO CGDS 2022001.	CGDS/DPLAN
11	4. Aprendizado e Crescimento	10. Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais.	Percentual	10% (100%)	14%	80	Projeto Estratégico de Desenvolvimento de Pessoas: Subprojeto de Desenvolvimento de ações para a recomposição da Força de Trabalho. PO CGGP 2021001.	CGGP/DAD

12	4. Aprendizado e Crescimento	10. Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais.	Percentual do Projeto.	20% (100%)	100% (Foi realizado 20% do projeto)	80	Projeto Estratégico de Desenvolvimento de Pessoas: Subprojeto de Planejamento para o dimensionamento da Força de Trabalho PO CGGP/2018001	CGGP/DAD
13	4. Aprendizado e Crescimento	11. Promover a qualidade de vida no trabalho.	Percentual do Projeto.	35%	100%	80	Projeto Estratégico de Desenvolvimento de Pessoas: Subprojeto de elaboração de indicadores de Gestão de Pessoas. PO CGGP/2020001	CGGP/DAD
14	1. Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Relatórios	4	2	40	Atividade: Acompanhar a aplicação de recursos do FNE pelo BNB por meio da elaboração de relatórios.	CGDF/DFIN
15	1. Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Percentual	100%	100% (22 Pleitos)	80	Atividade: Analisar as consultas prévias apresentadas ao FDNE em até 30 (trinta) dias, conforme § 3º, art. 18 do Regulamento do FDNE (aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012).	CGDF/DFIN
16	1. Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Percentual	100%	100% (02 pleitos)	80	Atividade: Analisar os pleitos de financiamento apresentados ao FDNE em até 30 (trinta) dias, conforme § 2º, art. 22 do Regulamento do FDNE (aprovado pelo Decreto nº 7.838/2012)	CGDF/DFIN
17	1. Resultados para a Sociedade	1. Aumentar a Competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo o uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação.	Pleitos Aprovados	320	62,2% (258 pleitos)	64	Atividade: Aprovação de Pleitos de incentivos Fiscais pela Diretoria Colegiada da Sudene.	CGIF/DFIN
TOTAL ALCANÇADO (média aritmética)						**67**		

Fontes: Diretorias de Administração; de Planejamento e Articulação de Políticas; de Gestão de Fundos, Incentivos e de Atração de Investimentos, e Coordenação-Geral de Gestão Institucional da Sudene.
