



ACOMPANHAMENTO DE OBRA
Módulo Transferências Discricionárias e Legais

CONVENIENTE

Departamento de Transferências da União
Secretaria de Gestão
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Acompanhamento de OBRAS na Plataforma +Brasil.

Para seguir os passos seguintes, é necessário que o CONVENENTE:

- Tenha um dos perfis assinalados(☑) abaixo; e
- Esteja **logado** no sistema.


* Perfis ?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cadastrador de Prestação de Contas | <input checked="" type="checkbox"/> Gestor de Convênio do Convenente |
| <input type="checkbox"/> Cadastrador de Proposta | <input checked="" type="checkbox"/> Gestor Financeiro do Convenente |
| <input type="checkbox"/> Cadastrador de Usuário de Órgão de Controle do Convenente | <input checked="" type="checkbox"/> Operador Financeiro do Convenente |
| <input type="checkbox"/> Cadastrador de Usuário do Ente/Entidade | <input type="checkbox"/> Ordenador de Despesa do Convenente |
| <input type="checkbox"/> Comissão de Licitação | <input type="checkbox"/> Relator da Agenda |
| <input type="checkbox"/> Consultas Básicas do Proponente | <input type="checkbox"/> Órgão de Controle do Convenente |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fiscal do Convenente | |



O Cadastrador de Usuário do Ente/Entidade poderá dar o perfil para os usuários.

Fluxo do CONVENENTE – Ateste da execução da empresa.

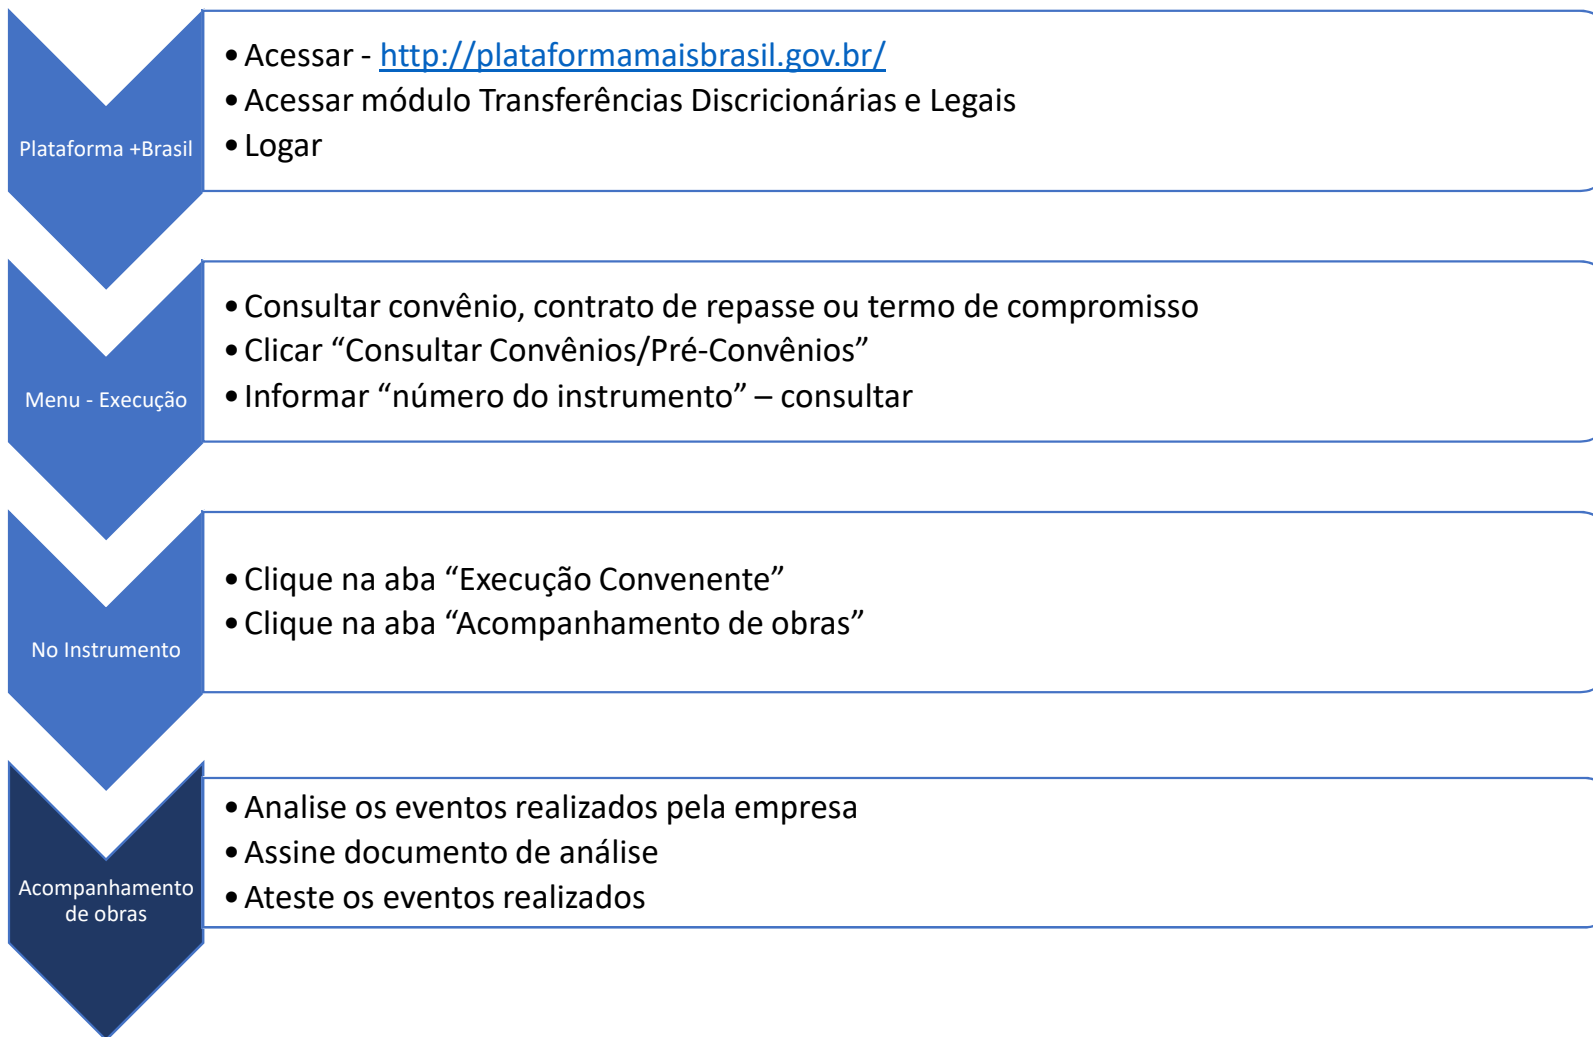

plataformamaisbrasil.gov.br

BRASIL

CORONAVÍRUS (COVID-19)

Simplifique!

Participe

Acesso à informação

Legislação

Canais

Ir para o conteúdo 1 Ir para o menu 2 Ir para a busca 3 Ir para o rodapé 4

ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE

Ministério da Economia

Plataforma +BRASIL

Buscar no portal

Sobre a Plataforma

#Rede+BRASIL

Dados e Estatísticas

Perguntas Frequentes

Contato

ACESSO AOS SISTEMAS

Acesso à
Plataforma
+Brasil

Cadastramento
Proponente

Painéis
Gerenciais
+BRASIL

Aplicativos
+BRASIL

Acesso Livre

Acesso ao
ambiente de
Treinamento

Sistema de

Clique no local
indicado.

gov.br

Legislação Acessibilidade Acesso à Informação Português Acesso GOV BR

Rede +Brasil

O que você procura?

Pesquise em gov.br/redemaisbrasil

Fale com seu Coordenador Estados Participantes Calendário Capacitação MEG-Tr Sistema de Gestão R+B

Portal da Rede +BRASIL Reformulado



Dúvidas sobre convênios?
Pergunte para Isis!



Últimas Notícias



Bem-vindo à Plataforma +Brasil

A **Plataforma +Brasil** constitui ferramenta integrada e centralizada, com dados abertos, destinada à informatização e à operacionalização das transferências de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União a órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital, municipal, direta ou indireta, consórcios públicos e entidades privadas sem fins lucrativos.

Para acessar os módulos da Plataforma +Brasil, clique nos cards abaixo:

Cadastros Acessar	Módulo Empresa Acessar	Transferências Especiais Acessar	Transferências Fundo a Fundo Acessar	Transferências Discricionárias e Legais Acessar
-----------------------------	----------------------------------	--	--	---

Selecione a opção “Transferências Discricionárias e Legais” para iniciarmos o registro.





Para iniciar o registro e envio do processo licitatório, o CONVENIENTE deve logar.




Principal

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- Verificação de Regularidade



Clique

Inicialmente consulte o instrumento (convênio, contrato de repasse ou termo de compromisso) de interesse. Clique no menu “Execução”, conforme indicado.

 Caixa de Entrada

- Foi registrada uma solicitação de esclarecimento para o convênio 854107/2017. O número dessa solicitação é 2/2018.
- Foi registrada uma solicitação de esclarecimento para o convênio 854107/2017. O número dessa solicitação é 1/2018.
- Foi registrada uma solicitação de esclarecimento para o convênio 881675/2018. O número dessa solicitação é 2/2019.
- Foi registrada uma solicitação de esclarecimento para o convênio 854107/2017. O número dessa solicitação é 1/2019.
- Foi registrada uma solicitação de esclarecimento para o convênio 854107/2017. O número dessa solicitação é 3/2018.
- Foi registrada uma solicitação de esclarecimento para o convênio 854107/2017. O número dessa solicitação é 2/2017.
- Foi registrada uma solicitação de esclarecimento para o convênio 854107/2017. O número dessa solicitação é 1/2017.

PLATAFORMA
+BRASIL

Principal

▶ Cadastramento	▶ Acomp. e Fiscalização
▶ Programas	▶ Prestação de Contas
▶ Propostas	▶ Administração
▶ Execução	▶ TCE
▶ Inf. Gerenciais	▶ Verificação de Regularidade
▶ Cadastros	

Caixa de Entrada
Foi registrada uma solicitação de esclarecimento para o convênio 854107/2017. O número dessa solicitação é 2/2018.
Foi registrada uma solicitação de esclarecimento para o convênio 854107/2017. O número dessa solicitação é 1/2018.
Foi registrada uma solicitação de esclarecimento para o convênio 881675/2018. O número dessa solicitação é 2/2019.
Foi registrada uma solicitação de esclarecimento para o convênio 854107/2017. O número dessa solicitação é 1/2019.
Foi registrada uma solicitação de esclarecimento para o convênio 854107/2017. O número dessa solicitação é 3/2018.
Foi registrada uma solicitação de esclarecimento para o convênio 854107/2017. O número dessa solicitação é 2/2017.
Foi registrada uma solicitação de esclarecimento para o convênio 854107/2017. O número dessa solicitação é 1/2017.

Execução

- » Aplicação em Poupança
- » Apostilamento
- » Autorizar Movimentação Financeira
- » Cadastrar Credor da Transferência Voluntária
- » Cancelar Movimentação Financeira
- » Classificar Ingresso de Recursos
- » Complementar Dados de Câmbio do Documento de Liquidação
- » Conciliação Bancária
- » Consultar Convênios Reservados
- » Consultar Convênios/Pré-Convênios
- » Consultar Documento de Liquidação
- » Consultar Domicílio Bancário Credor
- » Consultar Tributos / Contribuições / Retenções
- » Contratos
- » Devolução de Recursos
- » Discriminar OBTV
- » Extrato Bancário do Convênio
- » Incluir Documento de Liquidação
- » Listar Movimentações Financeiras
- » Ordenador Despesa OBTV
- » Pagamento com OBTV
- » Processo de Compra
- » Prorroga de Ofício
- » Realizar Eventos/Retificações
- » Recolher Tributo / Pagar Contribuição com OBTV
- » Registrar Notificação
- » Registro Execução Termo de Parceria
- » Registro Ingresso de Recurso
- » Reiniciar Senha OBTV
- » Relatórios Execução
- » Termos Aditivos

Clique

Para consultar o instrumento (convênio, contrato de repasse ou termo de compromisso) de interesse, clique na opção “Consultar Convênios/Pré-Convênios”.

PLATAFORMA
BRASIL

Página Principal

Cadastramento

Programas

Propostas

Execução

Inf. Gerenciais

Cadastros

Acomp. e Fiscalização

Prestação de Contas

Administração

TCE

Verificação de Regularidade

Principal > Consultar Pré-Convênio/Convênio

Consultar Pré-Convênio/Convênio

Preencha os campos abaixo com os dados da consulta e clique em "Consultar".

Número da Proposta

Número do Convênio/Pré-Convênio

Consultar

Clique

Órgão Convênio/Pré-Convênio



Código da UG do Órgão

Modalidade

Ano

Situação do Convênio/Pré-Convênio

- Não Aprovado Plano de Trabalho
- Não empenhado
- Não Assinado
- Não Publicado
- Pendente de Envio para o SIAFI
- Opera por OBTV
- Solicitação de TA
- TA em Ajuste pelo Concedente
- Em prorrogação
- Solicitação de Ajuste do PT
- Aguardando aprovação de Ajuste de PT
- PC em complementação
- Em Sub-Rogação

Informe o número do seu instrumento e clique em "Consultar".

- Aprovado Plano de Trabalho
- Empenhado
- Assinado
- Publicado
- Enviado para o SIAFI
- Cláusula Suspensiva/Liminar Judicial
- TA em Ajuste pelo Convenente
- TA em Análise
- Em Complementação de Prorroga
- Em Ajuste do PT
- Aguardando análise de PC
- Tem TCE
- Legados

Código do Programa

Código Parlamentar



Número Emenda Parlamentar

Nome do Proponente

- | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|
| ▶ Cadastro | ▶ Programas | ▶ Propostas | ▶ Execução | ▶ Inf. Gerenciais | ▶ Cadastros | ▶ Acomp. e Fiscalização |
| ▶ Prestação de Contas | ▶ Administração | ▶ TCE | ▶ Verificação de Regularidade | | | |

Principal > Consultar Pré-Convênio/Convênio

Consultar Pré-Convênio/Convênio

Lista de Pré-Convênios/Convênios

Selecione o PRÉ-CONVÊNIO/CONVÊNIO de seu interesse para obter o detalhamento

Filtros da pesquisa: Nenhum

Página 1 de 1 (1 item(s))

Número do Convênio/Pré-Convênio

881887/2018



Clique

Para acessar o instrumento de interesse, clique no identificador do instrumento, conforme indicado.

Consultar Pré-Convênio/Convênio

Dados da Proposta | Plano de Trabalho | Requisitos | Projeto Básico/Termo de Referência | Execução Concedente | Execução Conveniente

Dados | Programas | Participantes



Clique



Verifique

Modalidade	Convênio	Situação no SIAFI	Enviado para o SIAFI - 2019NS000550
Situação de Contratação Atual	Normal		
Situação	Em execução		
	Empenhado	sim	Publicação Publicado
Número do Convênio	881887/2018	Número da Proposta	064951/2018
Número Interno do Órgão	02532/2018		
Número do Processo	25100.017524/2018-70		

Para iniciar o registro do processo licitatório, o instrumento deve estar com as situações conforme destaque. Após realizar a verificação, clique no menu "Execução Conveniente", conforme indicado.

- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- Administração
- TCE
- Verificação de Regularidade

Principal > Consultar Pré-Convênio/Convênio

Consultar Pré-Convênio/Convênio

Convênio 881887/2018

- Dados da Proposta
- Plano de Trabalho
- Requisitos
- Projeto Básico/Termo de Referência
- Execução Concedente
- Execução Conveniente
- Ajustes do PT
- Prorroga de Ofício
- TAs
- Apostilamentos
- Processo de Execução
- Verificação do Resultado do Processo Licitatório
- Instrumentos Contratuais
- Acompanhamento de Obras
- Documento de Liquidação
- Movimentações Financeiras
- Rendimento de Aplicação
- Relatórios de Execução




Modalidade	Convênio	Situação no SIAFI	viado para o SIAFI - 2019NS000550
Situação de Contratação Atual	Normal		
Situação	Em execução		
	Empenhado	sim	Publicação Publicado
Número do Convênio	881887/2018	Número da Proposta	064951/2018
Número Interno do Órgão	02532/2018		
Número do Processo	25100.017524/2018-70		



Clique em “Acompanhamento de Obras”, conforme indicado.

Para iniciar o processo de ateste do processo de execução, clique no ícone indicado.

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

Submeta	Situação	Valor Total R\$	Realizado	Empresa		Conveniente		Concedente		Ações
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	
CTEF 123	Medição 1									 4 dias
1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1	Apta a Iniciar	124.600,00	Período	111.100,00	89,17					
			Acumulado	111.100,00	89,17					
Lote 2										
2.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 2	SPA Concluída Automaticamente pelo Sistema - Fase de Análise									
Total		124.600,00	Acumulado	111.100,00	89,17					

Clique

Se a instrução contratual ainda não foi realizada, as ações de atualização e medição estarão inativas.

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10



Quantidade de dias sem medição.

MEDIÇÃO
Medições
Lista de Medições Efetuadas

Empresa contratada

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Clique no ícone ► para iniciar a análise e o ateste dos eventos realizados pela empresa contratada.

Medições Histórico

Medições

Número	Período	Realizado	Empresa		Conveniente		Concedente		Situação
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	14/05/2021 a 14/05/2021	Período	111.100,00	89,17					Enviada para o Conveniente
		Acumulado	111.100,00	89,17					

Clique

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10 « < 1 > »

Voltar


MEDIÇÃO

Medições

Lista de Medições Efetuadas

Iniciar Ateste

Deseja iniciar o ateste da medição?



▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medições | Histórico

Medições

Número	Período	Realizado	Empresa		Convenente		Concedente		Situação	Ações
			R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	14/05/2021 a 14/05/2021	Período	111.100,00	89,17					Enviada para o Convenente	
		Acumulado	111.100,00	89,17						

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10 « < 1 > »

✔ Ateste da medição iniciado com sucesso.

MEDIÇÃO

Medição 1

Escolha uma submeta abaixo para fiscalizar uma medição

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição

Observações

Medição

Data de Início do Objeto
14/05/2021

Data de Início da Medição
14/05/2021

Situação
Em Ateste

Data Fim da Medição
14/05/2021

Para analisar e registrar o ateste, clique no ícone indicado.

Submetas

Descrição	Valor (R\$)	Realizado	Empresa		Conveniente		Concedente	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1	124.600,00	Período	111.100,00	89,17				
		Acumulado	111.100,00	89,17				
Total	124.600,00	Período	111.100,00	89,17				
		Acumulado	111.100,00	89,17				



Clique

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10 « < 1 > »

[Voltar](#)

[Solicitar Complementação](#)

Preencher Medição 1

Informe Abaixo quais Eventos foram Concluídos na Medição

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição

Data de Início do Objeto
14/05/2021

Data de Início da Medição
14/05/2021

Situação
Em Ateste

Data Fim da Medição
14/05/2021

1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1

Assinatura Responsável Técnico

Aqui o fiscal verifica quem foi o responsável pela execução dos eventos concluídos pela empresa.

CPF	Nome	Perfil	CREA/CAU	Data da Assinatura
CPF	Usuário	Empresa	CREA	14/05/2021 - 21:38:31

— Frente de Obra: RUA A

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Concluído Empresa	Concluído Conveniente	Concluído Concedente
SERVIÇOS PRELIMINARES	7.700,00	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MOVIMENTO DE TERRA	1.800,00	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PAVIMENTAÇÃO	44.594,00	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	6.750,00	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
DIVERSOS	1.456,00	1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Os eventos marcados com o número "1" indicam que a empresa declarou que executou os respectivos eventos na Medição 1.

Voltar

Salvar Rascunho

Assinar

Continua na próxima página

— Frente de Obra: RUA A

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Concluído	Concluído	Concluído
				Empresa	Conveniente	Concedente
SERVIÇOS PRELIMINARES	7.700,00			1	<input checked="" type="checkbox"/>	
MOVIMENTO DE TERRA	1.800,00			1	<input type="checkbox"/>	
PAVIMENTAÇÃO	44.594,00			1	<input type="checkbox"/>	
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	6.750,00					
DIVERSOS	1.456,00			1	<input type="checkbox"/>	

Ateste

O fiscal do conveniente vai analisando e atestando se os eventos declarados pela empresa foram ou não executados. O ateste é realizado ao clicar no ícone indicado.

— Frente de Obra: RUA B

Evento / Descrição do Serviço	Valor do Evento (R\$)	Qtde.	Unid.	Concluído	Concluído	Concluído
				Empresa	Conveniente	Concedente
SERVIÇOS PRELIMINARES	7.700,00			1	<input type="checkbox"/>	
MOVIMENTO DE TERRA	1.800,00			1	<input checked="" type="checkbox"/>	
PAVIMENTAÇÃO	44.594,00			1	<input checked="" type="checkbox"/>	
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE	6.750,00					
DIVERSOS	1.456,00			1	<input type="checkbox"/>	

Não atesto.

Atesto.

Finalizado a análise, o conveniente clica em “Assinar”, conforme indicado.

Valor executado informado pela empresa

111.100,00
111.100,00

101.944,00
101.944,00

Valor total atestado pelo conveniente.

Clique

O botão Assinar só é exibido para o usuário do Conveniente que possui o perfil de Fiscal do Conveniente, foi cadastrado como Responsável Técnico pela Fiscalização para a submeta em questão e possui uma ART ativa.

Voltar Salvar Rascunho **Assinar**

Submeta assinada com sucesso.

MEDIÇÃO
Preencher Medição 1
 Informe Abaixo quais Eventos foram Concluídos na Medição

Após assinar o documento de análise, os dados do fiscal serão registrados e o conveniente deve clicar em "Voltar", conforme indicado.

Termo de Compromisso 940147/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição

Data de Início do Objeto	Situação
14/05/2021	Em Ateste
Data de Início da Medição	Data Fim da Medição
14/05/2021	14/05/2021

1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1

Assinatura Responsável Técnico

CPF	Nome	Perfil	CREA/CAU	Data da Assinatura
CPF	Usuário	Empresa	CREA	14/05/2021 - 21:38:31
CPF	Usuário	Conveniente	CREA	18/05/2021 - 12:23:12

Clique

[Voltar](#)
[Salvar Rascunho](#)
[Assinar](#)

Concluído Concluído Concluído

MEDIÇÃO
Medição 1
 Escolha uma submeta abaixo para fiscalizar uma medição

Para finalizar e registrar o ateste, o conveniente clica em "Atestar Medição", conforme indicado.

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição Observações

Medição

Data de Início do Objeto	14/05/2021	Situação	Em Ateste
Data de Início da Medição	14/05/2021	Data Fim da Medição	14/05/2021

Submetas

Descrição	Valor (R\$)	Realizado	Empresa		Conveniente		Concedente		Ações
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1	124.600,00	Período	111.100,00	89,17	101.944,00	81,82			
		Acumulado	111.100,00	89,17	101.944,00	81,82			
Total	124.600,00	Período	111.100,00	89,17	101.944,00	81,82			
		Acumulado	111.100,00	89,17	101.944,00	81,82			

Exportar em formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)



Atestar Medição

Deseja confirmar o **atesto** da medição?



/ Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Medição / Alterar Medição

MEDIÇÃO

Medição 1

Escolha uma submeta abaixo para fiscalizar uma medição

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição Observações

Medição

Data de Início do Objeto
14/05/2021

Situação
Em Ateste

Data de Início da Medição
14/05/2021

Data Fim da Medição
14/05/2021

Submetas

Descrição	Valor (R\$)	Realizado	Empresa		Conveniente		Concedente		Ações
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1	124.600,00	Período	111.100,00	89,17	111.100,00	89,17			
		Acumulado	111.100,00	89,17	111.100,00	89,17			
Total	124.600,00	Período	111.100,00	89,17	111.100,00	89,17			
		Acumulado	111.100,00	89,17	111.100,00	89,17			

Voltar

Atestar Medição

Solicitar Complementação

 **Medição atestada com sucesso.**

MEDIÇÃO

Medição 1

Escolha uma submeta abaixo para detalhar a medição

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição Observações

Medição

 Data de Início do Objeto
14/05/2021


 Data de Início da Medição
14/05/2021

Submetas

 Situação
Atestada

 Data Fim da Medição
14/05/2021

Eventos atestados.

Descrição	Valor (R\$)	Realizado	Empresa		Convenente		Concedente		Ações
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1	124.600,00	Período	111.100,00	89,17	111.100,00	89,17			
		Acumulado	111.100,00	89,17	111.100,00	89,17			

Voltar

Como solicitar complementação das informações?



MEDIÇÃO

Medição 1

Escolha uma submeta abaixo para fiscalizar uma medição

Após análise o conveniente pode solicitar complementação de informações. Para solicitar, clique em "Observações".

Termo de Compromisso 940147/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição Observações

Clique
 Data da Medição: 14/05/2021
 Situação: Em Ateste
 Data de Início da Medição: 14/05/2021
 Data Fim da Medição: 14/05/2021

Submetas

Descrição	Valor (R\$)	Realizado	Empresa		Conveniente		Concedente		Ações
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1	124.600,00	Periodo	111.100,00	89,17	101.944,00	81,82			🔍 ✎
		Acumulado	111.100,00	89,17	101.944,00	81,82			
Total	124.600,00	Periodo	111.100,00	89,17	101.944,00	81,82			
		Acumulado	111.100,00	89,17	101.944,00	81,82			

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

MEDIÇÃO

Medição 1

Adicione uma Observação à Medição.

Para complementação o registro da observação é obrigatório. Clique em "Incluir", conforme indicação.

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição

Observações

Observações - Medição Atual

Nenhum Registro Encontrado.



Incluir

Voltar

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

^ Observação

Descrição

Registre todas as complementações que serão necessárias.

Caracteres restantes: 1000

Caso tenha algum documento para anexar, que contribua com as complementações solicitadas, clique no campo Arquivo e na sequência clique em "+Anexar".

^ Anexos

Arquivo



Arquivo a Anexar

Clique 01

Nome do Arquivo

Nenhum item incluído

Clique 02

Itens por pág. 10

Cancelar

Salvar

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

^ Observação

Descrição

Complementação - Tutorial

Registro de todas as complementações que serão necessárias.

Caracteres restantes: 975

^ Anexos

Arquivo



Arquivo a Anexar

+ Anexar

Nome do Arquivo

MODELO TUTORIAL.pdf

Arquivo anexado

Ação



Itens por pág. 10 « < 1 > »

Cancelar

Salvar

Clique

Clique em "Salvar"

Observação salva com sucesso.

MEDIÇÃO

Medição 1

Adicione uma Observação à Medição.

Termo de Compromisso 940147/2021

Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição Observações

Observações - Medição Atual

Incluir

Exibir Anexos Inativos

Data	Perfil	Responsável	Descrição	Anexos	Ações
18/05/2021	Conveniente	Usuário	Complementação - Tutorial	MODELO TUTORIAL.pdf	

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10 1 > >>

Observações salvas, o conveniente pode alterar as observações ou excluí-las.

Clique

Voltar



- Cadastramento
- Programas
- Propostas
- Execução
- Inf. Gerenciais
- Cadastros
- Acomp. e Fiscalização
- Prestação de Contas
- Administração
- TCE
- Verificação de Regularidade

Página Principal

/ Acompanhamento de Obras / Contrato de Execução e/ou Fornecimento / Medição / Listar Medição

MEDIÇÃO

Medições

Lista de Medições Efetuadas


▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medições Histórico

Medições

Número	Período	Realizado	Empresa		Conveniente		Concedente		Situação	Ações
			R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	14/05/2021 a 14/05/2021	Período	111.100,00	89,17	101.944,00					
		Acumulado	111.100,00	89,17	101.944,00					



Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. « < 1 > »

Voltar

MEDIÇÃO
Medição 1

Escolha uma submeta abaixo para fiscalizar uma medição

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição Observações

Medição

Data de Início do Objeto
14/05/2021

Situação
Em Ateste

Data de Início da Medição
14/05/2021

Data Fim da Medição
14/05/2021

Submetas

Descrição	Valor (R\$)	Realizado	Empresa		Convenente		Concedente		Ações
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.1 - Submeta: Execução da Paviment	124.600,00	Período	111.100,00	89,17	101.944,00	81,82			
		Acumulado	111.100,00	89,17	101.944,00	81,82			
Total	124.600,00	Período	111.100,00	89,17	101.944,00	81,82			
		Acumulado	111.100,00	89,17	101.944,00	81,82			

Clique

Voltar


Atestar Medição

Solicitar Complementação

MEDIÇÃO
Medição 1
 Escolha uma submeta abaixo para fiscalizar uma medição

Solicitar Complementação para Empresa

Deseja solicitar **complementação para empresa**? Ressalta-se que a marcação dos eventos feitas pelo Conveniente serão perdidas, as Observações da medição serão mantidas.



- ▼ Termo de Compromisso 940147/2021
- ▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medição Observações

Medição

Data de Início do Objeto 14/05/2021	Situação Em Ateste
Data de Início da Medição 14/05/2021	Data Fim da Medição 14/05/2021

Submetas

Descrição	Valor (R\$)	Realizado	Empresa		Conveniente		Concedente		Ações
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1.1 - Submeta: Execução da Pavimentação da Parte 1	124.600,00	Período	111.100,00	89,17	101.944,00	81,82			
		Acumulado	111.100,00	89,17	101.944,00	81,82			
Total	124.600,00	Período	111.100,00	89,17	101.944,00	81,82			
		Acumulado	111.100,00	89,17	101.944,00	81,82			

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Solicitação de complementação efetuada com sucesso.



MEDIÇÃO
Medições
Lista de Medições Efetuadas

▼ Termo de Compromisso 940147/2021

▼ Contrato de Execução e/ou Fornecimento 123

Medições Histórico

Medições

Número	Período	Realizado		Empresa		Conveniente		Concedente		Situação	Ações
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%		
1	14/05/2021 a 14/05/2021	Período	89,17	111.100,00	89,17					Enviada para Complementação da Empresa	
	Acumulado	89,17	111.100,00	89,17							

Exportar o conteúdo dessa tabela no formato [TXT](#), [CSV](#), [XLS](#), [PDF](#) ou [XML](#)

Itens por pág. 10

[Voltar](#)

DÚVIDAS

- Antes de enviar seu questionamento, verifique se sua dúvida não pode ser sanada com as orientações aqui disponibilizadas.
- Caso as informações não solucionem seu questionamento, a equipe de atendimento disponibiliza opções para o registro de suas manifestações.
- **0800-978-9008** - (segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 18h)
- <https://portaldeservicos.economia.gov.br>

